

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto Recuperación De Emergencia A Causa De Ciclones Tropicales Eta E Iota En Honduras.				
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador:	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio:	6822-HN				
Monto Financiamiento L:	3,988,845,000.00				
Monto Financiamiento USD:	150,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	67 meses	Fecha de Inicio	25/5/2021	Fecha de Fin	31/12/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de Inversión:	1 - Inversión Real				
Tipo de Cambio 1 Trimestre 2026	26.5923				



2. Objetivo Estratégico

Apoyar las necesidades de respuesta y recuperación de Honduras y fortalecer la capacidad institucional para gestionar una recuperación y reconstrucción resiliente e inclusiva.

3. Cobertura	
Departamentos	Atlántida, Colón, Comayagua, Copán, Cortes, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Yoro
Municipios	La Ceiba, El Porvenir, Esparta, Jutiapa, La Masica, San Francisco, Tela, Arizona, Trujillo, Balfate, Iriona, Limón, Sabá, Santa Fe, Santa Rosa De Aguán, Sonaguera, Tocoa, Bonito Oriental, Comayagua, San José Del Potrero, Santa Rosa De Copán, Cabañas, Concepción, Conquín, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, La Jigua, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, Santa Rita, Trinidad De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, Onoa, Pimienta, Potrerillos, Puerto Cortés, San Antonio De Cortés, Villanueva, La Lima, Duyure, Yusearán, Danlí, Teapasantí, Distrito Central, Cantarranas, Puerto Lempira, Brus Laguna, Ahuás, Juan Francisco Bulnes, Villeda Morales, Wampusiripi, La Esperanza, Jesús De Otoro, Masaguara, San Isidro, San Juan, San Miguelito, Yamaranguila, San Francisco De Opalaca, La Paz, Chinaela, Gracias, Erandique, Gualacines, La Campa, La Iguala, Las Flores, La Unión, Lepueva, San Manuel Colohete, San Sebastián, San Marcos De Caguán, Ocotepeque, Belén Gualeho, Dolores Merendón, La Encarnación, La Labor, Lacerna, San Marcos, Sensenti, Catcamas, Dulce Nombre De Culmí, San Esteban, Patuca, Santa Bárbara, Arada, Azacualpa, Ceguaca, San Jose De Colinas, Concepción Del Norte, Chinda, Gualala, Ilama, Maculizo, Protección, Quimista, San Francisco De Ojuera, San Luis, San Marcos, San Pedro Zacapa, San Vicente Centenario, Las Vegas, Yoro, El Negrito, El Progreso, Morazán, Santa Rita

Beneficiarios:	2,601,622
Generacion de empleo	



3. Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1941 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública		-	0.00	460,046,790.00
1942 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos.	460,046,790.00	-	0.00	460,046,790.00
1946 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	3,169,802,160.00	-	0.00	3,169,802,160.00
1947 - Gestión y Administración del Proyecto -UCP	84,446,507.88	-	0.00	84,446,507.88
	274,549,542.12	-	0.00	274,549,542.12
				0.00
				0.00
TOTAL	3,988,845,000.00	0.00	0.00	3,988,845,000.00




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$)	
Organismo Financiador: UEPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento
Monto Contratado:	\$124,211,000.00
Desembolsado Acumulado	\$105,594,279.38
Disponible:	\$18,616,720.62
% Desembolsado:	85%

5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)					
Presupuesto	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	
Presupuesto Aprobado:	175,465,939.00	-	-	175,465,939.00	
Presupuesto Vigente:	175,465,939.00	-	-	175,465,939.00	
Ejecutado al 31/03/2026	2,327,553.01	-	-	2,327,553.01	
% Ejecución 2026	1%			1.3%	



6. Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	
2021	175,537,269.00	-	-	175,537,269.00	1,116,987.87	-	-	1,116,987.87	0.64%
2022	259,608,231.00	-	-	259,608,231.00	53,027,150.75	-	-	53,027,150.75	20.43%
2023	407,092,852.00	-	-	407,092,852.00	345,958,202.10	-	-	345,958,202.10	84.98%
2024	480,926,045.00	-	-	480,926,045.00	432,753,537.07	-	-	432,753,537.07	89.98%
2025	651,793,199.00	-	-	651,793,199.00	496,128,263.74	-	-	496,128,263.74	76.12%
2026	175,465,939.00	-	-	175,465,939.00	2,327,553.01	-	-	2,327,553.01	1.33%
TOTAL	2,150,423,529.00	-	-	2,150,423,529.00	1,331,311,694.54	-	-	1,331,311,694.54	62%



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE 2026						
Total Entregables					% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
9	0	0	5	4	51%	0%

Seguimiento Físico De Metasproyecto Recuperación De Emergencia A Causa De Ciclones Tropicales Eta E Iota En Honduras.																		
8. ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programacion (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automaticamente																		
Componente 1. Operaciones de Asistencia y Respuesta de emergencia, y Salud y Seguridad Pública																		
Familias atendidas en albergues	Familia	60,000.00	36,643.00	61%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	ⓘ NO PROGRAMADO	0
Componente 2. Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos																		
Reconstruidos en cajas puentes	Metro	437.50	164.10	38%	0.00	0.00	0.00	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(16.60)	ⓘ CON RETRASO	353.39
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Diseño	1	3	300%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	ⓘ NO PROGRAMADO	0
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública	Metro cuadrado	1,214.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	1,378.00	1,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1378.00)	ⓘ CON RETRASO	1,378.00
Sistemas de agua potable y saneamiento básico	Sistema	17	4	24%	0.00	1.00	2.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(7.00)	ⓘ CON RETRASO	9.00
Rehabilitados en centros de educación básica	Metro cuadrado	34,300.00	28,835.13	84%	0.00	0.00	1,482.20	19,464.43	20,946.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(20946.63)	ⓘ CON RETRASO	44,144.95
Puentes reconstruidos	Puente	11	2	18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	ⓘ NO PROGRAMADO	8
Caminos rurales de terracería	Kilómetro	524.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(8.45)	ⓘ CON RETRASO	139.71
Muros de contención rehabilitados	Metro cúbico	26,000.00	2,800.00	11%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	ⓘ NO PROGRAMADO	1,456.85
TOTAL / PROMEDIO		62504.50	31808.23	51%	0.00	1.00	1484.20	20871.48	22356.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(22356.68)		47489.90

Situacion Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (ST) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026. Aún se está en una etapa de recuperación de la operatividad del proyecto; aunque se firmaron contratos de consultores con vigencia hasta el 31 de julio, todavía no se han completado pagos y no se cuenta con todos los usuarios habilitados.

Principales Riesgos Identificados

Se reconoce como tema crítico la normalización de pagos y la recuperación de la operatividad del proyecto antes de avanzar plenamente con la reestructuración.

Acciones Recomendadas

Definir formalmente cómo funcionará la reestructuración y la integración del proyecto a la SIT.
Documentar los flujos de trabajo para pagos, contrataciones, licitaciones, asuntos legales y seguimiento.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.



Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE 2026						
Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	No Programado	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
6	0	0	3	3	73%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Mejoramiento Integral De La Infraestructura Y Formacion Educativa En Honduras																		
8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	ROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Die-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente de INFRAESTRUCTURA																		
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Proyectos Formulados	141	163	116%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	NO PROGRAMADO	0
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública	Centros Escolares	141	83	59%	2	3	2	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(8.00)	CON RETRASO	0
1751 - Equipamiento y Mobiliario	Equipo	141	83	59%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	NO PROGRAMADO	0
1753 - Formación Permanente Docente																		
1754 - Formación en Emprendimiento	Tablet (Lote)	1	1	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	NO PROGRAMADO	0
ComponenteSUPERVISIÓN																		
Supervisión de Obra Física	Supervisiones	141	83	59%	2	3	2	1	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(8.00)	CON RETRASO	0
Auditoria Concurrente	Auditoria	5	4	80%	0	1	0	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	CON RETRASO	0
TOTAL / PROMEDIO		570.00	417.00	73%	4.00	7.00	4.00	2.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(17.00)		0.00

Situación Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.

los fondos correspondientes al Contrato de Préstamo BCIE No. 2-239 fueron objeto de desobligación mediante Oficio No. DGCP-FEMS-178/2026 de fecha 13 de abril de 2026

el FHIS señala que el techo presupuestario vigente aprobado para el ejercicio fiscal 2026 por un monto de L98,494,585.00 resulta insuficiente para atender los compromisos contractuales del proyecto

A la fecha no se han firmado los contratos de Febrero a marzo 2026. Se está cumpliendo 04 meses sin Honorarios Profesionales a los Consultores.

Los contrattitos enviados al congreso nacional aun no esta aprobados.

Principales Riesgos Identificados

Actualmente para cubrir con el total de los gastos de Cierre Técnico y Admon se requieren aproximadamente US\$ 11 Millones, de los cuales actualmente se tiene en deuda o Comprometidos US\$ 7.8 Millones, contando únicamente con US\$ 2 Millones en la cuenta especial del programa; y el restante se requiere para realizar el Cierre Técnico y Admon (Honorarios Profesionales, Gastos Operativos, Servicios, entre otros). En conclusión, se debería solicitar al BCIE un último desembolso de US\$ 9. Millones para lo antes expuesto.

Al no tener contratos firmados por los consultores, se afecta la operatividad del programa; ya que el personal no está autorizado para firmar: Estimaciones, Ordenes de Cambio, o hacer los cierres, entre otros. Es importante exponer, que para la firma de los mismos se lleva mas de dos meses desde la elaboración hasta la firma final.

Acciones Recomendadas

Se Requiere urgentemente la firma y pago de los contratos de personal UE de Enero a marzo.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Se han desembolsado US\$ 30,166,417.02 de US\$ 80,000,000.00 del Préstamo, pendiente de desembolar US\$ 49,833,582.98 y para el cierre técnico y financiero se requiere US\$ 11,000,000.00, de los cuales existe US\$ 2,000,000.00 en la cuenta especial lo que se deberá presentar un desembolso de US\$ 9,000,000.00. El Monto a desobligar debería de ser: US\$ 40,833,582.98

Información General del Proyecto

1. Identificación del Proyecto				
Programa/Proyecto:	Proyecto Convivencia Y Espacios Seguros Para Los Jóvenes En Honduras			
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social			
Sector:	Gobernabilidad Y Descentralización			
Organismo Financiador	167 - Kreditalstafel Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)			
Convenio	KfW 2018.6756.3			
Monto	367,106,300.00			
Financiamiento L:	10,000,000.00 C			
Monto Financiamiento :				
	172 meses	Fecha de Inicio	6/12/2013	Fecha de Fin 6/4/2028
Plazo de Ejecución:	Ejecución			
Estado del Proyecto:				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real			
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.5923			


2. Objetivo Estratégico
El objetivo consiste en promover la participacion protagonica de las y los jovenes en la revitalizacion y utilizacion de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en las municipalidades prioritizadas de forma sostenible.

3. Cobertura	
Departamentos	Comayagua, Copán, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Olancha, Yoro
Municipios	Siguatepeque, Santa Rosa De Copán, La Lima, Danlí, Distrito Central, La Esperanza, Intibucá, La Paz, Gracias, Juticalpa, Yoro, El Progreso

Beneficiarios:	112,183
Generacion de empleo	



3. Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2708 - Construcción y/o mejoramiento de infraestructura Fase III	-	166,866,500.00	0.00	166,866,500.00
2709 - Fortalecimiento de habilidades de jóvenes para el trabajo y de habilidades sociales Fase III	-	80,095,920.00	0.00	80,095,920.00
2710 - Mejoramiento de capacidades de actores relevantes como instituciones	-	33,373,300.00	0.00	33,373,300.00
2711 - Consultoría de Asistencia técnica Fase III	-	53,397,280.00	0.00	53,397,280.00
2712 - Gasto Operativo FHIS Fase III	-	-	33,373,300.00	33,373,300.00
TOTAL	0.00	333,733,000.00	33,373,300.00	367,106,300.00




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$)	
Organismo Financiador: UEPEX	167 - Kreditalstafel Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)
Monto Contratado:	C 10,000,000.00
Desembolsado Acumulado	C 1,238,035.83
Disponible:	C 8,761,964.17
% Desembolso:	12%

5. Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	-	-
Presupuesto Vigente:	-	132,819,384.00	-	132,819,384.00
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	-	-
% Ejecución 2026		0%		0.0%



Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	% de Ejecución
2024	-	16,991,101.00	3,193,654.00	20,184,755.00	-	10,003,814.23	3,193,648.75	13,197,462.98	65.38%
2025	-	66,471,315.00	6,937,170.00	73,408,485.00	-	10,792,271.67	6,937,163.94	17,729,435.61	24.15%
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	83,462,416.00	10,130,824.00	93,593,240.00	-	20,796,085.90	10,130,812.69	30,926,898.59	33%

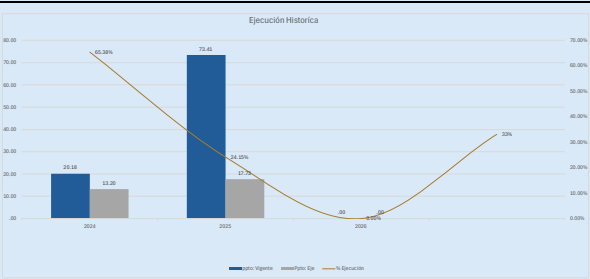

Información Física del Proyecto

%-INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	No Programdo	% Ejec. Global	Prog. vs Elec.
7	0	0	6	1	20%	0%

8. ENTREGABLE		META GLOBAL			Seguimiento Físico De Metaproyecto Convivencia Y Espacios Seguros Para Los Jóvenes En Honduras					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
1. Construcción y/o mejoramiento de infraestructura																		
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real \ Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) \ Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Contratación equipo UAP	Contratos	13	7	54%	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(6.00)	● CON RETRASO	0
Diseño y Formulación de Espacios de convivencia, parques y Plazas Juveniles urbano y periurbano	Expediente Técnicos	6	0	0%	0.00	1.00	3.00	2.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(6.00)	● CON RETRASO	0
Infraestructura Social Publica para Jóvenes, Casa de la Juventud y Centros de la Juventud	Expediente Técnicos	3	0	0%	0.00	0.00	1.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(3.00)	● CON RETRASO	0
Obras de infraestructura Social (parques, plazas, Casa de Juventud) separadas	Obras Ejecutadas	9	0	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	○ NO PROGRAMA DO	0
2. Fortalecimiento de habilidades laborales y sociales de jóvenes																		
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Contratos	10	4	40%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(2.00)	● CON RETRASO	0
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública	Capacitaciones	8	0	0%	0.00	0.00	3.00	4.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(7.00)	● CON RETRASO	0
3. Mejoramiento de capacidades de actores relevantes																		
Terminos de Referencia en Capacitación en Fortalecimiento de las Capacidades de los Actores Relevantes	Capacitaciones	5	0	0%	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	0
TOTAL / PROMEDIO		54.00	11.00	20%	0.00	1.00	7.00	17.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(25.00)		0.00

Situación Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 22 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026.

Algunos proyectos se encuentran suspendidos debido a la falta de pagos relacionados con órdenes de cambio y retenciones contractuales.

Los contrarttos enviados al congreso nacional aun no esta aprobados.

Principales Riesgos Identificados

El Organismo Financiador esta pendiente de autorización a la Unidad Ejecutora la reprogramación del cronograma, tomando como base la fecha de Orden de Inicio (8 de mayo de 2024) representa un desafío en la coordinación institucional, al depender de procesos externos para la habilitación de recursos, lo que incrementa el riesgo de acumulación de actividades y posibles demoras en la implementación de los proyectos programados.

Acciones Recomendadas

Resulta fundamental agilizar decisiones técnicas y administrativas durante 2026 para asegurar el inicio oportuno de obras y procesos sociales contemplados en la Fase III.

Dar seguimiento constante a las gestiones institucionales, documentar los avances y mantener comunicaciones activas con las autoridades para agilizar la toma de decisiones.

Prioritar el procesamiento de pagos pendientes y coordinar la reactivación inmediata de las obras una vez se regularice el proceso de transición.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El cronograma cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

Información General del Proyecto


1. Identificación del Proyecto				
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Mejora De La Infraestructura Escolar (Promine/Kfw, Fase II)			
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social			
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social			
Organismo Financiador:	167 - Kreditalant Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)			
Convenio	BMZ 2016 68 763			
Monto Financiamiento L:	L295,966,650.00			
Monto Financiamiento C:	10,384,291.59 C			
Plazo de Ejecución:	168 meses	Fecha de Inicio	10/7/2012	Fecha de Fin 31/7/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución			
Tipo de inversión	1 - Inversion Real			
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	05.0993			

2. Objetivo Estratégico


El objetivo del programa consiste en fortalecer la Rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos de las comunidades pobres a CE de calidad que operen de manera sostenible.

3. Cobertura	
Departamentos	Comayagua, Copán, Choluteca, Francisco Morazán, Gracias A Dios, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Valle
Municipios	Comayagua, Santa Rosa de Copán, Choluteca, Distrito Central, Puerto Lempira, La Esperanza, La Paz, Gracias, Ocotepeque, Santa Bárbara, San Lorenzo

Beneficiarios:	21,287
Generacion de empleo	



3.Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
1663 - Infraestructura Fase V	-	211,619,543.77	0.00	211,619,543.77
1664 - Fortalecimiento FHS Fase V	-	10,644,000.00	0.00	10,644,000.00
1665 - Asistencia Tecnica Fase V	-	37,912,656.23	0.00	37,912,656.23
1666 - Gasto Operativo FHS Fase V	-	-	13,171,950.00	13,171,950.00
1667 - Gasto Operativo SE Fase V	-	-	6,652,500.00	6,652,500.00
1668 - Fortalecimiento SE Fase V	-	10,644,000.00	0.00	10,644,000.00
1669 - Calidad Educativa SE Fase V	-	5,322,000.00	0.00	5,322,000.00
TOTAL	0.00	276,142,200.00	19,824,450.00	295,966,650.00




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$)	
Organismo Financiador:	167 - Kreditalant Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán)
Monto Contratado:	C 10,000,000
Desembolsado Acumulado	C 6,339,720
Disponible:	C 3,660,280.03
% Desembolso:	63%

Presupuesto	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	-	-	-
Presupuesto Vigente:	-	52,122,350.00	-	52,122,350.00
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	-	-
% Ejecución 2026	-	0%	-	0.0%

Presupuesto Vigente Ejecutado al 31/03/2026

6.Presupuesto Histórico Según SIAFI (L.)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				% de Ejecución
	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Credito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	
2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021	-	5,838,248.00	3,923,174.00	9,361,422.00	-	5,405,974.57	1,118,825.15	6,524,799.72	69.70%
2022	-	37,984,690.00	3,772,147.00	41,756,837.00	-	13,358,807.64	3,604,427.41	16,963,235.05	40.62%
2023	-	82,275,179.00	5,401,767.00	87,676,946.00	-	71,800,692.35	4,679,865.37	76,480,557.72	87.23%
2024	-	33,495,495.00	3,264,345.00	36,759,840.00	-	21,748,905.60	3,284,341.06	25,033,246.66	68.10%
2025	-	82,158,116.00	1,767,487.00	83,925,603.00	-	39,994,829.36	1,767,480.90	41,762,310.26	62.87%
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	241,721,728.00	17,728,920.00	259,450,648.00	-	163,309,309.52	14,434,939.89	177,744,149.41	69%

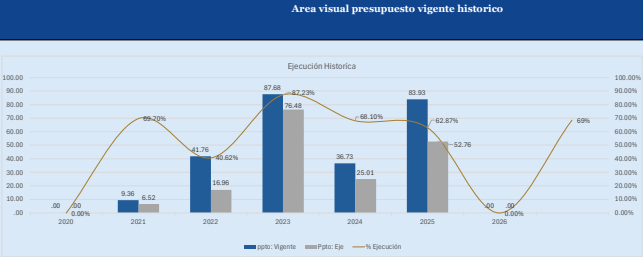

7.INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	No Programado	% Ejec. Global	%(Ejec vs Prog.)
4	0	0	3	1	43%	0%

8. ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)					RESULTADO		SEMÁFORO	'ROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog. 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente Infraestructura																		
Centros educativos construidos, reparados y/o ampliados	Centros	17	4	24%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	12
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.																		
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública		6	4	67%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	1
Componente Asistencia Técnica		7	5	71%	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(1.00)	● CON RETRASO	1
Componente Gasto Operativo		NA	0	NA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-	○ NO PROGRAMADO	NA
TOTAL / PROMEDIO		30.00	13.00	43%	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(3.00)		14.00

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir la dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026. Los contrarrios enviados al congreso nacional aun no esta aprobados.

Principales Riesgos Identificados	
1. Falta de capacitación adecuada para el personal de atención al cliente.	2. Falta de comunicación efectiva entre los departamentos de ventas y soporte técnico.
3. Falta de seguimiento de los clientes que han reportado problemas.	4. Falta de documentación clara y concisa de los procedimientos de atención al cliente.
5. Falta de recursos humanos para atender a un volumen creciente de clientes.	6. Falta de retroalimentación de los clientes para mejorar los servicios.
7. Falta de coordinación entre los equipos de marketing y ventas.	8. Falta de actualización de los productos y servicios ofrecidos.
9. Falta de control de calidad en los productos entregados.	10. Falta de transparencia en los precios y condiciones de venta.
11. Falta de cumplimiento de los plazos de entrega de los pedidos.	12. Falta de seguridad en el manejo de los datos de los clientes.
13. Falta de flexibilidad para adaptarse a cambios en el mercado.	14. Falta de inversión en tecnología para optimizar procesos.
15. Falta de alineación de los objetivos de los departamentos.	16. Falta de claridad en los roles y responsabilidades de cada empleado.
17. Falta de comunicación con los proveedores para asegurar la calidad de los insumos.	18. Falta de control de los costos de producción y distribución.
19. Falta de atención a las necesidades específicas de cada cliente.	20. Falta de seguimiento de la competencia en el mercado.

Es importante indicar que se requiere la aprobación de los contratos en el Congreso Nacional, elaboración y firmas de adendas.

Acciones Recomendadas

Ejecutar el cronograma de transición a la SIT, el cual se ha trabajado con algunos retrasos y se contempla finalizar la transición a la SIT en el mes de agosto 2026.

Solicitud de Usuarios SNIPH para realizar las acciones necesarias para la actualización de los datos del proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

El programa cuenta con financiamiento asegurado y alto impacto social, pero requiere **decisiones inmediatas para acelerar la ejecución financiera** y evitar riesgos de subejecución en el corto plazo.

1. Identificación del Proyecto

Nombre del Programa/Proyecto:	Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira				
Entidad Ejecutora:	0022 - Fondo Hondureño De Inversión Social				
Sector:	Gabinete De Infraestructura, Servicios Y Empresas Públicas				
Organismo Financiador	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica				
Convenio	BCIE-2261				
Monto Financiamiento L:	957,322,800.00				
Monto Financiamiento USD:	\$36,000,000.00				
Plazo de Ejecución:	49 meses	Fecha de Inicio	3/1/2022	Fecha de Fin	3/2/2026
Estado del Proyecto:	En Proceso de Cierre				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio 1 Trimestre 2026	26.5923				

2. Objetivo Estratégico

Eficiente Servicio de agua potable en la ciudad de Gracias, Lempira

3. Cobertura



Departamentos	Lempira
Municipios	Gracias

Beneficiarios

11,676.00 Mujeres

11,005.00 Hombres

22,681.00 Total



Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

3. Ejecución Financiera (US\$)

Organismo Financiador: UEPEX	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica
Monto Contratado:	\$36,000,000.00
Desembolsado Acumulado	\$2,652,928.50
Disponible:	\$33,347,071.50
% Desembolso:	7%


5.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)

Presupuesto	Donaciones Externas	Crédito Externo	Fondos Nacionales
Presupuesto Aprobado:	10,829,246.00	-	-
Presupuesto Vigente:	10,829,246.00	-	-
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	-
% Ejecución 2026	0%	-	-

Area visual presupuesto SIAFI 2026



■ Presupuesto Vigente: ■ Ejecutado al 31/03/2026

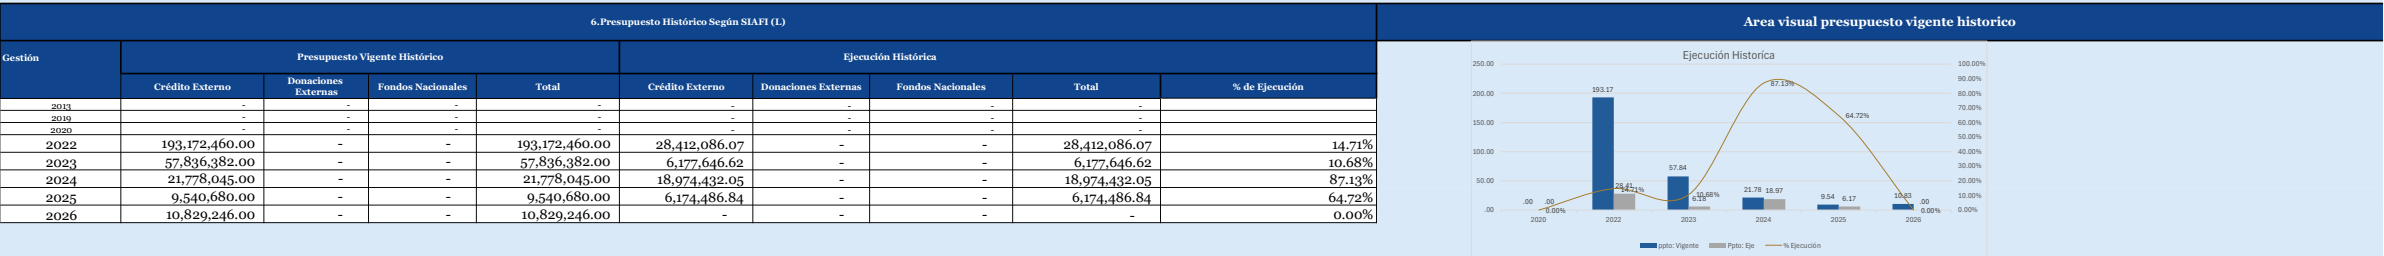

Información Física del Proyecto

7.INDICADORES CLAVE						
Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	Prog. vs Ejec.
1	0	0	0	0	0%	0%

Seguimiento Físico De Metas ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira																
8.ENTREGABLE		META GLOBAL			PROGRAMACIÓN 2026					EJECUTADO 2026 (editar)			RESULTADO		SEMÁFORO	PROG 2026-27
Estudios y diseños de infraestructura, estudios ambientales etc.	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Semáforo	Prog 2026-27
Rehabilitados en centros de asistencia en salud pública																
2044 - Preinversion				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2045 - Infraestructura				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2050 - Supervisión				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2051 - Incremento de capacidades al prestador/Capacitaciones a la comunidad																
2052 - Estrategia de Sostenibilidad de Sistema(parque solar/estaciones de bombeo)				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
2056 - Gestión y Administración				0%					0.00			0.00	0%	-	○ SIN INICIAR	0
TOTAL / PROMEDIO		0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	-		0.00

Situacion Actual

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 11 se instruye adscribir como dependencia interna de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y el proceso de traspaso de los proyectos a la nueva institución debe estar concluido en agosto del 2026. los fondos correspondientes a este Contrato de Préstamo fueron objeto de desobligación mediante Oficio No. DGCP-FEMS-178/2026 de fecha 13 de abril de 2026

El Proyecto se encuentra en proceso de cierre.

Principales Riesgos Identificados
La coordinación interinstitucional entre BCIE, SEFIN, SIT y FHIS será determinante para cumplir los plazos de cierre y devolución de remanentes establecidos.
Acciones Recomendadas
Identificar riesgos operativos y establecer acciones inmediatas para avanzar en el cierre ordenado del proyecto.
Mensaje Clave para Alta Dirección
Gestionar devolución de fondos remanentes mediante oficio ministerial y coordinación con Tesorería, Verificar saldos operativos y conciliación contable previa a devolución de recursos
