



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)

Informe No. 0511-002-2026
Tegucigalpa, julio de 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	3
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) ..	4
D. PRINCIPALES PROYECTOS	5
D.1 Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.	5
D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026.....	6
D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	7
D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026	7
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	7
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026	8
G. CONCLUSIONES	9
H. RECOMENDACIONES	9
ANEXO 1	10
ANEXO 2	11



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), anteriormente denominada Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), fue fundada en 1969. Es una institución de educación superior autónoma especializada en la formación de profesionales en el área forestal, la conservación de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Al cierre del segundo trimestre del 2026, el presupuesto vigente del Programa de Inversión Pública ascendió a L32.98 millones, de los cuales se ejecutaron de forma acumulada L2.32 millones, equivalente al 7.0% del presupuesto vigente. La asignación presupuestaria se concentró principalmente en Formación Bruta de Capital, con L20.78 millones (63.0%), seguida de Inversión Productiva, con L12.20 millones (37.0%).

En cuanto al desempeño de la ejecución al segundo trimestre, la misma alcanzó L1.43 millones, representando el 4.3% del presupuesto vigente. Asimismo, el compromiso presupuestario acumulado alcanzó L2.32 millones, correspondiente al 7.0% del presupuesto vigente, reflejando que los recursos comprometidos coinciden con el monto ejecutado al cierre del trimestre.

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) financia sus programas y proyectos, al segundo trimestre del 2026, exclusivamente con recursos provenientes del Tesoro Nacional (Fuente 11). Su presupuesto vigente asciende a L32.98 millones, constituyéndose en la única

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	32,979,703
Inversión Productiva	12,200,000
Formación Bruta de Capital	20,779,703
Presupuesto Vigente	32,979,703
Inversión Productiva	12,200,000
Formación Bruta de Capital	20,779,703
Ejecutado II Trimestre	1,431,864
Inversión Productiva	205,582
Formación Bruta de Capital	1,226,282
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	4.3%
Ejecutado Anual	2,324,870
Inversión Productiva	205,582
Formación Bruta de Capital	2,119,288
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	7.0%
Compromiso Aprobado	2,324,870
Inversión Productiva	205,582
Formación Bruta de Capital	2,119,288
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	7.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



fuentes de financiamiento para la ejecución de las inversiones institucionales durante el período analizado.

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento del presupuesto vigente y ejecutado para la UNACIFOR durante el período 2022 - 2026:

- En 2022, el presupuesto vigente fue de L15.9 millones, de los cuales se ejecutaron L2.3 millones, equivalente a una ejecución del 14.3%, reflejando un nivel de ejecución moderado durante el período.
- En 2023, el presupuesto vigente aumentó a L38.6 millones; sin embargo, la ejecución disminuyó a L1.3 millones, lo que representó apenas el 3.3% del presupuesto vigente, evidenciando una baja capacidad de ejecución en comparación con el año anterior.
- Para 2024, el presupuesto vigente se redujo a L26.3 millones, mientras que la ejecución ascendió a L4.9 millones, alcanzando un 18.7% de ejecución. Este resultado muestra una mejora significativa en el aprovechamiento de los recursos asignados respecto de 2023.
- En 2025, el presupuesto vigente se incrementó de forma considerable hasta L78.2 millones, registrándose una ejecución de L42.8 millones, equivalente al 54.7%, el porcentaje de ejecución más alto de toda la serie analizada, lo que evidencia un importante fortalecimiento en la gestión de la inversión pública.
- Al segundo trimestre del 2026, el presupuesto vigente asciende a L33.0 millones, con una ejecución acumulada de L2.3 millones, equivalente al 7.0%. Aunque este porcentaje es inferior al alcanzado en 2025, corresponde a un período parcial del ejercicio fiscal, por lo que aún existe margen para incrementar el nivel de ejecución durante el resto del año.


En términos generales, las inversiones de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) muestran un comportamiento variable durante el período 2022–2026, tanto en la disponibilidad de recursos como en su nivel de ejecución, tal como se describe en la siguiente gráfica.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Gráfico No. 01
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0511 - Universidad de Ciencias Forestales
Cifras en millones de Lempiras

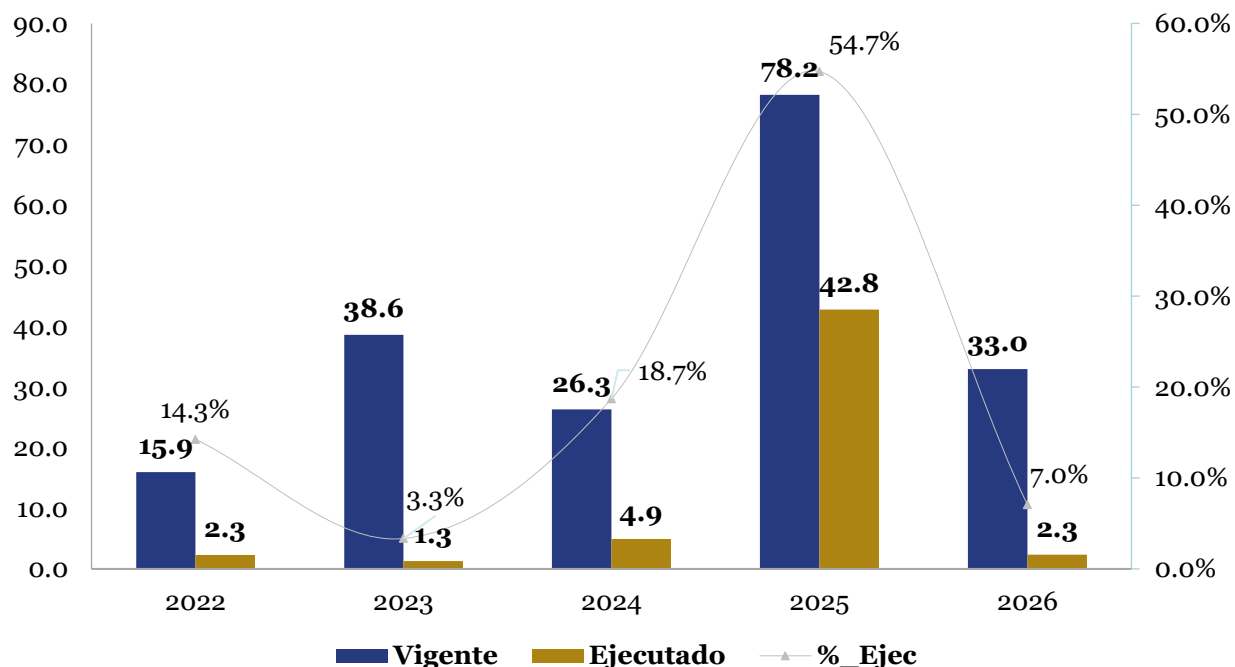

Fuente: SIAFI

D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva al segundo trimestre del 2026 se concentra en el proyecto Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales.

El objetivo general del proyecto es mejorar la infraestructura física del campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR), con el propósito de fortalecer la prestación de los servicios académicos, estudiantiles y administrativos, mediante la remodelación, ampliación y construcción de obras que contribuyan a brindar espacios seguros, modernos y funcionales para la comunidad universitaria.

Entre los beneficios, se incluyen:



SECRETARÍA DE FINANZAS



1. Mejora de la infraestructura académica: Remodelación de tres edificios institucionales y ampliación de un laboratorio de cómputo para ofrecer espacios adecuados para la enseñanza, la investigación y el aprendizaje.
2. Fortalecimiento de los servicios estudiantiles: Construcción de una clínica estudiantil que permitirá mejorar el acceso a servicios de atención médica para estudiantes, docentes y personal administrativo.
3. Optimización del acceso y funcionamiento del campus: Construcción de un pórtico principal de acceso sobre la carretera CA-5, facilitando el ingreso y la salida de la comunidad universitaria, así como mejorando la seguridad y el orden en las instalaciones.

Como resultado, el proyecto contempla la remodelación de la Cabaña 21, el Edificio de Enseñanza e Investigación y el Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA), incluyendo mejoras en la estructura de techos, sistemas eléctricos e hidrosanitarios y acabados; además de la ampliación de un laboratorio de cómputo y la construcción de una clínica estudiantil y un nuevo acceso principal al campus.

D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre del 2026

Al cierre del segundo trimestre del 2026, el proyecto registra avances físicos, que corresponden principalmente a la planificación operativa, coordinación interinstitucional y desarrollo de acciones preparatorias orientadas a la implementación de las actividades contempladas en el programa, sentando las bases para su ejecución en los siguientes trimestres del año.

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Program.	Ejecución	% Ejec	Program.	Ejecución	% Ejec
0511 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)								
Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la UNACIFOR	Ampliación y remodelación de la Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	% de avance físico	90.13	90.13	100.0%	47.63	47.63	100.0%
	Ampliación y remodelación del Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA)	% de avance físico	55	55	100.0%	20	20	100.0%
	Remodelación de la Cabaña No. 21	% de avance físico	100	100	100.0%	0	0	100.0%
	Restauración del Laboratorio de Computación	% de avance físico	100	100	100.0%	52.87	52.87	100.0%
	Remodelación del Edificio de Enseñanza e Investigación	% de avance físico	100	100	100.0%	0	0	100.0%
	Construcción del pórtico de acceso por la CA-5	% de avance físico	0	0	0.0%	0	0	0.0%

Fuente: Unidad de Servicios Generales y Obras Civiles, UNACIFOR, Informe de Seguimiento de Avance de Proyectos de Inversión, II Trimestre 2026.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Otros avances relevantes del proyecto al II trimestre del 2026: La UNACIFOR obtuvo la aprobación de una ampliación de 7.5 meses para la ejecución del proyecto, estableciéndose como nueva fecha de cierre el 31 de octubre de 2026, con el propósito de garantizar el cumplimiento de los objetivos planteados. Asimismo, durante el segundo trimestre continuó la ejecución de las obras de infraestructura previstas, alcanzando una ejecución financiera de L4,390,454.48 en el período y un acumulado de L21,657,963.97 entre los años 2025 y 2026. No se suscribieron nuevos contratos de obras, bienes o supervisión durante el trimestre, manteniéndose vigentes los contratos previamente adjudicados para las diferentes intervenciones del proyecto.

D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre del 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica de la Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la UNACIFOR al segundo trimestre del 2026:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la UNACIFOR	FN-25715	US\$	\$1,319,395.17	20/6/2024 - 31/10/2026
		Lempiras	L35,251,996.0	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	12,200,000	12,200,000	205,582	1.7%
Acumulado 2026	12,200,000	12,200,000	205,582	1.7%
Acumulado Vida del Proyecto*	35,251,996.0	35,251,996.0	33,558,596.8	95.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US\$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre del 2026

No se registraron adquisiciones ni nuevas contrataciones durante el II Trimestre 2026.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

A continuación, se detallan las gestiones realizadas por la Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR) ante la Secretaría de Finanzas (SEFIN):

- Durante el II Trimestre del 2026, la gestión de la inversión de la UNACIFOR estuvo orientada al seguimiento técnico, administrativo y financiero del proyecto “Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la UNACIFOR”, priorizando la continuidad de las obras de infraestructura académica y estudiantil.



- En seguimiento a la Circular DGIP-002-2026, la UNACIFOR remitió la proyección de ejecución presupuestaria para el segundo semestre de 2026, programando la utilización de los recursos necesarios para finalizar las obras de infraestructura en ejecución, conforme a la programación mensual establecida para los meses de julio a octubre de 2026, con el objetivo de alcanzar la culminación del proyecto dentro del plazo de ejecución aprobado.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL 2026

Durante el II trimestre del 2026, la ejecución del proyecto antes mencionado presentó avances importantes en la ejecución física de las obras; sin embargo, se identificaron diversos factores de carácter administrativo y técnico que incidieron en el desarrollo normal del proyecto y requirieron la adopción de medidas para garantizar el cumplimiento de sus objetivos dentro del plazo establecido.

Problemática identificada

- Obras con distintos niveles de avance físico: Al cierre del segundo trimestre, algunos proyectos aún presentaban avances parciales, entre ellos la ampliación y remodelación de la Clínica Estudiantil (90.13% acumulado) y del edificio DIFA (55.00%), mientras que la construcción del pórtico de acceso por la CA-5 aún no registraba avance físico. Asimismo, la remodelación del Edificio de Enseñanza e Investigación se encontraba en proceso de revisión de ofertas para su contratación.
- Procesos administrativos de contratación pendientes: Durante el trimestre no se suscribieron nuevos contratos de obras, bienes, servicios o supervisión, manteniéndose únicamente la ejecución de los contratos previamente formalizados.

Acciones Ejecutadas Durante el Trimestre

- Continuidad de las obras de infraestructura: Se mantuvo la ejecución de las obras correspondientes a la Clínica Estudiantil, el edificio DIFA, la restauración del Laboratorio de Computación y otras intervenciones contempladas en el proyecto, alcanzando un avance físico acumulado del 74.19% para el componente de infraestructura.
- Seguimiento técnico y supervisión del proyecto: La Unidad de Servicios Generales y Obras Civiles continuó realizando el seguimiento técnico de las obras en ejecución y la programación presupuestaria para los meses siguientes, priorizando la finalización de las intervenciones pendientes y la utilización eficiente de los recursos disponibles.
- Programación de recursos para la conclusión de las obras: Se definió la programación financiera correspondiente al segundo semestre de 2026 para garantizar la continuidad de las obras en ejecución y concluir los proyectos dentro del nuevo plazo autorizado.



SECRETARÍA DE FINANZAS



G. CONCLUSIONES

- Al cierre del II trimestre del 2026, la UNACIFOR registra un presupuesto vigente de L32.98 millones y una ejecución financiera acumulada de L2.32 millones, equivalente al 7.0% del presupuesto vigente, reflejando un nivel de ejecución que aún puede fortalecerse durante el segundo semestre del año.
- El proyecto ejecutado por la UNACIFOR alcanzó un avance físico acumulado del 74.19%, destacando la finalización de la remodelación de la Cabaña No. 21 y del Laboratorio de Computación, así como el progreso de la Clínica Estudiantil y del edificio DIFA.
- La ampliación del plazo de ejecución hasta el 31 de octubre de 2026 permitirá concluir las obras pendientes y favorecer el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

H. RECOMENDACIONES

- Fortalecer el seguimiento técnico y administrativo de las obras pendientes para asegurar su conclusión dentro del plazo autorizado y evitar nuevos retrasos.
- Agilizar los procesos administrativos y de contratación requeridos para iniciar las intervenciones que aún se encuentran en etapas previas de ejecución, especialmente el pórtico de acceso y el Edificio de Enseñanza e Investigación.
- Dar seguimiento a la programación financiera remitida a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), procurando la disponibilidad oportuna de recursos para garantizar la continuidad de las obras durante el segundo semestre de 2026.
- Mantener una supervisión permanente del avance físico y financiero del proyecto, con el fin de asegurar el cumplimiento de las metas programadas y la entrega oportuna de la infraestructura en beneficio de la comunidad universitaria.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado II Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Total Fondos Nacionales	Total General	Total Fondos Nacionales	Total General	Total Fondos Nacionales	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
81	1. Inversión Productiva		12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	205,582	205,582	1.7%	205,582	205,582	1.7%
1	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	205,582	205,582	1.7%	205,582	205,582	1.7%
1	Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-25715	12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	205,582	205,582	1.7%	205,582	205,582	1.7%
	Total Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestr		12,200,000	12,200,000	12,200,000	12,200,000	205,582	205,582	1.7%	205,582	205,582	1.7%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		20,779,703	20,779,703	20,779,703	20,779,703	1,226,282	1,226,282	5.9%	2,119,288	2,119,288	10.2%
	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		20,779,703	20,779,703	20,779,703	20,779,703	1,226,282	1,226,282	5.9%	2,119,288	2,119,288	10.2%
	ACTIVIDADES CENTRALES		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	374,482	374,482	13.4%	738,829	738,829	26.4%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	374,482	374,482	13.4%	738,829	738,829	26.4%
	FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA		14,679,703	14,679,703	14,679,703	14,679,703	598,575	598,575	4.1%	851,130	851,130	5.8%
	Total FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA		14,679,703	14,679,703	14,679,703	14,679,703	598,575	598,575	4.1%	851,130	851,130	5.8%
	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		850,000	850,000	850,000	850,000	147,754	147,754	17.4%	191,105	191,105	22.5%
	Total INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		850,000	850,000	850,000	850,000	147,754	147,754	17.4%	191,105	191,105	22.5%
	VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	105,470	105,470	4.3%	338,224	338,224	13.8%
	Total VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	105,470	105,470	4.3%	338,224	338,224	13.8%
	Total general		32,979,703	32,979,703	32,979,703	32,979,703	1,431,864	1,431,864	4.3%	2,324,870	2,324,870	7.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0511 - Universidad Nacional de Ciencias Forestales (UNACIFOR)								
Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la UNACIFOR	Ampliación y remodelación de la Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	% de avance físico	90.13	90.13	100%	47.63	47.63	100%
	Ampliación y remodelación del Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas (DIFA)	% de avance físico	55	55	100%	20	20	100%
	Remodelación de la Cabaña No. 21	% de avance físico	100	100	100%	0	0	0%
	Restauración del Laboratorio de Computación	% de avance físico	100	100	100%	52.87	52.87	100%
	Remodelación del Edificio de Enseñanza e Investigación	% de avance físico	100	100	100%	0	0	0%
	Construcción del pórtico de acceso por la CA-5	% de avance físico	0	0	0%	0	0	0%

Nota: Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de junio de 2026
