



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones  
Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## ***CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO- HONDURAS***

### ***MCA-H***

Al Primer Trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Abril, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Cuenta del Desafío del Milenio de Honduras, (MCA-H/INVEST), representa 14.3% de la inversión Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; su presupuesto de inversión para el presente año y su ejecución financiera se detalla en el cuadro No. 1.

La mayor parte del financiamiento externo de la Inversión proviene de fondos de préstamo del BID (53%), con una aportación de L.543,263,800 y fondos de donación de USAID (20%), con una aportación de L.203,046,863 y del Gobierno de los Estados Unidos (11%) con L.115,675,734, seguido de los fondos de préstamo de OFID con L.117,992,320 (11%), tal y como se muestra en el gráfico No. 4.

Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016  
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	596,632,780
Presupuesto Vigente	1,126,310,805
Congelamiento	89,405,087
Presupuesto Vigente Ajustado	1,036,905,718
Presupuesto Ejecutado (Devengado)	258,209,632
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>25</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	285,800,198
<b>% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>28</b>

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

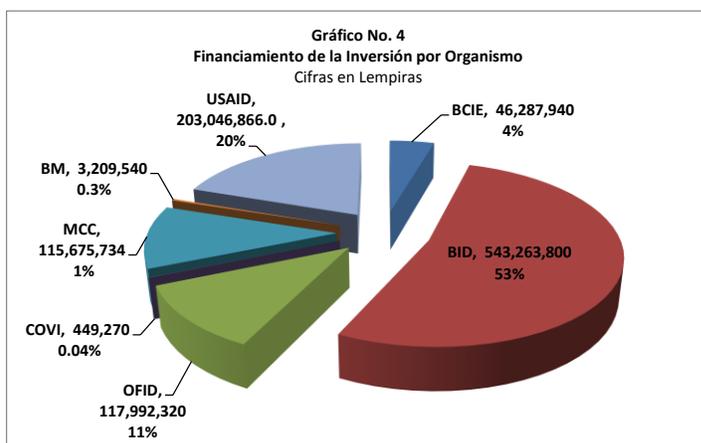

En el segundo trimestre se alcanzó una ejecución de L.258,209,632 representativa del 25% de ejecución respecto al vigente ajustado, comportamiento similar a lo alcanzado al segundo trimestre del 2015 donde se ejecutó un 26%.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en ocho (8) proyectos relevantes que apoyan la infraestructura logística de 3 corredores estratégicos, la construcción del segundo anillo vial de San Pedro Sula, incrementar los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria, entre otros; los principales proyectos de la Institución se detallan a continuación:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
1) Ampliación, Rehabilitación y Mejora del Segundo Anillo Vial de San Pedro Sula	BID 2017/BL-HO	Lempiras	502,891,400	24/12/2009 24/06/2016
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	45,505,886	79,702,043	34,372,045	43.1
Acumulado 2016	45,505,886	79,702,043	49,384,095	62.0
Acumulado Vida del Proyecto */	502,891,400	502,891,400	440,188,563	87.5
<b>Observaciones:</b>				
A la fecha ya se ha desembolsado el 100% de los fondos del convenio de crédito BID 2017/BL-HO y se alcanzó el 100% del avance físico del proyecto.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Las obras que se derivan del mantenimiento mayor del tramo entre el Río Chamelecón y la Intersección de la 6ta calle (18 km), Componente 1, se finalizaron el 20 de abril, siendo la recepción de las mismas el 24 de junio. El mantenimiento incluyó como principales actividades el sellado de grietas y juntas, sustitución de losas dañadas, la construcción de obras de seguridad peatonal, señalización horizontal y la colocación de white topping en el tramo Toyota-Estadio Olímpico en aquellos sitios donde el pavimento era de concreto asfáltico. El Componente 2 en su totalidad se inauguró el 15 de marzo del presente, con una longitud total de 5.5 km, dividido en dos lotes: tramo lote I (Estación 13+600-Industrias Gala) y lote II (6ta calle-Estación 13+600).

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
2) Programa de Rehabilitación del Corredor Agrícola	BID 2155/BL-HO OFID 1412	Lempiras	1,760,119,900	15/07/2010 30/12/2016
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	142,699,212	184,481,055	62,202,354	33.7
Acumulado 2016	142,699,212	184,481,055	99,976,809	54.2
Acumulado Vida del Proyecto */	1,760,119,900	1,760,119,900	1,058,090,653	60.1
<b>Observaciones:</b>				
En el año 2014 se realizó el cierre de los contratos de obra y supervisión de la Sección III: Gualaco - San Esteban (42 km, finalizó en el 2013), y la Sección IV: San Esteban - El Carbón (41.0 km, finalizó en mayo 2014).				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se alcanzó un avance físico del 59.2 % en la Sección V “El Carbón-Bonito Oriental”, habiéndose desarrollado durante el trimestre actividades de reconstrucción de cunetas, excavación común, instalación de drenaje menor, mampostería, construcción de 1 caja puente, mejoramiento de subrasante, instalación de geomalla triaxial, colocación de base triturada e imprimación. Durante el trimestre se avanzó en el proceso de licitación de la Sección VI “Bonito Oriental-Corocito”, realizando la convocatoria pública en el mes de mayo. Además, se desarrollaron actividades de mantenimiento a través de las Microempresas, en 133 km del Corredor Agrícola.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
3) Alianza para el Corredor Seco	Carta de Ejecución No. 7 USAID (y sus enmiendas) / GASFP	Lempiras	1,874,413,400	28/09/2010 31/12/2019
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	292,451,953	203,046,866	58,429,372	28.8
Acumulado 2016	292,451,953	203,046,866	79,429,020	39.1
Acumulado Vida del Proyecto */	725,132,457	1,874,413,400	175,689,095	9.4
<b>Observaciones:</b>				
Durante el trimestre se remitió a Banco Mundial el informe de evaluación técnica para los operadores del proyecto (Convenio de Donación GAFSP). Se espera iniciar con actividades en campo en el segundo semestre del 2016. También se avanza, en coordinación con la Secretaría de Finanzas, en el proceso de incorporación de los recursos financieros de la donación en el presupuesto 2016.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se trabaja en reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque, a través del incremento de los ingresos, las oportunidades de empleo, la productividad, el acceso a mercados y a servicios financieros, así como la gobernanza en el manejo del agua y el acceso a mejores servicios de salud y nutrición materna e infantil. Al mes de junio, un total de 15,784 clientes hogares ya están recibiendo asistencia.

Como producto de la asistencia técnica, 7433 agricultores han aplicado al menos una tecnología en las siguientes categorías: productivas a nivel de finca, manejo de recursos naturales, energía renovable, buenas prácticas de manejo de negocio y mercadeo.

Asimismo, se alcanzaron 665 hogares con condiciones de salud y nutrición mejoradas, lo que incluye la instalación de eco-fogones, mejoras de pisos, dotación de filtros y conexiones de agua. A la fecha, el implementador del proyecto ha instalado 114.5 hectáreas bajo riego en aproximadamente 38 distritos, fortaleciendo además la capacidad de los beneficiarios para la administración del recurso hídrico, la conformación de la estructura de administración del riego y la capacidad productiva a través de buenas prácticas agrícolas.

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
4) Programa de Integración Vial regional	BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	Lempiras	3,520,239,800	26/01/2016 26/01/2020
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejecución</b>
II Trimestre 2016	-	404,053,270	10,754,170	2.7
Acumulado 2016	-	404,053,270	10,754,170	2.7
Acumulado Vida del Proyecto */	3,520,239,800	3,520,239,800	10,754,170	0.3
<b>Observaciones:</b>				
A la fecha se ha liberado el derecho de vía sobre una longitud de 113.7 km, entre los tres tramos actualmente en procesos de licitación.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Se tienen avances considerables en los procesos de licitación de obras y supervisión de los lotes “Jícara Galán-Santa Elena” y “Santa Elena-Choluteca”, Tramo 2 del proyecto. En ese sentido, los contratos tanto de obra como de supervisión han sido adjudicados. A la fecha, ya se extendió la carta de aceptación a los contratistas de obra y el contrato de supervisión (para ambos lotes) se encuentra en trámite de firma. En referencia a los lotes “Jícara Galán-Desvío El Tránsito” y “Desvío El Tránsito-El Amatillo”, Tramo 1, los procesos de contratación se encuentran en etapa de revisión y análisis de las ofertas presentadas por los oferentes participantes.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

1. Se elaboró Dictamen Técnico Favorable para continuar con el trámite solicita realizar transferencia entre categorías de inversión al Proyecto “Programa de Infraestructura del Corredor Logístico de San Pedro Sula” (BID 2017/BL-HO).
2. Ajustes en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) relacionados a la formulación presupuestaria.
3. Se solicitó a la Unidad Ejecutora (UE) el listado de los proyectos de ingeniería civil adjudicados y en ejecución con sus respectivos ejecutores (Construcción y supervisión).

### Conclusiones

- Al II trimestre del año 2016, la MCA-H registra un 25% de ejecución a nivel de devengado y un 28% a nivel de comprometido.
- El Corredor Logístico de San Pedro Sula, alcanzo el 100% de avance físico y se está trabajando en el cierre financiero e informe de cierre.
- Las obras de la Sección V, tramo “El Carbón-Bonito Oriental” del Corredor Agrícola, presenta un avance físico bajo de un 59%, con lo que se aprecia que se está recuperando el desfase físico y financiero que mantenía.

### Recomendaciones

- En vista de la gran cantidad de procesos de licitación con procesos avanzados, que mantiene el Programa de Integración Vial Regional (Corredor del Sur), se recomienda el seguimiento oportuno de acuerdo a metas reales para iniciar la ejecución de obras en el presente año.
- Continuar con los esfuerzos realizados en la resolución de casos identificados para la liberación del derecho de vía en el Canal Seco y en el Corredor del Sur, para no retrasar los trabajos de los contratistas de las obras.

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**ANEXO No. 4**  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente Ajustado			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)
12	0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras			6,980,253	589,652,527	596,632,780	6,980,253	1,029,925,465	1,036,905,718	3,712,998	254,496,634	258,209,632	25	5,538,220	280,261,977	285,800,198	28
1	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	19/08/2011 11/10/2015	-	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CONSTRUCCION DEL SEGMENTO1 - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	BCIE 2071	19/08/2011 11/10/2015	-	-	-	-	34,287,942	34,287,942	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL	BID_2470/BL-HO-1	26/01/2016 26/01/2020	-	-	-	-	404,053,270	404,053,270	-	10,754,170	10,754,170	3	-	19,588,969	19,588,969	5
4	AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	BID 2017	24/12/2009 24/06/2016	6,980,253	38,525,633	45,505,886	6,980,253	72,721,790	79,702,043	3,712,998	45,671,097	49,384,095	62	5,538,220	48,836,964	54,375,185	68
5	CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE 2116	11/06/2013 29/11/2016	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	857,763	857,763	7	-	1,093,207	1,093,207	9
6	CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	COVI- DEC LEG 204-2012	01/01/2016 31/01/2016	-	-	-	-	449,269	449,269	-	199,946	199,946	45	-	199,946	199,946	45
7	ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID- GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	28/09/2010 31/12/2019	-	292,451,953	292,451,953	-	203,046,866	203,046,866	-	79,429,020	79,429,020	39	-	81,496,554	81,496,554	40
8	INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	MDTF EITI TFO16493	26/09/2014 30/04/2016	-	-	-	-	3,209,544	3,209,544	-	2,668,531	2,668,531	83	-	2,668,531	2,668,531	83
9	PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	BID 2115/BL-HO	15/07/2010 30/12/2016	-	142,699,212	142,699,212	-	184,481,055	184,481,055	-	99,976,809	99,976,809	54	-	109,020,650	109,020,650	59
10	ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001		-	8,437,500	8,437,500	-	10,661,500	10,661,500	-	2,491,144	2,491,144	23	-	2,557,006	2,557,006	24
11	PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001	15/07/2014 31/08/2017	-	18,499,186	18,499,186	-	18,499,186	18,499,186	-	6,470,641	6,470,641	35	-	6,470,641	6,470,641	35
12	PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	MCC - THR13HND13001		-	88,739,043	88,739,043	-	86,515,043	86,515,043	-	5,977,512	5,977,512	7	-	8,329,509	8,329,509	10

Fuente: SIAFI

## Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
CORREDOR DEL SUR-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	AUDITORIA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1: JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO	PORCENTAJE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA	PORCENTAJE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA	PORCENTAJE	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN PLAN DE REASENTAMIENTO	PORCENTAJE	100	0	47	0	47	0	0	0	47	0	0	0
	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1, JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO	PORCENTAJE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA	PORCENTAJE	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2, LOTE B: SANTA ELENA-CHOLUTECA	PORCENTAJE	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCES DE FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO	INFORME	8	0	3	0	38	0	2	0	3	0	150	0
	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016	PORCENTAJE	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS REALIZADO	KILÓMETRO	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UNIDAD DE CONCESIONES ESTABLECIDA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE INSEP	UNIDAD EJECUTORA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRACION DEL PROGRAMA, MONITOREO Y EVALUACION (PROGRAMA UMBRAL)	INFORME DE EVALUACIÓN PEFA ENTREGADO	INFORME	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	HOGARES CON CONDICIONES DE SALUD Y NUTRICIÓN MEJORADOS	HOGAR	2,372	0	1,074	0	45	0	791	0	665	0	84	0
	HOGARES QUE ADOPTAN NUEVA TECNOLOGÍA	HOGAR	11,650	0	9,005	0	77	0	2,200	0	6,975	0	317	0
AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA	AVANCE DE OBRA DEL TRAMO ENTRE INTERSECCIÓN 6TA CALLE E INDUSTRIAS GALA	PORCENTAJE	100	0	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE DE OBRA EN MANTENIMIENTO MAYOR, TRAMO ENTRE RIO CHAMELECÓN E INTERSECCIÓN GALE	PORCENTAJE	100	0	200	0	200	0	7	0	17	0	240	0
CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCIÓN II Y III	COMISIONES PAGADAS AL BANCO FIDEICOMISARIO EN 2016	PORCENTAJE	225	0	23	0	10	0	50	0	23	0	46	0
CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" (TRANSPORTE " CUENTA DEL MILENIO")	AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE LA RAMPA NÚMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO	PORCENTAJE	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE EN LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA EN LA REHABILITACIÓN DE LA RAMPA NÚMERO 5 DEL INTERCAMBIO DEL MILENIO	PORCENTAJE	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESTUDIO Y DISEÑO PARA ESTABILIZAR LA FALLA LOCALIZADA EN UN TALUD DE LA RESIDENCIAL CIUDAD DEL ÁNGEL ELABORADO	DISEÑO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORREDOR LOGISTICO GOASCORAN-VILLA DE SAN ANTONIO Y TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-CORTES	CIERRE ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO	PORCENTAJE	100	0	45	0	45	0	34	0	45	0	132	0
INICIATIVA PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS INDUSTRIAS EXTRACTIVAS	AVANCE EN CIERRE DE PROYECTO	PORCENTAJE	180	0	173	0	96	0	100	0	100	0	100	0

## Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
			Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
			Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
PROGRAMA DE REHABILITACION DEL CORREDOR AGRICOLA	AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA	INFORME	3	0			0	0	1	0			0	0
	AUDITORÍAS AMBIENTALES Y SOCIALES REALIZADAS	INFORME	9	0	3	0	33	0	3	0	3	0	100	0
	AVANCE DE OBRA EN LA REHABILITACIÓN CORREDOR AGRÍCOLA SECCIÓN V EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL	PORCENTAJE	80	0	59	0	74	0	12	0	21	0	177	0
	AVANCE DE OBRA EN REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGRÍCOLA SECCIÓN VI BONITO ORIENTAL-COROCITO	PORCENTAJE	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	AVANCE EN TRAMOS SUPERVISADOS	PORCENTAJE	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN REALIZADOS	PERFIL DE PROYECTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESTIONES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GESTIONES UAF REALIZADAS	UNIDAD EQUIVALENTE	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	INICIO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	HITO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	MANTENIMIENTO DE LAS SECCIONES III, IV Y V (GUALACO-SAN ESTEBÁN, EL CARBÓN-BONITO ORIENTAL-PUERTO CASTILLA)	KILÓMETRO	266	0	166	0	62	0	72	0	77	0	107	0
PROYECTO ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS (PROGRAMA UMBRAL)	APOYO TÉCNICO A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN EN EJECUCIÓN	CONTRATO	24	0	12	0	50	0	6	0	6	0	100	0
	ESTABLECIMIENTO DE UNA UNIDAD DE CONTINGENCIAS FISCALES PARA LA MEJORA EN LA CAPACIDAD DE DISEÑO Y ADJUDICACIÓN EN APP	UNIDAD EJECUTORA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROYECTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PUBLICA (PROGRAMA UMBRAL)	AUDITORIAS DE DESEMPEÑO EN EL TSC APOYADAS POR EXPERTOS FINANCIADOS POR EL PROGRAMA UMBRAL	AUDITORIA	3	0	1	0	33	0	0	0	0	0	0	0
	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE ADQUISICIONES	PROCESO	2	0	1	0	50	0	1	0	1	0	100	0
	MEJORA EN LA GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y LA TESORERÍA	INDICADOR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL ACUERDAN CON PROGRAMA REALIZACIÓN DE VEEDURÍA SOCIAL DE LA GETIÓN GUBERNAMENTAL	ACUERDO	1	0	1	0	100	0	1	0	1	0	100	0

Fuente: SIAFI
