



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Secretaría de Agricultura y Ganarías

Al Cuarto Trimestre, 2021

Enero, 2022

Tegucigalpa M.D.C.

Honduras C.A.

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 70.65% del presupuesto vigente de la inversión del sector Desarrollo Productivo y Riego (L 1,204.9 millones). La SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobado por el Congreso Nacional para inversión en el año 2021 de L.876.1 millones, con un presupuesto vigente al cuarto trimestre de L.826.5 millones. con una ejecución financiera de L.220.7 millones que representan el 27% de cumplimiento; la diferencia entre el presupuesto vigente y el aprobado se debe a que el Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego cedió espacio presupuestario por fondos que no van a utilizaron en el año 2021 (Ver cuadro No.1).

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2021  
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	876,186,458
Presupuesto Vigente	826,509,798
Devengado IV Trimestre-2021	66,664,450
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2021/ Vigente)</b>	<b>8%</b>
Devengado Anual	220,765,435
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>27%</b>


Fuente: SIAFI, 31/12/2021

Los Proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tienen como objetivo facilitar a los productores los mecanismos e infraestructura necesaria como ser sistemas de riego, semillas de calidad, entre otros para la productividad de granos básicos a fin de contribuir en proporcionar facilidades de producción agrícola a los productores nacionales en pro de los habitantes de la República de Honduras.

La ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

El presupuesto para Inversión de esta Institución es financiado en un 99% con fondos externos (Créditos y donaciones) L826.5 millones de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 49% de la cartera de proyectos de la institución, seguido por FIDA con L.216.4 (26%) y en menor porcentaje India 22% (L.187.3) fondos de donación Gef L.15.9 millones así como Fondos Nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) por un monto de L.6.9 millones, equivalente al 1% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No.1.

Gráfico No. 1  
Financiamiento de la Inversión por Organismo

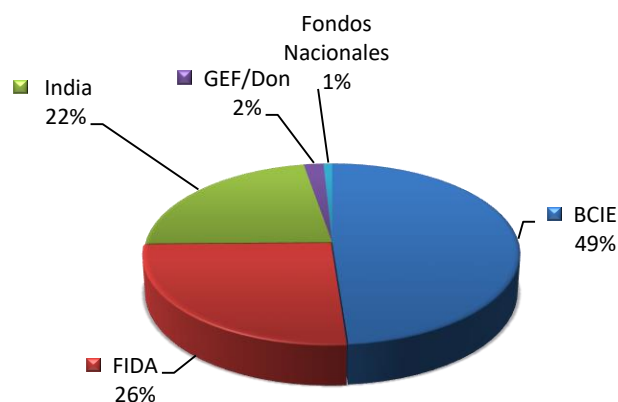

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está integrada por tres (3) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural (sistemas de riego, planes de negocios, construcción de caminos terciarios), desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

A continuación, se detallan los principales proyectos ejecutados por la institución:

#### Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
<b>Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)</b>	Préstamo BCIE-2101	1,207,598,551	2013-2023	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>% Ejec.</b>
cumulado al 2020	647,310,346	396,166,822	612,083,428	50.7%
IV Trimestre 2021	443,764,430	413,624,276	130,606,007	31.6%
Acumulado Vida del Proyecto	1,060,934,622	809,791,098	742,689,435	62%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en el reporte de la ejecución del gasto según SIAFI.				

\* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto es Financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos de contraparte nacional; el proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género. El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con un área de regadío de 8,476 hectáreas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa.

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego (Sulaco, Oloman, San Sebastian, Selguapa y Pequeños proyectos de Riegos) en los Departamentos de Yoro, Comayagua y Francisco Morazán, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, actualmente ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Al cuarto trimestre de este año, el proyecto presenta una ejecución financiera de L. 130.6 millones equivalente a 31.6%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

La ejecución Financiera del Programa para este IV Trimestre del 2021, y en General Para todo el año 2021 fue muy baja, en consideración con lo que se tenía programado, y con la Disponibilidad

Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Agricultura y Ganadería

Presupuestaria, en vista que no se pudieron realizar varios pagos de Estimaciones de Obra y Pagos mensuales de Supervisión de Obras que se tenían programado realizar en este mes, por los motivos de que aún no se resuelven algunos problemas legales y las extensiones de tiempo de los contratos (Adendas) tanto de las Empresas Constructoras como de las Empresas Supervisoras.

**El Subproyecto Sistema de riego Sulaco:** En fecha 13 de octubre 2017 se firmó el contrato con la Empresa NANDANJAIN MEXICO S.A. de C.V por un monto \$13,507,067.64 y con la adenda otorgada por BCIE finaliza en abril 2022, del cual ha ejecutado financieramente \$11,212,203.82 que representa el 82% del monto total del contrato.

Para el IV Trimestre 2021, se han realizado acciones que incrementan el avance en la construcción del sistema de riego Sulaco tales como los siguientes:

Durante este Trimestre 2021 se realizó la fundición de 41.6 M<sup>3</sup> de concreto en la presa del sub proyecto Tascalapa.

Con los 741.6 M<sup>3</sup> de concreto fundido, se tiene un acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,821.31 M<sup>3</sup> de un total contratado de 6,777.17 M<sup>3</sup> que representa un 85.89% de avance.

N°	Sub Proyecto	Cantidad Contratada	Unidad de Medida	Ejecutado Diciembre 2021	Acumulado A Diciembre 2021	% Avance Total
1	Maralito	2,498.10	M <sup>3</sup>	0	1,637.05	65.53
2	Siguapa	2,273.00	M <sup>3</sup>	0	2,273.00	100.00
3	Tascalapa	2,006.07	M <sup>3</sup>	41.6	1,869.66	93.20
<b>Totales</b>		<b>6,777.17</b>	<b>M<sup>3</sup></b>	<b>41.6</b>	<b>5,821.31</b>	<b>85.89</b>

Avances en Obra de Toma y Desarenador:

Durante este Trimestre 2021 se realizó la fundición de 3 M<sup>3</sup> de concreto en la presa del sub proyecto Tascalapa.

Con los 3 M<sup>3</sup> de concreto fundido, se tiene un acumulado total de fundición de concreto en Obra Toma de 554.51 M<sup>3</sup> de un total contratado de 563.51 M<sup>3</sup> que representa un 97.87% de avance

En instalación de tubería en el IV Trimestre 2021 se realizó la instalación de 328.20 ML de tubería. En forma general en el proyecto Sulaco se tienen instalado 128,345.41 metros lineales de un total de 129, 889.67 contratado, equivalente a un avance general de 98.81%.

Durante este Trimestre no se realizó ninguna prueba hidrostática, en general, se cuenta a la fecha informada con acumulado de tubería probada de 122,441.72 M.L, equivalente a un avance general del 94.26% de un total a probar de 129,889.67 M.L.

### **Construcción, Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Selguapa, Comayagua**

Proyecto adjudicado en fecha 9 de julio 2019 a Constructora SATO S. DE R.L. DE C.V. por un monto de \$10,186,120.19 el cual finaliza en agosto 2022, del cual ha ejecutado financieramente \$5,794,239.96 que representa el 56% del monto total del contrato.

Entre las actividades realizadas se detallan la siguientes:

- Como resultado de esta actividad, una vez realizada la inspección de toma granjas construidas con compuertas de control incorporadas: TG # 36 a TG # 38, TG # 40 a TG # 42, TG # 27 a TG # 29, TG # 31 y TG # 33, se acordó que el Contratista junto con el Supervisor, procedan a definir y realizar algunos resanes de las estructuras sujetas a traspaso antes de validar dicho proceso, dentro de estos defectos se pueden mencionar: verticalidad de vástago de compuertas, conexión adecuada entre muro de toma granjas y la compuerta en sí, incorporación de compuertas deslizantes en cajas distribuidoras de toma granjas, etc.
- Desfogue/Aliviadero descargando en Rio Tepanguare. Es proyectado en estación 11+669.24, iniciando en lado derecho del Canal Principal y descargando en Rio Tepanguare, aguas arriba del sifón de cruce del Rio, donde el nivel de aguas de crecidas afectaría la evacuación del caudal de descarga del aliviadero.
- Se acordó replantear alineamiento de canal de desfogue para elaborar detalles constructivos de acuerdo a altimetría en la zona de la obra. Así mismo se definiría el cruce de muro de gaviones construido en margen izquierda del rio, aguas abajo del sifón de cruce del mismo.

Se acordó el replanteo de puente canal proyectado para definir en campo el puente vehicular de acceso antes referenciado.

**Subproyecto Sistema de Riego de Olomán:** Este Contrato de obra se encuentra en adenda de tiempo en el BCIE por un periodo de (20 meses) del 30 de agosto 2021 al 30 de abril de 2023 suscrito con la Empresa NANDANJAIN MEXICO S.A. de C.V, por un monto de \$10,046,549.02, del cual ha ejecutado financieramente \$1,508,869.28 que representa el 15% del anticipo otorgado del monto total del contrato.

Durante el IV Trimestre 2021 el contratista presento el diseño en el mes de diciembre, el cual se encuentra en proceso de revisión por parte de la supervisión, quien emitirá su dictamen en la segunda quincena del mes de enero 2022.

### **El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián:**

En fecha 4 de septiembre 2017 se firmó contrato para este subproyecto con la empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. (SEDECO) por un monto de US\$ 2,989,008.26, la baja ejecución se debe a que se presentaron problemas de liberación de servidumbre los cuales fueron solucionaron hasta el año 2019, su nueva fecha de cierre es abril 2022, del cual ha ejecutado financieramente \$1,166,820.13 que representa el 37% del monto total del contrato.

Cumpliendo con la celebración de reuniones programadas de seguimiento de ejecución del Proyecto San Sebastián, se participó en la presente actividad, con el objetivo primordial de dar seguimiento a responsabilidades, acuerdos, compromisos, avance de obra, programa de obra, entre

Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Agricultura y Ganaría

otros, inherentes a la ejecución del Proyecto en el tiempo programado y de acuerdo a lo definido en contrato.

Como resultado de esta reunión se presentan a continuación los temas tratados:

- Se informó que la entrega de bomba al señor Hernán Varela está en proceso de suministro. Además, se hizo saber que ya se instaló tubería en milpas de maíz, propiedad del señor Varela. Así mismo, se indicó que se esperara la cosecha de plátano en parcela inmediata a la derivación del lateral L-2, para proceder a la instalación de tramo de tubería de Línea de Conducción Principal (LCP), que cruza dicha parcela.
- Se dio a conocer que el replanteo de las obras proyectas en el sitio de toma, se encuentra en proceso, se programa contar con excavadora para reorientación de corredero natural existente de su último tramo.
- Referente a solicitud de cambio de tipo de tubería en canal seco, de HFD, indicada en diseño, a PVC, el Ingeniero Residente del Contratista manifestó que consultaría al respecto con el Gerente del Proyecto, por parte de Cedeco.
- El Supervisor solicitó al Contratista que complete el número de cotizaciones requerido para gestión de adquisición de juntas dresser a ser utilizadas en el Proyecto.
- Se indicó considerar en orden de cambio, modificación acordada sobre cruce aéreo, además, incorporar obra adicional en zona baja del Proyecto, definida de acuerdo a inventario y estado de obra ejecutada (hidrantes, UR's, etc.).
- Finalmente, se definió depurar el diseño de 50 hectáreas – Lamani el cual presenta un avance en líneas de conducción Principal: 771.90 ml y Laterales y Sublaterales: 2,836.43 ml Terciaria: 10,314.01 ml presentando un avance físico de obra de un 34.15%.

### **Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos**

Con estos subproyectos se atenderán a 42 organizaciones que serán beneficiadas con la instalación de Sistemas de Riego, para lo cual está en proceso la documentación necesaria para realizar el proceso de Licitación para la adquisición del equipo y los servicios para la instalación de los sistemas de riego por un monto de \$4.0 millones, sin presentar ejecución financiera a la fecha.

Mediante estos sistemas se instalará infraestructura de riego en 1,253.62 hectáreas de tierra agrícola, serán incorporados a la agricultura bajo riego 1516 emprendimientos agrícolas de producción.

Estos subproyectos no presentan avance físico a la fecha, dado que no contaban con diseños e identificación de beneficiarios hasta este momento está en proceso para su adjudicación.

El proyecto ha generado 93 empleos directos y 186 empleos indirectos.

**Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (Financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donación GEF)**

**Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN (Préstamo)	576,079,308	2013-2022	
	GEF-SF-05-HN (Donación)		2015-2020	
	200000125200 (Préstamo)		2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado al 2020	331,050,857	113,721,809	294,773,340	51.17%
IV Trimestre 2021	245,028,443	229,306,561	88,939,694	38.79%
Acumulado Vida del Proyecto	576,079,300	343,028,370	383,713,034	66.61%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Este proyecto comprende la formulación de 313 planes de inversión para organizaciones y planes de fortalecimiento organizacional y la rehabilitación de 150 km de caminos terciarios y 3 Sistemas de riego y agua potable, y 225 km de rehabilitación y/o recuperación de hectáreas de bosque, la realización de 100 Letrinas y 100 Ecofogones en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Durante el cuarto trimestre se ha obtenido un porcentaje de ejecución del 38.79% con fondos FIDA equivalente a L.88.9 millones.

**Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora se describen a continuación:**

**COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:**

Se elaboraron e implementación de 65 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género, los contratos se firmaron por las empresas y por el Ministro dada la transición de un gobierno a otro y por la duración de los contratos los mismos serán remitidos al Congreso Nacional de la República para su aprobación; las empresas formularan y ejecutaran los planes de fortalecimiento durante el 2022.

Durante el cuarto trimestre 54 Convenios suscritos con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión, en fortalecimiento financiero en cefe, hortalizas, papa, granos básicos y fresas, en los municipios de San Miguelito, San Juan, Dolores, Yamaranguila, Colomocagua en el departamento de Intibucá, La Campa, Guarita, Ejecución al IV Trimestre 2021; Secretaría de Agricultura y Ganadería

San Sebastián, San Francisco, en el departamento de Lempira, Santa Elena, Yarula en el departamento de la Paz.

## **COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo y de Negocios**

El convenio con Fundación Capital culminó con logros que fueron altamente satisfactorios capacitando a 5,602 personas, donde el 58% son mujeres y hombres jóvenes 36% de hombres adultos capacitados en temas de educación financiera evidenciando condición inclusiva del proyecto la cual mantenemos monitoreada, además 4.627 personas fueron capacitadas en temas de bancarización y de las cuales 4,032 formalizaron su mecanismo de ahorro aperturando cuentas en la banca privada, cooperativas locales y Cajas Rurales de Ahorro y Crédito en donde 94 CRAC fortalecieron su sistema interno de ahorro con libretas, aplicación de mecanismos de control entre otros.

En el trimestre a reportar según los informes de asistencia técnica con la ejecución de las diferentes iniciativas se han generado 169 nuevos empleos temporales valorados en L 578,150.00 de estos empleos 119 beneficiarios son hombres y 51 son mujeres cabe mencionar de estos 170 nuevos empleos 29 beneficiarios son jóvenes menores de 29 años.

Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias, aplicando medidas de bioseguridad.

En la ejecución de los Planes de Inversión se está brindando asistencia técnica a 65 organizaciones con la colaboración de 28 consultores en asistencia técnica en donde la asistencia técnica está dirigida en el área organizativa, empresarial, área productiva, género, inclusión social y comercialización mediante la asistencia técnica y financiera y el acompañamiento para la ejecución financiera en campo; estas 65 Organizaciones son reportadas en SIAFI y GPR con sus respectivos medios de verificación (informes de asistencia técnica).

En el trimestre según los informes de asistencia técnica con la ejecución de las diferentes iniciativas, se han generado 165 nuevos empleos temporales valorados en L 1,894,021 de estos empleos 102 beneficiarios son hombres y 63 son mujeres.

## **COMPONENTE 3. Infraestructura Rural**

### **Rehabilitación de Caminos Terciarios Rurales y Caminos de Acceso.**

Los convenios para la rehabilitación de caminos están firmados, ya que entrego el primer desembolso para beneficiar una cantidad de 46.4km, según cuadro adjunto.

<b>Proyecto</b>	<b>Acuerdos de cooperación</b>	<b>No. De Km</b>
Mejoramiento de caminos terciarios en La Esperanza, Intibucá.	Espera firma del ministro.	14.95
Mejoramiento de caminos terciarios en San Marcos de la Sierra, Intibucá.	Espera firma del ministro.	13.8
Mejoramiento de caminos terciarios en Yamaranguila, Intibucá.	Espera firma del ministro.	8
Mejoramiento de caminos terciarios en Gracias, Lempira.	Espera firma del ministro.	9.7
		<b>46.45 km</b>



### Rehabilitación de 14.95 kms Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucá.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en el tramo puente hondo (KM 8) hacia El Pelón; teniéndose hasta la fecha 13.9 kms mecanizados, equivalentes a un 93%, teniéndose instaladas 25 de las 75 alcantarillas a instalar, representando el 34% de la instalación y un avance de ejecución global de obra de 33%.

### Rehabilitación de 13.80 kms de Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en los tramos San Marcos centro – Lodo Negro – Llano de Balas y el tramo de San José – El Mangal; teniéndose hasta fecha 7.5 kms mecanizados, equivalentes a un 54% con un avance de ejecución global de obra de 16%.

### Rehabilitación de 8 Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en los tramos Cruz Alta – Los Mangos – Semane y el tramo de Las Flores – Cofradía; teniéndose hasta la fecha 5.0 kms mecanizados, equivalentes a un 62% de los trabajos de mecanización a realizar que equivalen a un 6% de los trabajos de balastado, teniéndose un avance de ejecución global de obra de 20%.

### Rehabilitación de 9,7 Kms Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de Gracias, Departamento de Lempira.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en el tramo Gracias – San Antonio - Guanteque; teniéndose hasta la fecha 6.5 kms mecanizados, equivalentes a un 67% de los trabajos de mecanización a realizar, teniéndose un avance de ejecución global de obra del 20%.

#### Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran

Proyecto	Convenio-Préstamo/India	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	IN-DL98134500295569L	582,235,100	2013-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2020	205,286,440	205,286,440	205,286,440	35.26%
IV Trimestre 2021	187,393,585	-	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	392,680,025	205,286,440	205,286,440	35.26%
Nota: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

## **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1**

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora están se resaltan las siguientes:

Al cuarto trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, debido a que el organismo financiador no ha otorgado desembolsos por lo que lleva varios años sin ejecutar en vista a la falta de comunicación con la India y por falta de gestión de la UAP-SAG en la y administración del proyecto.

Se ha solicitado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando esos fondos para poder hacer frente a los compromisos contractuales alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales.

Sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser la contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto, gastos de monitoreo.

Al respecto la DGIP, ha informado que dichos recursos No están contemplados en la Nota de Prioridad Inicial, en ese sentido se deberá solicitar una Enmienda e identificar los recursos para su incorporación.

### **3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Se han realizado reuniones de seguimiento físico y financiero del proyecto con personal de la SAG y organismo financiador.
- Se han atendido solicitudes de ampliación de plazo de Proyecto Prolenca.

### **CONCLUSIONES**

- La SAG presenta una ejecución al cuarto trimestre 2021 de L.220.7 millones que representa un monto muy bajo a nivel institucional representativo del 27% respecto al presupuesto vigente, debido a la limitación de recursos en el proyecto Prolenca por parte del organismo FIDA.
- Al trimestre el PDABR reporta baja ejecución debido a que las empresas contratadas para construir los sistemas de riego han suspendido operaciones y otras están trabajando a un 30% de la capacidad debido a la pandemia sanitaria del país del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública y en los resultados y metas planificadas por los proyectos.
- Al cuarto trimestre el proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos de gestión y con el el organismo financiador.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2014 con una ejecución acumulada financiera de 52% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido 8 años tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de cuatro años que finaliza en diciembre 2023.

## RECOMENDACIONES

- La SAG como ejecutora de proyectos debe realizar de forma eficiente los procesos de Licitación dado que se están fracasando los mismos conllevando a desfases del proyecto en tiempo y cumplimiento de la meta.
- En aras de mejorar la ejecución, se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos en la medida que las circunstancias del país lo permitan, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.

Tomar decisiones sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta una baja ejecución, el mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo, el mismo lleva 3 años sin mostrar ejecución física ni financiera y mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas. por tanto, se concluye que la UAP/SAG ha sido deficiente en la gestión y la toma de decisiones por tener tantos años paralizado el proyecto.
