



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Tercer Trimestre, 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 70.65% del presupuesto vigente de la inversión del sector Desarrollo Productivo y Riego (L. 1,204.9 millones). La SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobado por el Congreso Nacional para inversión en el año 2021 de L.876.1 millones, con un presupuesto vigente al tercer trimestre de L.851.3 millones. con una ejecución financiera de L.153.6 millones que representan el 18% de

cumplimiento; la diferencia entre el presupuesto vigente y el aprobado se debe a que el Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego cedió espacio presupuestario por fondos que no van a utilizar en el año 2021 (Ver cuadro No.1).

Los Proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tienen como objetivo facilitar a los productores los mecanismos e infraestructura necesaria como ser sistemas de riego, semillas de calidad, entre otros para la productividad de granos básicos a fin de contribuir en proporcionar facilidades de producción agrícola a los productores nacionales en pro de los habitantes de la República de Honduras.


La ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	876,186,458
Presupuesto Vigente	851,370,084
Devengado III Trimestre-2021	42,801,163
% Ejecución (Devengado III Trim-2021/ Vigente)	5%
Devengado Anual	153,625,552
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	18%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	153,625,552
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	18%

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

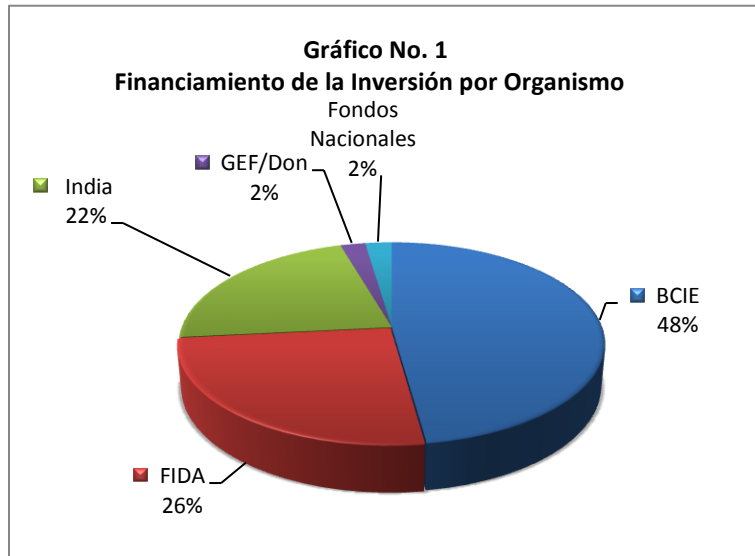

SECRETARIA DE FINANZAS

La inversión de la institución está integrada por tres (3) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural (sistemas de riego, planes de negocios, construcción de caminos terciarios), desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

Dicho presupuesto es financiado en un 98% con fondos externos (Créditos y donaciones) L834.2 millones de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 48% de la cartera de proyectos de la institución, seguido por FIDA con L.221.4 (26%) y en menor porcentaje India 22% (L.187.3) fondos de donación Gef L.2.7 millones así como Fondos Nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) por un monto de L.20.0 millones, equivalente al 2% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No.1.

A continuación, se detallan los principales proyectos ejecutados por la institución:

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	Préstamo BCIE-2101	1,207,598,551	2013-2021	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado al 2020	647,310,346	396,166,822	612,083,428	50.7%
III Trimestre 2021	443,764,430	426,701,010	85,567,515	20.1%
Acumulado Vida del Proyecto	1,091,074,776	822,867,832	697,650,943	58%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto es Financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y fondos de contraparte nacional; el proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género. El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectáreas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa.

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego (Sulaco, Oloman, San Sebastian, Selguapa y Pequeños proyectos de Riegos) en los Departamentos de Yoro, Comayagua y Francisco Morazan, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, actualmente ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Al tercer trimestre de este año, el proyecto presenta una ejecución financiera de L. 85.5 millones equivalente a 20%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora son:

El subproyecto sistema de riego Sulaco: En fecha 13 de octubre 2017 se firmó el contrato con la Empresa NANDANJAIN MEXICO S.A. de C.V por un monto \$13,507,067.64 y con la adenda otorgada por BCIE finaliza en abril 2022, del cual ha ejecutado financieramente \$ 11,212,203.82 que representa el 82% del monto total del contrato.

Este proyecto se esta ejecutando a un ritmo lento. La orden de reinicio de obra reconstrucción no ha sido ordenada por lo que el contratista ha paralizado sus trabajos. Sin embargo, se continúan realizando las siguientes actividades:

- Se realizaron 21 M³ fundicion de tanque amortiguador en presa con concreto de 4,000 PSI.
- Se realizaron 8.50 M³ de fundición del muro de encauce con concreto de 4,000 PSI.
- Se realizaron 12.50 M³ de fundición del muro de encauce con concreto de 4,000 PSI.
- Fundición en tanque amortiguador y muro de encauce del lado izquierdo aguas abajo de la presa del Sub Proyecto Tascalapa, equivalente a 72.80 M³ de concreto de 4,000 Psi, para un acumulado total del proyecto de 5,779.71 M³, que representa un avance del 85.28% de un total contratado equivalente a 6,777.71 M³.
- La ejecución física según estimación N°27 presenta en general un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,536.91 M3 de un total contratado de 6,599.17 M3, lo que representa un 81 % de avance.
- En obra toma se continua con un acumulado a la fecha de 551.51 M³ que representa un avance del 86.63% de un total contratado equivalente a 636.60 M³, así mismo se mantiene en tubería un acumulado de 128,017.21 metros lineales que corresponde a un 98.56% de avance del de un total contratado de 129,889.67 metros lineales.

Durante este mes no se realizó ningún avance en la instalación de tubería, se mantiene un acumulado de 128,017.21 metros lineales que corresponde a un % de avance del 98.56% de un total contratado de L129,889.7

Construcción, Rehabilitación y Modernización del Sistema de Riego Selguapa, Comayagua

Proyecto adjudicado en fecha 9 de julio 2019 a Constructora SATO S. DE R.L. DE C.V. por un monto de \$10,186,120.19 el cual finaliza en agosto 2022, del cual ha ejecutado financieramente \$5,794,239.96 que representa el 56% del monto total del contrato.

Entre las actividades realizadas se detallan la siguientes:

- Desfogue/Aliviadero descargando en Rio Tepanguare. Es proyectado en estación 11+669.24, iniciando en lado derecho del Canal Principal y descargando en Rio Tepanguare, aguas arriba del sifón de cruce del Rio, donde el nivel de aguas de crecidas afectaría la evacuación del caudal de descarga del aliviadero.
- Se acordó replantear alineamiento de canal de desfogue para elaborar detalles constructivos de acuerdo a altimetría en la zona de la obra. Así mismo se definiría el cruce de muro de gaviones construido en margen izquierda del rio, aguas abajo del sifón de cruce del mismo.

Se acordó el replanteo de puente canal proyectado para definir en campo el puente vehicular de acceso antes referenciado.

Subproyecto Sistema de Riego de Olomán: Este Contrato de obra se encuentra en adenda de tiempo en el BCIE por un periodo de (20 meses) del 30 de agosto 2021 al 30 de abril de 2023 suscrito con la Empresa NANDANJAIN MEXICO S.A. de C.V, por un monto de \$10,046,549.02, del cual ha ejecutado financieramente \$1,508,869.28 que representa el 15% del anticipo otorgado del monto total del contrato.

Es de mencionar que el contrato inicial se firmó el 13 de octubre del 2017, pero debido a que los Diseños finales no cumplían a satisfacción del BCIE y la SAG con lo requerido, se volvieron a realizar los estudios, mismos que esta pendiente de entrega los cuales se espera para finales del mes de octubre 2021 de acuerdo a reuniones sostenidas con la Unidad Ejecutora.

El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián:

En fecha 4 de septiembre 2017 se firmó contrato para este subproyecto con la empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. (SEDECO) por un monto de US\$ 2,989,008.26, la baja ejecución se debe a que se presentaron problemas de liberación de servidumbre los cuales fueron solucionaron hasta el año 2019, su nueva fecha de cierre es abril 2022, del cual ha ejecutado financieramente \$1,166,820.13 que representa el 37% del monto total del contrato.

La Supervisión del Proyecto San Sebastián ha propuesto una salida de 12" de diámetro desde foso de derivación de desarenador de Proyecto San Sebastián, para abastecer el área de 50 hectáreas Lamani; considerar cortina intermedia en foso de derivación de desarenador para control de caudales a derivar, tanto para 50 hectáreas – Lamani (Q max = 43 l/s), como para Proyecto San Sebastián (Q max = 190 l/s); incorporar válvula intermedia en Línea de Conducción 50 hectáreas – Lamani para regular presión en parte alta; incluir medidor y regulador de caudal; incorporación de válvulas de aire y de válvulas

de limpieza de acuerdo a su ubicación en el primer kilómetro de la LCP de Proyecto San Sebastián.

El representante de UCP/PDABR/SAG indicó que es urgente contar con diseño final de proyecto (50 hectáreas Lamani) para que el Contratista prepare su cotización, la Asociación de Regantes Lamani demanda diseño final del Proyecto 50 hectáreas – Lamani, por lo que se requiere fijar fecha de entrega de cotización por parte de Contratista, y así proceder a gestionar No Objeción por parte del BCIE.

Se instruyó en cuanto a considerar válvulas de control para cada hidrante en derecho de vía de camino intermedio de área de 50 hectáreas – Lamani.

Finalmente, se definió depurar el diseño de 50 hectáreas – Lamani el cual presenta un avance en líneas de conducción Principal: 771.90 ml y Laterales y Sublaterales: 2,836.43 ml Terciaria: 10,314.01 ml presentando un avance físico de obra de un 34.15%.

Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos

Con estos subproyectos se atenderán a 42 organizaciones que serán beneficiadas con la instalación de Sistemas de Riego, para lo cual esta en proceso la documentación necesaria para realizar el proceso de Licitación para la adquisición del equipo y los servicios para la instalación de los sistemas de riego por un monto de \$4.0 millones, sin presentar ejecución financiera a la fecha.

Mediante estos sistemas se instalará infraestructura de riego en 1,253.62 hectáreas de tierra agrícola, serán incorporados a la agricultura bajo riego 1516 emprendimientos agrícolas de producción.

Estos subproyectos no presentan avance físico a la fecha, dado que no contaban con diseños e identificación de beneficiarios hasta este momento está en proceso para su adjudicación.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (Financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donacion GEF)

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	FIDA-899-HN (Préstamo) GEF-SF-05-HN (Donación) 200000125200 (Préstamo)	576,079,308	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado al 2020	331,050,857	113,721,809	294,773,340	51.17%
III Trimestre 2021	245,028,443	232,826,488	68,058,037	29.23%
Acumulado Vida del Proyecto	576,079,300	346,548,297	362,831,377	62.98%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Este proyecto comprende la formulación de 313 planes de inversión para organizaciones y planes de fortalecimiento organizacional y la rehabilitación de 150 km de caminos terciarios y 3 Sistemas de riego y agua potable, y 225 km de rehabilitación y/o recuperación de hectareas de bosque, la realización de 100 Letrinas y 100 Ecofogones en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Durante el tercer trimestre se ha obtenido un porcentaje de ejecución del 29.23% con fondos FIDA equivalente a L.68.0 millones.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora se describen a continuación:

COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:

Se elaboraron y Formulación de 65 Planes de inversión, durante el trimestre se evaluaron las ofertas económicas, se elaboró el informe y se elaboraron los borradores de contratos y se obtuvo la no objeción por parte del FIDA.

Se tienen elaborados los contratos referente a los planes de negocio, mismos que se encuentran en proceso de firma por parte del Ministro. Durante el trimestre se han realizado talleres orientados a la sensibilización en género y seguridad alimentaria en organizaciones; capacitando mediante 16 jornadas en el departamento de Intibucá 235 de las cuales 145 son mujeres y 90 son hombres.

COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo y de Negocios

Se realizaron Desembolsos a 40 Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados por un monto de L.45,568,347.20.

En la ejecución de los Planes de Inversión se está brindando asistencia técnica a 70 Organizaciones Beneficiadas, la asistencia técnica se esta realizando en el área organizativa, empresarial, área productiva, genero, inclusión social y comercialización.

Mediante el convenio con Fundación Capital se han realizado ya 23 jornadas de capacitación con la participación de 127 líderes representantes de organizaciones.

Los avances en campo son muy significativos; se han capacitado 5,602 personas capacitadas, de las cuales el 58% son mujeres y hombres jóvenes; 36% de hombres adultos capacitados en temas de educación financiera evidenciando condición inclusiva del proyecto la cual mantenemos monitoreada, con el uso individual de tablets que no requieren conexión a wifi, las cuales son confiadas a los líderes.

En el trimestre según los informes de asistencia técnica con la ejecución de las diferentes iniciativas, se han generado 165 nuevos empleos temporales valorados en L 1,894,021 de estos empleos 102 beneficiarios son hombres y 63 son mujeres.

COMPONENTE 3. Infraestructura Rural**Rehabilitación de Caminos Terciarios Rurales y Caminos de Acceso.**

Los convenios ya están firmados, están en proceso de otorgar el primer desembolso para beneficiar una cantidad de 46.4km, según cuadro adjunto.

Proyecto	Acuerdos de cooperación	No. De Km
Mejoramiento de caminos terciarios en La Esperanza, Intibucá.	Espera firma del ministro.	14.95
Mejoramiento de caminos terciarios en San Marcos de la Sierra, Intibucá.	Espera firma del ministro.	13.8
Mejoramiento de caminos terciarios en Yamaranguila, Intibucá.	Espera firma del ministro.	8
Mejoramiento de caminos terciarios en Gracias, Lempira.	Espera firma del ministro.	9.7
		46.45 km

Rehabilitación de 14.95 kms Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucá.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en el tramo puente hondo (KM 8) hacia El Pelón; teniéndose hasta la fecha 13.9 kms mecanizados, equivalentes a un 93% de los trabajos de mecanización a realizar, en los dos tramos del sector Chogola centro, Terreros y Arenales, teniéndose instaladas 25 de las 75 alcantarillas a instalar, representando el 34% de la instalación; Igualmente se está realizando el corte del material de balastado en los bancos autorizados para la extracción del material y se tiene ya colocado en sitio, 600 metros del camino en el tramo que va hacia Arenales, que equivalen a un 4% de los trabajos de balastado, teniéndose un avance de ejecución global de obra de 33%.

Rehabilitación de 13.80 kms de Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de San Marcos de la Sierra, Departamento de Intibucá.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en los tramos San Marcos centro – Lodo Negro – Llano de Balas y el tramo de San José – El Mangal; teniéndose hasta la fecha 7.5 kms mecanizados, equivalentes a un 54% de los trabajos de mecanización a realizar, también se trabaja en demolición de taludes de suelo rocoso utilizando un equipo especial (tractor Martillo) en el tramo que va a lodo negro y llano de balas lo cual ha dificultado la terminación de la mecanización en dicho sector para dejar el ancho de los 6.00 metros como mínimo, teniéndose un avance de ejecución global de obra de 16%.

Rehabilitación de 8 Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en los tramos Cruz Alta – Los Mangos – Semane y el tramo de Las Flores – Cofradía; teniéndose hasta la fecha 5.0 kms mecanizados, equivalentes a un 62% de los trabajos de mecanización a realizar, también

se está realizando el corte del material de balastado en los bancos autorizados para la extracción del material y se tiene ya colocado en sitio 500 metros del camino en el tramo Las Flores - Cofradía, que equivalen a un 6% de los trabajos de balastado, teniéndose un avance de ejecución global de obra de 20%.

Rehabilitación de 9,7 Kms Caminos Rurales Terciarios en el Municipio de Gracias, Departamento de Lempira.

Se continua con la actividad de la Mecanización del camino en el tramo Gracias – San Antonio - Guanteque; teniéndose hasta la fecha 6.5 kms mecanizados, equivalentes a un 67% de los trabajos de mecanización a realizar, teniéndose un avance de ejecución global de obra del 20%.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora están se resaltan las siguientes:

Para el tercer trimestre el proyecto no presenta ejecución física ni financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser la contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto, gastos de monitoreo.

Se ha solicitado el presupuesto necesario para realizar las actividades descritas y se está solicitando esos fondos para poder hacer frente a los compromisos contractuales alrededor de L.25.0 millones de fondos nacionales.

Al respecto la DGIP, ha informado que dichos recursos No están contemplados en la Nota de Prioridad Inicial, en ese sentido se deberá solicitar una Enmienda e identificar los recursos para su incorporación.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran

Proyecto	Convenio-Préstamo/India	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	IN-DL98134500295569L	582,235,100	2013-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2020	205,286,440	205,286,440	205,286,440	35.26%
III Trimestre 2021	187,393,585	-	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	392,680,025	205,286,440	205,286,440	35.26%
Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Se han realizado reuniones de seguimiento físico y financiero del proyecto con personal de la SAG y organismo financiador.
- Se han atendido solicitudes de ampliación de plazo de Proyecto Prolenca.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución al tercer trimestre 2021 de L.153.8 millones que representa un monto muy bajo a nivel institucional representativo del 18% respecto al presupuesto vigente, debido a la limitación de recursos en el proyecto Prolenca por parte del organismo FIDA.
- Al trimestre el PDABR reporta baja ejecución debido a que las empresas contratadas para construir los sistemas de riego han suspendido operaciones y otras están trabajando a un 30% de la capacidad debido a la pandemia sanitaria del país del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública y en los resultados y metas planificadas por los proyectos.
- Al tercer trimestre el proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos y financieros con el organismo financiador.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2014 con una ejecución acumulada financiera de 52% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido 8 años tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años que finaliza en diciembre 2021.

RECOMENDACIONES

- La SAG como ejecutora de proyectos debe realizar de forma eficiente los procesos de Licitación dado que se están fracasando los mismos conllevando a desfases del proyecto en tiempo y cumplimiento de la meta.
- En aras de mejorar la ejecución, se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos en la medida que las circunstancias del país lo permitan, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Se recomienda tomar las decisiones correspondientes sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta una baja ejecución, el mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución transcurrido de 5 años y al tercer trimestre 2021 no reporta ejecución física ni financiera.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.

SECRETARIA DE FINANZAS

ANEXO 4
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha Inicio - Término	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
	Desarrollo Productivo y Riego																		
3	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			876,186,458	20,035,359	831,334,725	851,370,084	5,306,345	148,319,207	153,625,552	18	4,584,956	38,216,207	42,801,163	5	5,306,345	148,319,207	153,625,552	18
1	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PROLENCA	FIDA-I-899-HN	18/10/2013 - 31/03/2022	124,373,526	-	100,579,181	100,579,181	-	39,859,505	39,859,505	40	-	11,937,525	11,937,525	12	-	39,859,505	39,859,505	40
		FIDA-II-20000012520	18/10/2013 - 31/03/2022	117,954,917	-	117,954,917	117,954,917	-	22,743,648	22,743,648	19	-	7,355,208	7,355,208	6	-	22,743,648	22,743,648	19
		GEF-FSS-05-HN	14/03/2016 - 30/12/2021	2,700,000	-	14,292,390	14,292,390	-	5,454,884	5,454,884	38	-	197,581	197,581	1	-	5,454,884	5,454,884	38
2	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	30/05/2013 - 30/11/2021	443,764,430	20,035,359	406,665,652	426,701,011	5,306,345	80,261,170	85,567,515	20	4,584,956	18,725,894	23,310,850	5	5,306,345	80,261,170	85,567,515	20
3	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL9813450029 5569L	16/06/2016 - 30/08/2022	187,393,585	-	187,392,585	187,392,585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).	DN-No.200000183 8-FIDA-SAG	01/06/2018 - 31/12/2021	-	-	4,450,000	4,450,000	-	475,430	475,430	11	-	475,430	475,430	11	-	955,766	955,766	21

Fuente: SIAFI

*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público-Privada (SAPP)

**/ Cifras según Circular No. CGG-014-2021, CGG-1574-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

SECRETARIA DE FINANZAS

ANEXO 5
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2021

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2021			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Secretaría de Agricultura y Ganadería	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	03 - Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación.	Plan de Inversión	65	0	0%	0	0	0%	
		04 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados.	Plan	65	0	0%	0	0	0%	
		05 - Convenio suscritos con las organizaciones hombres, mujeres, jóvenes y etnias.Fida II.	Convenio	40	0	0%	30	0	0%	
		06 - Asistencia técnica a Productores(as) rurales de las organizaciones beneficiarias.	Asistencia Técnica	65	0	0%	0	0	0%	
		07 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	Kilómetro	2	0	0%	0	0	0%	
		08 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación.	Hectárea	125	0	0%	0	0	0%	
		09 - Convenio suscritos con las organizaciones(hombres, mujeres, jóvenes y etnias, (FIDA II)	Convenio	30	0	0%	0	0	0%	
		10 - Rehabilitación de líneas de conducción para sistemas de riego en parcelas de tierra agrícola	Kilómetro	20	0	0%	0	0	0%	
		11 - Rehabilitadas hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego.	Hectárea	50	0	0%	0	0	0%	
		12 - Instalados eco-fogones en hogares de familias de productoras.	Eco-fogón	100	0	0%	0	0	0%	
		13 - Instaladas letrinas en hogares de familias de productoras.	Letrina	100	0	0%	0	0	0%	
		14 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. (FIDAII)	Kilómetro	48	0	0%	0	0	0%	
		007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO (PDABR)	01 - Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	Capacitación	13	0	0%	3	0	0%
			02 - Capacitaciones brindadas a Productores de asociaciones de regantes.	grupo	19	0	0%	11	0	0%
	02 - Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola.		Capacitación	82	0	0%	28	0	0%	
	03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.		Contrato	17	0	0%	15	0	0%	
	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	06 - Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	Kilómetro	150	0	0%	50	0	0%	
		02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.	Porcentaje	100	0	0%	33	0	0%	
	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).	03 - Talleres de socialización y seguimiento de los resultados del Diagnostico.	Informe	3	0	0%	2	0	0%	
		04 - Informe de la firma auditoria externa contratada.	Informe	1	0	0%	0	0	0%	
		05 - Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones.	Informe	4	0	0%	2	0	0%	
		06 - Sistema automatizado de información Gerencial operando.	Sistema	1	0	0%	0	0	0%	

Fuente: SIAFI, 30/09/2021
