



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2025

*Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)*

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2025

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Honduras, fundada en 1995 para regular y promover el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país. Como ente técnico estatal, administra el espectro radioeléctrico y establece políticas que fomentan la competencia justa, protegen los derechos

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	236,460,722
Inversión Productiva	36,215,722
Inversión Social	200,000,000
Formación Bruta de Capital	245,000
Presupuesto Vigente	236,460,722
Inversión Productiva	236,215,722
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	245,000
Ejecutado II Trimestre	16,964,037
Inversión Productiva	16,903,429
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	60,608
% Ejecución (Devengado II Trim-2025/Vigente)	7.2%
Ejecutado Anual	17,025,287
Inversión Productiva	16,903,429
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	121,858
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	7.2%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

de los usuarios y aseguran servicios de calidad. Su misión es impulsar la conectividad y reducir la brecha digital, garantizando el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y colaborando en la transformación digital de Honduras.

Al segundo trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente para la ejecución de programas y proyectos de L236.5 millones. La ejecución del trimestre ascendió a casi L17.0 millones lo que representa a 7.2%, monto muy similar presupuesto ejecutado anual, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) financia la ejecución de sus programas y proyectos principalmente con recursos de




origen interno, siendo el Tesoro Nacional la principal fuente de financiamiento. Todas las actividades y proyectos se desarrollan exclusivamente con fondos provenientes de fuentes nacionales.

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2021-2025)

Al segundo trimestre de cada año en el período 2021-2025, la ejecución presupuestaria de los recursos asignados ha mostrado variaciones considerables.

En 2021, la ejecución alcanzó un 6.85% del presupuesto vigente, mientras que en 2022 se registró una ejecución aún menor, alcanzando solo el 1.60%. En 2023, se evidenció un incremento importante, con una ejecución del 24.65% de los fondos asignados. Para 2024, la ejecución fue de 17.95%, mostrando una leve disminución respecto al año anterior. Finalmente, en el segundo trimestre de 2025, la ejecución se sitúa en 7.20%.

Gráfico No. 01
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2021-2025)
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Cifras en millones de Lempiras

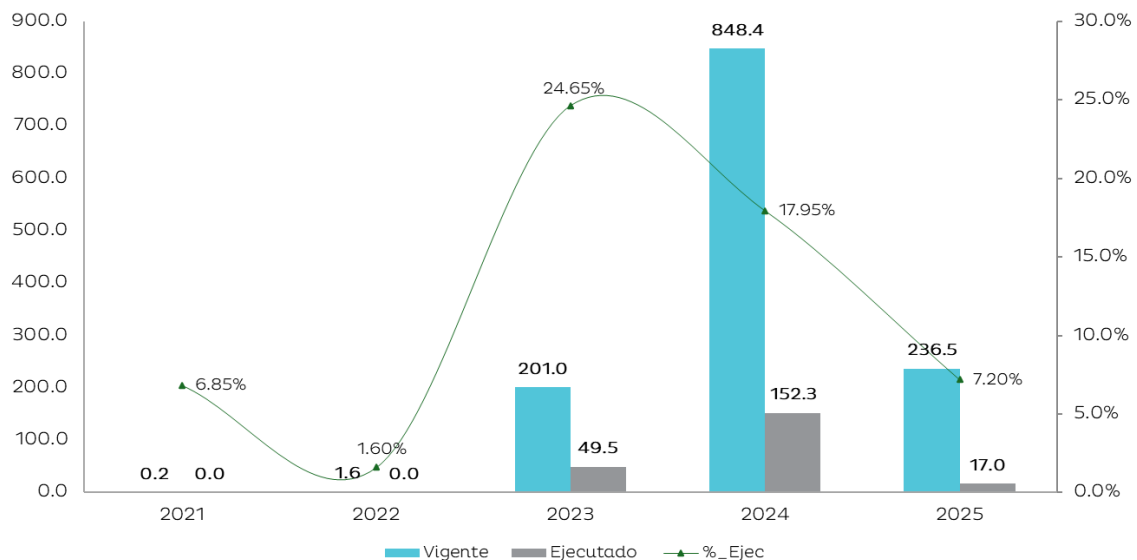

d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el segundo trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto:



1. Programa de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

El objetivo general del Programa Ampliar la capacidad de CONATEL para regular los servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la calidad de los servicios, protegiendo los derechos de los usuarios y promoviendo la conectividad de la población.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al II trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre de 2025		
		Program.	Ejecución	% Ejec.	Program.	Ejecución	% Ejec.
Construcción de Nuevas plantas del Edificio de CONATEL	PISO	2	0.94	47%	1	0.94	94%
Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad	SISTEMA	4	1	25%	1	1	100%
Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios	SISTEMA	1	1	100%	1	1	100%
Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	EQUIPO	210	210	100%	210	210	100%

Fuente: CONATEL, al 30 de junio de 2025

Al segundo trimestre se avanzó con los siguientes procesos:

Componente I: Fortalecimiento Técnico

- Se finalizó la remodelación de la oficina de la estación remota atendida en la ciudad de Tocoa, ubicada en las instalaciones de COPECO, proceso adjudicado a la empresa ELCOS.
- Continuó la instalación de estaciones desatendidas para el control y monitoreo del espectro radioeléctrico, alcanzando un avance del 90% mediante el proceso adjudicado vía Licitación Pública Internacional LPI-001-2023-CONATEL.
- Se realizó la segunda revisión, por parte de expertos de la UIT, del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información.

Componente III: Ampliación y Modernización de Infraestructura

- El avance en la construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal de CONATEL llegó al 70%, habiendo iniciado el 10 de diciembre de 2024 a través de la Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024.
- La instalación del sistema de climatización en el edificio principal de CONATEL presentó un avance del 90% en el nivel 1 y del 40% en el nivel 4, desarrollado mediante la Licitación Pública Nacional LPN-CNT-02-2024.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa a Nivel Nacional al segundo trimestre de 2025:



Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.	25261-1	US\$9,477,701.9	L248,257,977.00	01/08/2023-31/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2025	36,215,722	36,215,722	16,903,429	46.7%
Acumulado 2025	36,215,722	36,215,722	16,903,429	46.7%
Acumulado Vida del Proyecto *	248,257,977	248,257,977	196,379,661	79.1%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2025 (BCH): L26.1939 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2025

Durante el segundo trimestre de 2025, las principales adquisiciones de CONATEL incluyeron la remodelación de la oficina de la estación remota atendida en Tocoa, ejecutada por la empresa ELCOS; la continuación de los pagos y estimaciones de avance para la construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal, a cargo de CONCO; y la instalación del sistema de climatización en el edificio principal de CONATEL, desarrollada por la empresa ELCON, alcanzando avances significativos en los diferentes niveles del edificio. Estas adquisiciones forman parte de los esfuerzos por fortalecer la infraestructura y modernizar las capacidades técnicas y operativas de la institución.

d.2. Programas Sociales

El presupuesto asignado a los programas sociales de la institución para el año 2025 asciende a L200 millones, los cuales se destinan a transferencias que deberán realizarse a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). Estos fondos tienen como objetivo respaldar iniciativas de proyectos indispensables para la recuperación de dicha entidad estatal. En consecuencia, los alcances físicos derivados de estas inversiones serán reportados directamente por HONDUTEL.

a. Gestión de la Inversión

Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- CONATEL solicitó mediante Oficio CONATEL-CP-189-2025 una modificación presupuestaria dentro del grupo de gasto 40000 (bienes capitalizables), realizando un traslado de fondos entre objetos del gasto por un monto de L2,165,831.00, con el fin de financiar la finalización del sistema de climatización y la construcción del cuarto y quinto nivel del edificio principal.
- Mediante Oficio CONATEL-CP-189-2025, Formulario FP-05 y Memorándum DPMF-M-174-2025, gestionó una modificación presupuestaria ante la DGIP para trasladar fondos del grupo de gasto 40000 (bienes capitalizables) al grupo 20000 (servicios no personales), con el objetivo de financiar actividades de mantenimiento, reparación, estudios y adquisición de repuestos para la ejecución del proyecto de fortalecimiento institucional, contando con dictamen favorable para asegurar la disponibilidad de recursos y el cumplimiento del Plan Operativo Anual ajustado 2025.

b. Problemática y Acciones Durante el II Trimestre-2025

Durante el segundo trimestre de 2025, persisten retrasos significativos tanto en la ejecución física como financiera del proyecto. Entre las principales dificultades destacan los retrasos en las obras físicas, debido a la falta o demora en la obtención de permisos de construcción y la necesidad de realizar remediones de los planes estructurales, lo que ha limitado el avance programado. Además, los tiempos de ejecución se han visto afectados porque gran parte de los equipos y sistemas adquiridos son importados y requieren procesos de verificación técnica y de calidad más exigentes, lo que ha extendido los plazos de entrega e instalación. Por otro lado, considerando que la fecha de finalización del proyecto es diciembre de 2025, resulta esencial gestionar e incorporar los fondos faltantes, ya

que existen compromisos contractuales adquiridos que no pueden ser cubiertos con el presupuesto actual. Estas gestiones son indispensables para garantizar la continuidad del proyecto y evitar posibles implicaciones legales por incumplimiento de obligaciones contractuales.

V. CONCLUSIONES

- Al cierre del segundo trimestre de 2025, la ejecución financiera alcanzó apenas L17.0 millones, equivalente al 7.2% del presupuesto, debido a retrasos en la obtención de permisos de construcción, ajustes en los planos y la no incorporación de fondos pendientes de años anteriores.
- La construcción del 4.º y 5.º piso se ha visto demorada por dificultades para obtener permisos derivados de modificaciones en los planos, así como por la importación de equipos del espectro radioeléctrico, cuyo ingreso y revisión toman más tiempo.
- Si no se identifican e incorporan los fondos faltantes, podrían surgir implicaciones legales y se pondría en riesgo el impacto esperado del proyecto en el cierre de la brecha digital y la mejora de los servicios de telecomunicaciones en el país.

VI. RECOMENDACIONES

- CONATEL debe establecer un plan de acción inmediato que permita agilizar la ejecución física y financiera del proyecto, priorizando los procesos que presentan retrasos y fortaleciendo la coordinación con instituciones responsables de otorgar permisos y dictámenes técnicos.
- Se recomienda que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) dar prioridad a la identificación y asignación de los recursos (L32,566,023) para que CONATEL pueda cumplir con los pagos y compromisos del proyecto, asimismo realizar un cierre físico y financiero satisfactorio del proyecto en el presente año. Esto es necesario



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

para evitar problemas legales y asegurar que el proyecto realmente ayude a mejorar la conexión y los servicios de telecomunicaciones en el país.

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado II Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
2	Inversión Productiva		36,215,722.0	36,215,722.0	236,215,722.0	236,215,722.0	16,903,429.1	16,903,429.1	7.2	16,903,429.1	16,903,429.1	7.2
2	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		36,215,722.0	36,215,722.0	236,215,722.0	236,215,722.0	16,903,429.1	16,903,429.1	7.2	16,903,429.1	16,903,429.1	7.2
1	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL.	BCH-25261-1	36,215,722.0	36,215,722.0	36,215,722.0	36,215,722.0	16,903,429.1	16,903,429.1	46.7	16,903,429.1	16,903,429.1	46.7
	Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN		36,215,722.0	36,215,722.0	36,215,722.0	36,215,722.0	16,903,429.1	16,903,429.1	46.7	16,903,429.1	16,903,429.1	46.7
2	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES			-	200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	-	-
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES			-	200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	-	-
	Inversión Social		200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTRAS INVERSIONES SOCIALES		200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - OTRAS INVERSIONES SOCIALES		200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Formación Bruta de Capital		245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	60,607.6	60,607.6	24.7	121,857.6	121,857.6	49.7
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	60,607.6	60,607.6	24.7	121,857.6	121,857.6	49.7
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	60,607.6	60,607.6	24.7	121,857.6	121,857.6	49.7
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		245,000.0	245,000.0	245,000.0	245,000.0	60,607.6	60,607.6	24.7	121,857.6	121,857.6	49.7
2	Total general		236,460,722.0	236,460,722.0	236,460,722.0	236,460,722.0	16,964,036.7	16,964,036.7	7.2	17,025,286.7	17,025,286.7	7.2

Fuente: SIAFI, 30/06/2025

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Comisión Nacional de Telecomunicaciones	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	Construcción de Nuevas plantas del Edificio de CONATEL	PISO	2	1	47%	1	1	94%
		Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad	SISTEMA	4	1	25%	1	1	100%
		Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios	SISTEMA	1	1	100%	1	1	100%
		Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	EQUIPO	210	210	100%	210	210	100%

Fuente: Unidad Ejecutora, al 30 de junio de 2025
