

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

*Secretaría de Desarrollo
Comunitario, Agua y
Saneamiento (SEDECOAS)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento en Honduras, (SEDECOAS), se dedica a promover el desarrollo comunitario a través de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos. Trabajan en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable del país.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	2,041,559,773
Inversión Productiva	351,030,506
Inversión Social	1,399,745,003
Formación Bruta de Capital	290,784,264
Presupuesto Vigente	357,354,047
Inversión Productiva	259,037,506
Inversión Social	80,800,000
Formación Bruta de Capital	17,516,541
Ejecutado III Trimestre	55,515,256
Inversión Productiva	53,320,971
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	2,194,285
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	15.5%
Ejecutado Anual	269,790,891
Inversión Productiva	254,062,668
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	15,728,223
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	75.5%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

Al III trimestre del 2025 la institución contó con un presupuesto vigente para la ejecución de programas y proyectos de L 357.3 millones; la ejecución presupuestaria ascendió a solamente el 15.5%, tal como se detalla en el Cuadro anterior, es importante mencionar que el Programa de Agua y Saneamiento de Honduras a pesar de contar con ejecución financiera sus obras se encuentran en etapa inicial de pago de anticipos por lo que aún no hay una ejecución física de obras como tal.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

Los proyectos que ejecuta SEDECOAS provienen de fuentes de financiamiento externo y recursos del tesoro nacional.

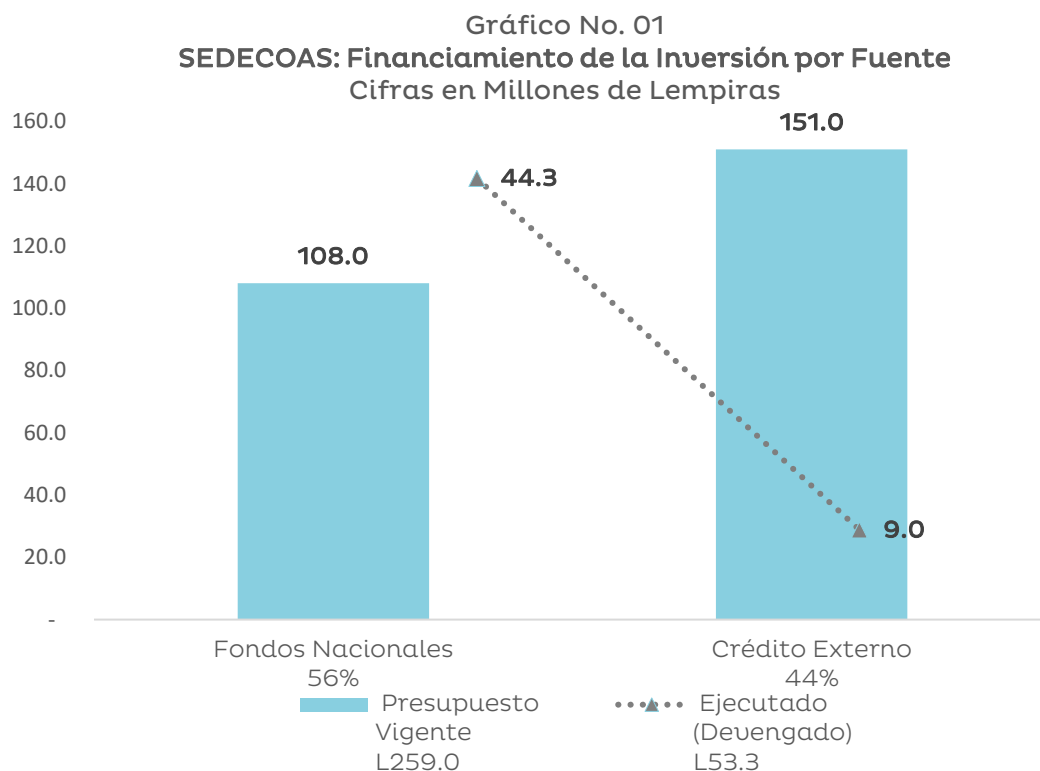


Fuente: SIAFI

Del total del financiamiento vigente para fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de L151.0 que corresponde al 44% y del tesoro nacional un monto de L108.0 que representan el 56% del total del presupuesto vigente L 259.0

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2023-2025)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2023 y 2025, basado en los montos vigentes y ejecutados.

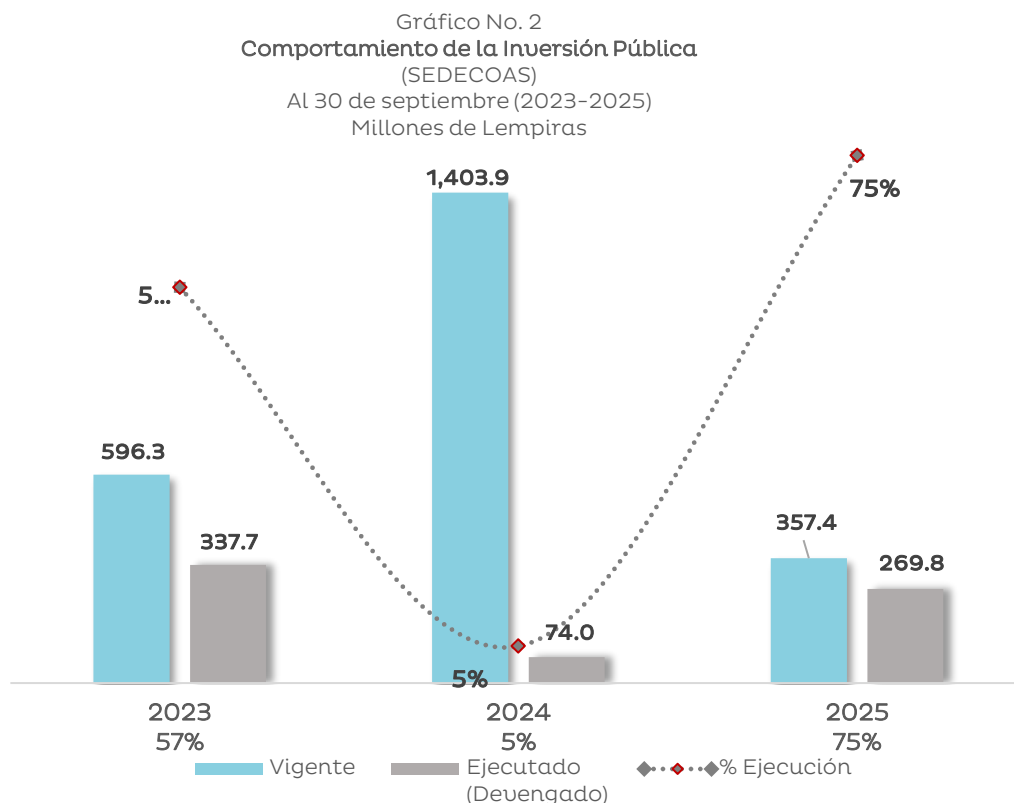

Fuente SIAFI

En la gráfica se detalla un incremento significativo del presupuesto vigente pasando de una asignación de L596.3 millones en 2023 a L1,403.9 millones en 2024, año para el que el Congreso Nacional de la República aprobó espacio presupuestario para ajustador de inversión pública de la institución para el financiamiento de nuevas iniciativas de proyectos. Sin embargo, para el 2025 disminuyó a L 357.4 a fin de que la institución iniciara los procesos de ejecución de las nuevas iniciativas de inversión.

En cuanto al porcentaje de ejecución, en el año 2023 a nivel institucional se reporta una ejecución de L337.7 millones, que representa el 57% con relación a su presupuesto vigente, en el año 2024 el monto ejecutado disminuyó a L74.0 millones que representó apenas el 5% en relación con su

presupuesto vigente y para el 2025 se alcanzó una ejecución de L269.8 millones que representan el 75% de cumplimiento.

d. Principales Proyectos

En el tercer trimestre de 2025, la inversión productiva se concentra en el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento. Para lograr el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rural.
- Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del cambio climático (CC) sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJE.	Programación	Ejecución	% EJE.
Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades	SISTEMA	0	0	0%	0	0	0%

Fuente: SEDECOAS, al 30 de septiembre de 2025

En el tercer trimestre no hay avances físicos que reportar, ya que el Programa se encuentra en etapa inicial, por lo que no se han efectuado los pagos iniciales y se espera que la ejecución inicie a partir del IV trimestre.

Al finalizar el año, se prevé avanzar en los indicadores del componente 2, que se relacionan al fortalecimiento institucional de entidades del sector de agua potable y saneamiento.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Agua Potable y Saneamiento En Honduras al III trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% Ejecución
Programa de Agua Potable y Saneamiento En Honduras	BID5284/BL-HO	US\$45,000,000	L1,179,396,000	01/12/2023-23/11/2028
III Trimestre 2025	351,030,506	151,030,506	9034631.46	6%
Acumulado 2025	351,030,506	151,030,506	65255668.5	43%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,179,396,000	1,179,396,000	69,096,749.46	6%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

Al cierre del trimestre, se resaltan los siguientes avances:

- El programa logro adjudicar los contratos de supervisión de las obras de micro captación pluvial (2 proyectos), igualmente para las obras de proyectos rurales de Paquete 1 (7 proyectos), en total 9 proyectos.
- Se ha avanzado con el proceso de Licitación de obras para los proyectos del Paquete 1, Lote 3: Agua Potable en aldeas de Sanata Ana de Yusguare en Choluteca y la planta potabilizadora FIME en San Jerónimo, Comayagua. Igualmente se avanzó con el proceso de Licitación de obras para los proyectos de cosecha de aguas lluvias o micro captación pluvial para aldeas en el departamento de Intibucá, en municipios de San Marcos de la Sierra y Concepción.
- Se logró contratar y dar orden de inicio a la firma supervisora del proyecto de Línea de Impulsión SANAA-Barrios.

d.1. Principales Adquisiciones II Trimestre 2025

El proyecto ejecutado por SEDECOAS, no reporta ninguna adquisición al cierre del III Trimestre.

e. Gestión de la Inversión

- En atención al oficio DSM-0594-2025 de fecha 8 de agosto de 2025 el proyecto solicita modificación presupuestaria entre objetos de gasto de capital, ya que el programa requiere efectuar una readecuación del presupuesto asignado para el presenta año fiscal.
- Acompañamiento a la institución en las actividades previas a la ejecución del proyecto.

f. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

- La ausencia de convenios interinstitucionales formales ha impedido acciones legales y administrativas, La falta de firma de los convenios entre SEDECOAS, ERSAPS y SANAA ha frenado procesos clave como la contratación de consultorías, adquisición de equipos e implementación técnica, al no existir un marco legal que permita ejecutar los recursos comprometidos en el préstamo internacional.
- Limitaciones operativas por falta de personal, equipo y vehículos, inicio tardío de personal clave, como el Coordinador del Componente 1, junto con la ausencia de contrataciones para el Componente 2, afecta directamente la ejecución de actividades y el cumplimiento de metas.
- Los procesos de revisión legal en SERNA han superado los plazos estimados, retrasando la emisión de licencias ambientales necesarias para iniciar obras, Por otra parte, también se ha detectado la debilidad de no contar con un consultor legal que realice la función de revisión de contratos suscritos con las empresas contratistas y de supervisión, pólizas de seguros, etc.
- Condiciones meteorológicas adversas, como las lluvias intensas, han obligado a reprogramar actividades de socialización en comunidades, afectando el calendario establecido para el despliegue del personal supervisor y contratista en campo.

V. CONCLUSIONES

- Se han dado pasos importantes, como la gestión de contrataciones, solicitudes de equipos y apoyo interinstitucional para el desarrollo de giras. No obstante, aún persisten retos que limitan la ejecución plena de las actividades. Estos desafíos estructurales y otros como el clima invitan para identificar soluciones sostenibles, con una

mirada integral centrada en la eficiencia, la participación territorial y la mejora continua.

VI. RECOMENDACIONES

- Promover la formalización oportuna de convenios y licencias a través de mesas técnicas con participación de todas las instituciones clave (ERSAPS, SANAA, SERNA) permitiría reducir cuellos de botella legales y administrativos. Estas acciones, además de anticipar soluciones, consolidan una cultura de trabajo conjunto y de responsabilidad compartida.
- Impulsar la provisión oportuna de equipos y vehículos, contribuirá directamente a la eficiencia de las actividades en territorio. Estos elementos, aunque operativos, son fundamentales para garantizar que el personal técnico desarrolle sus funciones en condiciones adecuadas y con un impacto real en las comunidades beneficiarias.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig)
2	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		-	351,030,506	351,030,506	108,007,000	151,030,506	259,037,506	44,286,340	9,034,631	53,320,971	20.6%	188,807,000	65,255,669	254,062,668	98.1%	188,807,000	94,965,612	283,772,612	109.5%
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS	BID5284/BL-HO		351,030,506	351,030,506		151,030,506	151,030,506		9,034,631	9,034,631	6.0%		65,255,669	65,255,669	43.2%		94,965,612	94,965,612	62.9%
	Total PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS			351,030,506	351,030,506		151,030,506	151,030,506		9,034,631	9,034,631	6.0%		65,255,669	65,255,669	43.2%		94,965,612	94,965,612	62.9%
2	PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		-	-	-	108,007,000		108,007,000	44,286,340		44,286,340	41.0%	188,807,000		188,807,000	174.8%	188,807,000		188,807,000	174.8%
	Total PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		-	-	-	108,007,000		108,007,000	44,286,340		44,286,340	41.0%	188,807,000		188,807,000	174.8%	188,807,000		188,807,000	174.8%
	Inversión Social																			
	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		1,399,745,003		1,399,745,003	80,800,000		80,800,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		1,399,745,003		1,399,745,003	80,800,000		80,800,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		1,399,745,003		1,399,745,003	80,800,000		80,800,000	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Formación Bruta de Capital																			
	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		290,784,264		290,784,264	17,516,541		17,516,541	2,194,285		2,194,285	12.5%	15,728,223		15,728,223	89.8%	15,728,223		15,728,223	89.8%
	PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		290,784,264		290,784,264	17,516,541		17,516,541	2,194,285		2,194,285	12.5%	15,728,223		15,728,223	89.8%	15,728,223		15,728,223	89.8%
	Total PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		290,784,264		290,784,264	17,516,541		17,516,541	2,194,285		2,194,285	12.5%	15,728,223		15,728,223	89.8%	15,728,223		15,728,223	89.8%
	Total general		1,690,529,267	351,030,506	2,041,559,773	206,323,541	151,030,506	357,354,047	46,480,625	9,034,631	55,515,256	21%	204,535,223	65,255,669	269,790,891	98%	204,535,223	94,965,612	299,500,835	110%

Fuente: SEFIN, 30 Septiembre 2025

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	001 - Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	14 - Ejecución del Contrato de Obras de los sistemas de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		15 - Ejecución del Contrato de Supervisión de Obras de los sistemas de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		16 - Ejecución del Contrato de Obras de de las soluciones individuales de saneamiento PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		17 - Ejecución del Contrato de supervisión de las soluciones individuales de saneamiento PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		18 - Ejecución del Contrato con ONGs para la construcción los sistemas individuales de cosecha de agua. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		19 - Ejecución del Contrato de Inspectores (consultores individuales) de los sistemas individuales de cosecha de agua. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		20 - Contratación de las firmas consultoras que elaborarán los diseños. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		21 - Informe de los proyectos en ejecución con enfoque de género para evidenciar las oportunidades entre mujeres y hombres. PAPSH	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
		22 - Ejecución del Contrato construcción de obras de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		23 - Ejecución Contrato de Supervisión de obras de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		24 - Ejecución del contrato de construcción de obras de Línea de Impulsión Barrios PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		25 - Ejecución Contrato de supervisión de obras de Línea de Impulsión Barrios PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		26 - Ejecución del Contrato de construcción obras de Alcantarillado PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		27 - Ejecución del Contrato de Supervisión de obras de Alcantarillado PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		30 - Contratación de firma para el diseño e implementación del plan. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		31 - Suscripción de Convenio de Cooperación	26 - CONVENIO	1	0	0	0	0	0

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		SEDECOAS FHIS SANAA. PAPSH							
		32 - Contratación de firma para el diseño de obras de infraestructura. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		33 - Contratación de firma para el desarrollo de los cursos. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Fuente: SIAFI, 30/09/2025
