



Informe de Avance Físico y Financiero al III Trimestre 2025

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

***Universidad de Ciencias Forestales
(UNACIFOR)***

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn





3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Universidad de Ciencias de Forestales (UNACIFOR) es el ente estatal especializado en la enseñanza del área forestal y la conservación de los recursos naturales orientados a mejorar las condiciones académicas y productivas en las diferentes áreas.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, se manifiesta la prioridad de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	8,597,175
Inversión Productiva	-
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	8,597,175
Presupuesto Vigente	78,230,729
Inversión Productiva	35,251,996
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	42,978,733
Ejecutado III Trimestre	1,309,677
Inversión Productiva	60,000
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	1,249,677
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	1.7%
Ejecutado Anual	43,578,584
Inversión Productiva	32,668,187
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	10,910,396
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	55.7%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

Al Tercer Trimestre 2025, se contó con un presupuesto vigente de L78.2 millones de los cuales, L35.2 millones corresponden a inversión productiva para la ejecución de un proyecto y L42.9 para la ejecución de inversiones de Formación Bruta de Capital.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

Actualmente la UNACIFOR tiene el 100% de sus recursos asignados al grupo 40000 (Bienes Capitalizables).



c. Comportamiento Histórico de la Ejecución al III TRIMESTRE (2023-2025):

En el periodo 2023-2025 mediante la UNACIFOR de acuerdo con lo indicado en el grafico anterior, se ha incrementado año a año los porcentajes de ejecución indicando que la UNACIFOR constantemente mejora sus capacidades para incrementar la ejecución presupuestaria respecto a las asignaciones anuales.

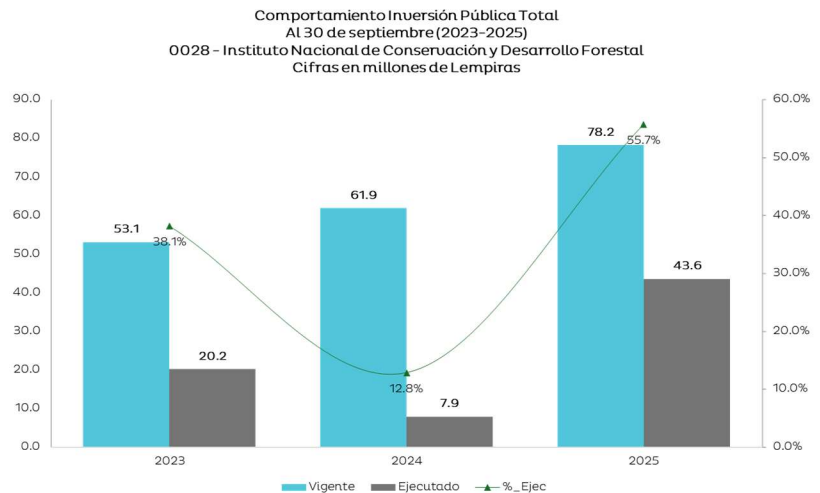

d. Principales Proyectos

1. Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Con el proyecto se está realizando la remodelación de tres (3) edificios en el campus central de la UNACIFOR (Cabaña 21, Edificio de Enseñanza e Investigación, Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), a los cuales se les realizarán cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados, Ampliación de laboratorio de cómputo, Construcción de pórtico de Acceso por la CA-5, y Una Clínica Estudiantil.

El detalle de ejecución Presupuestaria se muestra a continuación:

Proyecto		Convenio	Costo Total del Proyecto	Fecha de Inicio - Fin
Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales		FN-25715	35,251,996	20/06/2024 31/12/2025
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
III Trimestre 2025	-	35,251,996	60,000	0.2%
Acumulado 2025	-	35,251,996	32,668,187	92.7%
Acumulado Vida del Proyecto */	L35,251,996	35,251,996	32,668,187	92.7%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto



De acuerdo con lo indicado por la UNACIFOR en su informe Trimestral al cierre del tercer trimestre del 2025, el proyecto se encuentra en ejecución realizando actividades en 5 de los subproyectos teniendo un avance físico promedio del 20.47% los mismos son: Proyecto Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR (14.82% de avance); Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA) (15.55% de avance); Remodelación Cabaña No. 21 (27.00% de avance); Restauración Laboratorio de Computación (17.00% de avance) y Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación (28.00% de avance).

e. Gestión de la Inversión

- Acompañamiento constante a la institución durante la ejecución del proyecto.
- Monitoreo de los Avances Financieros y Físicos del proyecto.

Conclusiones

- A pesar de que la incorporación presupuestaria por el orden de L35,251,996.00 para el proyecto de inversión se autorizó a finales de abril, la UNACIFOR pudo realizar de manera ágil la adjudicación, contratación y emisión de ordenes de inicio de las obras. Sin embargo, es posible que la incorporación tardía de recursos impacte en los tiempos de ejecución de las obras por lo que las mismas puedan llegar a finalizar en el año 2026.

Recomendaciones

- Definir estrategias para ejecutar los proyectos en los plazos establecidos.
- Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para seguir fortaleciendo las capacidades y servicios que brinda la UNACIFOR.
- Mejorar los tiempos de incorporaciones presupuestarias por parte de SEFIN.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado III Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./Vig)
104	Inversión Productiva		-	-	-	35,251,996	-	35,251,996	60,000	-	60,000	0.2%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%
1	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		-	-	-	35,251,996	-	35,251,996	60,000	-	60,000	0.2%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%
1	Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-25715	-	-	-	35,251,996	-	35,251,996	60,000	-	60,000	0.2%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%
	Total Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus cen		-	-	-	35,251,996	-	35,251,996	60,000	-	60,000	0.2%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%	32,668,187	-	32,668,187	92.7%
	Formación Bruta de Capital		8,597,175	-	8,597,175	42,978,733	-	42,978,733	1,249,677	-	1,249,677	2.9%	10,910,396	-	10,910,396	25.4%	10,910,396	-	10,910,396	25.4%
	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		8,597,175	-	8,597,175	42,978,733	-	42,978,733	1,249,677	-	1,249,677	2.9%	10,910,396	-	10,910,396	25.4%	10,910,396	-	10,910,396	25.4%
	DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION		300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	51,923	-	51,923	17.3%	289,789	-	289,789	96.6%	289,789	-	289,789	96.6%
	Total DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION		300,000	-	300,000	300,000	-	300,000	51,923	-	51,923	17.3%	289,789	-	289,789	96.6%	289,789	-	289,789	96.6%
	DIRECCION Y COORDINACION		5,797,175	-	5,797,175	40,178,733	-	40,178,733	602,763	-	602,763	1.5%	8,938,057	-	8,938,057	22.2%	8,938,057	-	8,938,057	22.2%
	Total DIRECCION Y COORDINACION		5,797,175	-	5,797,175	40,178,733	-	40,178,733	602,763	-	602,763	1.5%	8,938,057	-	8,938,057	22.2%	8,938,057	-	8,938,057	22.2%
	GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL		400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	178,709	-	178,709	44.7%	292,532	-	292,532	73.1%	292,532	-	292,532	73.1%
	Total GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL		400,000	-	400,000	400,000	-	400,000	178,709	-	178,709	44.7%	292,532	-	292,532	73.1%	292,532	-	292,532	73.1%
	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	416,282	-	416,282	19.8%	1,390,018	-	1,390,018	66.2%	1,390,018	-	1,390,018	66.2%
	Total SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	2,100,000	416,282	-	416,282	19.8%	1,390,018	-	1,390,018	66.2%	1,390,018	-	1,390,018	66.2%
	Total general		8,597,175	-	8,597,175	78,230,729	-	78,230,729	1,309,677	-	1,309,677	1.7%	43,578,584	-	43,578,584	55.7%	43,578,584	-	43,578,584	55.7%

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Universidad de Ciencias Forestales	002 - Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	Proyecto Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	Porcentaje	100%	15%	15%	-	15%	-
		Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA)	Porcentaje	100%	16%	2%	-	15%	-
		Remodelación Cabaña No. 21	Porcentaje	100%	3%	3%	-	24%	-
		Restauración Laboratorio de Computación	Porcentaje	100%	2%	2%	-	15%	-
		Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación	Porcentaje	100%	3%	3%	-	25%	-
