

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

*Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Honduras, fundada en 1995 para regular y promover el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país. Como ente técnico estatal, administra el espectro radioeléctrico y establece políticas que fomentan la competencia justa, protegen los derechos

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	236,460,722
Inversión Productiva	36,215,722
Inversión Social	200,000,000
Formación Bruta de Capital	245,000
Presupuesto Vigente	236,460,722
Inversión Productiva	36,215,722
Inversión Social	200,000,000
Formación Bruta de Capital	245,000
Ejecutado III Trimestre	18,048,076
Inversión Productiva	18,048,076
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	-
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	7.6%
Ejecutado Anual	35,073,362
Inversión Productiva	34,951,505
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	121,858
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	14.8%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

de los usuarios y aseguran servicios de calidad. Su misión es impulsar la conectividad y reducir la brecha digital, garantizando el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y colaborando en la transformación digital de Honduras.

Al tercer trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente para la ejecución de programas y proyectos de L236.5 millones. La ejecución del trimestre ascendió a L18.0 millones lo que representa a 7.6%, y la ejecución acumulada al 14.8% con relación al vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) financia la ejecución de sus programas y proyectos principalmente con recursos de origen interno, siendo el Tesoro Nacional la principal fuente de financiamiento. Todas las actividades y proyectos se desarrollan exclusivamente con fondos provenientes de fuentes nacionales.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2021-2025)

Al tercer trimestre de cada año en el período 2021-2025, la ejecución presupuestaria de los recursos asignados ha mostrado variaciones significativas. En 2021, la ejecución alcanzó un 46.2% del presupuesto vigente, mientras que en 2022 se registró una disminución, alcanzando solo el 20.0%. En 2023, el presupuesto aumentó considerablemente con la implementación del proyecto de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a nivel nacional, alcanzando una ejecución del 12.8%. Para 2024, se observa una mayor ejecución, con un 23.0%. Finalmente, en el tercer trimestre de 2025, la ejecución se sitúa en 14.8% del presupuesto vigente.

Gráfico No. 01
 Comportamiento Inversión Pública Total
 Al 30 de septiembre (2021-2025)
 0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones
 Cifras en millones de Lempiras

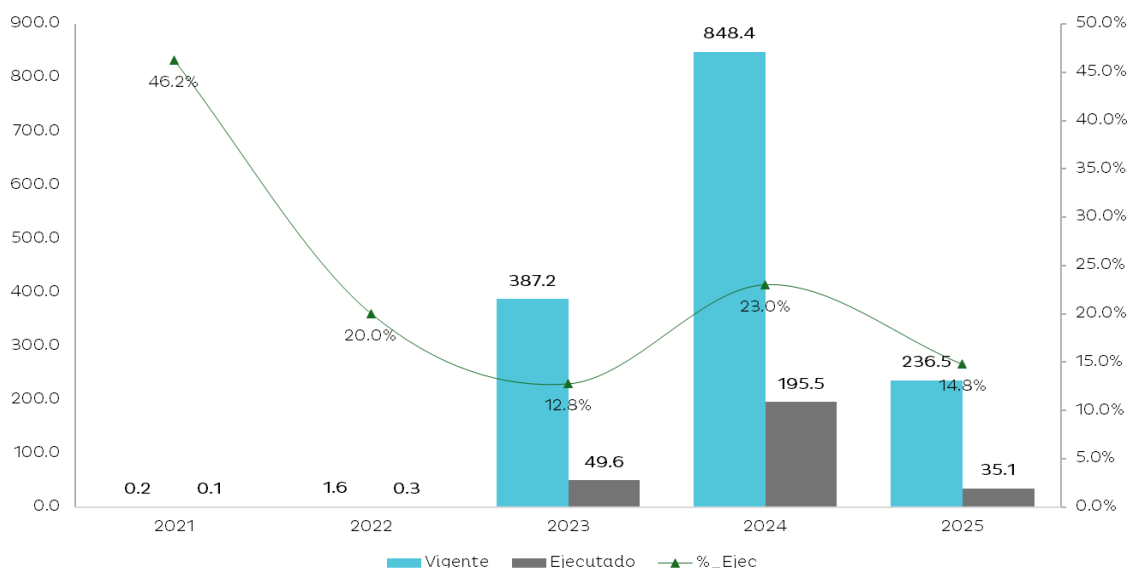

d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el tercer trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Programa de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

El objetivo general del Programa Ampliar la capacidad de CONATEL para regular los servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la calidad de los servicios, protegiendo los derechos de los usuarios y promoviendo la conectividad de la población.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2025 son los siguientes:

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al III trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre de 2025		
		Program.	Ejecución	% Ejec.	Program.	Ejecución	% Ejec.
Construcción de Nuevas plantas del Edificio de CONATEL	PISO	1	0.95	95%	1	0.95	95%
Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad	SISTEMA	4	3.7	93%	3	2.7	%
Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios	SISTEMA	1	1	100%	1	1	100%
Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	EQUIPO	210	210	100%	210	210	100%

Fuente: CONATEL, al 30 de septiembre de 2025

Al tercer trimestre se avanzó con los siguientes procesos:

Componente I: Fortalecimiento Técnico

- Se finalizó la remodelación de la oficina de la estación remota atendida en la ciudad de Tocoa, ubicada en las instalaciones de COPECO, proceso adjudicado a la empresa ELCOS.
- Se alcanzó un 93% de avance en la instalación de estaciones desatendidas para el control y monitoreo del espectro radioeléctrico, proceso adjudicado mediante Licitación Pública Internacional LPI-001-2023-CONATEL.
- Se realizó la segunda revisión del Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, con el acompañamiento de expertos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

Componente III: Ampliación y Modernización de Infraestructura

- El avance en la construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal de CONATEL alcanzó el 95%, proceso desarrollado mediante Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024.
- La instalación del sistema de climatización en el edificio principal de CONATEL presentó avances significativos en los niveles 1, 2, 3 y 4, desarrollándose a través de la Licitación Pública Nacional LPN-CNT-02-2024.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa a Nivel Nacional al tercer trimestre de 2025:



Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.	25261-1	US\$9,472,313.8	L248,257,977.00	01/08/2023-31/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III Trimestre 2025	36,215,722	36,215,722	18,048,076	49.8%
Acumulado 2025	36,215,722	36,215,722	34,951,505	96.5%
Acumulado Vida del Proyecto *	248,257,977	248,257,977	214,427,736	86.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2025 (BCH): L26.2088 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones III Trimestre 2025

Durante el tercer trimestre de 2025, no se adjudicaron nuevas contrataciones dentro del Proyecto, sin embargo, se dio continuidad a las adquisiciones previamente adjudicadas, enfocadas en la culminación de los procesos en ejecución. Entre ellas destacan la remodelación de la oficina de la estación remota atendida en Tocoa, ejecutada por ELCOS; la fase final de la construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal, a cargo de CONCO, con un avance del 95%; y la instalación del sistema de climatización en los niveles 1, 2, 3 y 4 del edificio principal, desarrollada por ELCON, con un avance cercano al 90%.

d.2. Programas Sociales

El presupuesto asignado a los programas sociales de la institución para el año 2025 asciende a L200 millones, los cuales se destinan a transferencias que deberán realizarse a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL). Estos recursos han sido solicitados por HONDUTEL a CONATEL para la ejecución de Programas Sociales, con el objetivo de respaldar iniciativas de proyectos indispensables para la recuperación de dicha entidad estatal. En consecuencia, los alcances

físicos derivados de estas inversiones serán reportados directamente por HONDUTEL.

a. Gestión de la Inversión

Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Mediante Oficio CONATEL-CP-321-2025 de fecha 30 de julio de 2025, CONATEL solicitó a la Secretaría de Finanzas una modificación presupuestaria por L32,530,252, con el fin de crear espacio presupuestario con fuente 14-Donaciones Internas, Organismo Financiador 224-BCH, para financiar el proyecto “Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL”. Dicha solicitud se encuentra en proceso de análisis y aprobación conforme a los artículos 35, 237, 240 y 242 del Decreto Legislativo No. 4-2025.

b. Problemática y Acciones Durante el III Trimestre-2025

Durante el tercer trimestre de 2025, el proyecto presenta retrasos en la ejecución física y financiera, principalmente por la falta de incorporación de los fondos solicitados a la Secretaría de Finanzas (L32,530,252.00), indispensables para la continuidad de las actividades programadas en los componentes técnicos y de infraestructura.

Dado que la fecha de finalización del proyecto está prevista para diciembre de 2025, resulta prioritario gestionar e incorporar los recursos pendientes, a fin de evitar la paralización de actividades, garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales vigentes y prevenir implicaciones legales por incumplimiento de obligaciones financieras o técnicas.

V. CONCLUSIONES

- Al cierre del tercer trimestre de 2025, la ejecución financiera alcanzó L18.0 millones, equivalente al 7.6% del presupuesto vigente, mientras que la ejecución acumulada llegó al 14.8%, reflejando un ritmo menor al esperado debido a retrasos en los

procesos administrativos y financieros, particularmente por la no incorporación de los fondos solicitados a SEFIN por L32,530,252.00.

- La construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal presenta un avance del 95%, mientras que la instalación del sistema de climatización y las estaciones desatendidas para monitoreo del espectro radioeléctrico registran progresos del 90% y 93% respectivamente; sin embargo, la importación de equipos y las revisiones técnicas han generado demoras adicionales en los plazos de entrega e instalación.
- De no incorporarse los fondos pendientes antes del cierre del ejercicio fiscal, podrían afectarse los compromisos contractuales y financieros del proyecto, poniendo en riesgo su culminación oportuna y el cumplimiento de los objetivos estratégicos orientados a fortalecer la conectividad nacional y reducir la brecha digital.

VI. RECOMENDACIONES

- CONATEL debe implementar un plan de acción inmediato que priorice las actividades críticas y agilice la ejecución física y financiera, reforzando la coordinación con las unidades técnicas y las instancias responsables de permisos y aprobaciones.
- Se recomienda que la Secretaría de Finanzas (SEFIN) otorgue prioridad a la aprobación e incorporación de los recursos solicitados (L32,530,252.00), garantizando la disponibilidad oportuna de fondos para concluir las obras y cumplir los compromisos contractuales establecidos.
- Fortalecer el seguimiento técnico, financiero y administrativo de los procesos en ejecución, asegurando la recepción final de obras y equipos dentro de los plazos previstos, con el fin de lograr un cierre exitoso y transparente del proyecto durante el ejercicio 2025.

Anexo No. 1
SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
104	Inversión Productiva		36,215,722	36,215,722	36,215,722	36,215,722	18,048,076	18,048,076	49.8%	34,951,505	34,951,505	96.5%
1	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		36,215,722	36,215,722	36,215,722	36,215,722	18,048,076	18,048,076	49.8%	34,951,505	34,951,505	96.5%
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL.	BCH-25261-1	36,215,722	36,215,722	36,215,722	36,215,722	18,048,076	18,048,076	49.8%	34,951,505	34,951,505	96.5%
	Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN I		36,215,722	36,215,722	36,215,722	36,215,722	18,048,076	18,048,076	49.8%	34,951,505	34,951,505	96.5%
	Inversión Social		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECO		200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Formación Bruta de Capital		245,000	245,000	245,000	245,000	-	-	0.0%	121,858	121,858	49.7%
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		245,000	245,000	245,000	245,000	-	-	0.0%	121,858	121,858	49.7%
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		245,000	245,000	245,000	245,000	-	-	0.0%	121,858	121,858	49.7%
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECO		245,000	245,000	245,000	245,000	-	-	0.0%	121,858	121,858	49.7%
	Total general		236,460,722	236,460,722	236,460,722	236,460,722	18,048,076	18,048,076	7.6%	35,073,362	35,073,362	14.8%

Nota: SIAFI, 30/09/2025

Anexo No. 2
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	Fortalecimiento de las capacidades técnicas de CONATEL para el control, monitoreo y supervisión en tiempo real del espectro radioeléctrico y la ejecución del Plan de Conectividad de Banda Ancha.	Sistemas	27	13	48.1%	13	13	100.0%
		Mejora de la calidad de los servicios de telecomunicaciones que los operadores ofrecen a nivel nacional, con una mejor regulación del mercado, orientado todo a la protección del usuario de los servicios.	Servicios	0	0	0.0%	0	0	0.0%
		Implementación del Plan de Fortalecimiento Institucional de CONATEL.	Informe	4	0	0.0%	1	0	0.0%

Nota: Unidad Ejecutora, 30/09/2025
