



# **Informe de Avance Físico y Financiero al IV Trimestre 2025**

## **PLAN DE INVERSION PÚBLICA**

***Universidad de Ciencias Forestales  
(UNACIFOR)***

**Tegucigalpa, Honduras**

**Enero, 2026**

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)





### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

#### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Universidad de Ciencias de Forestales (UNACIFOR) es el ente estatal especializado en la enseñanza del área forestal y la conservación de los recursos naturales orientados a mejorar las condiciones académicas y productivas en las diferentes áreas.

En el Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático, en el Apartado 4.3 Educación, se manifiesta la prioridad de fortalecer la Educación Superior inclusiva con visión científica y humanista, comprometida con la transformación de la realidad nacional, garantizando competencia para integrarse a la vida laboral.

Al Cuarto Trimestre 2025, se contó con un presupuesto vigente de L78.2 millones de los cuales, L35.2 millones corresponden a inversión productiva para la ejecución de un proyecto y L42.9 para la ejecución de inversiones de Formación Bruta de Capital.

#### b. Financiamiento de la Inversión Pública

Actualmente la UNACIFOR tiene el 100% de sus recursos asignados al grupo 40000 (Bienes Capitalizables) financiados con recursos del tesoro nacional

#### c. Comportamiento Histórico de la Ejecución al IV TRIMESTRE (2023-2025):

En el periodo 2023-2025 la UNACIFOR de acuerdo con lo indicado en el grafico de Comportamiento Inversión Pública, presenta un comportamiento fluctuante entre 2023 y 2025. En 2023 se observa un desempeño aceptable con un 67.9% de ejecución, reflejando una buena capacidad para transformar el presupuesto vigente en resultados. Sin embargo, en 2024 ocurre una fuerte caída hasta el 38%, pese a que el monto vigente aumenta ligeramente, lo que sugiere dificultades operativas, retrasos administrativos y limitaciones en la implementación de proyectos debido a la tardía incorporación de fondos ya que los mismos no fueron formulados por la

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>8,597,175.0</b>
Inversión Productiva	-
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	8,597,175.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>78,230,729.0</b>
Inversión Productiva	35,251,996.0
Inversión Social	0.0
Formación Bruta de Capital	42,978,733.0
<b>Ejecutado IV Trimestre</b>	<b>3,887,528.1</b>
Inversión Productiva	684,826.9
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	3,202,701.1
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim-2024/Vigente)</b>	<b>5.0%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>47,466,111.7</b>
Inversión Productiva	33,353,014.3
Inversión Social	-
Formación Bruta de Capital	14,113,097.4
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>60.7%</b>

Nota: SIAFI, 31/12/2025



institución. Para 2025, la institución muestra una recuperación importante, elevando la ejecución al 60.7% y gestionando un presupuesto mayor, aunque sin alcanzar aún los niveles de eficiencia logrados en 2023.

d.

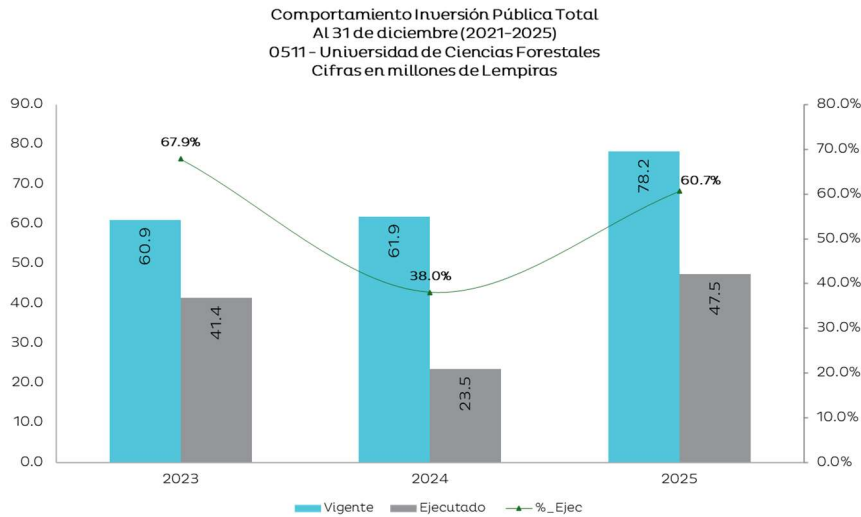

## Principales Proyectos

### 1. Construcción, Ampliación y Remodelación de Obras de Infraestructura en el Campus Central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales

Con el proyecto se está realizando la remodelación de tres (5) edificios en el campus central de la UNACIFOR (Cabaña 21, Edificio de Enseñanza e Investigación, Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), Clínica Estudiantil y el Laboratorio de Computación a los cuales se les realizarán cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados, Ampliación de laboratorio de cómputo, Construcción de pórtico de Acceso por la CA-5, y Una Clínica Estudiantil.

El detalle de ejecución Presupuestaria se muestra a continuación:



Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto	Fecha de Inicio - Fin	
Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-25715	35,251,996	20/06/2024 13/3/2026	
	<b>Financiera</b>			
	<b>Aprobado</b>	<b>Vigente</b>	<b>Deuengado</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2025	-	35,251,996	684,827	1.9%
Acumulado 2025	-	35,251,996	33,353,014	94.6%
Acumulado Vida del Proyecto */	L35,251,996	35,251,996	33,353,014	94.6%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

La UNACIFOR en el informe correspondiente al IV Trimestre 2025, ha indicado que se cuenta con la ejecución de obras en 5 de los subproyectos teniendo un avance físico promedio del 30.71% dichas actividades se detallan a continuación:

- Proyecto Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR (31.68% de avance)
- Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA) (26.73% de avance)
- Remodelación Cabaña No. 21 (45.41% de avance)
- Restauración Laboratorio de Computación (47.13% de avance) y Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación (28.00% de avance).

#### **e. Gestión de la Inversión**

- Acompañamiento constante a la institución durante la ejecución del proyecto.
- Monitoreo de los Avances Financieros y Físicos del proyecto.

#### **Conclusiones**

- A pesar de que la incorporación presupuestaria por el orden de L35,251,996.00 para el proyecto de inversión se autorizó a finales del mes de abril, la UNACIFOR pudo realizar de manera ágil la adjudicación, contratación y emisión de ordenes de inicio de las obras. Sin embargo, es posible que la incorporación tardía de recursos halla impactado en los tiempos de ejecución de las obras, No obstante, las mismas finalizaran en el año 2026.



## **Recomendaciones**

- Definir estrategias para ejecutar los proyectos en los plazos establecidos.
- Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para seguir fortaleciendo las capacidades y servicios que brinda la UNACIFOR.
- Mejorar los tiempos de incorporaciones presupuestarias por parte de SEFIN.

# **ANEXOS**

## Anexo 1

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
	I. Inversión Productiva		-	-	-	35,251,996.0	-	35,251,996.0	684,826.9	-	684,826.9	1.9	33,353,014.3	-	33,353,014.3	94.6
	<b>0511 - Universidad de Ciencias Forestales</b>		-	-	-	<b>35,251,996.0</b>	-	<b>35,251,996.0</b>	<b>684,826.9</b>	-	<b>684,826.9</b>	<b>1.9</b>	<b>33,353,014.3</b>	-	<b>33,353,014.3</b>	<b>94.6</b>
	Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-25715	-	-	-	35,251,996.0	-	35,251,996.0	684,826.9	-	684,826.9	1.9	33,353,014.3	-	33,353,014.3	94.6
	<b>Total Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura</b>		-	-	-	<b>35,251,996.0</b>	-	<b>35,251,996.0</b>	<b>684,826.9</b>	-	<b>684,826.9</b>	<b>1.9</b>	<b>33,353,014.3</b>	-	<b>33,353,014.3</b>	<b>94.6</b>
	II. Formación Bruta de Capital		8,597,175.0	-	8,597,175.0	42,978,733.0	-	42,978,733.0	3,202,701.1	-	3,202,701.1	7.5	14,113,097.4	-	14,113,097.4	32.8
	<b>0511 - Universidad de Ciencias Forestales</b>		<b>8,597,175.0</b>	-	<b>8,597,175.0</b>	<b>42,978,733.0</b>	-	<b>42,978,733.0</b>	<b>3,202,701.1</b>	-	<b>3,202,701.1</b>	<b>7.5</b>	<b>14,113,097.4</b>	-	<b>14,113,097.4</b>	<b>32.8</b>
	DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION		250,000.0	-	250,000.0	300,000.0	-	300,000.0	25,135.6	-	25,135.6	8.4	264,653.6	-	264,653.6	88.2
	<b>Total DIRECCION SUPERIOR Y COORDINACION</b>		<b>250,000.0</b>	-	<b>250,000.0</b>	<b>300,000.0</b>	-	<b>300,000.0</b>	<b>25,135.6</b>	-	<b>25,135.6</b>	<b>8.4</b>	<b>264,653.6</b>	-	<b>264,653.6</b>	<b>88.2</b>
	DIRECCION Y COORDINACION		6,500,000.0	-	6,500,000.0	40,178,733.0	-	40,178,733.0	2,729,306.6	-	2,729,306.6	6.8	11,667,364.0	-	11,667,364.0	29.0
	<b>Total DIRECCION Y COORDINACION</b>		<b>6,500,000.0</b>	-	<b>6,500,000.0</b>	<b>40,178,733.0</b>	-	<b>40,178,733.0</b>	<b>2,729,306.6</b>	-	<b>2,729,306.6</b>	<b>6.8</b>	<b>11,667,364.0</b>	-	<b>11,667,364.0</b>	<b>29.0</b>
	GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL		397,175.0	-	397,175.0	400,000.0	-	400,000.0	91,662.0	-	91,662.0	22.9	384,193.9	-	384,193.9	96.0
	<b>Total GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL</b>		<b>397,175.0</b>	-	<b>397,175.0</b>	<b>400,000.0</b>	-	<b>400,000.0</b>	<b>91,662.0</b>	-	<b>91,662.0</b>	<b>22.9</b>	<b>384,193.9</b>	-	<b>384,193.9</b>	<b>96.0</b>
	SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		1,450,000.0	-	1,450,000.0	2,100,000.0	-	2,100,000.0	406,868.1	-	406,868.1	19.4	1,796,885.9	-	1,796,885.9	85.6
	<b>Total SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>1,450,000.0</b>	-	<b>1,450,000.0</b>	<b>2,100,000.0</b>	-	<b>2,100,000.0</b>	<b>406,868.1</b>	-	<b>406,868.1</b>	<b>19.4</b>	<b>1,796,885.9</b>	-	<b>1,796,885.9</b>	<b>85.6</b>
	<b>Total general</b>		<b>8,597,175.0</b>	-	<b>8,597,175.0</b>	<b>78,230,729.0</b>	-	<b>78,230,729.0</b>	<b>3,887,528.1</b>	-	<b>3,887,528.1</b>	<b>5.0</b>	<b>47,466,111.7</b>	-	<b>47,466,111.7</b>	<b>60.7</b>

Fuente: SIAFI, 31/12/2025 (Preliminar)



## Anexo 2

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Universidad de Ciencias Forestales	002 - Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	Proyecto Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	Porcentaje	100%	32%	32%	-	17%	-
		Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA)	Porcentaje	100%	27%	27%	-	11%	-
		Remodelación Cabaña No. 21	Porcentaje	100%	45%	45%	-	18%	-
		Restauración Laboratorio de Computación	Porcentaje	100%	47%	47%	-	16%	-
		Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación	Porcentaje	100%	28%	28%	-	19%	-

Fuente UNACIFOR
