



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
Universidad de
Ciencias
Forestales
(UNACIFOR)

Informe No. 0511-001-2026
Tegucigalpa, Abril 2026



Contenido

Contenido	2
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) 4	
C. PRINCIPALES PROYECTOS	4
C.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	5
C.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	6
C.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026	6
D. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	7
E. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026.....	7
F. CONCLUSIONES	7
G. RECOMENDACIONES	7
ANEXO 1	8
ANEXO 2.....	9



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Universidad de Ciencias Forestales (UNACIFOR) es el ente estatal especializado en la enseñanza del área forestal y la conservación de los recursos naturales orientados a mejorar las condiciones académicas y productivas en las diferentes áreas.

Al primer trimestre del 2026, la institución contó con un presupuesto vigente de inversión de L32,979,703.0, de los cuales L12,200,000.0 corresponden a Inversión productiva; L20,779,703.0 a la Formación Bruta de Capital para el desarrollo de actividades en función a Formación Académica Universitaria e Investigación Científica.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	32,979,703.0
Inversión Productiva	12,200,000.0
Formación Bruta de Capital	20,779,703.0
Presupuesto Vigente	32,979,703.0
Inversión Productiva	12,200,000.0
Formación Bruta de Capital	20,779,703.0
Ejecutado Anual	893,006.1
Inversión Productiva	0.0
Formación Bruta de Capital	893,006.1
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	2.7%
Compromiso Aprobado	893,006.1
Inversión Productiva	0.0
Formación Bruta de Capital	893,006.1
% Compromiso (Compromiso I Cuatrim-2026/Vigente)	2.7%


Nota: SIAFI, 31/03/2026

Actualmente el presupuesto de la UNACIFOR es financiado en su totalidad con fondos del Tesoro Nacional; de los cuales al primer trimestre se ejecutaron L893,006.1 que representan el 2.7% de cumplimiento con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No.1.



B. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 31 de marzo (2022-2026)
0511 – Universidad de Ciencias Forestales
Cifras en millones de Lempiras

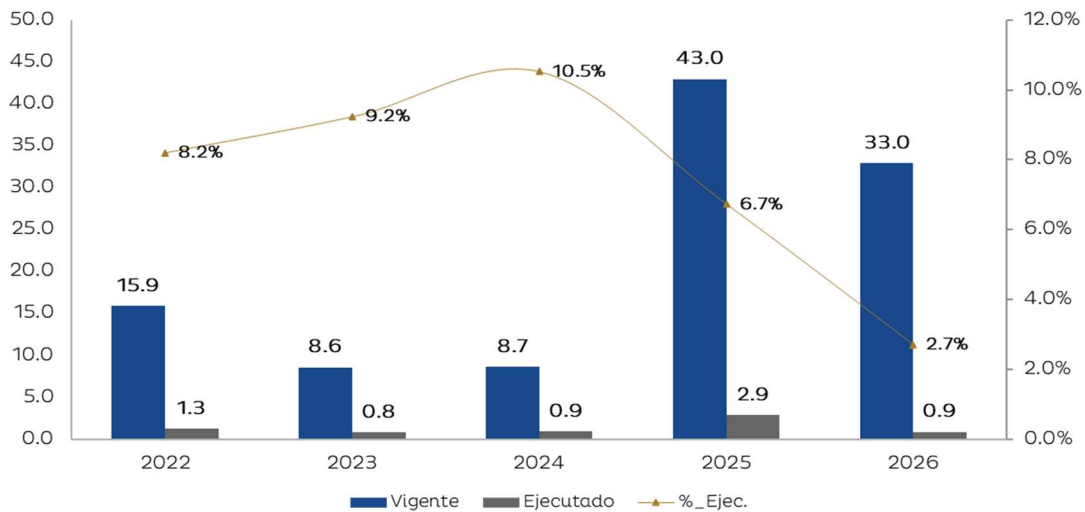

Fuente: SIAFI al 30/04/2026

Durante el período 2022–2024, el comportamiento de las inversiones al I Trimestre predomina la inversión en Formación Bruta de Capital, cuyos niveles de ejecución se han mantenido relativamente estables, promediando aproximadamente 9.3%. Esta tendencia se observa de manera consistente en el gráfico histórico, así como para los períodos 2025–2026.

La inversión productiva se incorporó a partir del 2023, sin registrar niveles significativos de ejecución durante el I Trimestre, ya que su implementación inicia a partir del II Trimestre. Es en este punto donde se evidencia un incremento progresivo en la ejecución, particularmente asociado a las intervenciones desarrolladas en el Campus de Siguatepeque y Lancetilla de la UNACIFOR.

En consecuencia, el comportamiento observado sugiere que el nivel de ejecución acumulado al I Trimestre es moderado, mientras que el crecimiento sustantivo en la ejecución presupuestaria se materializa a partir del II Trimestre, impulsado principalmente por la entrada en operación de proyectos de inversión productiva.

C. PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de proyectos



C.1. Construcción, Ampliación Y Remodelación De Obras De Infraestructura En El Campus Central De La Universidad Nacional De Ciencias Forestales

Tiene como objetivo la Remodelación de tres (3) edificios en el campus central de la UNACIFOR (Cabaña 21, Edificio de Enseñanza e Investigación, Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA), a los cuales se les realizarán cambios de estructura de techo, sistema eléctrico, sistema hidrosanitario y acabados, Ampliación de laboratorio de cómputo, Construcción de pórtico de Acceso por la CA-5, y Una Clínica Estudiantil.

En el marco del seguimiento al proyecto, al primer trimestre del año 2026 se observa un desempeño que, si bien evidencia avances sostenidos, también refleja retos estructurales propios de la ejecución de inversiones en infraestructura pública.

C.1.1. Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

Desde la perspectiva de los avances físicos, y de acuerdo con lo indicado por la UNACIFOR en su informe al Primer Trimestre del 2026, el proyecto alcanzó un 54.74% de ejecución acumulada, lo cual denota un progreso significativo considerando la complejidad de las intervenciones. Este avance ha sido impulsado principalmente por la culminación de obras específicas como la Remodelación de la Cabaña No. 21 y el Edificio de Enseñanza e Investigación, ambos con un 100% de ejecución, así como por el progreso intermedio en componentes clave como la clínica estudiantil (42.50%), el edificio DIFA (35.0%) y el laboratorio de computación (51.0%). No obstante, persisten rezagos relevantes, particularmente la obra de construcción del pórtico de acceso la cual aún no ha sido contratada.

En cuanto a los logros por componente, el proyecto ha avanzado de manera consistente en el fortalecimiento de la infraestructura académica, administrativa y de servicios estudiantiles, cumpliendo progresivamente con el objetivo de mejorar las condiciones de atención en el campus. Desde una óptica de indicadores, el proyecto ha transitado desde una línea base nula en 2024 hacia un nivel superior al 50% de ejecución física, con al menos dos intervenciones completamente finalizadas y varias más en proceso, lo que evidencia una trayectoria positiva en la generación de productos concretos.

En términos integrales, el proyecto refleja un desempeño moderadamente favorable, caracterizado por avances físicos tangibles y logros concretos en infraestructura, pero condicionado por debilidades en la gestión operativa, especialmente en contratación y arranque de nuevas intervenciones. En consecuencia, el cumplimiento de las metas al cierre del proyecto en octubre 2026 dependerá de la capacidad institucional para acelerar los procesos pendientes, activar las obras rezagados y alinear de manera más efectiva la programación con la ejecución real.



SECRETARÍA DE FINANZAS



Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejec	Programación	Ejecución	% Ejec
002 - Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	Proyecto Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	Porcentaje	0%	11%	-	0%	11%	-
	Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA)	Porcentaje	0%	8%	-	0%	8%	-
	Remodelación Cabaña No. 21	Porcentaje	0%	55%	-	0%	55%	-
	Restauración Laboratorio de Computación	Porcentaje	0%	4%	-	0%	4%	-
	Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación	Porcentaje	0%	72%	-	0%	72%	-
	Construcción de Pórtico de Acceso por la CA-5 de la UNACIFOR	Porcentaje	0%	0%	-	0%	0%	-

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto/Informe al I Trimestre 2026

C.1.2. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-25715	Lempiras	35,251,996.0	20/6/2024 31/10/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2026	119,639,594	12,200,000	-	0.0%
Acumulado 2026	119,639,594	12,200,000	-	0.0%
Acumulado Vida del Proyecto */	35,251,996.0	35,251,996	33,353,014	94.6%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

C.1.3. Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

- Se suscribió un contrato para la supervisión de las obras del proyecto.



D. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento oportuno durante la ejecución del proyecto
- Elaboración de Dictamen de Ampliación de tiempo para que las obras en curso puedan ser ejecutadas al 100% y dar cumplimiento a los objetivos del proyecto a octubre 2026.

E. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

De manera general y de acuerdo con lo indicado en el informe presentado por la UNACIFOR, se ha detectado que aún no se realiza la contratación de la obra correspondiente a la construcción del pórtico de acceso por lo que deben de definir si esta obra se realizará.

F. CONCLUSIONES

- A pesar de que aún falta por contratar una obra se observa que la ejecución es favorable debido a que, de las 6 obras a realizarse, dos de ellas cuentan con el 100% y las tres restantes cuentan con una ejecución física que oscila del 35% al 51% por lo que se visualiza que las obras contratadas podrán ser ejecutadas dentro del plazo de ejecución del proyecto.

G. RECOMENDACIONES

- Debido a que en el presente año la UNACIFOR amplió el proyecto para finalizar en octubre 2026 y en vista de que aún no se ha realizado la contratación de la obra la UNACIFOR debe definir si aún está dentro de sus prioridades realizar esta obra.
- Buscar alianzas estratégicas o financiamiento con instituciones para seguir fortaleciendo las capacidades y servicios que brinda la UNACIFOR.
- UNACIFOR en sus informes debe programar la ejecución física para conocer sus niveles de ejecución reales respecto a lo programado.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total general	% Compromiso (Comp./Vig.)
1	1. Inversión Productiva		12,200,000	-	12,200,000	12,200,000	-	12,200,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1	Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	FN-25715	12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	Total Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales		12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
4	2. Formación Bruta de Capital Fijo		20,779,703	-	20,779,703	20,779,703	-	20,779,703	893,006	-	893,006	4.3%	893,006	-	893,006	4.3%
4	0511 - Universidad de Ciencias Forestales		20,779,703		20,779,703	20,779,703		20,779,703	893,006		893,006	4.3%	893,006		893,006	4.3%
1	ACTIVIDADES CENTRALES		2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,800,000	364,347		364,347	13.0%	364,347		364,347	13.0%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		2,800,000		2,800,000	2,800,000		2,800,000	364,347		364,347	13.0%	364,347		364,347	13.0%
2	FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA		14,679,703		14,679,703	14,679,703		14,679,703	252,555		252,555	1.7%	252,555		252,555	1.7%
	Total FORMACIÓN ACADÉMICA UNIVERSITARIA		14,679,703		14,679,703	14,679,703		14,679,703	252,555		252,555	1.7%	252,555		252,555	1.7%
3	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		850,000		850,000	850,000		850,000	43,350		43,350	5.1%	43,350		43,350	5.1%
	Total INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		850,000		850,000	850,000		850,000	43,350		43,350	5.1%	43,350		43,350	5.1%
4	VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		2,450,000		2,450,000	2,450,000		2,450,000	232,754		232,754	9.5%	232,754		232,754	9.5%
	Total VINCULACIÓN UNIVERSIDAD SOCIEDAD		2,450,000		2,450,000	2,450,000		2,450,000	232,754		232,754	9.5%	232,754		232,754	9.5%
	Total general		32,979,703	-	32,979,703	32,979,703	-	32,979,703	893,006	-	893,006	2.7%	893,006	-	893,006	2.7%

Nota: SIAFI, 30/04/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0511 - Universidad de Ciencias Forestales								
002 - Construcción, ampliación y remodelación de obras de infraestructura en el campus central de la Universidad Nacional de Ciencias Forestales	Proyecto Ampliación y Remodelación Clínica Estudiantil de la UNACIFOR	Porcentaje	0%	11%	-	0%	11%	-
	Ampliación y Remodelación Edificio Ingeniero Forestal Oscar Washington Ferreira Rojas de la UNACIFOR (DIFA)	Porcentaje	0%	8%	-	0%	8%	-
	Remodelación Cabaña No. 21	Porcentaje	0%	55%	-	0%	55%	-
	Restauración Laboratorio de Computación	Porcentaje	0%	4%	-	0%	4%	-
	Remodelación Edificio Enseñanza e Investigación	Porcentaje	0%	72%	-	0%	72%	-
	Construcción de Pórtico de Acceso por la CA-5 de la UNACIFOR	Porcentaje	0%	0%	-	0%	0%	-

Nota: Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 31 de marzo de 2026
