



Código BIP

25528

Programa De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras

1. Identificación del Proyecto				
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras			
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud			
Sector:	Promoción Y Protección Humana			
Organismo Financiador	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica			
Convenio	BCE-2329			
Monto Total de Financiamiento USD:	81,261,800.00			
Monto Financiamiento L:	2,169,356,886.62			
Plazo de Ejecución:	48 meses	Fecha de Inicio	30/7/2024	Fecha de Fin
Estado del Proyecto:	Ejecución			
Tipo de inversión	1 - Inversión Real			
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6959			



Foto: Ministerio de Salud
© Geoportales, Microsoft, Bing

2. Objetivo Estratégico	
Incrementar la cobertura en Atención de los Servicios de Salud a nivel Hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca, departamento de Choluteca y Tocoa, departamento de Colón, al Sur y Nor-orienté del país, respectivamente, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).	

3. Cobertura	
Departamentos	Colón, Choluteca
Municipios	Tocoa, Choluteca

Beneficiarios:	268,851
Generación de empleo (Estimado)	1,474 directos 4,422 indirectos


Beneficiarios del Proyecto



3.Componentes del Proyecto					Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)										
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)														
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total											
Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento															
2624 - Diseño, Construcción y Equipamiento de Nuevo Hospital General de Choluteca	2,099,447,532.4	-	-	2,099,447,532.4	EN MILLONES DE LEMPIRAS <table><tr><th>Fuente de Financiamiento</th><th>Costo (Millones de Lempiras)</th></tr><tr><td>Donaciones Externas</td><td>2,099,447,532.4</td></tr><tr><td>Fondos Nacionales</td><td>20,031,802.5</td></tr><tr><td>Crédito Externo</td><td>49,877,551.7</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>2,169,356,886.6</td></tr></table> FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Fuente de Financiamiento	Costo (Millones de Lempiras)	Donaciones Externas	2,099,447,532.4	Fondos Nacionales	20,031,802.5	Crédito Externo	49,877,551.7	TOTAL	2,169,356,886.6
Fuente de Financiamiento	Costo (Millones de Lempiras)														
Donaciones Externas	2,099,447,532.4														
Fondos Nacionales	20,031,802.5														
Crédito Externo	49,877,551.7														
TOTAL	2,169,356,886.6														
2626 - Fortalecimiento Institucional	12,023,032.5	8,008,770.0	-	20,031,802.5											
2627 - Gastos de Administración y Auditoría del Programa	49,877,551.7	-	-	49,877,551.7											
				-											
TOTAL	2,161,348,116.6	8,008,770.0	-	2,169,356,886.6											

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	172 - Banco Centroamericano De Integración Económica
Monto Contratado:	81.3
Desembolsado Acumulado	54.8
Disponible:	26.5
% Desembolso:	67%

6. Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	595,435,840.0	7,851,000.0	-	603,286,840.0
Presupuesto Vigente:	436,050,429.0	7,851,000.0	-	443,901,429.0
Ejecutado al 31/03/2026	511,649.8	-	-	511,649.8
% Ejecución al 31/03/2026	0.1%	0%	-	0.1%



7. Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico			Total	Ejecución Histórica			Total	% de Ejecución
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales		Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales		
2024	522,921,135.0	-	-	522,921,135.0	363,205,139.0	-	-	363,205,139.0	69%
2025	1,196,400,341.0	-	-	1,196,400,341.0	748,719,556.1	-	-	748,719,556.1	63%
2026	436,050,429.0	7,851,000.0	-	443,901,429.0	511,649.8	-	-	511,649.8	0%
TOTAL	2,155,371,905.0	7,851,000.0	-	2,163,222,905.0	1,112,436,344.9	-	-	1,112,436,344.9	51%



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución Global 2026
7	1	0	3	1	38%	0%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Diseño, Construcción Y Equipamiento Del Nuevo Hospital En Las Ciudades De Choluteca Y Tocoa Como Apoyo A La Red Hospitalaria De La República De Honduras																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026					Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente Infraestructura y equipamiento hospitalaria																		
Implementar Apoyo de Agencia al PAEH	Gestión Inicial del Programa	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Manejar vigente la contratación de la Supervisión de las obras del Hospital General, en el Departamento de Choluteca y del Hospital Básico, en el Departamento de Cádiz	Supervisión	26	11	42%	4	3	3	3	13	0	0	0	0	0	0%	-13	● CON RETRASO	2
Desarrollar Auditoría Externa del Programa	Auditoría	15	2	13%	4	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0%	-7	● CON RETRASO	6
Componente Imprevistos y Escalamiento																		
Ejecutar el apoyo del Membro DAAB	DAAB	44	18	41%	6	6	5	0	17	0	0	0	0	0	0%	-17	● COMPLETADO	9
Componente Comisión																		
Pagar Comisión de Administración del BCE	BCE	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	○ SIN INICIAR	0
TOTAL / PROMEDIO		87.00	33.00	49%	14.00	10.00	9.00	4.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(37.00)		

Situación Actual

Al primer trimestre del 2026, la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance acumulado:

Hospital Regional del Sur en Choluteca:

Etapla (1) Reinversión: avance físico 96.16%, avance financiero 47.0% (US\$1,128,614.07); fecha de fin prevista 29 junio de 2025.

Etapa (2) Construcción: avance físico 45.61%, avance financiero 43.36% (US\$14,446,195.64); fecha de fin prevista 12 agosto de 2026.

Etapa (3) Equipamiento: avance físico 13.96%, avance financiero 9.45% (US\$2,162,245.49); fecha de fin prevista 12 agosto 2026.

Hospital San Isidro en Tocos

Etapas (1) Reinversión: avance físico 100%, avance financiero 95% (US\$3,504,173.42); fecha de fin prevista 26 agosto de 2025

Etapa (2) Construcción: avance físico 21.12%, avance financiero 32.41% (US\$13,434,768.75); fecha de fin prevista 21 julio de 2014.

Etapa (3) Equipamiento: avance físico 0%, avance financiero 20% (US\$2,743,285.34); fecha de fin prevista 21 julio de 2026.

Principales Riesgos Identificados

Enmienda-02 de los contratos del Hospital Regional del Sur en Choluteca y del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa, específicamente lo relacionado al esquema de pagos de la Fase 3 Equipamiento Médico y el Listado de Equipamiento que será suministrado por el contratista de acuerdo a lo negociado en las mesas de trabajo contemplando las opiniones técnicas del equipo biomédico de la agencia de apoyo, UTGP y miembro de la UE-PARH.


Acciones Recomendadas

La SESAL debe velar por el cumplimiento del cronograma de diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de hospitales; considerando que son contratos que consideran la ejecución de sus etapas en paralelo.

Mensaje Clave para Alta Dirección

SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, apoyando el monitoreo y avance del Programa.


1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Programa De Construcción Y Equipamiento De Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula Y Roatán) Para El Fortalecimiento De La Red Hospitalaria En Honduras				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Promoción Y Protección Humana				
Organismo Financiador	147 - Japan International Cooperation Agency, 173 - Banco Interamericano De Desarrollo				
Convenio	BID 5790/BL-HO				
Monto Total de Financiamiento USD:	223,723,200.00				
Monto Financiamiento L:	5,972,492,174.88				
Plazo de Ejecución:	72 meses	Fecha de Inicio	15/4/2024	Fecha de Fin	15/5/2030
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	1 - Inversion Real				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6959				

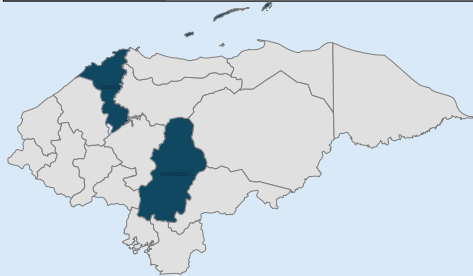

2. Objetivo Estratégico	
Mejorar la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).	

3. Cobertura	
Departamentos	Cortés, Francisco Morazán, Islas de la Bahía
Municipios	San Pedro Sula, Distrito Central, Roatán

Beneficiarios:	3,716,093
Generación de empleo (Estimado)	3,521 directos 10,563 indirectos




Nombre del Componentes	3. Componentes del Proyecto		
	Costo Componente (L)		
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales
2600 - Construcción y Equipamiento del Hospital General de Roatán, en Roatán Islas de la Bahía	600,059,761.8	-	-
2602 - Fortalecimiento de la integración y gestión de redes de servicios priorizadas	178,295,471.0	-	-
2603 - Administración del Programa/Costos de Gestión	193,376,129.8	-	-
2604 - Construcción y Equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en la Ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán	2,786,736,094.1	-	-
2605 - Construcción y Equipamiento de Hospital de Especialidades (Trauma) en la Ciudad de San Pedro Sula, Cortés	2,213,724,618.2	-	-
TOTAL	5,972,492,174.9	-	-




Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	147 - Japan International Cooperation Agency, 173 - Banco Interamericano De Desarrollo
Monto Contratado:	223.7
Desembolsado Acumulado	37.8
Disponible:	185.9
% Desembolso:	17%

6. Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	575,566,138.0	-	-	575,566,138.0
Presupuesto Vigente:	416,180,727.0	-	-	416,180,727.0
Ejecutado al 31/03/2026	9,110,615.8	-	-	9,110,615.8
% Ejecución al 31/03/2026	2%	-	-	2%



7. Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)							
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico			Ejecución Histórica			% de Ejecución
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	
2024	449,390,810.0	-	-	233,135,599.7	-	-	52%
2025	331,233,092.0	-	-	179,696,846.9	-	-	54%
2026	416,180,727.0	-	-	9,110,615.8	-	-	2%
TOTAL	1,196,804,629.0	-	-	421,943,122.4	-	-	35%



Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
25	1	0	5	17	354%	20%

Seguimiento Físico De Metasprograma De Construcción Y Equipamiento De Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula Y Roatán) Para El Fortalecimiento De La Red Hospitalaria En Honduras

[illegible]

Situación Actual

Cabe señalar que debido a la Prorroga del Presupuesto 2026, la ejecución financiera priorizada fue para el pago de honorarios profesionales a consultores, en virtud de la transición gubernamental y sujeto a la aprobación y publicación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso Nacional.

RESUMEN sobre la ejecución de las siguientes actividades:

1. Construcción y supervisión de la obra del hospital general de Roatán: Según informe de reporte a la fecha se cuenta con un avance físico acumulado de obra en 32.69% y de supervisión en un 99.22% se realizaron reuniones de seguimiento de manera semanal por la TITNII, se mencionan algunas actividades en ejecución: Trabajos de excavación de terreno en área de puente de interconexión entre Activación 1 y Edificio Existente, Construcción de contrapisos en nivel 2 del Edificio Existente, Habilitado y colocación de ductos de laminas galvanizadas para instalaciones de HVAC nivel 1 en el Edificio Existente, Colocación de tuberías y camufla para instalación de telecomunicaciones en niveles 2 y 3 de la Activación 2 y 3 Colocación de tuberías de cobre de diferentes diámetros para instalación agua fría/caliente en el edificio existente entre otras.
2. Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa: en proceso de ajustes al presupuesto y petición del BID/ TITNII responsable de revisar y cambios para enviar nuevamente la NOB al banco.
3. Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula: en proceso de ajustes al documento a petición del BID/ TITNII responsable de revisar y cambios para enviar nuevamente la NOB al banco.
4. Desarrollo de competencias técnicas y de gestión hospitalaria: priorizados 7 productos para el 2016; la Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud (DGRSS) ha conformado las comisiones de trabajo organizar el inicio de las actividades mismas que se da seguimiento, actualmente en revisión el borrador de convenio de becas de formación de especialidades del 4 nivel nacional, los 54 cupos la UNAH aprobó 45 cupos.
5. Fortalecimiento de la integración y gestión de redes de servicios de salud: en proceso de elaboración de propuestas técnicas por las comisiones que la DGRSS para los productos prioritarios.
6. Administración del programa: costos operativos y auditoría.

Principales Riesgos Identificados

Reformulación del Programa, considerando la decisión de pausar la construcción del Hospital de Trauma en Tegucigalpa, en vista de no contar con financiamiento adicional que cubra los costos estimados producto de los Diseños recibidos al cierre de 2025.

Acciones Recomendadas

La SESAL debe velar por el cumplimiento del cronograma de ejecución y puesta en marcha del Hospital de Roatán; considerando ser mas rigurosos con las empresas contratistas (obra y supervisión) para el cumplimiento de contratos, sin aprobar mas ordenes de cambio por ampliación en los plazos de ejecución.

Mensaje Clave para Alta Dirección

SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, apoyando el monitoreo y avance del Programa

Respuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus (Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestación De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)

Mapa de Colombia que muestra los límites de los departamentos. Los departamentos etiquetados son: Cúcuta, Santander, Atlántica, Córdoba, Guajará, Cesar, Boyacá, Casanare, Arauca, Meta, Guaviare, Vichada, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Chiriquí, Panamá, Veraguas, Coclé, Dagua, Sucre, Bolívar, Atlántica, Córdoba, Guajará, Cesar, Boyacá, Casanare, Arauca, Meta, Guaviare, Vichada, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Chiriquí, Panamá, Veraguas, Coclé, Dagua, Sucre, Bolívar.

Beneficiarios:	9,464,406
Generación de empleo (Estimado)	1,894 directos 5,682 indirectos

4,858,512.0	Mujeres	
4,605,894.0	Hombres	
9,464,406.0	Total	

Costo Total de Proyecto
(Cifras en Millones de Lempiiras)

Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento

Fuente de Financiamiento	Costo (Millones de Lempiras)
Inversiones Externas	100.0
Fondos Nacionales	100.0
Crédito Externo	1,300.00

6.Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	85,720,918.0	-	-	85,720,918
Presupuesto Vigente:	85,720,918.0	-	-	85,720,918
Ejecutado al 31/03/2026	610,426.9	-	-	610,426
% Ejecución al 31/03/2026	1%			1%

Fuente de Fondos	Presupuesto Aprobado (Millones de Pesos)	Ejecutado al 31/03/2026 (Millones de Pesos)
Crédito Externo	~85	~84
Donaciones Externas	~10	~9
Fondos Nacionales	~10	~9

Presupuesto Vigente - Ejecutado Histórico

Ejecución Histórica

Año	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución
2001	464.48	430.00	92%
2002	460.43	444.00	96%
2003	375.99	330.00	88%
2004	345.62	299.33	86%
2005	445.09	346.83	78%
2006	35.72	3.00	8%



Código BIP

24538

Respuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus (Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestación De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO ●	En Riesgo ●	Con Retraso ●	Sin Iniciar ○	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
5	0	0	4	0	22%	8%

Seguimiento Físico De Metasrespuesta Inmediata De Salud Pública Para Contener Y Controlar El Coronavirus (Covid-19) Y Mitigar Su Efecto En La Prestación De Servicios En Honduras (Risp-Ho-2)																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026				Ejecutado 2026						Resultados		Indicador	PROG 2026-27
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualment) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Componente 3: Interrupción de la Cadena de Transmisión																		
Adquisición, mantenimiento e instalación de generadores eléctricos para los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Anibal Murillo	Equipo	2	0	0%	0	0	0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0%	-0.2	● CON RETRASO	2
Componente 4: Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud																		
Sub-estación eléctrica del Hospital Escuela Instituto y Funcionado	Equipo	1	0.46	46%	0.19	0.25	0.1	0	0.54	0.2	0	0	0	0.2	37%	-0.34	● CON RETRASO	0
Hospitales fortalecidos con Equipo Médico y no médico para la continuidad de servicios esenciales (salas neonatales)	Letas	10	0	0%	0	0	0.8	0.2	1	0	0	0	0	0	0%	-1	● CON RETRASO	0
Fortalecimiento a la red de hospitales a través de equipamiento médico y no médico	Letas	14	0	0%	0	0	0.35	0.5	0.85	0	0	0	0	0	0%	-0.85	● CON RETRASO	0.15
TOTAL / PROMEDIO		27.00	0.46	2%	0.19	0.25	1.25	0.90	2.59	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	8%	(2.39)		

Situación Actual

Al Primer trimestre del 2026, se reporta un avance acumulado físico del 0.71% y financiero del 86.2% en la vida del Proyecto.
Cabe señalar que debido a la Prorrogación del Presupuesto 2026, la ejecución financiera priorizada fue para el pago de honorarios profesionales a consultores, en virtud de la transición gubernamental y sujeto a la aprobación y publicación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso Nacional.

GESALUD reporta la ejecución de las siguientes actividades:

- Realizada la Adecuación y Equipamiento del Centro de Datos de la SESAL; continúa el proceso de evaluación de ofertas por el personal de la Unidad de Gestión Informática (UGI), para su posterior envío a No Objeción del BID.
- Adquisición de generadores eléctricos para 3 hospitales: En Proceso de evaluación de oferta por la SESAL por técnicos de Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) esperando se concluya con la oportunidad requerida para proseguir con los pasos subsiguientes.
- Reemplazo de la Sub-Estación Eléctrica del Bloque Médico Quirúrgico del Hospital Escuela: se completó la adquisición del equipo requerido para proceder con la instalación y transferencias de carga a las salas del Hospital Escuela, y que por las diferentes eventualidades de demora que hubo en la entrega del último equipo por la empresa proveedora se hace necesario la adenda No. 3, misma que ya está en no objeción en el BID, existe un cronograma de trabajo para esta instalación coordinado con el Hospital Escuela.
- Gestiones Administrativas y Auditoría 2026.

Principales Riesgos Identificados

Asegurar la finalización de las siguientes actividades:

- Subproyecto de "Reemplazo y puesta en marcha de la Subestación Eléctrica del Hospital Escuela"
- Adquisición del equipo no médico de las salas neonatales para cuatro hospitales: Hospital Escuela, Hospital Santa Teresa, Hospital San Francisco, Hospital Roberto Suazo Córdova,
- Fortalecimiento de la red hospitalaria a través de la adquisición del Equipo Electromecánico, Instrumental Quirúrgico, Adquisición de insumo médico y Adquisición de la Reparación y mantenimiento de equipo y la continuidad del proceso de adquisición de las plantas generadoras eléctricas de los hospitales: Hospital Juan Manuel Gálvez y Hospital Anibal Murillo; adquisición y reparación de equipo médico y no médico para tres hospitales: Hospital Escuela, Hospital San Felipe y Hospital Mario Cárter Rivas, a través de la adquisición de mobiliario médico y adquisición de equipo médico,
- Cumplir con la devolución de Garantías Desecho Hospitalares de Traumatología.


Acciones Recomendadas

Asegurar el cumplimiento del cronograma de cierre del Proyecto.

Mensaje Clave para Alta Dirección

Proyecto ha cumplido el objetivo por el cual fue creado, para apoyar acciones durante la Pandemia COVID-19; los recursos disponibles de acuerdo a priorización de las diferentes Autoridades de la SESAL han ocasionado mantener la vigencia del Proyecto sin concretar las adquisiciones, procesos desfasados y/o desiertos, entre otros por lo que se sugiere la des obligación de saldos no desembolsados (estimados en US\$4.9 millones) y cierre del Proyecto.

I. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Proyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Promocion Y Proteccion Humana				
Organismo Financiator	171 - Asociación Internacional De Fomento				
Convenio	IDA 7142-JN, TPOB8564-JN, TPOC1861				
Monto Total de Financiamiento USD:	64,000,000.00				
Monto Financiamiento L:	1,708,537,600.00				
Plazo de Ejecución:	60 meses	Fecha de Inicio	15/3/2024	Fecha de Fin	15/3/2029
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de inversión	2 - Inversion En Desarrollo Humano				
Tipo de Cambio I Trimestre 2026	26.6099				

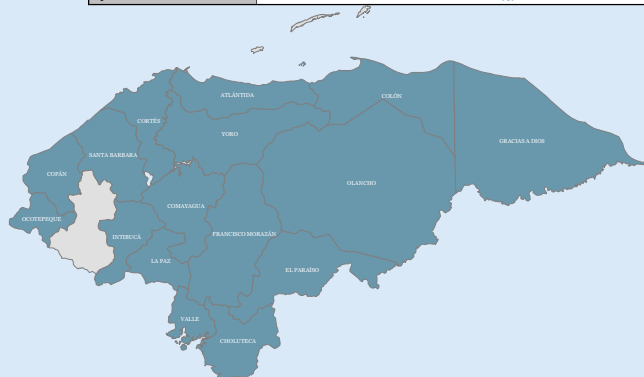

2. Objetivo Estratégico

Fortalecer la respuesta del sistema de salud para prestar servicios esenciales de salud materna, infantil y de adolescentes y con mayor capacidad de preparación, respuesta y rectoría de la Salud Pública

3. Cobertura	
Departamentos	Atlántida, Cádiz, Comayagua, Copán, Cortés, Choluteca, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Interoceánico, Isla de la Bahía, La Paz, Lempiara, Ocoateque, Olancha, Santa Bárbara, Valle, Yoro.
Municipios	La Ceiba, Trujillo, Comayagua, Santa Rosa De Copán, San Pedro Sula, Choluteca, El Paraíso, Distrito Central, Brus Laguna, Interoceánico, Rositán, La Paz, Gracias, Ocoateque, Interoceánico, Santa Bárbara, Nacaome, Yoro.


Beneficiarios:	5,948,115
Generación de empleo (Estimado)	5,774 directos 17,320 indirectos

Beneficiarios del Proyecto

2,998,329.00
Mujeres

2,919,786.00
Hombres


5,918,115.00



3. Componentes del Proyecto				
Nombre del Componentes	Costo Componente (L)			
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
2480 - 1(a) Actividades de inmunización para los niños parcialmente Vacunados y Niños Cero Dosis	146,827,450.0	66,739,750.0	-	213,567,200.0
2485 - Comp. 3. Gestión del Proyecto	86,087,700.0	26,695,900.0	-	106,783,600.0
2724 - 1(b) Mejora de la Calidad de los Servicios Materno y Neonatales	694,093,400.0	106,783,600.0	-	800,877,000.0
2725 - 1(c) Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva (Adolescentes)	307,002,850.0	93,435,650.0	-	400,438,500.0
2726 - 1(d) GAVI: Actividades de inmunización para los niños parcialmente Vacunados y Niños Cero Dosis	-	106,783,600.0	-	106,783,600.0
2727 - Comp. 2. GAVI-Capacidad de Preparación, Respuesta y Rectoría de la Salud Pública	-	53,391,800.0	-	53,391,800.0
2728 - Comp. 3. GAVI- Gestión del Proyecto	-	26,695,900.0	-	26,695,900.0
TOTAL	1,208,011,400.0	486,526,200.0	-	1,208,537,600.0


Costo Total de Proyecto
(Cifras en Millones de Lempiras)

Costo Total por Tipo de Fuente de Financiamiento

**Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto**

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)		
Organismo Financiador: UPEX	171 - Asociación Internacional De Fomento	
Monto Contratado:		64,4
Desembolsado Acumulado		7,1
Disponible:		56,3
% Desembolso:		12,2

6. Presupuesto según SIIFT 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	124,306.0	192,019,865.0	-	192,144,171.0
Presupuesto Vigente:	124,306.0	83,854,000.0	-	83,978,306.0
Ejecutado al 31/03/2026	-	10,256,016.4	-	10,256,016.4
% Ejecución al 31/03/2026	0%	12%	0%	12%

Presupuesto SIAFI 2020
(Millones de Lempiras)

7. Presupuesto Histórico Según SIAT (L)									
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				% de Ejecución
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	
2024	-	17,314,947.0	-	17,314,947.0	-	4,391,136.5	-	4,391,136.5	25
2025	3,400.0	169,412,480.0	-	169,415,880.0	-	164,493,570.9	-	164,493,570.9	97
2026	124,706.0	87,874,000.0	-	88,098,706.0	-	10,295,016.4	-	10,295,016.4	12
TOTAL	127,306.0	270,581,866.0	-	270,709,808.0	-	179,140,522.8	-	179,140,522.8	66

Presupuesto Vigente -Ejecutado Histórico



SECRETARÍA DE FINANZAS		Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026																
Código BIP	25216	Proyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias																
Información Física del Proyecto																		
8. INDICADORES CLAVE																		
Total Entregables 18	COMPLETADO 0	En Riesgo 0	Con Retraso 15	Sin Iniciar 7	% Ejec. Global 33%	% Ejecución 2026 0%												
Seguimiento Físico De Metasproyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias																		
8.1 Entregables		Meta Global			Programación 2026					Ejecutado 2026				Resultados		Indicador	PROG 2026-27	
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Tjecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																		
Mejorar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil en las regiones prioritarias																		
Número de regiones sanitarias que tienen una cobertura de vacunación Penta3 superior o igual al 85%	Número	20	3	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Incremento en cobertura de partos institucionales que ocurren en instituciones que cumplen con estándares nacionales para cuidados maternos y neonatales, en regiones prioritizadas por el proyecto	Porcentaje	25	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias																		
Notificaciones de casos sospechosos de dengue para los cuales los resultados de laboratorio están disponibles para la Unidad de Vigilancia de la Salud (UVS) dentro de los 10 días posteriores a la recolección de la muestra	Porcentaje	40	2	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Fortalecimiento de los servicios de salud para adolescentes, madres y niños																		
Personas que han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población (SNP) (CRI, Número)	Personas	1,230,000	414,305	34%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Personas que han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población (SNP) - Mujeres (requinto) (CRI, Número)	Mujeres	805,000	204,414	25%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Número de niños inmunizados (CRI, Número)	Niños	850,000	414,305	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Número de partos atendidos por personal sanitario calificado (CRI, Número)	Mujeres	380,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Mujeres embarazadas que acudieron a su primer control prenatal con 12 semanas o menos de gestación, en regiones prioritizadas por el proyecto (Porcentaje)	Porcentaje	70	22	31%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Establecimientos que brindan servicios de SSR adaptados a los adolescentes que actualizan sus planes de acción en función de los comentarios de los usuarios sobre la calidad de los servicios brindados, en regiones prioritizadas por el proyecto	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Trabajadores en salud capacitados/certificados en la provisión de servicios amigables a los adolescentes, en regiones prioritizadas por el Proyecto (IDAV40-ID)	Personas	500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Establecimientos que brindan servicios de labor y parto rehabilitados y/o equipados para cumplir con los estándares nacionales mínimos para atención materna y neonatal, en regiones prioritizadas por el Proyecto	Porcentaje	60	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Número de niños menores de 1 año pendientes de su primera dosis de la vacuna pentavalente	Niños	16,219	45,044	278%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Capacidad de preparación y respuesta de la salud pública																		
Establecimientos de salud que reportan datos al sistema integrado de conformidad con los protocolos de la SESAL	Número	506	854	169%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Laboratorios regionales que siguen los Procedimientos Operativos Estándares (POEs) establecidos para las tres principales enfermedades prioritarias (COVID-19, dengue y Zika), con base en auditorías técnicas (Porcentaje)	Porcentaje	100	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
Unidades regionales de vigilancia equipadas y capacitadas para el análisis de datos epidemiológicos (Número)	Número	15	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0
TOTAL / PROMEDIO		3,282,655	1,079,349	40%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0		

 SECRETARÍA DE FINANZAS Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto 2026		
Código BIP	25216	Proyecto De Servicios Esenciales De Salud Y Preparación Ante Emergencias
Situación Actual		
Debido a la Prorrogação del Presupuesto 2026, la ejecución financiera priorizada fue para el pago de honorarios profesionales a consultores, en virtud de la transición gubernamental y sujeto a la aprobación y publicación del Presupuesto 2026 por parte del Congreso Nacional. Para el primer trimestre la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH) reporta las siguientes acciones en base a la Matriz de Resultados (actualización semestral): Fortalecimiento de los servicios de salud para adolescentes, madres y niños: 414,505 personas han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población. 204,414 mujeres han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población. 414,505 niños fueron inmunizados (aplicación de vacunas). 31.4% de las mujeres embarazadas acudieron a primer control prenatal, con 12 semanas o menos de gestación. 45,044 niños menos de 1 año pendientes de su primera dosis de vacuna pentavalente. Capacidad de preparación y respuesta de la salud pública: 864 establecimientos de salud reportan datos al Sistema Integrado de conformidad con los protocolos de la SESAL.		
Principales Riesgos Identificados		
Tardía gestión del proceso de desembolsos del Crédito Externo (Proyecto en ejecución desde el año 2024) se ha priorizado la ejecución de recursos de Donación Externa por parte de la Unidad Ejecutora. Registro y actualización de recurso humano que se encuentra en campo apoyando las actividades de vacunación así como personal técnico de apoyo en la UAP-PROSALH; en plataforma SIREP (al rededor de 340 personas). Demora en la gestión de honorarios, viáticos y logística asociada a la Estrategia de Vacunación.		
Acciones Recomendadas		
Propuesta para reorientación de saldos no desembolsados, con prioridad en el Sector.		
Mensaje Clave para Alta Dirección		
SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, apoyando el monitoreo y avance del Programa.		

Código BIP 25289

Construcción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán

1. Identificación del Proyecto					
Nombre del Programa/Proyecto:	Construcción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán				
Entidad Ejecutora:	0060 - Secretaría De Salud				
Sector:	Desarrollo E Inclusión Social				
Organismo Financiador	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 147 - Japan International Cooperation Agency				
Convenio	Acuerdo Donación No 1660400				
Monto Total de Financiamiento USD:	9,244,073.77				
Monto Financiamiento L:	246,778,869.00				
Plazo de Ejecución:	30 meses	Fecha de Inicio	1/9/2023	Fecha de Fin	31/3/2026
Estado del Proyecto:	Ejecución				
Tipo de Inversión	1 - Inversión Real				
Tipo de Cambio T Trimestre 2026	26.9959				



Con Imágenes de Red
© Microsoft, 2023

2. Objetivo Estratégico	
ADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA UN FUNCIONAMIENTO OPTIMO DEL AREA TECNICO-ADMINISTRATIVA DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA EN FRANCISCO MORAZAN	

3. Cobertura	
Departamentos	Francisco Morazán
Municipios	Distrito Central

Beneficiarios:	3,497,636
Generación de empleo (Estimado)	59 directos 177 indirectos

Beneficiarios del Proyecto



3.Componentes del Proyecto					Costo Total de Proyecto (Cifras en Millones de Lempiras)
Nombre de los Componentes	Costo Componente (L)				
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	
2524 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	-	202,374,309.0	26,362,840.0	228,737,149.0	
2526 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL	-	-	18,041,720.0	18,041,720.0	
				-	
TOTAL	-	202,374,309.0	44,404,360.0	246,778,869.0	

EN MILLONES DE LEMPIRAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento	Costo (Millones de Lempiras)
Donaciones Externas	202,374,309.00
Fondos Nacionales	44,404,360.00
Crédito Externo	246,778,869.00


Información Financiera/Presupuestaria del Proyecto

5. Ejecución Financiera (US\$ Millones)	
Organismo Financiador: UEPEX	001 - Tesorería General De La República - Efectivo, 147 - Japan International Cooperation Agency
Monto Contratado:	9.2
Desembolsado Acumulado	5.6
Disponible:	3.7
% Desembolso:	60%

6. Presupuesto según SIAFI 2026 (L)				
Presupuesto	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total
Presupuesto Aprobado:	-	148,917.0	27,552,928.0	27,701,845.0
Presupuesto Vigente:	-	148,917.0	27,552,928.0	27,701,845.0
Ejecutado al 31/03/2026	-	-	-	-
% Ejecución al 31/03/2026		0%	0%	0%



7. Presupuesto Histórico Según SIAFI (L)					Ejecución Histórica				
Gestión	Presupuesto Vigente Histórico				Ejecución Histórica				% de Ejecución
	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	Crédito Externo	Donaciones Externas	Fondos Nacionales	Total	
2024	-	112,249,329.0	5,187,117.0	117,436,446.0	-	108,062,232.1	5,187,116.5	114,149,348.6	97%
2025	-	106,317,132.0	9,154,179.0	115,471,311.0	-	25,253,296.1	9,154,177.0	34,407,473.1	30%
2026	-	148,917.0	27,552,928.0	27,701,845.0	-	-	-	-	0%
TOTAL	-	218,715,378.0	41,894,224.0	260,609,602.0	-	134,315,528.2	14,341,293.4	148,656,821.6	57%





SECRETARÍA
DE FINANZAS
★ ★ ★ ★ ★

Ficha Ejecutiva de Seguimiento de Proyecto
2026

Código BIP

25289

Construcción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán

Información Física del Proyecto

8. INDICADORES CLAVE

Total Entregables	COMPLETADO	En Riesgo	Con Retraso	Sin Iniciar	% Ejec. Global	% Ejecución 2026
13	1	0	4	17	82%	0%

Seguimiento Físico De Metasconstrucción Y Equipamiento Del Edificio Administrativo Y Del Laboratorio Nacional De Vigilancia (Lnv) De La Salud En Tegucigalpa, Francisco Morazán

8.1 Entregables		Meta Global		Acumulado Dic-2025		% Avance Ac. 2025		Programación 2026				Ejecutado 2026				Resultados		Indicador		PROG 2026-27	
Entregable	Unidad de Medida	Meta Global	Acumulado Dic-2025	% Avance Ac. 2025	T1 Prog	T2 Prog	T3 Prog	T4 Prog	Total Prog 2026	T1 Real	T2 Real	T3 Real	T4 Real	Total Ejec 2026	% Ejecución 2026	Desviación	Indicadores	Prog 2026-27			
Celdas en AMARILLO = ingrese avance real Celdas en AZUL = programación (editable anualmente) Celdas en BLANCO = calculadas automáticamente																					
2524 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD																					
Realizar los Estudios y Diseños del Edificio Administrativo	DISEÑO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0			
Construir Edificio Administrativo (966 mtr) i. (Diseño y Construcción del Muro Perimetral (Rientra) ii. (Construcción del Estacionamiento Vehicular (800 mtr) iii. (Diseño y Construcción de la Cuesta del Suroeste Generador (40mtr) iv. Supervisar obra de Construcción del Edificio	EDIFICIO	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	-1	● CON RETRASO	0			
Supervisar obra de Construcción del Edificio Administrativo	INFORME	1	0	0%	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	-1	● CON RETRASO	0			
Construir Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud	EDIFICIO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● CON RETRASO	0			
2525 - EQUIPAMIENTO CLINICO DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD																					
Realizar el Equipamiento Clínico del Laboratorio Nacional de Vigilancia de la Salud	LOTE DE EQUIPO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	● COMPLETADO	0			
2526 - FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL																					
Adquirir Mobiliario Equipo y útiles varios de oficina	LOTE DE EQUIPO	3	2	67%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	○ SIN INICIAR	0			
Adquirir Equipo y Mobiliario de Computación	LOTE DE EQUIPO	2	2	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	○ SIN INICIAR	0			
Adquirir vehículos	VEHICULO	4	4	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	○ SIN INICIAR	0			
Adquirir Hyster (Capacidad de carga: 3000kg) (2026BCE)	EQUIPO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	○ SIN INICIAR	0			
Instalar montacargas para equipo, (capacidad: 1500 Kg)	EQUIPO	1	1	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	○ SIN INICIAR	0			
Instalar Elevador (capacidad: de 8 Pasajeros tipo K)	EQUIPO	1	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	○ SIN INICIAR	0			
TOTAL / PROMEDIO		17.00	14.00	70%	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	(2.00)					

Situación Actual

Al Primer trimestre del 2026, UAFCE-SESAL no reportó informe de evaluación.

Principales Riesgos Identificados

Tras varios intentos, no se logra concretar la contratación de la obra y supervisión para la construcción del Edificio Administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), el cual representa la contrapartida nacional del Acuerdo de Donación JICA. Cabe señalar, que por su parte JICA en diciembre del 2025 entregó a SESAL construido el Edificio del LNV. Bajo el Acuerdo de Donación, la SESAL ha gestionado directamente 5 enmiendas para ampliar el periodo de desembolso ante JICA; sin embargo, para el Proyecto se solicitó 1 ampliación de plazo de ejecución hasta el 31/03/2027 la cual se encuentra pendiente de actualización en el SNIPIH.

Acciones Recomendadas

Tomando en consideración la baja capacidad de ejecución por parte de la SESAL, a fin de evitar continuar con las gestiones de ampliación se recomienda finalizar el Proyecto dentro la vigencia a marzo del 2027. Considerar realizar la construcción del Edificio Administrativo bajo un esquema diferente de ejecución (acuerdo interinstitucional dentro del Sector Público o mediante la tercerización de las actividades permitidas bajo la Ley de Contratación del Estado).

Mensaje Clave para Alta Dirección

SEFIN apoyará las gestiones pertinentes, el monitoreo y avance del Proyecto hasta su cierre.
