

Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete de Infraestructura Productiva

Al Primer trimestre, 2016

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Marzo, 2016

2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

El gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L.6,410,224,004.00 y al I trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.6,453,433,584.00 Reportando según SIAFI una ejecución anual de L.623,864,448.00 (10%). Cabe resaltar que del presupuesto Vigente para el presente año fiscal, al cierre del primer trimestre ha presentado un Congelamiento representativo del 1% con respecto al presupuesto Vigente, en los Proyectos ejecutados por La Cuenta del Milenio.

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Institucional al I Trimestre, 2016

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)
	Infraestructura Productiva	6,410,224,004	6,453,433,548	89,405,087	6,364,028,461	623,864,448	10
	0031 - Cuenta del Desafio del Milenio-						
	Honduras	596,632,780	599,842,324	89,405,087	510,437,237	83,386,215	16
	0120 - Secretaría de Infraestructura y						
	Servicios Públicos	3,503,453,818	3,543,453,818	-	3,543,453,818	228,761,729	6
	0801 - Empresa Nacional de Energía						
	Eléctrica	2,256,837,406	2,256,837,406	-	2,256,837,406	311,716,504	14
	0804 - Empresa Hondureña de						
	Telecomunicaciones	53,300,000	53,300,000	-	53,300,000	-	0


Fuente: SIAFI

2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 48% por fondos nacionales y el restante 52% por fondos externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como Austria y China.

El 99.7% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por el INSEP, mientras que los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la ENEE y HONDUTEL.

En cuanto a los Fondos Externos mayormente son ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con el 59.6%, el restante 40.4% está formado por la participación de INSEP, HONDUTEL

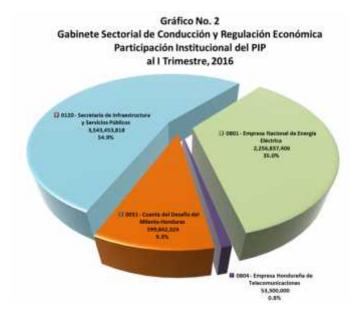

Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica, Programa de Inversión Pública Cifras en Lempiras

robo	oado	Vigente	Conge	lamiento	Vigen	te Ajustado	De	vengado	% Ejecu (Deveng Vigente Aju	ado/
35,7	775,536	3,338,985,080	89	,405,087	6,	383,484,257	4	61,044,599		7
09,9	944,287	2,909,944,287		-	3,	249,579,993	4	29,932,016		13
10,1	155,520	313,365,064	89	,405,087	2,	909,944,287		24,071,396		1
15,6	675,729	115,675,729		-		223,959,977		7,041,187		3
4,44	148,468	3,114,448,468		-	3,	114,448,468	1	62,819,849		5
15,5	558,360	2,515,558,360			2,	515,558,360	1	14,061,801		5
58,8	890,108	558,890,108		-		558,890,108		8,758,048		2
	-	40,000,000		-		40,000,000		40,000,000		100
0,22	24,004	6,453,433,548	89,	405,087	9,4	497,932,725	62	23,864,448		7
0,22	224,004		89,	405,087	9,4		_	_		<u> </u>

y MCA-H. Al primer trimestre el gabinete cuenta con una ejecución del 7% (L. 461,044,599.00) de sus Fondos Externos y el 5% (L.162,819,849.00) de Fondos

2.3 Metas Realizadas

Nacionales.

Al primer trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

- AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORA DEL SEGUNDO ANILLO VIAL DE SAN PEDRO SULA
- PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DEL CORREDOR AGRICOLA: en la Sección V "El Carbón-Bonito Oriental", habiéndose desarrollado durante el trimestre actividades de reconstrucción de cunetas, excavación común, instalación de drenaje menor, mampostería, construcción de una caja puente, mejoramiento de sub rasante, instalación de geomalla triaxial, colocación de base triturada e imprimación, por las actividades antes mencionadas alcanzó un avance físico del 38%.
- ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO: Al mes de marzo, un total de 14,276 clientes hogares ya están recibiendo asistencia en reducir la pobreza y la desnutrición de los hogares y comunidades beneficiadas en los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque
- CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO GOASCORAN SECCIÓN I-A Y I-B: Se logró finalizar la Sección I-A tanto en la parte Física, como Financiera. La Sección I-B se encuentra en gestión ante el BCIE el monto faltante para finalizar la obra.
- CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO GOASCORAN SECCIÓN II Y III: Se encuentra a la espera de la contratación de consultores para el control y seguimiento de las obras, por lo que se ha pausado temporalmente su ejecución, presentan retrasos en el desembolso, los cuales serán efectivos a finales del mes de marzo o principios del mes de abril.

- PROGRAMA DE APOYO A LA INTEGRACIÓN DE HONDURAS EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL: Presentó un avance físicosegún la Unidad Ejecutora de 21.4% dando inicio a los trabajos de la obra civil de la Construcción de la Subestación Eléctrica La Entrada.
- TRABAJOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS SUBTERRÁNEAS (MOS) Y SUS ESTRUCTURAS CONEXAS DE LA REPRESA FRANCISCO MORAZÁN: Reporta un avance físico según la Unidad Ejecutora es del 60%.
- PROYECTO HIDROELÉCTRICO PATUCA III (PIEDRAS AMARILLAS) FASE II: Los trabajos ejecutados se orientaron a la construcción del plantel e instalación de estructuras de lo que será la planta dosificadora y trituradora, corte y voladuras en acceso carretero al área utilizada para la casa de máquinas y excavaciones en el estribo izquierdo y derecho del eje de presa.
- PLAN DE EXPANSIÓN: Por su medio se realizará la adquisición, instalación y puesta en servicio de puertos multiservicios, necesarios para dar servicios de telecomunicaciones a varias comunidades del país.

2.4 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos del Sector

Los Principales Problemas que afectan la ejecución de los Proyectos del Gabinete Sectorial son:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	 Carencias por parte de las empresas contratistas de equipos adecuados para mejorar su avance de obra. No se cuenta con suficiente equipo de laboratorio para pruebas previas para el análisis respectivo de las obras. Deficiente entrega de materiales, equipos y accesorios en la obra. 	 Solicitar a los contratistas existentes el cumplimiento de lo establecido en el contrato. Mejorar el equipamiento de laboratorio para realizar las pruebas previas de las obras de forma eficiente. Readecuar la planificación en la compra de materiales, equipos y suministros, considerando los desfases de tiempo y solicitar a los proveedores mejorar los tiempos.
Administrativa	 Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escases. Refleja debilidad en la sistematización de procesos operativos y administrativos, así como la recopilación de experiencias aprendidas por parte de las Unidades Ejecutoras Institucionales de cada proyecto. 	e incrementar el mantenimiento preventivo. 2) Fortalecer sistemas de almacenamiento de

Área	Problemas	Acciones
Fillaliciela	 La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento. Falta de flujo de caja para hacer efectivos los pagos a contratistas y supervisores de obra. Falta de disponibilidad del fondo reintegrable afecta la operatividad y trabajo de mantenimiento. 	Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo
Legal	 Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción. 	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.

Dirección General de Inversiones Públicas-Subsecretaria de Crédito e Inversión Pública Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al I Trimestre 2016 Anexo 2 Cifra en tempras

Gabinete Sectorial INSTITUCION Fondos Nacionales Fondos Externos Total Fondos Nacionales Fon	Ajusti 4,231 106,499,767
Gabinete Sectorial Gabinete Sectorial (INSTITUCION Fondos Nacionales Fondos Sectorial Gabinete Sectorial Gab	remos Total (Comp Ajusta 4,231 106,499,767
Infraestructura Productiva 0031 - Cuenta del Design de Mileino-Honduras 6,990,233 589,607,527 596,632,780 6,980,253 592,662,071 599,842,324 - 89,405,087 6,980,233 503,455,984 510,437,237 - 83,386,215 83,386,215 83,386,215 16 1,555,535 10	,
0120 - Secretaria de Infraestructura y Servicios 2,508,578,107 994,875,711 3,503,453,818 2,548,578,107 994,875,711 3,543,453,818 2,548,578,107 994,875,711 3,543,453,818 154,061,801 74,699,929 228,761,729 154,061,801 74,699,929 228,761,729 6 165,818,866 Politicos	
	9,929 240,518,795
0801 - Empresa Nacional de Energia Eléctrica 505,590,108 1,751,247,298 2,256,837,406 505,590,108 1,751,247,298 2,256,837,406 505,590,108 1,751,247,298 2,256,837,406 8,758,048 302,958,456 311,716,504 14 8,808,048 30	4,462 315,182,510
0804 - Empresa Mondardina de 153,300,000 - 5	
	8,621 662,201,071
Total general 3,812,231,000 8,156,785,814 11,969,016,814 3,863,441,252 8,384,902,024 12,248,343,276 50,000,000 174,348,535 224,348,535 3,813,441,252 8,210,553,489 12,023,994,741 228,264,452 785,545,589 1,013,810,041 8 246,828,041 1,041,042 1,042,043,043 1,043,043 1,044,043,043 1,04	3,123 1,287,201,163
