



Secretaría de Finanzas
Dirección General de Inversiones
Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

***Secretaría de Infraestructura y Servicios
Públicos***

INSEP

Tercer Trimestre, 2018

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Octubre, 2018

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) cuenta con un Presupuesto de Inversión Vigente por el orden de L 2,727,851,966 que representa el 27% de la inversión del Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva; al III Trimestre cuenta con una cartera de 25 proyectos, reportando una ejecución de L 1,036,803,062 representativos del 38% de ejecución respecto al vigente.


Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 41.6% (L 1,422,272,027.00) con fondos externos y el 52.1% (L1,135,020,185.00) con fondos nacionales y el 6.3%(L170,559,754.00) con Donaciones Externas.

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2018

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	3,918,515,935
Presupuesto Vigente	2,727,851,966
Devengado III Trimestre -18	1,036,803,062
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	38%
Devengado Anual	1,917,224,750
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	70%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	2,107,727,810
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	77%

Fuente: SIAFI, 30/09/2018

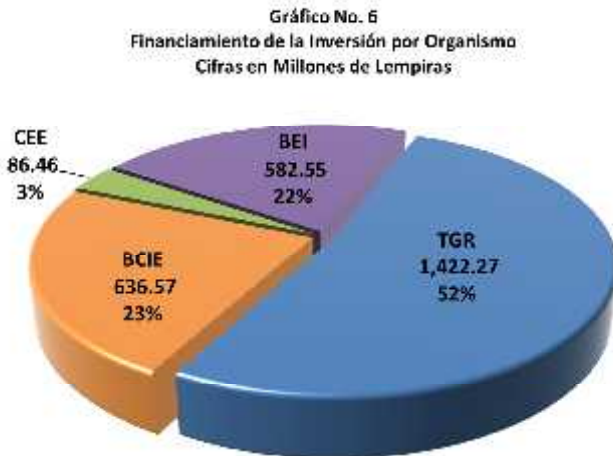

Tal como se muestra en el **Gráfico No. 6** los fondos para el financiamiento de proyectos de fuente externa provienen en mayor cuantía del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con una contribución del 23.3%, y 21.4% respectivamente, además cuenta con una donación proveniente de la Comunidad Económica Europea (CEE) con un 3.2%.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en once (12) proyectos relevantes que apoyan la infraestructura logística del país, dentro de estos 10 proyectos se encuentra la construcción del Corredor de Occidente. Así como otros proyectos de suma importancia como la Construcción y Pavimentación del tramo carretero Santa Ana de Yusguare, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico a 4 Carriles En Calle 8 -La Ceiba, Atlántida y la Construcción y Pavimentación de San Nicolás – Atima entre otros, que en conjunto representan un total de **81.5%** de la inversión en Infraestructura Productiva de la INSEP, por lo que la adecuada planificación y ejecución de los mismos, dependerá de la constante supervisión y seguimiento de las gestiones ante los desembolsos pendientes con los organismos financiadores y las estrategias o líneas de acción ante los retrasos en las rutas críticas de cada uno de los proyectos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

A continuación, se detallan los principales proyectos de la Institución:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
1) PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA CATACAMAS- CUEVAS DE TALGUA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 8.93 KILÓMETROS"	Total Fondos Nacionales	<u>170,536,365.44</u>		18/11/2013 30/06/2019
		170,536,365.44		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	81,800,000.00	26,800,000.00	-	0%
Acumulado 2018	81,800,000.00	26,800,000.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto*/	170,536,365.44	170,536,365.44	87,353,301.49	51%
<p>Observaciones: El proyecto inicio su ejecución en el año 2013 ejecutando hasta el 2016 donde se suspendió debido a la falta de recursos presupuestario. Durante dicho tiempo de ejecución se logró ejecutar 6.5 kilómetros de una longitud total de 9km.</p> <p>Para el Tercer Trimestre del presente año la INSEP contaba con la documentación necesaria para poder realizar las modificaciones a los contratos para poder otorgar a finales de septiembre e inicios de octubre la orden de re- inicio del proyecto y ejecutar los L 26.8 millones del presupuesto vigente. Sin embargo la INSEP realizó modificaciones presupuestarias en sus proyectos afectando al proyecto de la referencia, reduciendo el presupuesto del mismo por lo que la Dirección de Carreteras ha manifestado que se postergará la fecha de re-inicio del proyecto lo que provocará realizar una nueva solicitud de enmienda para poder aumentar el plazo de ejecución del proyecto.</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
3) REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA - SANTA ROSA DE COPÁN	Total	4,127,890,560.00		11/06/2015 11/06/2020
	Fondos Nacional	365,309,059.20		
	BEI-FI No.84859	3,345,234,179.98		
	BCIE-2156	417,347,320.82		
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	1,062,673,901.00	1,089,396,049.00	676,751,311.49	62%
Acumulado 2018	1,062,673,901.00	1,089,396,049.00	691,583,567.03	63%
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,127,890,583.00	4,127,890,560.00	1,398,716,230.33	34%
<p>Observaciones: El Proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico en el TRAMO 1 SANTA ROSA – LA ENTRADA (45.80km) del 15.21%, TRAMO 2 LA ENTRADA – LOS RANCHOS (36.18 km) con una ejecución física del 50%, TRAMO 3 LOS RANCHOS – EL FLORIDO (36.36 km) con un 21.0% de avance físico.</p> <p>Actualmente la Unidad de Ejecutora de la INSEP ha presentado la solicitud de identificación presupuestaria a la SEFFIN. Lo anterior debido a que las empresas constructoras a finales del tercer trimestre iniciaron a presentar estimaciones mayores a lo planificado, lo que es indicativo de que las empresas constructoras han mejorado sus esfuerzos para incrementar la ejecución del proyecto y así reducir los retrasos para poder finalizar la obra de acuerdo a lo estipulado en los tiempos contractuales.</p> <p>¹Tipo de cambio utilizado: HNL 24.8593 por US\$1.00</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
2) RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS LAJAS	Total Fondos Nacional	439,025,107.96 439,025,107.96		25/05/2011 28/06/2021
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2018	216,775,047.00	151,628,686.00	40,259,683.28	27%
Acumulado 2018	216,775,047.00	151,628,686.00	52,827,201.72	35%
Acumulado Vida del Proyecto*/	439,025,107.96	439,025,107.96	224,890,957.35	51%
<p>Observaciones: El Proyecto se encuentra en ejecución a partir de la Orden de Reinicio el 20 de junio del 2016. Al tercer trimestre del 2018 el Contratista ha realizado trabajos de colocación de pavimento con doble tratamiento, construcción de filtros, construcción de muros de gaviones. De igual manera ha realizado actividades en el área urbana con la construcción de aceras, construcción con concreto hidráulico entre otras.</p> <p>En fecha 31/07/2018 se emite la Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto de la referencia la Cual incrementa el costo total del proyecto de L 212.89 millones a L 439.03 millones dicho incremento es para la construcción de 3 puentes lo que incremente simultáneamente los Costos de las Empresas Supervisora y Constructora de obra. De igual forma la Enmienda también contempla la ampliación de tiempo de ejecución del proyecto para la empresa constructora a 18 meses y a la empresa Supervisora a 19 meses.</p> <p>¹Tipo de cambio utilizado: HNL 24.1423 por US\$1.00</p>				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Además de los proyectos antes mencionados se destacan otros de alta importancia dentro del programa de Infraestructura y Servicios Públicos los cuales son: Obras de Construcción de Vías Urbanas el cual en su presupuesto vigente del presente año fue utilizado para hacer el pago de la deuda de los sub proyectos ejecutados de la gestión 2017, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico a 4 Carriles En Calle 8 -La Ceiba, Atlántida el cual presenta un porcentaje de ejecución del 100%.

Por otra parte, en cuanto a los Proyectos ejecutados por la Dirección de Obras Públicas durante el tercer trimestre se dio inicio a los procesos de contrataciones para poder ejecutar los recursos asignados para el 2018: por lo anterior, la Unidad Ejecutora de la Dirección de Obras Publicas estarían otorgando la orden de inicio a en las primeras semanas del cuarto del trimestre. Dichos proyectos finalizarían en la primera semana de diciembre 2018 dado que los mismos, tienen una duración de 45 días.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se ha solicitado la proyección de ejecución de fondos externos para conocer el momento preciso para gestionar ante el comité de Incorporaciones presupuestarias las solicitudes de recursos adicionales conforme a las necesidades de los proyectos.
- Las unidades Ejecutora de la INSEP han mantenido un especial seguimiento a los proyectos financiados por Fondos Externos y Fondos Nacionales de la Institución lo que ha producido un efecto satisfactorio en cuanto el interés de mantener actualizada la información en el sistema SNIPH.

Conclusiones

- La ejecución al tercer trimestre del año 2017 y el 2018 respectivamente, se mantiene constante, lo que refleja debilidad en la sistematización de procesos operativos y administrativos, así como la recopilación de experiencias aprendidas por parte de las Unidades Ejecutoras Institucionales de cada proyecto.
- Dada la Importancia de los caminos, carreteras y obras de infraestructura para el Gobierno actual, el impacto de los proyectos programados en Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva, contribuye en gran manera a los objetivos para el desarrollo estratégico del país, concentrando INSEP una alta responsabilidad en el desempeño de los mismos.

Recomendaciones

- Es importante que las autoridades del Gobierno Central representadas en cada una de las Instituciones involucradas, agilicen los procesos, gestiones administrativas y financieras, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de metas y actividades planificadas en el Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva.
- Es importante gestionar ante la Secretaria de Finanzas las respectivas modificaciones presupuestarias para trasladar los fondos a las estructuras correspondientes y así iniciar a pagar la deuda que mantiene INSEP de los proyectos ejecutados en el año 2017.
- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución representativa mejore año con año, dadas la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
Dirección General de Inversión Pública
ANONb4
Programa de Inversión Pública Ejecución Financiera III Trimestre 2018
Cifras en millones

No Proy	Institución/Proyecto	Código	Responde a Proy			Responde a Mte			Daerغب III Trimestre			Daerغب Anul				Compromiso (Daerغب + Compromiso)			
			Fonds Nacionales	Fonds Externos	Total	Fonds Nacionales	Fonds Externos	Total	Fonds Nacionales	Fonds Externos	Total	Fonds Nacionales	Fonds Externos	Total	% Ejecución (Daerغب / Mte)	Fonds Nacionales	Fonds Externos	Total	% Ejecución (Compromiso / Mte)
28	000-Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	001-MODIFICACION DE OBRAS VARIAS EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
2	002-ESTUDIO DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS	FONDS NACIONALES	48,000,000.00	-	48,000,000.00	24,250,000.00	-	24,250,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
3	002-OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	10,000,000.00	-	10,000,000.00	6,629,000.00	-	6,629,000.00	-	-	-	5,248,605.00	-	5,248,605.00	2%	5,248,605.00	-	5,248,605.00	2%
4	002-OBRA DE PROYECCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	3,000,000.00	-	3,000,000.00	2,210,000.00	-	2,210,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
5	005-CONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	121,300,000.00	-	121,300,000.00	17,463,000.00	-	17,463,000.00	5,114,197.55	-	5,114,197.55	11,881,703.55	-	11,881,703.55	68%	16,792,881.45	-	16,792,881.45	98%
6	007-CONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	100,000,000.00	-	100,000,000.00	10,880,198.00	-	10,880,198.00	18,891,266.55	-	18,891,266.55	78,558,896.55	-	78,558,896.55	78%	78,558,896.55	-	78,558,896.55	78%
7	008-CONSTRUCCION DE OBRAS DE RECONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	3,000,000.00	-	3,000,000.00	3,022,000.00	-	3,022,000.00	2,885,489.73	-	2,885,489.73	4,826,203.55	-	4,826,203.55	16%	4,826,203.55	-	4,826,203.55	16%
8	008-CONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	16,888,740.00	-	16,888,740.00	16,888,740.00	-	16,888,740.00	2,308,471.70	-	2,308,471.70	5,667,128.96	-	5,667,128.96	34%	5,667,128.96	-	5,667,128.96	34%
9	001-OBRA DE CONSTRUCCION DE VASURRANS EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	101,983,172.00	-	101,983,172.00	35,521,980.00	-	35,521,980.00	144,385,852.64	-	144,385,852.64	246,304,028.84	-	246,304,028.84	78%	246,304,028.84	-	246,304,028.84	78%
10	002-RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	24,175,398.00	-	24,175,398.00	16,520,898.00	-	16,520,898.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
11	003-CONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	36,040,620.00	-	36,040,620.00	35,257,856.00	-	35,257,856.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%
12	006-PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	1,064,780.00	-	1,064,780.00	18,525,656.00	-	18,525,656.00	8,480,888.28	-	8,480,888.28	18,525,656.00	-	18,525,656.00	100%	18,525,656.00	-	18,525,656.00	100%
13	005-PAVIMENTACION DE CALLES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	-	99,189,000.00	99,189,000.00	-	24,081,989.00	24,081,989.00	-	-	-	-	24,081,989.00	24,081,989.00	100%	-	24,081,989.00	24,081,989.00	100%
14	001-RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	216,750,000.00	-	216,750,000.00	151,688,860.00	-	151,688,860.00	4,029,888.28	-	4,029,888.28	52,827,201.72	-	52,827,201.72	39%	146,022,085.12	-	146,022,085.12	99%
15	001-PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	-	26,197,860.00	26,197,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	006-CONSTRUCCION DE REDES DE AGUAS CALIENTES EN LA CIUDAD DE ADELPHO	FONDS NACIONALES	8,800,000.00	-	8,800,000.00	2,800,000.00	-	2,800,000.00	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%



SECRETARÍA DE FINANZAS

ANEXO 4
 Programación Pública Ejecución Financiera II Trimestre 2018
 Cifras en millones

No. Proy.	Institución/Proyecto	Concepto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Ejecutado			Deberá al Trimestre			Deberá al Año				Compromiso (Deberá + Compromiso)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Deberá/ Ejecutado)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compromiso/ Ejecutado)
17	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SERVICIOS COMUNITARIOS ANONIMO-COACOPAR SECCION VIII	BOE-2116	19,444,653.00	78,988,887.00	98,433,540.00	15,403,300.00	13,476,885.00	19,879,215.00	9,131,874.42	-	9,131,874.42	9,131,874.42	13,476,884.09	144,608,785.1	99%	9,131,874.42	13,476,884.09	144,608,785.1	99%
18	RE-ABITACION MAQUILADORA DE CORREDORES DE CARRILAS EN PASEO DE LA UNIDAD - COPANRUMS- EL CILCO Y LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	BOE-2158B-FI N° 888801-AA/2015/39-556/2016/03/H-UF	4,232,349.00	1,003,881,552.00	1,026,739,001.00	4,232,349.00	1,066,003,315.00	1,108,232,664.00	8,792,463.35	66,972,065.13	67,764,528.48	13,449,528.16	92,576,207.09	96,025,785.25	88%	17,003,304.02	92,576,207.09	99,656,511.11	87%
19	CONSTRUCCIÓN DEL BUEN VIVIR PARA LA VIDA EN LA COMUNIDAD DE CALLES SAN MARCOS DE COCCÓN	FININP-23391	73,600,000.00	-	73,600,000.00	73,600,000.00	-	73,600,000.00	4,548,793.67	-	4,548,793.67	73,600,000.00	-	73,600,000.00	100%	73,600,000.00	-	73,600,000.00	100%
20	MEJORAMIENTO PAIMINACIÓN DE BARRIO EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN MARCOS DE COCCÓN	FININP-23391	4,922,656.00	-	4,922,656.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	CONSTRUCCIÓN DE RE-ABITACION Y AMPLIACIÓN DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE COPAN	BOE-2162	-	425,389,190.00	425,389,190.00	-	80,029,900.00	80,029,900.00	-	-	-	-	80,029,986.68	80,029,986.68	100%	-	80,029,986.68	80,029,986.68	100%
22	MEJORAMIENTO PAIMINACIÓN DE BARRIO EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	FININP-23461	76,119,546.00	-	76,119,546.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	CONSTRUCCIÓN PAIMINACIÓN DE CALLES EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	FININP-23429	-	-	-	7,789,482.00	-	7,789,482.00	9,801,304.24	-	9,801,304.24	6,998,720.05	-	6,998,720.05	78%	7,789,482.00	-	7,789,482.00	100%
24	RE-ABITACION DEL TRAMO CARRETERO ENTRE MICULIZO-AZUCAR CON UN ANCHO DE CALLE DE 10 M. LOCALIZADO EN LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	FININP-23138	-	-	-	21,891,666.00	-	21,891,666.00	7,324,281.69	-	7,324,281.69	15,728,785.14	-	15,728,785.14	72%	21,891,666.00	-	21,891,666.00	100%
25	CONSTRUCCIÓN PAIMINACIÓN DE CALLES EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	FININP-23391	-	-	-	5,998,108.00	-	5,998,108.00	21,622,240.01	-	21,622,240.01	2,957,648.07	-	2,957,648.07	53%	5,998,108.00	-	5,998,108.00	100%
26	RE-ABITACION DE LAS CALLES DE LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	FININP-23492	-	-	-	20,955,771.00	-	20,955,771.00	1,174,326.74	-	1,174,326.74	19,408,165.2	-	19,408,165.2	98%	20,772,181.56	-	20,772,181.56	99%
27	CONSTRUCCIÓN PAIMINACIÓN DE CALLES EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	FININP-23165	-	-	-	74,955,536.00	-	74,955,536.00	26,604,155.46	-	26,604,155.46	36,987,399.66	-	36,987,399.66	49%	74,955,536.00	-	74,955,536.00	100%
28	CONSTRUCCIÓN PAIMINACIÓN DE CALLES EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE LA UNIDAD SAN FRANCISCO DE COPAN	FININP-23245	-	-	-	144,024,338.00	-	144,024,338.00	5,466,046.8	-	5,466,046.8	5,466,046.8	-	5,466,046.8	4%	5,466,046.8	-	5,466,046.8	4%
Total ODD- Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			1,313,425,461.00	2,650,014,940.00	3,988,515,965.00	1,422,272,020.00	1,305,599,890.00	2,727,851,966.00	388,809,970.00	66,972,065.13	1,065,803,652.13	735,489,921.02	1,182,155,887.00	1,917,234,749.02	70%	925,571,980.65	1,182,155,887.00	2,107,727,839.65	77%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos								
001 - MICROPROYECTOS DE OBRAS VARIAS EN LA CAPITAL (POR ADMINISTRACIÓN)	03 - Pavimentación de las calles con concreto hidráulico en la Capital.	982 - METRO LINEAL	4320	0	0%	1728	0	0%
	04 - Supervisión de la Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la Capital.	982 - METRO LINEAL	4320	0	0%	1728	0	0%
002 - ESTUDIO, DISEÑO Y RECONSTR. DE EDIFICIOS PÚBLICOS, CONSIDERA	03 - Construcción de Edificaciones Públicas.	983 - METRO CUADRADO	1420	0	0%	568	0	0%
	04 - Reparación de Edificaciones Públicas.	983 - METRO CUADRADO	1086	0	0%	0	0	0%
	05 - Supervisión de la Construcción y Reparación de Edificaciones Públicas a Nivel Nacional.	983 - METRO CUADRADO	1988	0	0%	795	0	0%
002 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MENOR EN EL PAÍS	06 - Pavimentación de las calles con concreto hidráulico.	982 - METRO LINEAL	6000	0	0%	2000	0	0%
	07 - Construcción del Sistema de Alcantarillado.	982 - METRO LINEAL	0.01	0	0%	0	0	0%
	08 - Construcción y Reparación de las Obras Menores en Puentes.	982 - METRO LINEAL	234	0	0%	0	0	0%
	09 - Construcción del Sistema de Agua Potable.	982 - METRO LINEAL	1303	0	0%	912	0	0%
	10 - Construcción de las Obras Menores de Infraestructura.	983 - METRO CUADRADO	960	0	0%	672	0	0%
	11 - Supervisión de las obras de infraestructura menor en el país.	149 - INFORME	66	0	0%	33	0	0%
002 - OBRAS DE PROTECCIÓN CONTRA EROSIÓN Y SEDIMENTOS EN EL PAÍS (POR ADMON.)	03 - Construcción de Canal.	982 - METRO LINEAL	92	0	0%	0	0	0%
	04 - Construcción de Cajas Puentes, Vados, Muros de Vagiones, Dragados, Bordos y Presas de Consolidación.	65 - METRO CUBICO	21043	0	0%	12626	0	0%
	05 - Supervisión de las Obras Hidráulicas en el País.	149 - INFORME	6	0	0%	3	0	0%
005 - CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION CAMINOS POR MANO DE OBRA EN TODO EL PAÍS	03 - Rehabilitación y mantenimiento de Tramos de Caminos por Mano de Obra en todo el País.	982 - METRO LINEAL	264000	163564	62%	176000	0	0%
	04 - Gastos Operativos.	982 - METRO LINEAL	1	0	0%	0	0	0%
007 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CARRETERAS.	06 - Construcción y Rehabilitación de Carreteras.	982 - METRO LINEAL	122590	158700	129%	590	0	0%
	07 - Supervisión de la Construcción y Rehabilitación de Carreteras	982 - METRO LINEAL	712000	158700	22%	417000	0	0%
008 - CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE	02 - Rehabilitación y construcción en Lugares de Recreo.	983 - METRO CUADRADO	3400	0	0%	1360	0	0%
	03 - Rehabilitación y construcción en parques.	983 - METRO CUADRADO	2000	0	0%	800	0	0%
	04 - Supervisión de la construcción y rehabilitación en parques y lugares de recreo del país.	149 - INFORME	26	0	0%	13	0	0%
013 - CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE OBRAS DE DRENAJE	07 - Construcción y Rehabilitación de las Obras de Drenaje Menor.	982 - METRO LINEAL	71	0	0%	0	0	0%
	08 - Supervisión de la construcción y rehabilitación de las Obras de Drenaje Menor.	982 - METRO LINEAL	54	0	0%	0	0	0%
021 - OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS	13 - Construcción de calles en vías urbanas.	982 - METRO LINEAL	39300	8750	22%	18000	0	0%
	14 - Supervisión de la construcción de calles en vías urbanas.	982 - METRO LINEAL	40300	8750	22%	30000	0	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos								
022 - PUENTE SOBRE EL RÍO SANGRELAYA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 52 ML. LOCALIZADO EN IRIONA DEPARTAMENTO DE COLÓN.	03 - Construcción del Puente sobre Río Sangrelaya para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	24	7.04	29%	0	0	0%
	04 - Supervisión del Puente sobre Río Sangrelaya para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	28	7.04	25%	4	0	0%
023 - Construcción de Puente Los Niños con una longitud aproximada de 260 Ml, localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	06 - Construcción del Puente Los Niños, Cantarrana, F.M. para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	260	0	0%	0	0	0%
	07 - Supervisión del Puente Los Niños, Cantarrana, F.M. para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	260	0	0%	68	0	0%
045 - PAVIMENTACION CARRETERA LAS CRUCITAS-TEUPASENTI	03 - Construcción y Pavimentación del Tramo de la Carretera en Las Crucitas-Teupasenti para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	2	0	0%	2	0	0%
	04 - Supervisión del Tramo en Las Crucitas-Teupasenti para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	2	0	0%	2	0	0%
095 - PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - CAMASCA	06 - Construcción y Pavimentación del Tramo de la Carretera en La Esperanza-Camasca para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	6000	1327.92	22%	0	0	0%
	07 - Supervisión del Tramo en La Esperanza-Camasca para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	6000	1327.92	22%	0	0	0%
101 - RECONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA LA LIBERTAD - LAS L	12 - Construcción y Pavimentación del Tramo Carretero La Libertad Las Lajas para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	1	2250	225000%	0	0	0%
	13 - Supervisión del Tramo Carretero La Libertad Las Lajas para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	11560	2250	19%	3650	0	0%
104 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION	09 - Supervisión del Tramo en La Villa de San Antonio-Guascorán Sección I, para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	6000	0	0%	1000	0	0%
	10 - Ampliación del Tramo de la Carretera en La Villa de San Antonio-Guascorán Sección I, para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	1	0	0%	0	0	0%
116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	12 - Construcción y Pavimentación del Tramo de la Carretera en Catacamas Cuevas de Talgua para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	4280	0	0%	1520	0	0%
	13 - Supervisión del Tramo en Catacamas Cuevas de Talgua para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	4280	0	0%	1520	0	0%
117 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	15 - Construcción y Pavimentación del Tramo de la Carretera en el Corredor Logístico Villa de San Antonio Guascorán Sección II y III	982 - METRO LINEAL	8000	1103.59	14%	0	0	0%
	16 - Supervisión del Tramo en el Corredor Logístico Villa de San Antonio Guascorán Sección II y III para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	6000	1103.59	18%	0	0	0%
	17 - Elaboración del Informe de la Firma Verificadora.	149 - INFORME	9	0	0%	3	0	0%
	18 - Elaboración del Informe para el Fortalecimiento Institucional.	149 - INFORME	9	0	0%	0	0	0%
121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	15 - Construcción del Tramo en El Corredor la Entrada Santa Rosa de Copán para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	50.01	17906.47	35806%	50	0	0%
	16 - Supervisión del Tramo del Corredor la entrada santa rosa de copán para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	35660	17906.47	50%	4780	0	0%
	17 - Elaboración del informe del fortalecimiento Institucional.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%
	18 - Elaboración del informe de reasentamientos.	149 - INFORME	191	481	252%	140	0	0%
	27 - Elaboración del informe de la Asistencia Técnica.	149 - INFORME	2	0	0%	0	0	0%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al III Trimestre, 2018

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos								
124 - CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD CARRETERA PANAMERICANA CHOLUTECA-SALIDA A SAN MARCOS DE COLÓN	20 - Mejoramiento y Pavimentación del Tramo de la Carretera en la Panamericana Choluteca-Salida a San Marcos de Colón para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	471	690	146%	0	0	0%
	21 - Supervisión del Tramo en la Panamericana Choluteca-Salida a San Marcos de Colón para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	471	690	146%	0	0	0%
125 - MEJORAMIENTO Y PAVIMENTO	23 - Mejoramiento y Pavimentación del Tramo de la Carretera en Libramiento Ruta 64: El Durazno-El Lolo-Cerro Grande, Fase I para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	1	0	0%	0	0	0%
130 - CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA CA-5 SUR: TEGUCIGALPA - JICARO GALÁN	20 - Construcción del Tramo en Júcaro Galán La Venta para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	7000	4751.4	68%	1000	0	0%
	21 - Supervisión del Tramo Júcaro Galán La Venta para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	1	4751.4	475140%	0	0	0%
	22 - Construcción y Rehabilitación del Tramo La Venta Cerro de Hula para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	6000	8493.46	142%	1000	0	0%
	23 - Supervisión del Tramo La Venta Cerro de Hula para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	6000	8493.46	142%	1000	0	0%
	24 - Construcción y Rehabilitación del Tramo en Cerro de Hula Tegucigalpa Puente Germania para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	1000	0	0%	0	0	0%
	25 - Supervisión del Tramo Cerro de Hula Tegucigalpa Puente Germania para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	5000	0	0%	0	0	0%
	26 - Adquisición del Derecho de vía.	149 - INFORME	5000	0	0%	0	0	0%
138 - Mejoramiento y Pavimentación Libramiento Ruta 64: El Lolo, Tegucigalpa Fase II	25 - Mejoramiento y Pavimentación del Tramo de la Carretera en Libramiento Ruta 64: El Lolo - Tegucigalpa, Fase II para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	3570	0	0%	1810	0	0%
	26 - Supervisión del Tramo en Libramiento Ruta 64: El Lolo - Tegucigalpa, Fase II para beneficio de los usuarios.	982 - METRO LINEAL	3570	0	0%	1810	0	0%
139 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BULEVARD A CUATRO (4) CARRILES EN CALLE 8, ETAPA I: "INTERSECCIÓN AVENIDA LA	28 - Construcción de Boulevard en calle 8, Etapa I La Ceiba, para beneficio de los Usuarios.	982 - METRO LINEAL	1900	1425	75%	600	0	0%
	29 - Supervisión de Boulevard en calle 8, Etapa I La Ceiba, para beneficio de los Usuarios.	982 - METRO LINEAL	1900	1425	75%	600	0	0%
140 - REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	29 - Rehabilitación de la Carretera entre Virrey-Macuelizo-Azacualpa, para beneficio de los usuarios	982 - METRO LINEAL	10000	5480	55%	2500	0	0%
	30 - Supervisión de la Rehabilitación de la Carretera entre Virrey-Macuelizo-Azacualpa, para beneficio de los usuarios	982 - METRO LINEAL	10000	5480	55%	2500	0	0%
141 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ¿SAN NICOLÁS-ATIMA¿, ETAPA I TRAMO ¿SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ¿, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA	31 - Construcción y Pavimentación de la etapa I San Nicolas-Santa Cruz, para beneficio de los Usuarios.	982 - METRO LINEAL	5000	700	14%	1500	0	0%
	32 - Supervisión de la Construcción y Pavimentación de la etapa I tramo San Nicolas-Santa Cruz , para beneficio de los Usuarios.	982 - METRO LINEAL	5000	700	14%	1500	0	0%
142 - REHABILITACIÓN DE BULEVAR ¿LOS POETAS¿, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO	32 - Rehabilitación de Boulevard Los Poetas, para beneficio de los usuarios	982 - METRO LINEAL	1150	1160	101%	0	0	0%
	33 - Supervisión de la Rehabilitación de Boulevard Los Poetas, para beneficio de los usuarios	982 - METRO LINEAL	1150	1160	101%	0	0	0%
Ejecución al III Trimestre 2018 Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	34 - Construcción y Pavimentación en el Tramo de la Carretera Santa Ana de Yusguare-El Corpus, para beneficio de los Usuarios.	982 - METRO LINEAL	10000	1132	11%	3000	0	0%
	35 - Supervisión de la Construcción y Pavimentación con							
