



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE FINANZAS

**Secretaría de Finanzas**  
**Dirección General de Inversiones**  
**Públicas**

**Informe General de la Inversión Pública**  
**III Trimestre**

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2018

## ***INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2018***

### **PRESENTACION**

El presente documento fue elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) de la Secretaría de Finanzas, en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP). En este apartado se muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al III Trimestre del ejercicio fiscal 2018.

El monto aprobado por el Congreso Nacional para el PIP en el ejercicio fiscal 2018 asciende a L13,317,043,521, en adición se incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por un monto de L7,816,000,000, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza que asciende a L4,500,000,000 totalizando un monto aprobado para el año 2018 de L25,633,043,521.

El presupuesto vigente en el PIP asciende a L 13,822,521,843 el incremento presupuestal respecto al aprobado se debe a incorporaciones presupuestarias de fondos externos y fondos nacionales (fuentes 21, 22 y 11) durante el presente año por un monto de L 505,468,322 en los proyectos que se detallan a continuación:

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS); Programa Prevención de la Enfermedad de Chagas y Leishmaniasis (PENCHALE), ejecutado por la Secretaría de Salud; Construcción y Equipamiento del Edificio Anexo al Edificio Pedagógico de la Universidad de Defensa de Honduras ejecutado por la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) y el Apoyo a la Gestión Basada en Resultados a Nivel Municipal ejecutado por la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG).

En el transcurso del tercer trimestre se realizaron traslados al presupuesto de inversión pública dentro de las instituciones, por concepto de requerimientos adicionales para la ejecución de los diferentes proyectos en fuente 21 y 22, alcanzando un presupuesto vigente ajustado de 13,759,779,043 producto de la aplicación de Nota Técnica para el traslado presupuestario entre Instituciones de la Administración Central, con el fin de mantener el equilibrio y control del déficit fiscal.

Lo cual al incluir la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada y el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza alcanza un presupuesto vigente ajustado a septiembre de L26,075,779,043 (4.0% del PIB proyectado para el 2018).

**Cuadro No.1**  
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
**INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2018**  
 Cifras en Lempiras

No. Proy Aprobados	Estructura del Sector Público	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vig. Ajustado)
94	Administración Central	9,470,149,397	10,006,913,964	10,006,913,964	5,711,017,807	57
11	Resto del Sector Público	3,846,894,124	3,815,597,879	3,752,865,079	1,401,135,803	37
<b>105</b>	<b>Total PIP General</b>	<b>13,317,043,521</b>	<b>13,822,511,843</b>	<b>13,759,779,043</b>	<b>7,112,153,610</b>	<b>51</b>
11	Resumen de Proyectos APP	7,816,000,000	7,816,000,000	7,816,000,000	3,785,170,322	48
1	Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000	3,058,500,000	68
<b>12</b>	<b>Sub Total APP-Fideicomiso</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>6,843,670,322</b>	<b>56</b>
<b>117</b>	<b>Total General</b>	<b>25,633,043,521</b>	<b>26,138,511,843</b>	<b>26,075,779,043</b>	<b>13,955,823,932</b>	<b>54</b>

Fuente: SIAFI, Superintendencia de Alianzas Público Privadas  
 APP: Dirección de Política Macro fiscal

Al término del tercer trimestre, se registra una ejecución financiera acumulada de **L7,112,153,610.05** (51%) que representa un porcentaje menor (-0.04%) comparado con la ejecución al tercer trimestre del 2017 (53.5%) respecto al presupuesto vigente, sin embargo el total de la inversión registra una ejecución total del 54% (incluye APP y Vida Mejor).

En cuanto a la ejecución del Fideicomiso Vida Mejor se observa una disminución de 7 puntos porcentuales comparado al III Trimestre 2017 (75.3%) registrando 68% de ejecución financiera; Mientras que en los proyectos ejecutados bajo la modalidad APP (48%) se observa un incremento de 5 puntos porcentuales en relación al tercer trimestre del 2017 (43%), alcanzando una ejecución de toda la inversión pública del 54% al tercer trimestre.

El comportamiento de ejecución reportado al tercer trimestre del año, es habitual en el Programa de Inversión Pública debido que los Proyectos ven dinamizada su ejecución en los dos últimos trimestres de cada año.

## I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 2018

### 1.1 Programa de Inversión Pública Global 2018

Los recursos del Programa de Inversión Pública para el ejercicio fiscal 2018 son destinados a la ejecución de 117 programas y proyectos, incluye un Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) y 11 Proyectos financiados bajo modalidad Asociaciones Públicas Privadas y 105 proyectos de Inversión Pública.

Durante el año se incorporaron 22 proyectos alcanzando 105 proyectos al tercer trimestre del presente año, dichos Proyectos fueron incorporados en las siguientes instituciones:

Cuenta del Desafío del Milenio, Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Alcaldía Municipal, Tribunal Superior de cuentas, Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Defensa, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Finanzas e Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación con un Proyecto cada institución, Instituto de Conservación Forestal.

Cabe resaltar que el monto que refleja el cuadro anterior en algunos casos corresponde a incorporaciones con financiamiento de su propio presupuesto para dar espacio a proyectos nuevos, y otros por incorporación de fondos de donación o fondos nacionales

de contraparte de proyectos, a continuación se presenta el listado de proyectos incorporados durante el año en el PIP:

### Cuadro No.2

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

#### PROYECTOS INCORPORADOS DURANTE EL AÑO 2018 AL III TRIMESTRE 2018

Valores en millones de Lempiras

No.	PROYECTO	PRESUPUESTO VIGENTE
1	<b>TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	<b>6.0</b>
1	PROYECTO APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO 2014-2018 PARA EL MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL TSC	6.0
1	<b>FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL</b>	<b>24.8</b>
2	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	24.8
1	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL</b>	<b>30.1</b>
3	MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	30.1
5	<b>CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO-HONDURAS</b>	<b>128.0</b>
4	Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio	47.3
5	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA LA ESPERANZA - MARCALA, SECCION II	40.9
6	PROGRAMA PILOTO DE RESILIENCIA CLIMÁTICA (PPCR)	13.3
7	PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I-A Y I-B (FINANCIAMIENTO ADICIONAL)	7.8
8	PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	72.9
1	<b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	<b>26.4</b>
9	PROGRAMA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS Y LEISHMANIASIS (PENCHALE)	26.4
1	<b>SECRETARÍA DE SEGURIDAD</b>	<b>97.6</b>
10	PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA (FONDOS DE DONACION)	97.6
1	<b>SECRETARÍA DE DEFENSA</b>	<b>14.4</b>
11	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ANEXO AL EDIFICIO PEDAGÓGICO DE LA UNIVERSIDAD DE DEFENSA DE HONDURAS	14.4
1	<b>SECRETARÍA DE FINANZAS</b>	<b>2.4</b>
12	APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)	2.4
6	<b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>395.3</b>
13	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO A 4 CARRILES EN CALLE 8 -LA CEIBA, ATLANTIDA	77.9
14	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO VIRREY - MACUELIZO - AZACUALPA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 10 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.	21.9
15	CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO ¿SAN NICOLÁS-ATIMA¿, ETAPA I TRAMO ¿SAN NICOLÁS-SANTA CRUZ¿, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 5 KM., LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA.	56.0
16	REHABILITACIÓN DEL BULEVAR LOS POETAS LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA DEPARTAMENTO DE OLANCHO	21.0
17	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON DOBLE TRATAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO SANTA ANA DE YUSGUARE, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA	74.6
18	CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL TRANMO CARRETERO VALLADOLID-LA VIRTUD-MAPULACA CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA	144.0
1	<b>SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA</b>	<b>2.6</b>
19	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP) DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (SAG) EN HONDURAS	2.6
1	<b>INSTITUTO HONDUREÑO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN</b>	<b>3.5</b>
20	APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE HONDURAS.	3.5
2	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL</b>	<b>48.2</b>
21	PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	9.0
22	PROGRAMA DE MITIGACIÓN DE DESASTRES NATURALES EN EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL	39.2
22	<b>TOTAL</b>	<b>779.1</b>

En el PIP se ejecutan proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

El desempeño de la ejecución del Programa de Inversión Pública al tercer Trimestre del 2018 a nivel de devengado (51%) muestra un comportamiento bastante similar a los mostrados en los años 2016 y 2017 (52% y 51.2% respectivamente) esto debido al comportamiento de la ejecución en el PIP. Durante el tercer trimestre varios de los proyectos se encuentran con procesos de contratación pendientes, no obstante, producto de las gestiones realizadas por la Secretaría de Finanzas, medidas adoptadas con el fin de cumplir con el ordenamiento y control del gasto en inversión pública, se espera que la ejecución de la Inversión aumente durante el cuarto trimestre, tal como se ha venido registrando en los últimos años


En seguimiento a las acciones que la Secretaría de Finanzas ha llevado a cabo con el propósito de mantener la estabilidad en el control del gasto y déficit fiscal, durante el tercer trimestre se propone efectuar traslado de estructuras presupuestarias a fin de compensar la incorporación de los recursos al presupuesto, con esto se pretende lograr que la ejecución del PIP 2018 sea ejecutada en un porcentaje mayor a los años anteriores, así como el puntual seguimiento a las Metas físicas de cada uno de los Proyectos de inversión pública.

## 1.2 Proyectos de Inversión Pública año 2018

El presupuesto vigente de la Inversión Pública se concentra en su mayor parte en instituciones de la Administración Central, concentrando el 86% que incluye proyectos APP y el Fideicomiso Vida Mejor.

El resto del Sector Público alcanza el 14% de la Inversión.

La distribución de la Inversión Pública de acuerdo a la Clasificación del Sector Económico se aprecia en el Gráfico No.1.

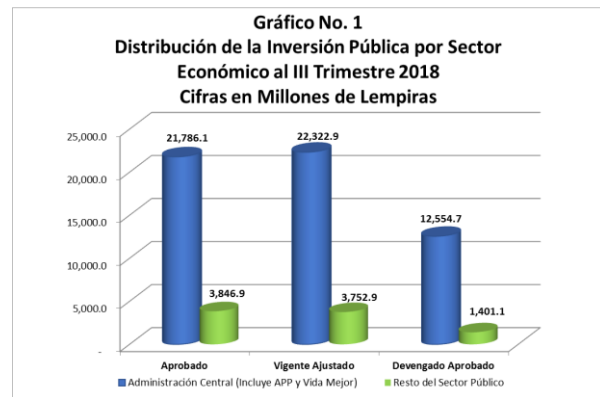

Los montos de inversión que sobresalen en la inversión se concentran en La Cuenta del Milenio-Honduras (MCA-H), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicas (INSEP) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y La Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social representando todas en su conjunto un 42.5% de la Inversión, por su parte el Fideicomiso Vida Mejor y proyectos APP representan el 47.0% del total de la inversión.

Para el ejercicio fiscal 2018 en las Disposiciones Generales de Presupuesto, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

### 1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel Sectorial

En cuanto a la ejecución a nivel sectorial, el Sector Carretero es el que abarca el mayor monto de ejecución presupuestaria (Incluye APP) por el orden de L7,518.2 millones. Es decir, un 54% de ejecución en relación al total del presupuesto ejecutado; seguido por el Sector de Protección Social (incluye Fideicomiso (Vida Mejor) con un monto ejecutado de L3,806.9 millones (27% de ejecución en relación al total del presupuesto ejecutado y el Sector Energía con un monto ejecutado de L1,420.8 millones, representando el 10% de participación respecto al total ejecutado del PIP. Estos Sectores en su conjunto concentran el 91% de la ejecución total de la inversión Pública al III Trimestre.

Los Sectores con menor ejecución financiera son en su orden el Sector Desarrollo Productivo y Recursos Forestales y Ambiente y otros sectores que incluyen (Modernización del Estado), seguido de sector Salud, Riego, Comunicaciones, Agua y Saneamiento quienes en su conjunto alcanzaron una ejecución de L1,209.9 millones representativos del 9% de participación de ejecución respecto al total ejecutado.

Gráfico No. 2  
Ejecución de la Inversión Pública al III Trimestre 2018 (L 13,955.8)  
Cifras en millones de Lempiras


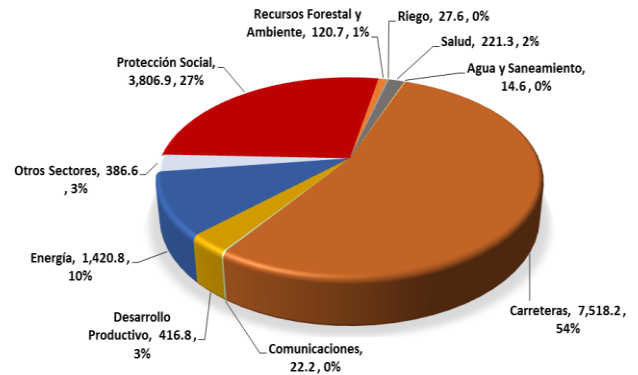


Gráfico No. 3  
Inversión Pública por Gabinete Sectorial (L 25,785.8)  
Cifras en millones de Lempiras

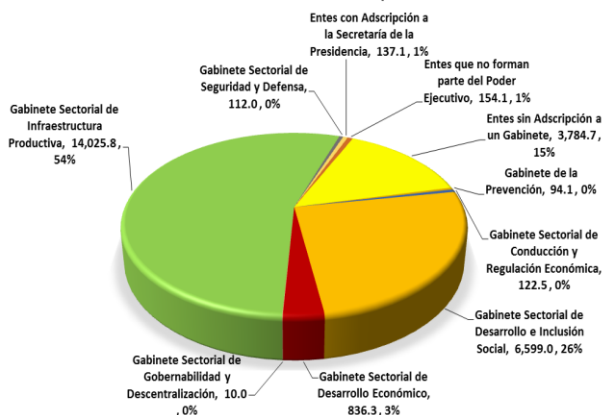

En el marco de la reforma a la Ley General de la Administración Pública, se conformaron Gabinetes Sectoriales que agrupan las instituciones de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones, a continuación, se presentan los principales avances físicos por cada Gabinete Sectorial:

- **Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva**

Al tercer trimestre el Gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto aprobado de L 9,563,896,694 , el cual se incrementó 5.6% alcanzado un presupuesto vigente de L 10,131,495,330.00, y una ejecución presupuestaria de L 5,502,587,156.66 (54%) según SIAFI

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 69.03% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China, un 24.10% por Fondos Nacionales y un 6.87% perteneciente a Donaciones.

El 98% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por la INSEP, mientras que los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (86%) y HONDUTEL (14%).

### **Principales Metas Ejecutadas al III Trimestre, 2018**

#### **Programa de Integración Vial (BID 2470/BL-HO-1):**

Se tienen avances considerables en el inicio de las obras de tres tramos del Corredor:

El tramo Júcaro Galán - El Amatillo (41.32 Km): Lote A Júcaro Galán – Desvío El Tránsito (Astaldi) presenta una ejecución física del 100% (20.68 Km finalizados), el Lote B Desvío el Tránsito – El Amatillo (Prodecon) presenta una ejecución física del 100% (20.64 Km finalizados).

El tramo Júcaro Galán – Choluteca (56.07 Km): el Lote A Júcaro Galán – Santa Elena (Astaldi) presenta una ejecución física del 95.74% (35.82 Km finalizados), el Lote B Santa Elena – Choluteca (Prodecon) presenta una ejecución física del 100% (20.25 Km finalizados).

En el Lote B está pendiente únicamente la finalización de los trabajos de pintura horizontal y la reparación de algunos hallazgos de calidad como la reparación de cabezales de alcantarillas, cabezales de acceso, puentes peatonales, bahías de buses y enchape de cunetas.

El tramo Choluteca – Guasaule (41.71 km), el Lote A Choluteca - Desvío San Bernardo (ETERNA) presenta una ejecución física del 76.85%, y Lote B Desvío San Bernardo – Guasaule (Santos & Cía) presenta una ejecución física del 58.39%.

En el Lote A se reporta una ejecución por encima de lo programado. En el Lote B también se ha ejecutado por encima de lo programado, se trabaja en la colocación de ambas carpetas asfálticas y el reciclado y estabilización con cemento de estructura existente.

#### **Programa de Integración Vial Regional II (BID-3815/BL-HO):**

Las obras dieron inicio en el mes de abril; no obstante, una vez que la supervisión revisó el diseño original determinó que era necesario hacer ajustes para mejorar la geometría especialmente en los retornos, lo que requirió de un esfuerzo adicional del equipo de supervisión y la necesidad de adquirir tierra adicional para implementar los retornos con una geometría segura para los vehículos pesados, esto provocó que se debieran recalcular las cantidades de obra y gestionar modificaciones a los contratos, lo que incidió en el logro de la ejecución financiera y física programada del periodo. No obstante, en el mes de septiembre se firmaron las modificaciones correspondientes y se espera que el nivel de avance físico mejore sustancialmente en los próximos meses. El avance físico al

30 de septiembre es el siguiente: Lote A "La Barca-Inicio Libramiento Pimienta"- 7.04%, Lote B" Inicio Libramiento Pimienta"- 24.01 %.

### **Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - Jícara Galán**

A la fecha, los avances son los siguientes: Jícara Galán - La Venta del Sur 100% (37.86 km finalizados), La Venta del Sur - Cerro de Hula 100% (32.16 km finalizados), La Esperanza - Camasca 100% (62.5 km finalizados), restando únicamente actividades vinculadas al cierre técnico y financiero de los contratos de obra y supervisión.

Con respecto a los tramos Jícara Galán - La Venta del Sur y La Venta del Sur - Cerro de Hula, para definir la estimación de cierre de dichos contratos de obra fue necesario el dictamen del Dispute Adjudication Board (DAB), el cual se activó durante el trimestre. La determinación se extenderá en el mes de octubre, con lo que se espera avanzar en las modificaciones contractuales de cierre para realizar los pagos finales en noviembre.

### **Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, (Fondos Nacionales) con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros":**

El proyecto inició su ejecución en el año 2013 ejecutando hasta el 2016 donde se suspendió debido a la falta de recursos presupuestario. Durante dicho tiempo de ejecución se logró finalizar 6.5 kilómetros de una longitud total de 8.93 km.

Para el Tercer Trimestre del presente año la INSEP contaba con la documentación necesaria para poder realizar las modificaciones a los contratos para poder otorgar a finales de septiembre e inicios de octubre la orden de re-inicio del proyecto y ejecutar los L 26.8 millones del presupuesto vigente. Sin embargo la INSEP realizó modificaciones presupuestarias en sus proyectos afectando al proyecto de la referencia, reduciendo el presupuesto del mismo por lo que la Unidad Ejecutora de la Dirección de Carreteras ha manifestado que se postergará la fecha de re-inicio del proyecto lo que provocara realizar una nueva solicitud de enmienda para poder aumentar el plazo de ejecución del proyecto.

### **Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas (Fondos Nacionales):**

El Proyecto se encuentra en ejecución a partir de la Orden de Reinicio el 20 de junio del 2016. Al tercer trimestre del 2018 el Contratista ha realizado trabajos de colocación de pavimento con doble tratamiento, construcción de filtros, construcción de muros de gaviones. De igual manera ha realizado actividades en el área urbana con la construcción de aceras, construcción con concreto hidráulico entre otras.

En fecha 31/07/2018 se emite la Enmienda a la Nota de Prioridad del proyecto de la referencia la Cual incrementa el costo total del proyecto de L 212.89 millones a L 439.03 millones dicho incremento es para la construcción de 3 puentes lo que incrementa simultáneamente los Costos de las Empresas Supervisora y Constructora. De igual forma la Enmienda también contempla la ampliación de tiempo de ejecución del proyecto para la empresa constructora a 18 meses y a la empresa Supervisora a 19 meses y otras



actividades que incrementan el costo total actual del proyecto así como los tiempos de ejecución

**Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copan y La Entrada- El Florido (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566 y TA2015034 HN LIF ):** El Proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico en el TRAMO 1 SANTA ROSA – LA ENTRADA (45.80km) del 15.21%, TRAMO 2 LA ENTRADA – LOS RANCHOS (36.18 km) con una ejecución física del 50%, TRAMO 3 LOS RANCHOS – EL FLORIDO (36.36 km) con un 21.0% de avance físico.

Actualmente la Unidad de Ejecutora de la INSEP ha presentado la solicitud de identificación presupuestaria a la SEFFIN. Lo anterior debido a que las empresas constructoras a finales del tercer trimestre iniciaron a presentar estimaciones mayores a lo planificado, lo que es indicativo de que las empresas constructoras han mejorado sus esfuerzos para incrementar la ejecución del proyecto y así reducir los retrasos para poder finalizar la obra de acuerdo a lo estipulado en los tiempos contractuales.

**Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (BID 3103/BL-HO):** Durante el trimestre continuo el proceso de adquisiciones de la obra, mediante oficio UCP-469-VIII-2018 de fecha 22 de agosto de 2018 se remitió al BID el Informe de Evaluación de Ofertas, el BID mediante CID/CHO/1151/2018 de fecha 06 de septiembre de 2018 otorgó la No Objeción, por lo que se realizó la adjudicación del Contrato a la Empresa “Construcciones Midence, S de RL de CV” el 07 de septiembre de 2018, y finalmente el 26 de septiembre de 2018 se realizó la suscripción del contrato, se espera en el mes de octubre emitir la orden de inicio de la obra.

Recepción de Vehículos Nuevos, 6 Tipo Pick Up, Doble Cabina, Doble Tracción 4x4, Motor Diesel para la Transmisión ENEE. b) Suscripción del Contrato de la Obra para el Mejoramiento del Centro Nacional de Despacho. c) Informe de Auditoría Financiera del I semestre de 2018 con opinión limpia. d) Finalización de la consultoría planificación y monitoreo de operaciones.

**Proyecto Hidroeléctrico Patuca III (Piedras Amarillas) Fase II (ICBC-CHINA A/ E No. 268):**

El Proyecto está en su fase de finalización, se dio una ampliación de tiempo hasta el 20 de junio del 2019 ya que se tienen que realizar las pruebas de la generación, así mismo que se inunde la zona de la represa.

Se estarán realizando obras adicionales como la carretera de acceso y puentes para que no quede incomunicado la zona de PATUCA.

**Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

En seguimiento del proceso de adquisición el 05 de julio de 2018 se realizó la publicación del proceso de licitación misma que establece la fecha de presentación de ofertas al 05 de septiembre de 2018, sin embargo a solicitud de

oferentes se emitió la Enmienda 3 la cual establece que la fecha de presentación de ofertas se realizará el 18 de octubre de 2018.

En seguimiento del proceso de adquisición el Contrato fue suscrito el 26 de julio de 2018, el contrato vence el 22 de noviembre de 2018. Se prevé realizar la recepción de los vehículos en el mes de octubre de 2018.

En seguimiento del Proceso de adquisición el 20 de julio de 2018 se realizó la publicación del aviso de concurso para la consultoría, la recepción de hojas de vida tuvo fecha límite el 17 de agosto de 2018, por lo que ese mismo día se suscribió el Acta de Recepción de Hojas de Vida. El comité de evaluación procedió a la realizar la evaluación de las hojas de vida y el 29 de agosto de 2018 mediante oficio UCP-498-VIII-2018 se remitió el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación al BID, el BID mediante CID/CHO/1206/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018 otorgó la No Objeción. Se estima que los contratos sean suscritos los primeros días del mes de octubre de 2018.

- **Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social:**

Este Gabinete lo conforman ocho (8) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, SEDIS, SANAA, FHIS, PRONADERS, UPNFM, UNA las cuales ejecutan 28 programas y proyectos de inversión pública.

Para el Tercer Trimestre, el Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social tiene un presupuesto vigente de L. 2,161,776,955, logrando ejecutar a nivel de devengado anual L. 944,778,983.64 equivalente el 28% respecto al presupuesto vigente respectivamente y un nivel de comprometido del 44%

Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos según la Unidad Ejecutora:

**Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente (BID 3723/BL-HO):**

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza, el 26 de julio del presente año se suscribió un Contrato de Servicios entre la Sub Secretaría de Integración Social SSIS y Fundación Capital, para la ejecución del Proyecto de Inclusión Productiva "Emprendiendo una Vida Mejor", cuyo objetivo primordial es acompañar el fortalecimiento de las habilidades y destrezas de las participantes del Programa Bono Vida Mejor (PBVM), de manera que no solo cuenten con un sistema de protección básico, sino que comiencen andar en una senda de desarrollo hacia la inclusión productiva, y así aumentar su resiliencia, autoestima, capacidad de generación de ingresos y mejoren sus condiciones de vida; en el mes de julio se suscribió el contrato entre la SSIS y Fundación Capital. La cobertura geográfica a considerar para el proyecto Emprendiendo una Vida Mejor es en 18 municipios distribuidos en los departamentos: Copán (2,501), Lempira (3,579) y El Paraíso (10,714). Este proyecto piloto de superación de pobreza extrema está dirigido fundamentalmente a aquellos hogares que por la edad de sus hijos están próximos a salir

del PBVM, por ende dejarán de recibir un apoyo al ingreso sin contar con una estrategia a corto plazo que les permita mejorar su estándar de vida.

En el Componente de la SESAL, se lograron avances acumulados en los siguientes sub componentes:

Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 9 gestores de primer nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Plan Internacional, Hombre a Hombre, MANCOMUNIDAD DEL SOL, Asociación Nueva Vida, MAMBOCAURE, Belén de Gualcho, Lepaera, Mancomunidad de Municipios del Sur del Depto. de la Paz por un monto de L57,627,522.36

Sub componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Se pagó la prestación de servicios de salud a 7 gestores de segundo nivel (Organización Predicar y Sanar (PREDISAN), Comité Apoyo Hospital de Occidente, Comité de Apoyo Hospital San Marcos de Ocotepeque, Fundación Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, Fundación Gestora de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato, Comité de Apoyo Hospital del Sur, Comité de Apoyo Hospital Roberto SuazoCórdoba) por un monto de L5,991,319.13.

Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: Se Pagaron consultorías y asistencias técnicas, para el fortalecimiento de hospitales, de la SESAL y Unidad Ejecutora por un monto de L4,909,199.3, tales como: asistencia técnica en gestión Hospitalaria para la implementación de procesos a los Hospitales, para atender compromisos establecidos en los convenios de gestión que se suscriben con organizaciones de la sociedad civil (gestores), a través de la implementación del Modelo de Gestión Hospitalaria en la red de segundo nivel de atención. Adquisición de Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental por un monto de L522,560.00.

**Hospital María de Especialidades Pediátricas (ITALIA-HOS/MARIA):**

Los recursos asignados fueron trasladados a otros proyectos a solicitud de la SESAL, debido a que se tiene pendiente la No objeción a las bases para la Licitación Pública Internacional de los últimos lotes para la Unidad quemados por parte del organismo financiador Artigiancasa (Italia). Asimismo, continúa pendiente la entrega de los últimos equipos por parte de la empresa Italiana AGMIN

**Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca (EDCF No. HND-4):**

Presenta una ejecución financiera al tercer trimestre únicamente de fondos nacionales por la cantidad de L299,859.41 representando el 1% respecto al presupuesto vigente (L31,973,789), lo ejecutado a la fecha corresponde a viáticos de giras realizadas a Choluteca y pagos a Consultores contratados para el proyecto. Respecto al diseño para la construcción del Hospital la empresa Mac/Mirae encargada de elaborar el mismo inició en el mes de julio y concluirá en el mes de enero del 2019, en el mes de septiembre se recibió el primer producto que consiste en el diseño conceptual, y en el mes de octubre se recibirá el segundo producto que contiene el diseño esquemático del nuevo Hospital del Sur.

Referente a las obras que incluyen muro de contención, alcantarillado, construcción de pozos, conexión eléctrica y agua potable financiadas con los fondos nacionales, se realizó la licitación y está por efectuarse la adjudicación de la empresa, las obras iniciaran a finales del mes de octubre del 2018. Asimismo, se hará un nuevo estudio de suelos en virtud de los acontecimientos climatológicos sucedidos durante los últimos tres años, que

indique el porcentaje de movimiento de terreno como requisito solicitado por la empresa Mac/Mirae.

### **Programa de Apoyo al Sistema Protección Social (BID-3371/BL-HO):**

En el tercer trimestre 2018, en el componente de Transferencias Monetarias Condicionadas, se beneficiaron a 151,404 hogares con una inversión de L304,778,085.00 que representa el 94% de lo programado financieramente; mediante la cual se cubrieron 4 meses de cumplimiento de corresponsabilidad, según detalle por departamento: Choluteca 18,001 hogares, Copan 10,064 hogares, El Paraíso 17,445 hogares, Francisco Morazán 13,737 hogares, Intibucá 18,491 hogares, La Paz 14,788 hogares, Lempira 28,570 hogares, Ocotepeque 5,951 hogares, Santa Bárbara 16,227 hogares y Valle 8,130 hogares. Asimismo, se realizó la transferencia de fondos al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), con el objetivo de iniciar la segunda entrega de Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del año 2018; mediante la cual se ha programado beneficiar a 44,290 hogares; según detalle por departamento: Choluteca 17,033 hogares, Copan 2,388 hogares, Lempira 19,345 hogares, y Ocotepeque 5,524 hogares con una inversión programada de L90,275,605.00. Se realizó el pago de la comisión bancaria contra presentación de la liquidación de los hogares beneficiados a través de la primera entrega de TMC del año 2018

### **Proyecto Municipios Más Seguros (BM 5192-HN)**

Proyectos en Ejecución:

- Construcción Plaza Recreativa El Mirador, proyecto ejecutado en un 80% de avance físico.
- Construcción de Cunetas, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, proyecto ejecutado en un 95% de avance físico.

*Subproyectos:*

- Construcción Kinder Colonia INFOP, Municipio de Choloma, Departamento de Cortés, proyecto ejecutado en un 70% de avance físico.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia PALERMO, Municipio de El Progreso, Yoro, proyecto ejecutado en un 50% de avance físico.
- Construcción Centro Integral Mi Comunidad Colonia FATIMA, Municipio de El Progreso, Yoro, Modalidad de ejecución con mano de obra de la Alcaldía de El Progreso.

### **Con el Financiamiento Adicional Proyecto de Infraestructura Rural (PIR) 5289-HN,**

En el sector de Caminos Rurales, se encuentra en ejecución un (1) subproyectos de rehabilitación de caminos y dos (2) en proceso de rescisión de contrato. Los contratos en proceso de rescisión corresponden a los tramos Aldea Bella Vista (105610) y Joya del Quebracho – Guarabuqui (105611), ambos del Municipio de Orica, Francisco Morazán. La Mancomunidad MANOFM como administrador de los contratos, el 25 de junio del 2018, la Junta Directiva determinó proceder a la rescisión de los contratos, considerando, entre otras causas, que el Contratista suspendió las obras sin autorización de la Supervisión por más tiempo del permitido en el contrato. Durante el mes de septiembre, se iniciaron las obras de rehabilitación del tramo La Puerta San Buenaventura, en el Municipio de San Andrés, Lempira (105601) presentando un avance del 2%. Adicional a los contratos antes

mencionados, se inició también la rescisión del contrato de obra del subproyecto Rehabilitación de Caminos Rurales El Roble-Susuma, con modalidad Centralizado. Se notificó al apoderado legal de IDECA, en fecha 11 de Junio del 2018, y se le otorgaron de 10 a 20 días para que presente medio probatorios, derecho conferido según el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

En el sector de Electrificación Rural por extensión de red, se encuentra en ejecución el subproyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las Comunidades El Pedernal y Susuma, del Municipio de Camasca, Intibucá. Actualmente, todos los postes del sistema se encuentran hincados. El detalle del avance del subproyecto del sector Electrificación

En el sector de Agua y Saneamiento, actualmente se encuentran en ejecución cuatro (4) subproyectos: dos corresponden a construcción de nuevos sistemas de Alcantarillado Sanitario y uno a ampliación de sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento; además de la ampliación de un sistema de Agua Potable y Saneamiento.

- **Gabinete Sectorial de la Prevención**

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2018 está integrado por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación, con un presupuesto vigente de L94,143,672, cantidad que representa el 0.68% del total del Programa de Inversión Pública vigente (L13,822,511,843), la ejecución financiera de Gabinete al Tercer Trimestre es de L43,245,177, equivalente al 46% del presupuesto vigente, a nivel de compromiso alcanza un 79% (L74,000,846), respecto a su presupuesto vigente.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de tres (3) proyectos:

**Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO) (2152/BL-HO):**

Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

Al tercer trimestre el Programa ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el mes de agosto de 2018.

**Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):** El avance físico obtenido al tercer trimestre del 2018 ha sido muy importante, lográndose comprometer muchas de las actividades reflejadas en el POA del proyecto. Dichas actividades culminarán en el último trimestre del año. A la fecha se presentan los siguientes avances:

a) Obras: 6 en proceso de construcción, estimando la culminación de 5 de ellas en el presente año y una obra en el municipio de Villanueva, Cortés en febrero de 2019.

*Las obras estructurales a finalizar este año son:*

Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Helado y Puente Colgante para Reducir el Riesgo en la Aldea Buenos Aires - La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.

Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal, Poder Ciudadano 1, y Callejas Maradiaga, para Reducción del Riesgo en el municipio de Potrerillos, Cortés.

Construcción de Caja Puente sobre río Naco para Reducción del Riesgo en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.

Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Chiquito y Canalización de Aguas Pluviales en Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés.

Construcción de caja puente triple sobre la quebrada Chasnigua en sector El Sauce para Reducción del Riesgo en el municipio de Villanueva, Cortés.

b) Bienes: Equipo de cómputo para la UCP, Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) en proceso de recepción y para el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO en proceso de adquisición en un 50%.

c) Consultorías: 19 Planes de adecuación, 20 Auditorías Sociales y 1 Auditoría externa en un 100%; 2 planes de intervención con población autóctona con avance en un 30%.

d) Servicios de No Consultoría: Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y

e) Capacitaciones: Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.

### **Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras (ATN/OC-16177-HO):**

Se hicieron las gestiones necesarias para la incorporación de espacio fiscal de fondos de la Donación ATN/OC-116177-HO, por un monto de L3,453,755.00 proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el primer desembolso se realizó el tercer trimestre por valor de US\$80,020; por lo que la ejecución de actividades del proyecto iniciara en el último trimestre de 2018.

- **Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica**

Para el año 2018, el Gabinete Sectorial de Conducción y Regulación Económica contó con un presupuesto en el Programa de Inversión Pública Aprobado de L.212,366,276, mismo que al término del tercer trimestre, tuvo una disminución presupuestaria del 42.3% (L.89,892,290), producto de la aplicación de la Nota Técnica No. 08 para el traslado presupuestario entre Instituciones de la Administración Central, con el fin de mantener el equilibrio y control del déficit fiscal.

El Gabinete Sectorial, en el marco del Programa de Inversión Pública (PIP) para el presente año únicamente cuenta con la participación de la Secretaría de Finanzas, misma que agrupa la ejecución de 7 proyectos; 3 orientados a la Inversión de Capital Humano (real) y 4 con orientación a la Inversión en Desarrollo Humano en relación a las

Asistencias Técnicas y la competitividad; al término del III Trimestre del 2018 el Programa de Inversión del Gabinete logró una ejecución del 49% (L.59,658,5486) en relación al presupuesto vigente

**Proyecto Manejo Sostenible de Bosques,(BID 3878/BL-HO):**

Está en proceso de contratación de la consultoría del Diseño del Programa de Incentivos, en el marco de los incentivos orientados a bosques privados. • Se realizará una compra de equipo para protección, seguridad y prevención de incendios para las organizaciones beneficiarias. • Se han adquirido equipo de infotecnología para el Departamento de Sanidad Forestal del ICF y se han iniciado los procesos de adquisición del equipo e insumos de laboratorios en el marco del Sistema de Alerta Temprano. • Se ha finalizado los procesos de compra de vehículos y equipo de infotecnología para el SAT. • Se ha finalizado el proceso de contratación de 5 técnicos en monitoreo en el marco del seguimiento y supervisión de ICF al trabajo de la firma especializada contratada. • Se han elaborado los borradores de Convenio Marco de Cooperación entre SEFIN, ICF y UNACIFOR para el desarrollo de los siguientes temas: diagnóstico e identificación de temas de investigación, diseño de un programa de capacitación, diagnóstico del banco de germoplasma existentes, facilitación de equipo e insumos de laboratorio y desarrollo de un diplomado en sanidad y salud forestal. • Están en ejecución 2 asesorías técnicas (recontratadas) en apoyo al funcionamiento del mecanismo financiero a través del fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus, de las cuales se obtendrá la Estrategia de Movilización

**Proyecto de Competitividad Rural en Honduras – COMRURAL (IDA-4465**

En la actualidad el proyecto se encuentra en fase de cierre. El proceso para la Auditoría Financiera y Operativa se encuentra en revisión intermedia del año 2018. alquileres de oficinas del Proyecto, Seguridad y seguros de Automóviles y médico del personal del Proyecto, compromiso de pago de aproximadamente el 50% del servicio de Auditoría que se encuentra en proceso de revisión hasta el cierre del Proyecto 31 de Diciembre 2018 como también el cierre de Planes de negocio de las OPR.

Para el año 2018, se han programado las siguientes metas: 6 informes de Administración y apoyo financiero para la restauración de bosques por la plaga del gorgojo (0% avance). 24 informes de Administración y apoyo financiero para el fortalecimiento del Sistema de Sanidad Forestal (14% avance). 4 informes de Administración y apoyo financiero para la mejora del acceso al financiamiento climático (0% avance). 1 informe de Auditoría y evaluación del Proyecto (0% avance).

- **Gabinete Sectorial Desarrollo Económico**

Al III Trimestre 2018 el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente de L.836,309,799.00 y un presupuesto Devengado Anual que asciende a L.345,990,900.00 (41%). Institucionalmente la ejecución por institución la que presente mayor ejecución a la fecha es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) con 87%, seguido por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) con 44% y finalmente la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con 31%.

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de

Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas y culturales.

**El Proyecto CLIFOR;** A la fecha el proyecto ha realizado la implementación de 10 Planes de Acción de microcuencas, al tercer trimestre se programó una meta de 6 planes, se ejecutaron los 6 planes, cumpliendo de la meta del trimestre del 100%.

Implementación de 6 nuevos proyectos productivos ejecutados con grupos de mujeres para mejorar su economía familiar, al tercer trimestre se programó 3 planes y se ejecutó los 3 planes, meta trimestral 100%, cumpliendo de la meta anual del 83%.

Implementación de 5 Sistemas de producción para la diversificación de cultivos implementándose en las comunidades sistemas agroforestales y silvopastoriles), al tercer trimestre se Programó 1 plan, se ejecutó 1 plan, cumpliendo la meta trimestral y anual del 100%.

**El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastrán;** firmó contrato con la Empresa APOLLO, que ejecutará las obras de sistema de riego por bombeo, contrato llave en mano.

El equipo que se utilizará para realizar las obras en el Valle de Jamastran, se encuentra en el puerto se ha presentado problemas para el desembarque de los mismos, lo que ha generado gastos por almacenamiento y multas las cuales deben ser cargadas al Proyecto.

La SAG no cuenta con suficiente documentación, información del Proyecto (convenios, comunicaciones oficiales, documentación del proceso de licitación llevado a cabo el cual fue adjudicado a la Empresa APOLLO), en ese sentido las autoridades de la SAG anunciaron públicamente una auditoria al Proyecto por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

El proyecto no cuenta con una Unidad Ejecutora, ni con el personal técnico especializado en el área de riego, que permita supervisar la ejecución del Proyecto en el área de influencia.

La Empresa Apollo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US\$.22.5 millones y se incrementó a US\$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.

Actualmente el Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego Valle de Jamastran se encuentra en un periodo de revisión, su ejecución está interrumpida, debido a que el Proyecto está siendo auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), se está a la espera de los resultados de la auditoría, para la toma de decisiones por parte de las autoridades de la SAG, para determinar la continuidad o no del mismo.

Asimismo las Autoridades de la SAG no harán ningún pronunciamiento sobre las comunicaciones realizadas por la Empresa Apollo, hasta contar con los resultados de la Auditoría.

A la fecha se han llevado a cabo reuniones en conjunto con presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP.

**El Proyecto Euro+Labor;** *En el Resultado 1:* Entrega del Informe del Marco de Acción Conjunta (MAC) se da cumplimiento a los indicadores del Resultado 1, queda al mes de agosto en su fase de cierre, en esta etapa del proceso.

*Resultado 2:* Se definió un marco de acción conjunta para abordar y resolver los problemas de empleo, sobre la base de un diálogo social fortalecido e inclusivo particularmente, en el marco del Consejo Económico y Social.



**Resultado 3:** Logro de los resultados planteados en las actividades multianuales y las actividades según los Términos de Referencia, cabe mencionar que a la fecha se ha dado acompañamiento y seguimiento a todas las acciones correspondientes a los procesos de iniciación de los Contratos de las Subvenciones y Contrato de Servicios de Asistencia Técnica de EURECNA.

**Resultado 4:** Desarrolló de una propuesta conceptual para la redefinición del sistema de información operado por el observatorio del mercado laboral (OML), con el fin de ampliar su alcance y considerando el marco de acción conjunta.

Sistema Integrado de Información/Coordinación del Programa, Fortalecimiento Institucional del Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras (EURO+LABOR) entre el Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco Central de Honduras (BCH), la Dirección Ejecutiva de Ingresos DEI, INFOP, IHSS integradas en el Centro Estadístico de Información (CENIS) y municipalidades.

Apoyo técnico para la operación del sistema de información con el fin de hacer frente a las necesidades de información, para la toma de decisiones con respecto al empleo decente.


- **Entes sin Adscripción a Un Gabinete**

### **Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria (BID-3541/BL-HO):**

La Consultoría de Reingeniería de los Procesos del SAR, se está desarrollando según lo programado, fue necesario realizar una enmienda al contrato ya que se eliminaron 2 productos que no se requerirán debido a que el SAR tomó la decisión de una solución tecnológica de desarrollo a la medida, con una empresa implementadora con un paquete ya existente en el mercado, provocando retraso en 1 pago el cual se harán en el siguiente trimestre. - Se continúa a la espera del permiso de construcción por parte de la Alcaldía de San Pedro Sula, para realizar las Obras de Remodelación Edificio Tributario. - A la espera de la respuesta de las notas enviadas a la Secretaría de Desarrollo Económico, para que el SAR sea determinada como una sola Autoridad Nacional en temas de firma electrónica, se tiene contrato firmado que está pendiente de dicha respuesta para poder concluir con la implementación de equipo que fueron entregados desde el primer trimestre del año. Para el año 2018 se han programado las siguientes metas: - Llevar a cabo 2 procesos para la Reingeniería de los procesos de la administración tributaria (0% Avance). - En relación al Fortalecimiento del talento humano del SAR, se espera realizar 1 capacitación (0% Avance). - Con respecto a la Modernización de los sistemas y de la infraestructura tecnológica del SAR, se pretende iniciar el proceso de contratación para el segundo semestre del año (1 Sistema, 0% Avance).

### **1.4 Financiamiento de la Inversión Pública Año 2018**

En cuanto al financiamiento del presupuesto vigente de la Inversión Pública al III Trimestre del 2018, el 57.8% del Gran Total es financiado por fuentes nacionales (distribuido Vida Mejor con 29.8%, APP 51.80% el resto 18.4 de proyectos con fondos nacionales), el 42.2% por fondos externos; de estos el 87.1% es financiado por crédito externo (fuente 21) y el 12.9% por donaciones (fuente 22 y 28).

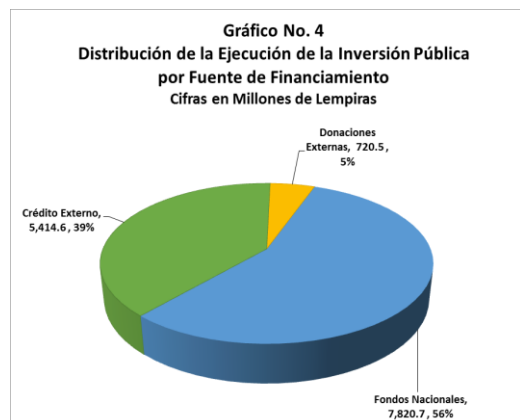

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa que la mayor parte de los recursos ejecutados en el trimestre reportan los fondos nacionales con un porcentaje de ejecución del 56% en su conjunto (incluye Fideicomiso Vida Mejor y APP; el restante fondos de crédito (fuente 21) reporta una ejecución del 39% y la fuente 22 y 28 reporta el restante 5% totalizando en crédito externo un total de 44% del total de la ejecución presupuestaria.

**Cuadro No.3**  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL III TRIMESTRE 2018**  
 Cifras en Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente Ajustado	Devengado Aprobado	% Ejecución (Dev./Vigente)
<b>Fondos Nacionales</b>	<b>2,609,199,647</b>	<b>2,758,126,757</b>	<b>977,002,510</b>	<b>35</b>
11 - Tesoro Nacional	1,614,932,081	1,763,859,191	825,797,714	47
12 - Recursos Propios	994,267,566	994,267,566	151,204,796	15
<b>Fondos Externos</b>	<b>10,707,843,874</b>	<b>11,001,652,286</b>	<b>6,135,151,100</b>	<b>56</b>
21 - Crédito Externo	9,232,741,461	9,589,378,709	5,414,622,704	56
22 - Donaciones Externas	1,344,900,901	1,292,072,065	664,907,088	51
28 - Cuenta del Milenio	130,201,512	120,201,512	55,621,308	46
<b>Total PIP</b>	<b>13,317,043,521</b>	<b>13,759,779,043</b>	<b>7,112,153,610</b>	<b>51</b>
Resumen de Proyectos APP	7,816,000,000	7,816,000,000	3,785,170,322	48
Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500,000,000	4,500,000,000	3,058,500,000	68
<b>Total APP y Vida Mejor</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>12,316,000,000</b>	<b>6,843,670,322</b>	<b>56</b>
<b>Gran Total</b>	<b>25,633,043,521</b>	<b>26,075,779,043</b>	<b>13,955,823,932</b>	<b>54</b>

*Fuente:* SIAFI, Superintendencia de Asociaciones Público Privadas

En relación a los fondos nacionales, las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destaca la INSEP, ENEE, SEDIS y HONDUTEL orientado a la construcción de carreteras, Fideicomiso Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, con Chamba Vivís mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, CONVIVIENDA, Microempresas Huertos familiares), Proyectos de Electrificación y Fibra Óptica.

En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Año 2018, en sus Artículo 23, que literalmente expresa que; "Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones o préstamos previamente aprobados por el Poder Legislativo, el Formulario (FMP-05) denominado "Documento de Modificación Presupuestaria" generado por el SIAFI, hará las veces de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.

En el caso de los recursos de financiamiento externo, que requieran incorporación presupuestaria deberán contar previamente con el Dictamen Favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, SEFIN."

Para el tercer Trimestre del 2018 se recibieron solicitudes de incorporación de fondos externos, mismos que han sido atendidos en conformidad a lo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal realizando traslados entre instituciones a través de Notas Técnicas haciendo de esta manera una Inversión Pública más eficiente.

## 1.5 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, año 2018

Durante la ejecución de la inversión pública al III Trimestre, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.
Administrativa-Financiera	Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escasos. Refleja debilidad en la sistematización de procesos operativos y administrativos, así como la recopilación de experiencias aprendidas por parte de las Unidades Ejecutoras Institucionales de cada proyecto.	Mejorar los equipos y sistemas de cómputo e incrementar el mantenimiento preventivo. Fortalecer sistemas de almacenamiento de información y aplicar experiencias aprendidas de proyectos anteriores.
	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.
	El proceso de cumplimiento de condiciones para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable, la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos. Mayor agilidad en el CN para la aprobación de dichos financiamientos
	Baja capacidad institucional, desconocimiento de procesos y lentitud en procesos de Contratación, por la duplicidad de funciones en las UAP'S de Proyectos.	Mejorar la atención a las gestiones de financiamiento de proyectos. Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo de caja y un fondo reintegrable

Área	Problemas	Acciones
Legal	<p>Retrasos en la formalización de contratos de obras y de personal de Proyectos y agilización de procesos de contratación de personal externo a las mismas.</p> <p>Tardanza en la reactivación de la ejecución de carteras de Proyectos que pasan de una institución a otra debido a procesos legales</p>	<p>Agilidad del por parte de las máximas autoridades de las instituciones a fin de no atrasar los procesos.</p>
