



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Gabinete de Infraestructura Productiva*

Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Julio, 2019

## 2 Análisis Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva

### 2.1 Programa de Inversión Pública Sectorial

Al segundo trimestre el Gabinete de Infraestructura Productiva cuenta con un presupuesto vigente de L 8,402,701,331, y una ejecución presupuestaria de L 1,170,973,378 (14%) según SIAFI.

Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al II Trimestre, 2019  
Cifras en Lempiras

Institución	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
<b>Total general</b>	<b>7,846,243,400.00</b>	<b>7,841,403,176.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,841,403,176.00</b>	<b>2,754,546,572.93</b>	<b>35%</b>
0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social	461,171,413.00	377,362,063.00	0.00	377,362,063.00	97,546,925.97	26%
0031 - Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras	4,054,283,330.00	4,045,528,989.00	0.00	4,045,528,989.00	1,791,330,228.43	44%
0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos	2,340,919,132.00	2,428,642,599.00	0.00	2,428,642,599.00	703,074,947.87	29%
0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	66,837,792.00	66,837,792.00	0.00	66,837,792.00	7,052,849.39	11%
0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica	844,592,557.00	844,592,557.00	0.00	844,592,557.00	155,541,621.27	18%
0804 - Empresa Hondureña de Telecomunicaciones	78,439,176.00	78,439,176.00	0.00	78,439,176.00	0.00	0%


### 2.2 Financiamiento de la Inversión Sectorial

La inversión del Gabinete Sectorial es financiada en un 81% por Fondos Externos provenientes de organismos multilaterales como BCIE, BID, BM, OFID y Gobiernos de países amigos como China, un 10% por Fondos Nacionales y un 9% perteneciente a Donaciones.

El 91% de los recursos del Tesoro Nacional son ejecutados por la INSEP, mientras que los recursos propios en su totalidad son ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) (38%) y HONDUTEL (62%).

En cuanto a los Fondos Externos, mayormente son ejecutados por la INVEST-H con el 57%, el restante 43% es ejecutado por la INSEP con un 27% y la ENEE con un 12% de participación, el Fondo Hondureño de Inversión Social y Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible con un 3% y 1% respectivamente.

Gráfico No.2  
Gabinete Sectorial de Infraestructura Productiva  
Participación Institucional del PIP  
al II Trimestre, 2019

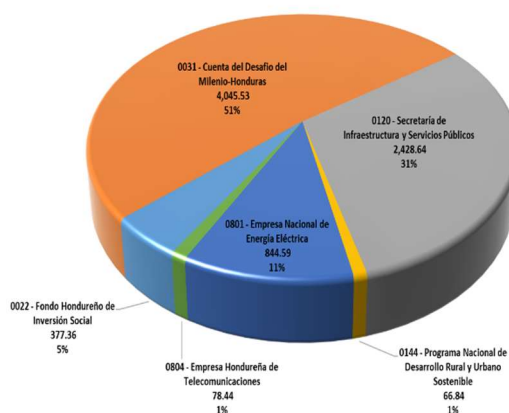

Durante el segundo trimestre el Gabinete alcanzó una ejecución del 35% (L 2,637,606,326.33) de sus Fondos Externos y el 15% (L 116,940,246.60) de Fondos Nacionales.

Gabinete Sectorial Infraestructura Productiva al II Trimestre, 2019

Cifras en Lempiras

FUENTE	Aprobado	Vigente	Congelamiento	Vigente Ajustado	Devengado	% Ejecución (Devengado/Vigente Ajustado)
<b>1 - Fuentes De Financiamiento Internas</b>	<b>563,284,625.00</b>	<b>799,337,605.00</b>	-	<b>799,337,605.00</b>	<b>116,940,246.60</b>	<b>15%</b>
11 - Tesoro Nacional	436,545,449.00	672,598,429.00	-	672,598,429.00	115,534,474.50	17%
12 - Recursos Propios	126,739,176.00	126,739,176.00	-	126,739,176.00	1,405,772.10	1%
13 - Crédito Interno	-	-	-	-	-	-
<b>2 - Fuentes De Financiamiento Externas</b>	<b>7,282,958,775.00</b>	<b>7,042,065,571.00</b>	-	<b>7,042,065,571.00</b>	<b>2,637,606,326.33</b>	<b>37%</b>
21 - Crédito Externo	6,362,638,200.00	6,362,638,200.00	-	6,362,638,200.00	2,314,498,393.08	36%
22 - Donaciones Externas	886,781,740.00	629,475,708.00	-	629,475,708.00	291,190,909.84	46%
28 - Cuenta del Milenio	33,538,835.00	49,951,663.00	-	49,951,663.00	31,917,023.41	64%
<b>Total general</b>	<b>7,846,243,400.00</b>	<b>7,841,403,176.00</b>	-	<b>7,841,403,176.00</b>	<b>2,754,546,572.93</b>	<b>35%</b>

### 2.3 Metas Realizadas

Al II trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

#### Proyectos ejecutados por LA Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras

- **Programa de Integración Vial:** Se tienen avances considerables en el II trimestre de las obras de tres tramos del Corredor:

Se avanza en la construcción del tramo 3 “Choluteca – Guasaule” (41.7 km). El avance físico al 30 de junio para cada Lote del tramo 3 es el siguiente: Lote A 99.9% y Lote B 86.82%. Se tiene previsto la finalización de ambos lotes en los meses de julio y agosto 2019, respectivamente.

Durante la implementación del proyecto se identificó la necesidad de reparar un puente y de construir tres puentes que se encontraban en mal estado a lo largo del tramo. Esta situación provocó la firma en el mes de febrero de la modificación No. 2 a los contratos de obra, ampliando dichos contratos en alcance, monto y tiempo, desfasando la finalización de las obras del lote A para el mes de julio y el lote B para el mes de agosto. Todo lo anterior afectó directamente el logro del avance físico del período.

Durante el segundo trimestre de 2019, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) dieron mantenimiento en una longitud de 180 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca.

**Programa de Integración Vial Regional II:** El avance físico acumulado al periodo del II trimestre en el mes junio es el siguiente: Lote A: La Barca – Potrerillos 54.07%, Lote B: Potrerillos – Pimienta 75.32%.

- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación de la Carretera CA-5 Sur: Tegucigalpa - Júcaro Galán:** Durante el semestre se realizaron los pagos finales para las firmas supervisoras de los Tramos “Júcaro Galán-La Venta del Sur” y “La

Venta del Sur-Cerro de Hula”; así como el pago final para la firma constructora del Tramo “La Venta del Sur-Cerro de Hula”, correspondiente a la estimación de cierre.

Asimismo, se encuentran en análisis del DAB (Dispute Adjudication Board) reclamos interpuestos por el contratista del tramo La Esperanza – Camasca, los que se irán resolviendo durante 2019; en caso de ser necesario, requerirá incorporar el presupuesto para hacer frente a las obligaciones de pago que se deriven de las determinaciones del DAB y realizar el cierre financiero de ese tramo.

#### **Proyectos ejecutados por INSEP:**

- **Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en El Departamento de Lempira.** Al segundo trimestre el proyecto se encuentra en ejecución con un buen ritmo de ejecución física teniendo un 20% de ejecución acumulada donde se han realizado las actividades excavación, colocación de alcantarillas, perfilado de taludes entre otras.

Actualmente el proyecto presenta una ejecución financiera acumulada del 29%.

- **Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas:** El Proyecto se encuentra en desarrollo a la fecha cuenta con una ejecución física acumulada del 94.02% y una ejecución financiera acumulada el 86%.

Durante el segundo trimestre la Unidad ejecutora realizó la solicitud de Dictamen de Fecha de Ampliación de cierre al proyecto debido al aumento en las cantidades de obras las cuales serán ejecutadas en un periodo de 6 meses. Por lo anterior y considerando el análisis para el aumento de las cantidades de obra la Unidad Ejecutora del Proyecto de igual manera solicitó el Dictamen de Transferencia Entre Categorías de Inversión y así cubrir los costos incrementados del componente de construcción.

- **Rehabilitación del Corredor de Occidente Tramos la Entrada-Santa Rosa de Copan y La Entrada- El Florido:** el proyecto se encuentra conformado por tres lotes de los cuales a continuación se detallan los principales avances:

#### **Lote1 La Entrada- Santa Rosa (45.80km)**

al segundo trimestre la ejecución financiera acumulada presenta un 86.34% respecto al monto de inversión US\$ 37.3 millones. Sin embargo el porcentaje de avance físico de las actividades ejecutadas es de un 89.0 %,

#### **Lote2 La entrada – Los Ranchos (36.18 km)**

) la ejecución financiera acumulada presenta un 95.97% respecto al monto de inversión US\$ 37.9millones. En cuanto al porcentaje de avance físico de las actividades realizadas el mismo asciende un 95.97 %.

**Lote 3 Los Ranchos- El Florido (36.36 km)**

La ejecución financiera acumulada presenta un 89.88% respecto al monto de inversión US\$ 42.8 millones. En cuanto al porcentaje de avance físico de las actividades realizadas el mismo es de un 89.88%

**Proyecto Ejecutado por PRONADERS:**

- **Proyecto de “Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible” (ProEnergía-Rural):** Al 30 de Junio 2019 se han instalado un total acumulado histórico de 21,486 Sistemas Fotovoltaicos sobre los 21,486 planificados, lo que representa una ejecución física de 100% de la meta total programada y logrando concluir anticipadamente con la ejecución física planificada en el Cronograma General de Proyecto. Se Elaboró la creación de cronogramas de Supervisión y Revisión, supervisando 8,438 Sistemas Fotovoltaicos para viviendas, ejecutado en los departamentos de Ocotepeque, Copan, Lempira, Santa Bárbara y La Paz, realizándose las reparaciones correspondientes a las instalaciones del proyecto de Pro-Energía Rural.

Con respecto a su ejecución financiera acumulada histórica al 30 de junio 2019, según el SIAFI presenta un monto por L. 966,850,884.0 (79%).

**Proyecto Ejecutado por HONDUTEL:**

- **Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación:** en el II Trimestre 2019 ninguna ejecución presupuestaria. Lo anterior debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP (Internet Protocol), La Dirección Red IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

En el II Trimestre 2019 Se sigue dando continuidad al proceso de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

**Proyectos Ejecutado por el FHIS:**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB):** PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

A la fecha, se finalizó 3 proyectos con el cual se beneficiaron 1,423 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 87 empleos, con lo cual se alcanzó ejecutar el 93% con respecto a lo planificado para el segundo trimestre, de acuerdo a la meta física de PROMINE en su Fase IV.

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/ KFW SE-FHIS FASE III y IV:** Para el II trimestre se inició la consultoría de diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3,035 predios , en las siguientes colonias: Montes de los Olivos (1,096 predios), colonia Nueva Jerusalén No. 2 (1,306 Predios), Brisas del Mogote (198 Predios), Altos de la Quezada (61 Predios) La Huerta (186 Predios), Villas San Miguel (53 Predios), Brisas del Roble (70 Predios), y Altos del Mirador (65 Predios).

Los avances del componente intervenciones para promover la convivencia ciudadana y emprendimiento a nivel barrial se detallan a continuación: 606 jóvenes participando del Programa deportivo y Valores, Capacitaciones en Emprendimiento y Valores de las cuales se han realizado 8 talleres de emprendimientos y valores, con 673 asistencias.

**Proyectos Ejecutados por la ENEE:**

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional:** Durante el segundo trimestre el proyecto se encuentra en ejecución teniendo actividades pendientes que serán realizadas en el transcurso del ejercicio fiscal 2019. Dentro de dichas actividades se encuentra: Completar la conformación del personal de planta de la UCP, realizar el proceso de Re-licitación, segunda vuelta proceso suministro de contenedores dicho proceso se encuentra en proceso con la Comparación de Precios (CP) el cual está en revisión de la Dirección de Ingeniería de Transmisión para ajustes del alcance y especificaciones técnicas, de igual

forma se encuentra pendiente la Adquisición de Equipo Especializado de Informática, Equipo de Cómputo

- **Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo:** Para el presente ejercicio fiscal se han definido estrategias para agilizar la ejecución del proyecto las cuales son: Dar un seguimiento cercano a la ejecución del contrato de la firma TSK de la construcción y pruebas de las mejoras a las sub estaciones eléctrica cañaverl y río lindo, tener acercamientos con la Dirección General de Franquicias Aduaneras para tener claridad en los procesos de exoneraciones para reducir los tiempos de respuestas a las solicitudes.

Por otra parte aún está pendiente la definición del proceso de adquisición de equipos de generación Complejo Cañaverl – Río Lindo a utilizar

**Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad** Para el segundo II trimestre la ENEE solicitó la modificación presupuestaria para incorporación al Programa de Inversión Pública el proyecto de la referencia el cual iniciara en el segundo semestre del año 2019.

Los Principales Problemas que afectan la ejecución de los Proyectos del Gabinete Sectorial son:

Área	Problemas	Acciones
Administrativa	Obsolescencia de equipo y sistemas de cómputo, con mantenimiento preventivo programados con escasos. Refleja debilidad en la sistematización de procesos operativos y administrativos, así como la recopilación de experiencias aprendidas por parte de las Unidades Ejecutoras Institucionales de cada proyecto.	Mejorar los equipos y sistemas de cómputo e incrementar el mantenimiento preventivo. Fortalecer sistemas de almacenamiento de información y aplicar experiencias aprendidas de proyectos anteriores.
Financiera	La falta de conclusión de las Gestiones de financiamiento. Falta de flujo de caja para hacer efectivos los pagos a contratistas y supervisores de obra. Falta de disponibilidad del fondo reintegrable afecta la operatividad y trabajo de mantenimiento.	Mejorar la atención a las gestiones de financiamiento de proyectos. Mejorar las proyecciones de pagos mensuales/anuales para contar con un flujo de caja y un fondo reintegrable eficiente.
Legal	Problemas en la liberación del derecho de vía en algunos de los tramos en construcción.	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción.
