



Gobierno de la  
República de Honduras



SECRETARÍA DE FINANZAS

# **Informe General de la Inversión Pública Al III Trimestre, Año 2020**

**Tegucigalpa M.D.C      Honduras C.A.**

**Octubre, 2020**

## Contenido

<b>INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020</b> .....	3
PRESENTACION .....	3
<b>I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2020</b> .....	4
<b>1.1 Inversión Pública Global 2020</b> .....	4
<b>1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público</b> .....	6
<b>1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector</b> .....	7
<b>1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's)</b> .....	8
<b>1.5 Financiamiento de la Inversión</b> .....	9
<b>1.6 EJECUCIÓN FISICA A NIVEL DE SECTORES:</b> .....	9
<b>a) SECTOR CARRETERAS:</b> .....	9
<b>b) SECTOR DE PROTECCION SOCIAL:</b> .....	12
<b>c) SECTOR ENERGIA:</b> .....	17
<b>d) SECTOR EDUCACIÓN:</b> .....	19
Los avances al tercer trimestre en los proyectos son:.....	19
<b>e) SECTOR SALUD:</b> .....	22
<b>f) SECTOR PRODUCTIVO y RIEGO</b> .....	25
<b>g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA:</b> .....	27
<b>h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE:</b> .....	29
<b>i) SECTOR COMUNICACIONES</b> .....	32
<b>1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Tercer Trimestre del Año 2020</b> .....	32

## **INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2020**

### **PRESENTACION**

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2020. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal 2020 asciende a **L25,211.4 millones** que incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), Programa de Infraestructura Vial, por un monto de **L4,576.9 millones y L2,500,0 millones** respectivamente, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que asciende a **L4,500.0 millones** y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por un monto de **L1,013.0 millones**. Del monto total de la Inversión Pública aprobado para la gestión 2020 los Proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) suman un monto de **L12,621.4 millones** y que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH).

Al Tercer Trimestre la Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de **L 26,074.0 millones** para la ejecución de **89** proyectos (incluidos cinco proyectos financiados a través de la modalidad Alianzas Público-Privadas (APP) y tres Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) y 81 proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP).

El presupuesto vigente de la Inversión Pública al Tercer Trimestre refleja un aumento global de **L862.6 millones** respecto al presupuesto aprobado, esto debido a incrementos en los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por la cantidad de **L329.2 millones**, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por la cantidad de **L631.7 millones** y **L743.0 millones** en el Fideicomiso de Infraestructura Vial, de igual forma el PIP muestra del presupuesto vigente de **L11,780.2 millones** una disminución de **L 841.3 millones** respecto al aprobado por el Congreso Nacional.

## I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2020

### 1.1 Inversión Pública Global 2020

El presupuesto global de la Inversión Pública al Tercer Trimestre del 2020 reporta un presupuesto vigente de **L26,074.0 millones** que representa el **4.3% del PIB<sup>1</sup>** para el 2020, el cual muestra un aumento global de **L862.6 millones** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

Cuadro No. 1  
Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 30 de septiembre de 2020  
Cifras en Millones de Lempiras

Sector Público	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución (Ejecutado/Vigente)
Administración Central	12,240.3	11,289.0	3,038.0	26.9
Resto del Sector Público	381.2	491.1	80.3	16.3
<b>Sub-total PIP</b>	<b>12,621.5</b>	<b>11,780.2</b>	<b>3,118.3</b>	<b>26.5</b>
Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema	4,500.0	4,500.0	711.5	15.8
APP's */	4,576.9	4,906.1	630.2	12.8
Programa de Infraestructura Vial	2,500.0	3,243.0	3,112.0	96.0
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	1,013.0	1,644.7	101.5	6.2
<b>Total General</b>	<b>25,211.4</b>	<b>26,074.0</b>	<b>7,673.4</b>	<b>29.4</b>

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-524-2020 y Circular No. CGG-665-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).


En el cuadro No.1 se ve reflejado el aumento debido a las adiciones en la proyección de los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por la cantidad de L329.2 millones, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por la cantidad de L631.7 millones y L743.0 millones en el Fideicomiso de Infraestructura Vial; y a la reducción de L841.3 millones en el PIP.

En relación al PIP, que muestra un presupuesto vigente de **L11,780.2 millones**, lo que refleja una disminución de **L841.3 millones** respecto al Presupuesto aprobado, de los cuales **L 888.6 millones** corresponden a Crédito Externo; **L 75.7 millones** a Donaciones Externas y finalmente un aumento de **L123.1 millones** de Fondos Nacionales.

Esta situación obedece a la facilitación de espacio presupuestario, para el traslado de fondos a instituciones con estructura presupuestaria sin proyecto, específicamente para casos de fuentes externas (crédito externo y donaciones); tales como: la incorporación de L738.6 millones para continuar con el proceso de cancelación del pago del Pasivo Laboral a los empleados del SANAA, traslado de L27.9 millones para la Secretaría de Seguridad para el Programa de Promoción de Paz y Convivencia, traslado de L42.2 millones al Instituto de Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal ICF, para el Programa de Apoyo Europeo al Sector Forestal de Honduras (EuroFor)/ (PAPSFOR) y L 7.7 millones Fondos de aporte de Honduras al Plan Trifinio, en el Marco del Programa de Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas en la Región del Trifinio. Entre otros.

Por su parte en la Fuente 11 Tesoro Nacional, se refleja un aumento de L123.1 millones, producto de traslado de fondos propios incorporados a la Empresa Nacional Portuaria L 105.4 millones para el proyecto de Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés y la incorporación de L17.6 millones a INSEP para el proyecto de Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada-Santa Rosa de Copán.

<sup>1</sup> El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2020 asciende a L.598,935,000,000, según cifra proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

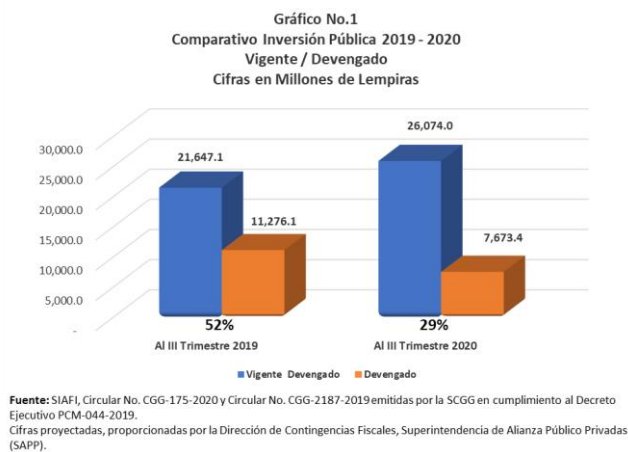

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 30 de septiembre del 2020 por la cantidad de **L7,673.4 millones** reflejando un **29%** de ejecución a nivel de devengado. El mismo incluye ejecución del Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) por la cantidad de **L711.5 millones** y el Programa de Infraestructura Vial, su ejecución asciende a **L3,111.9 millones**. Según el Sistema de Administración Financiera (SIAFI), para la ejecución de **89** proyectos detallados así: 68 para la Administración Central, 13 para el Resto del Sector Público, 5 de Alianzas

Público Privadas, 1 para el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor y 1 del Fondo Vial, y 1 para el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2). El mayor porcentaje del PIP se concentra en los proyectos ejecutados en el Sector de Carreteras con **38%**: Social con **18%**, Transporte y Obras Públicas con **10%**, Salud y productivo con un **(5%)**; en menor proporción el resto de los sectores.

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al Tercer Trimestre del 2020 a nivel de devengado muestra una reducción de **23** puntos porcentuales en comparación con el tercer trimestre del año 2019 (**52%**), lo anterior se debe a retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria vigentes específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales, por otra parte, a partir del 16 de marzo del presente año la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno por el COVID 19 y las medidas de contención del gasto establecidas mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-020-2020, obligó a las instituciones a limitar la ejecución en varios rubros, como los indicados en la circular DGP-003-2020.

En el tercer trimestre los principales centros económicos del país, iniciaron con la apertura inteligente Fase I, pero con restricciones, por lo que, la ejecución de los proyectos siempre se ve afectada a causa de la pandemia mundial ocasionada por el COVID 19, lo cual impacta directamente a la ejecución del PIP en su mayoría los proyectos orientados a generar un beneficio económico en el país.

A su vez, y con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, en el transcurso del Tercer Trimestre se han incorporado **4 nuevos proyectos al PIP**; tales como: **1)** Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19, **2)** Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, ejecutados por INVEST-H; **3)** Programa de Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID- 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras para la SESAL; **4)** Telesalud para Mitigar el Coronavirus y Mejorar el Acceso a la Salud en Honduras. Asimismo, se han trasladado a la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H) según Decreto Ejecutivo número PCM-004-2020, Artículo 24 del Decreto Ejecutivo los siguientes proyectos: 1) Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, 2) Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal, y 3) el Proyecto Manejo Sostenible de Bosques.

Cabe resaltar que en el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y

servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Adicionalmente, las restricciones en la aprobación de cuotas de compromiso, hasta cierto punto afectan la ejecución de los proyectos en cuanto a honrar compromisos que no se encuentran en la proyección original de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del presente año. Dichas medidas han sido consideradas con el propósito de ejecutar fondos estrictamente para la emergencia nacional y controlar el gasto y déficit fiscal. Sin embargo, se han efectuado traslados de estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se pretende lograr que la ejecución de la Inversión Pública 2020 sea ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestaria.

**Cabe señalar que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 188-2020) de fecha 17 de abril 2020, el cual literalmente dice:**

***"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."***


Para el ejercicio fiscal 2020 en las Normas de Ejecución Presupuestarias, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

## **1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público**

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente al Tercer Trimestre del 2020, ascendió a **L26,074.0 millones** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de las instituciones de la Administración Central, con **99%** específicamente en los proyectos ejecutados por INVEST-H, SESAL, ENEE, INSEP, SAG, y SEDIS, proyectos APP, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fondo Infraestructura Vial, y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), El resto del Sector Público alcanza apenas el **1%** de la Inversión.

La distribución del PIP de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. Asimismo, refleja una ejecución de **L7,673,359,650** representando un **29%** respecto al presupuesto vigente global.

En términos financieros del Programa de Inversión Pública, se registran mayores niveles de ejecución en INVEST-H **L901.1 millones**; La Secretaría de Salud (SESAL) **L 480,6 millones** La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) **L 347.4 millones**; seguido, La Secretaría de Infraestructura Servicios Públicos (INSEP) **L252.9 millones**; el Registro Nacional de las personas (RNP) **L 229.8 millones** y La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social **L 202.3 millones**; quienes en su conjunto suman **L2,414.3 millones**; es decir que concentran el **77%** del total del presupuesto ejecutado correspondiente al PIP registrados en el SNIPH, (**L 3,118.2 millones**); por otra parte, el Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), los Proyectos APP's, el Programa Vial y Finca II suman **L 4,555.1 millones** de presupuesto ejecutado, haciendo un total de **L6,969.4 millones**.

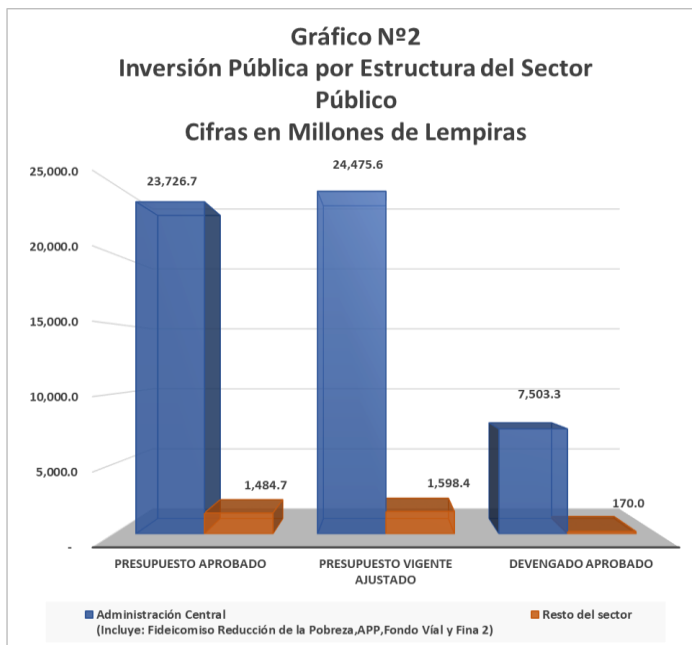


Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-524-2020 y Circular No. CGG-665-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianzas Público Privadas (SAPP).

### 1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector

En cuanto a la inversión Sectorial, el **Sector Carretero** cuenta con el mayor porcentaje de inversión **L9,898.4 millones (38%)**, incluye el Plan de Infraestructura Vial a través del Fideicomiso, los proyectos financiados a través de Alianzas Público Privada (APP's); para la ejecución de Corredores Lenca y Turístico las principales instituciones que concentran este sector son INVESTH con una inversión de **L1,260,0 millones** para la ejecución de los principales proyectos Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, el Programa de Integración Vial Regional II, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danli, tramo Neteapa – Danlí entre otros, e INSEP con **L897.6 millones**, para ejecutar algunos de los proyectos como ser: Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La

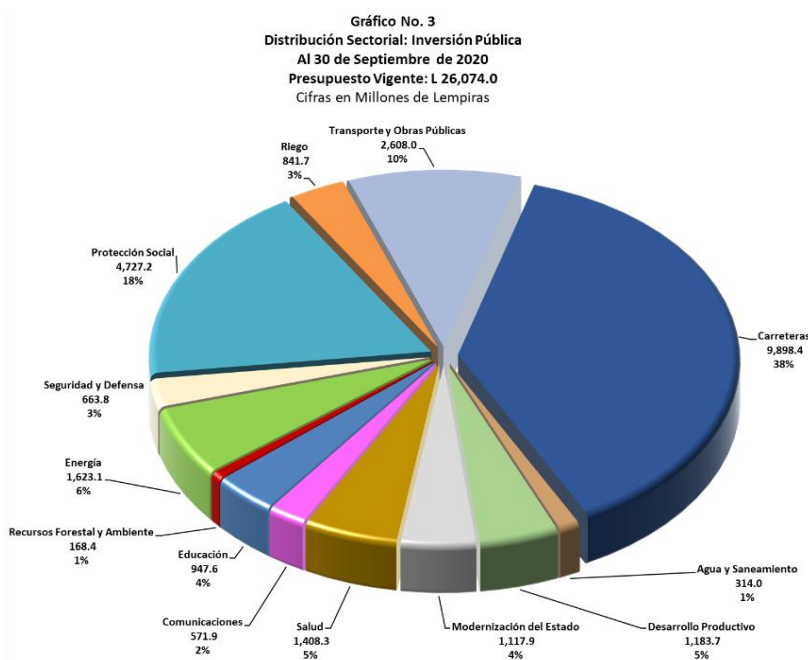

Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán, Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento De Lempira, Corredor Turístico Distrito de los Lagos Etapa 1: Rehabilitación con Concreto Hidráulico Tramos: 1-Cañaverál-Río Lindo-Caracol Sección 1.

Seguido el **Sector Protección Social con L4,727.2 Millones (18%)** incluye el fideicomiso de Fondo Social para la Reducción de la Pobreza, apoyando las iniciativas de Gobierno tales como Criando con amor, Vivienda Saludable, Guías de Familia, Ecofogones, Merienda Escolar, Bolsa Solidaria Adulto Mayor, entre otras; la institución que ejecuta proyectos en apoyo a este sector es La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con una inversión de **L659.6 millones** para la ejecución de algunos proyectos tales como: Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor), Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Integración de la Protección Social, y otros programas de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad,

Seguido del **Sector de Transporte y Obras Públicas con L2,608.0 millones (10%)** el cual incluye algunos proyectos de APP'S como la construcción Aeropuerto de Palmerola, Centro Cívico y la obra de construcción de la Lima. Asimismo la ejecución de proyectos como: La Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés (**ENP**).

Siguiéndole el **Sector Energía L1,623.1 millones (6%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

Siguiéndole el **Sector Salud L1,408.3 millones, (5%)**; para ejecutar proyectos principalmente en apoyo a la emergencia por el COVID 19, entre los principales proyectos se encuentran: Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (Covid - 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras, Programa Apoyo a La Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente. En menor participación el resto de los sectores.

#### **1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's)**

Al tercer trimestre de 2020, la Ejecución a nivel de fideicomisos y APP's, asciende a **L4,555.1 millones**, representando un **32%** respecto al presupuesto vigente de **L 14,293.8 millones** asignados a estos. Dicha ejecución corresponde al Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), por la cantidad de **L 711.4** representando un **16%**, respecto al presupuesto vigente (**L4,500.0 millones**) según el SIAFI y el Fideicomiso de Infraestructura Vial con una ejecución de **L 3,111.9 millones** representativo de **96%** de ejecución, respecto al presupuesto vigente (**L 3,243.0 millones**) esta situación se explica en que gran parte de este fideicomiso ha sido destinado para atender la Emergencia sanitaria nacional producto de la pandemia ocasionada por el COVID-19; mientras que la superintendencia de Alianzas Público Privadas reporta una ejecución de **L630.2 millones** en proyectos APP's, los cuales cuentan con presupuesto vigente de **L4,906.1 (13%)** de ejecución. Asimismo, el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de **L1,644.7 millones, 6% L101.5 millones** de ejecución, respecto a los fondos asignados.



## 1.5 Financiamiento de la Inversión

El **60%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor, APP's, Plan de Infraestructura Vial y Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), y el **40%** por fondos externos; de estos el 85% es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el 15% por donaciones (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.2

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destacan la INVEST-H, INSEP, ENEE, SAG, SEDIS orientado a la construcción de carreteras, proyectos de energía, construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, Microempresas).

**Cuadro No. 2**  
**Inversión Pública: Clasificación por Fuente de Financiamiento**

Cifras en Millones de Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución (Ejec./Vig.)
Fondos Nacionales	13,742.9	15,569.9	4,794.1	31%
Crédito Externo	9,775.7	8,887.0	2,376.2	27%
Donaciones Externas	1,692.8	1,617.1	503.0	31%
<b>TOTAL PLAN DE INVERSIÓN</b>	<b>25,211.4</b>	<b>26,074.0</b>	<b>7,673.4</b>	<b>29%</b>

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-524-2020 y Circular No. CGG-665-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

\*/Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

En seguimiento a las Normas de Ejecución Presupuestaria del Año 2020, en su Artículo 28, que literalmente expresa que; "Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones, el Formulario (FMP-05) denominado "Documento de Modificación Presupuestaria" generado por el SIAFI, tendrá el mismo efecto de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.....

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

## 1.6 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:

### a) SECTOR CARRETERAS:

Al Tercer Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INVESTH e INSEP entre los cuales están:

#### Proyectos ejecutados por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVEST-H:

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2):**

En el trimestre no se reporta avance físico, ya que las Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) suspendieron labores, debido a la emergencia sanitaria generada

por el COVID-19. A la fecha ya se cuenta con la No Objeción del Organismo Financiero para modificar los contratos de las MEACV y se prevé que reinicien labores durante el mes de octubre.

- **Programa de Integración Vial Regional II, (BID-3815/BL-HO):**

El proyecto cerró su obra física contractualmente en el mes de abril, finalizando 23 km del tramo La Barca-Pimienta. Actualmente, está en gestión la recepción final y el traspaso de las obras al Concesionario Vial para su respectivo mantenimiento. Adicionalmente, debido a la suspensión de labores producto de la declaración de Estado de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional por causa del Coronavirus (COVID-19), el supervisor del proyecto presentó el informe de cierre hasta el mes de agosto de 2020, requiriendo realizar el ajuste correspondiente en la programación del proyecto.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, (BCIE 2116 y BCIE-2205):**

La obra física del Tramo “El Quebrachal-Goascorán” se encuentra finalizada, mismas que consistieron en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica de 46.18 km. Es importante hacer notar que debido a que, al cierre del 2018, ya se contaba con 29 km con carpeta asfáltica terminada.

- **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID y TF017904):**

Como parte de la iniciativa del Gobierno para la reactivación del sector productivo en el Corredor Seco y en cumplimiento a los Decretos PCM-030-2020 y PCM-041-2020, se incorporaron L.200 millones como contraparte del proyecto, ampliando la implementación del programa a marzo del 2021. Con estos nuevos recursos en el tercer trimestre se reportan 3,957 visitas de asistencia técnica a productores con hectáreas de riego para la producción de granos básicos, hortalizas y frutales; 253 macro túneles instalados en áreas con agricultura protegida y 8,500 bonos para la compra de insumos agrícolas (semilla, fertilizante, etc.) entregados para el apoyo a la producción como un incentivo a los productores que fueron afectados económicamente por la crisis Covid 19.

Por otro lado, en relación al proyecto ACS-GAFSP, a marzo de 2020 hay un total de 10,893 hogares beneficiados con asistencia técnica de generación de ingresos, seguridad alimentaria, y salud y nutrición, el 36% tienen a mujeres como cabeza de familia. Se han creado 4,000 nuevos empleos y 66 Mypimes en el área de servicio y valor agregado. De forma acumulada, se cuenta con 447 hectáreas instaladas con sistemas de riego por goteo. La asistencia técnica se ha reanudado contando con las medidas de bioseguridad respectivas. La entrega de insumos clave para la siembra de postrera pudo entregarse a tiempo, por lo que se espera una cosecha exitosa.

- **Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danli, tramo Neteapa – Danlí. (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2 BID-3815/BL-HO):**

Este proyecto reactivó sus obras a finales de junio. Al 30 de septiembre el proyecto avanza según nueva programación, presentando un avance físico de 43.42% en el lote A (Estación 54+240 - Estación 74+240) y 63.06% en el lote B (Estación 74+240 a la 89+160).

• **Programa de Infraestructura Vial (Fideicomiso)**

Lo que respecta a los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad del Fideicomiso Vial no se encuentra registrado en el SNIPH debido a que en su mayoría corresponde a obras de mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada.

En relación a los proyectos de la Dirección de conservación del Patrimonio Vial, el proceso de reactivación de los programas y proyectos ha comenzado pero sigue aún retrasado, debido a las mismas circunstancias relacionadas a la pandemia de COVID-19.

Al cierre del tercer trimestre, se continuaron las labores en el Programa de Balastados a Cabeceras Municipales: en el lote 1 del departamento de Ocotepeque y el lote 14 del departamento de Olancho, los cuales suman una ejecución total de 17.02km. Se logró reactivar el Programa de Mantenimiento Rutinario de Limpieza de Derecho de Vías que se ejecuta a través de las Microempresas Asociativas de Conservación Vial y con ello se logró una ejecución de 289.02km. Aún no se tiene el avance esperado en el Programa de Estudios y Diseños, el cual se espera que arroje una cantidad de diseños aprobados para el mes de diciembre, debido a que UNOPS aún está haciendo revisión de los mismos. En el caso del Programa de Caminos Productivos no se tienen avances de ejecución, pues en este momento se está en la etapa de la elaboración de la documentación para el posterior lanzamiento de la licitación el cual se espera arroje avances para el mes de diciembre.

A continuación se detalla cuadro resumen de los trabajos en los programas de conservación periódica rutinaria en la red vial en el cual muestra al 30 de septiembre del 2020 una ejecución de 916.52 millones de lempiras.

**Cuadro Resumen de los Trabajos en los Programas de Conservación Periódica y Rutinaria en la Red Vial de Carreteras Pavimentadas y No Pavimentadas:**

PROGRAMAS DE CONSERVACIÓN	UNIDAD	Cantidad	Ejecutado Acumulado (Km)*	Fondos "FINA 2"	Fondos "ACPV"	Total Inversión (MM L.)**	% Avance Físico
Atención de Contingencias y Mitigación de Riesgos.		Global		0.00	35.64	35.64	49 %
Conservación de las Carreteras de la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP) que conducen a los Accesos de las Cabeceras Municipales.	Km	1,261.35	697.47	347.61	334.06	681.67	55.29%
Programa de Conservación Rutinaria con Bacheo Asfáltico Emergente en la Red Vial Pavimentada (RVP).	Km	1,104.47	597.03	0.00	70.35	70.35	54.06%
Programa de Limpieza del Derecho de Vía con Atención de Microempresas de Conservación Vial (MEACV) de la Red Vial Pavimentada.	Km	2,778.94	289.02	0.00	34.07	34.07	10.40%
Programa de Estudios y Diseños Finales Acceso a Cabeceras Municipales y Zonas Turísticas.**	Km Diseñados Grupo 1	990.67	595.03	0.00	68.35	68.35	60.06%
Conservación Periódica y Rutinaria Red Vial Sector Turismo.	Km	Global	Global	0.00	26.45	26.45	100 %
<b>TOTAL</b>		<b>4,248.41</b>	<b>1,793.80</b>	<b>347.61</b>	<b>568.91</b>	<b>916.52</b>	<b>42.22%</b>

\* Ejecución acumulada desde enero hasta el 30 de septiembre del 2020, cabe destacar que todos los Programas de las DCPV / INVEST-H se suspendieron las labores a partir del 16 de marzo del presente año, trabajando solamente el lote 11 del departamento de Olancho, Zona 3 en el Programa de Balastados en los Accesos a las Cabeceras Municipales (PACM) en la Red Vial No Pavimentada en los meses de abril hasta julio, y se reactivaron los lotes 1 de los departamentos de Copán y Ocotepeque Zona 1, Lote 26 departamento de Francisco Morazán Zona 5, continuados Lote 11 Olancho.

\*\* Con respecto a la ejecución acumulada del Avance Financiero (MM L.) es reportado en los meses de enero al 30 de septiembre del presente año.

\*\*\* En el Programa de Estudios y Diseños Entregados en proceso de aprobación por UNOPS.

Desde inicio de la emergencia, de manera Estratégica, el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Salud (SESAL) e Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), como medida para mitigar los impactos a la salud de la población, derivado de la Pandemia Mundial del Coronavirus, resolvieron adquirir e instalar a través de INVEST-H, siete (7) hospitales móviles, distribuidos en igual número de ciudades del país, de preferencia ubicados en los predios de hospitales existentes, de tal manera que estuvieran localizados cerca de un Hospital Regional

a efecto de generar una interacción eficiente entre ambos hospitales y brindarse recíprocamente servicios complementarios, ya que los Hospitales de Aislamiento Covid-19 no traen Sala de Cirugía, ni Sala de Parto, pero si traen laboratorio, unidad de rayos x, unidades de cuidados intensivos y respiradores mecánicos, entre otros equipamientos.

Representantes de la SESAL, Cruz Roja Hondureña e INVEST-H, realizaron una gira por el territorio nacional para inspeccionar los siete (7) sitios previamente seleccionados para la instalación de los hospitales de Aislamiento Covid-19, Teniendo como resultado la definición de las actividades necesarias para la construcción y acondicionamiento de los planteles para la instalación de los mismos. Las ciudades seleccionadas donde se instalarían los Hospitales Covid-19, fueron; Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba, Danlí, Santa Rosa de Copán y Juticalpa.

#### **Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):**

- **Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Valladolid-la virtud-Mapulaca con una longitud aproximada de 30 km localizado en el departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):**

Durante el III trimestre se logró solucionar los problemas de derecho de vía por medio de la municipalidad de la virtud, donde se estaban realizando trabajos de terracería en las estaciones 60+000 – 62+000 conocido como las vueltas del olvido.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF).**

Durante el III Trimestre, la unidad ejecutora ha realizado una reprogramación de la ejecución mensual física y financiera del proyecto, debido a que a la fecha, aun no se ha recibido la respuesta por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la solicitud de ampliación para el convenio de financiamiento BEI-FI No.84859.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros, (Fondos Nacionales 0000003-13):**

El Proyecto no reportó ejecución física ni financiera durante el III trimestre de 2020 debido a que el Proyecto aún no cuenta con la respectiva aprobación por parte del Congreso Nacional a la modificación No. 4 (la cual conlleva un incremento superior al 25% del costo inicial del contrato de obra), lo cual limita a que INSEP pueda continuar con la ejecución financiera del proyecto. A la fecha, el proyecto cuenta con un avance físico de 74%.

#### **b) SECTOR DE PROTECCION SOCIAL:**

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al Tercer Trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

#### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):**

La inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan las

Trasferencias a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales tres (3) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

- **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social III (3371/BL-HO)**

Durante este tercer trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**: se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, durante el tercer trimestre, se continuó con los servicios de cuatro (4) ingenieros supervisores, en apoyo a la Dirección General de Construcciones Escolares Bienes e Inmuebles (DIGECEBI) de la Secretaría de Educación.

Asimismo, se realizaron los pagos de los procesos de ampliación de obra en los 34 CEB's ampliados específicamente con tres (3) aulas, un módulo sanitario, fosa séptica y otras obras adicionales como aceras de conexión, cunetas de evacuación de aguas lluvias, según la necesidad de cada CEB ubicados en los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes; así como a la empresa supervisora de dicho proceso.

También de las **Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB)** de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes. Además, se asignaron viáticos con el propósito de (i) verificación de obras en compañía de la supervisión y contratistas en el marco del Proyecto de Ampliación y Cobertura del Tercer Ciclo, en los departamentos de Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara y La Paz (ii) verificación de la nuevas obras de infraestructura escolar de los 24 y 34 CEB, (iii) supervisión de proyectos en ejecución del proceso de licitación de **24 CEB's** en los departamentos de La Paz, Intibucá y Lempira, (v) realizar la inspección del sitio y verificación de obras de infraestructura escolar en los departamentos de Santa Bárbara, La Paz y Ocotepeque y (vi) realizar inspección del sitio de **siete (7) proyectos** en el Departamento de Santa Bárbara y verificación de avance de obras de los lotes D y G para el mejoramiento de la cobertura del Tercer Ciclo de Educación Básica, en los departamentos de Copán y Lempira.

La meta programada en este año es de **58 módulos escolares construidos en los Centros de Educación Básica (CEB's)** en los municipios priorizados con recursos del préstamo BID 3371 / BL-HO, de los cuales se han recepcionado 30 CEB en los departamentos de Copán (10 CEB) en los municipios de Concepción (3 CEB), Dulce Nombre (1 CEB), Cucuyagua (1 CEB) La Unión (1 CEB), San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB) San Antonio (1 CEB), Santa Rosa de Copán (1 CEB), Intibucá (3 CEB): municipio de Colomoncagua y municipio de Intibucá (2 CEB), La Paz (5 CEB): Santa Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), Lempira: 4 CEB en los municipios de Las Flores (1 CEB), San Manuel de Colohete (2 CEB), Santa Cruz (1 CEB), Ocotepeque (3 CEB) en los municipios de San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), Santa Bárbara (5 CEB) en los municipios de Naranjito (1 CEB), San Luis (1 CEB), San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1CEB).

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):**

En el tercer trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**: no se ha logrado realizar la primera entrega de TMC del año 2020, la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS) ha trabajado junto al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) en la suscripción de contrato a fin de que las TMC puedan ser entregadas a los hogares a través del mecanismo de Billetera Electrónica o en Agencias Bancarias, volviendo el proceso más ágil, transparente y moderno se ha previsto la entrega para el último trimestre del presente año.

El **Componente Fortalecimiento Institucional**: se inició el proceso de contratación de las consultorías para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): (i) Consultoría para el Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Protección Social, (ii) Consultoría para Diagnóstico del Ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social, incluyendo a las participantes del PBVM (SENPRENDE) y la (iii) Consultoría para la revisión de políticas públicas prioritarias en el marco del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras.

El **Componente Piloto de Superación de Pobreza**: En el tercer trimestre 2020, no se programó ejecución física ni financiera.

- **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Dentro del Componente **Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, al igual que en el Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO) no se ha logrado realizar la primera entrega de TMC del año 2020.

**Componente Fortalecimiento Institucional para la Integración del Sistema de Protección Social**, se inició el proceso de contratación de las consultorías para la Secretaría de Coordinación General de Gobierno (SCGG): (i) Consultoría para el Diagnóstico sobre el estado del Sistema de Protección Social, (ii) Consultoría para Diagnóstico del Ecosistema y necesidades de formación de la estrategia de inclusión financiera para el Sector Social, incluyendo a las participantes del PBVM (SENPRENDE) y la (iii) Consultoría para la revisión de políticas públicas prioritarias en el marco del Índice de Pobreza Multidimensional de Honduras.

**Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, se continuó apoyando el fortalecimiento del Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de servicios profesionales de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación,

**Fideicomiso: Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor**

La información que se refleja en el presente Informe del Fideicomiso de Protección Social es indicativa ya que no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH). Cuenta con presupuesto para el 2020 de **L4,500.0** millones está fundamentado en 13 Proyectos de inversión, de los cuales, en base a la información proporcionada por la Secretaria

de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) solamente presentan ejecución de cuatro proyectos y la misma corresponde al segundo trimestre, ya que en el tercer trimestre la SEDIS No presentó ejecución respecto al Fideicomiso.

**Guías de Familia:** (Monto Presupuestado L708.0 millones), ejecución financiera de L486.4 millones, beneficiando a 90,508 familias.

**Mejores Familias:** (Monto Presupuestado L207.7 millones) ejecución financiera de L116.8 millones, beneficiando a 377,041 familias.

**Bolsa Solidaria Adulto Mayor:** (Monto Presupuestado L130.6 millones) ejecución financiera de L54.6 millones, beneficiando a 206,949 personas adultas mayores.

**Honduras para Todos:** (Monto Presupuestado L24.2 millones) ejecución financiera de L13.8 millones, beneficiando a 3,606 personas con discapacidad.

**Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:**

• **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

- 1) **Centro Ciudad Mujer Kennedy:** Durante el trimestre se han atendido a 4,303 mujeres de las cuales 1,509 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 2,794 (65%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 18,340.
- 2) **Centro Ciudad Mujer Choloma:** Durante el trimestre se han atendido a 4,940 mujeres de las cuales 1,201 fueron nuevos ingresos (24.3%) del total y 3,739 (75.7%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 14,995. Con un incremento de más del 23% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 38% en servicios, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de los servicios que ofrece el Centro tanto presenciales como virtuales.
- 3) **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula:** Durante el trimestre se han atendido a 6,316 mujeres de las cuales 1,996 fueron nuevos ingresos (34%) del total y 4,320 (68%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 14,606. Incrementando más del 23% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 33% en servicios, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de servicios que ofrece el Centro tanto presenciales como virtuales.
- 4) **Centro Ciudad Mujer La Ceiba:** Durante el trimestre se han atendido a 6,918 mujeres de las cuales 2,867 fueron nuevos ingresos (41.4%) del total y 4,051 (58.6%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 15,120. Con un incremento de más del 44.2% en las atenciones con respecto al mes anterior y del 30% en servicios, producto de la apertura progresiva por parte del Gobierno Central para la circulación de personas, así como de la oferta de servicios que ofrece el Centro tanto presenciales como virtuales.
- 5) **Centro Ciudad Mujer Juticalpa:** En el tercer trimestre del presente año se han atendido 2,117 mujeres, de las cuales 692 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 1,425 (53%)

visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 10,531 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

- 6) Ciudad Mujer Móvil:** Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 11,963 mujeres, de las cuales 11,091 fueron nuevos ingresos (92%) del total y 872 (8%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 17,906 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

#### **Proyecto ejecutado por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVEST-H**

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

Debido a los meses de suspensión de obras por la situación de la pandemia por COVID-19, este proyecto que originalmente estaba planificado a entregarse en el mes de agosto 2020 desfaso su fecha de entrega para el primer trimestre del año 2021, período en el que alcanzará el 100%.

#### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Se muestran los avances por productos al 30 de septiembre de 2020:

#### **Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios.**

Al mes de septiembre de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un **20%** y tiene un avance financiero de 50% en relación al monto contratado que es de L 128,592,322.

El proyecto de equipamiento social el cual incluye. Al mes de septiembre de 2020 se tiene un avance físico promedio del 65% y un avance financiero del **42.5%** en relación al monto contratado que es de L10, 967,584.51. En comparación al avance físico del trimestre anterior el proyecto no ha tenido un avance notorio, debido al paro de labores establecidas por la emergencia nacional ante el COVID-19. El Programa de Deportes y Valores, en el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas, sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19 se ha comenzado a realizar clases virtuales para el entrenamiento en deportes y a estas sólo tienen acceso quienes en sus viviendas cuentan con un servicio de internet; en este sentido se ha creado un canal en YouTube, para el aprovechamiento de clases. En el Componente de Capacitaciones en valores y emprendimiento, la meta a alcanzar inicialmente programada era 2,000 asistencias a capacitación, sin embargo, ante la emergencia se ha reprogramado este producto a una asistencia de 750 personas.

Cabe mencionar que como respuesta para detener la propagación de la Pandemia del COVID-19 en el país se determinó la redistribución o reasignación de recursos de crédito externo disminuido fondos por un monto de US\$ 5.0 millones del monto total asignado al



Programa de acuerdo al convenio de crédito firmado entre el Gobierno de Honduras y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de acuerdo al PCM-046-2020.

- **Proyecto de Infraestructura Rural (PIR-BCIE)**

Proyecto que consiste en Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de US\$ 15.0 millones.

Se solicitó a lo interno del SEDECOAS/FHIS una modificación de aprovechamiento de espacio presupuestario, disminuyendo así el espacio del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) y creando espacio para PIR, con el fin de mantener el equilibrio presupuestario a nivel institucional, por la cantidad de L 5.0 millones correspondiente al presupuesto vigente y una ejecución de L 4.2 millones lo que representa el 84%.

Para el presente año se finalizaron las siguientes obras:

1. Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico Comunidad El Coyolar
2. Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidades de Guasquin, La Puebla, El Triunfo y San Matías
3. Construcción de Sistema de Micro captación Pluvial y Saneamiento, Comunidad de El Derrumbado

**c) SECTOR ENERGIA:**

El Sector destina su inversión a la Construcción de Subestaciones Eléctricas y líneas de transmisión a través de los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo) Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Los avances al tercer trimestre se presentan a continuación.

**Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):**

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional, (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Durante el Segundo Trimestre 2020 el proyecto se encuentra en ejecución obteniendo avances en las actividades por convenio de financiamiento siguientes:

1. Subestación El Progreso ampliada de 300MVA a 450MVA: Obras de la ampliación fueron finalizadas, en proceso de energización y puesta en operación comercial, prevista a más tardar para finales del mes de octubre 2020.
2. Subestación Toncontín Etapa I ampliada de 75MVA a 150MVA: Ampliación de la SE Toncontín fue energizada y puesta en operación comercial el 06 de septiembre de 2020.

3. La ENEE realizó pagos parciales (75%) por servicios a la UAP-IP un paso importante para continuar con el saneamiento de la servidumbre las Flores-Erandique y Danlí-Chichicaste, lo que podría permitir liberar el segundo desembolso de esta operación siempre que la Oficina de Salvaguardas Ambientales y Sociales (ESG) del banco este de acuerdo, el proyecto con el convenio 3103/BL-HO ya fue cerrado el 19 de marzo del 2020 y con el convenio GRT/SX-16864-HO tiene un avance de ejecución del 59% teniendo poco atrasos en las actividades.

- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Se ha tenido avances en el III Trimestre. En Cierre técnico-financiero se obtuvo el "Certificado de Terminación de Obras", según cláusula 55, certificando que las 38 estaciones Hidroclimatológicas quedaron en operación y visualización de datos en la plataforma Hydromet Cloud, sin pendientes de obra del proyecto "Construcción, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de 38 Estaciones Hidroclimatológicas automáticas para la Optimización de la Red de Monitoreo de las Cuencas Hidrológicas de las Centrales Hidroeléctricas Francisco Morazán y Cañaverl – Río Lindo", "Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán", a la fecha se lleva un avance de 63%, donde se ha completado el 100% de la ingeniería y se lleva un 100% de avance de abastecimiento de suministros (consumibles) y El 21 de agosto de 2020, se realizó la suscripción del contrato para la "Auditoría Ambiental para el Préstamo 3435/BL-HO.

- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica**

Durante el III Trimestre se logró emisión de la Enmienda a la Nota de Prioridad, donde se autoriza la compra de los terrenos y pago de servidumbres de las Obras Componente I d Programa con Fondos Externos, previa autorización del BID, recepción de ofertas para la contratación de la obra "Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito", actualmente se encuentra en evaluación y la emisión por parte del Área técnica de ENEE de especificaciones técnicas para la Adquisición de Equipo para el Fortalecimiento de la Supervisión ENEE y Mantenimiento del Sistema de Transmisión ENEE.

**Proyecto Ejecutado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS):**

- **Proyecto De Energía Renovable Para El Desarrollo Rural Sostenible Pro-Energía Rural, (EDCF No. HND-5) Fondos de Korea Eximbank:**

El proyecto "Pro-Energía Rural" ya finalizó la etapa de Operación, Mantenimiento y Soporte a los 21,486 Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Este proceso tuvo una duración de 12 meses plazo máximo, desde julio 2019 a junio 2020. Actualmente se trabaja en el Cierre del Proyecto y en la aprobación del uso de los Fondos de Contingencia para realizar la ampliación de **2,347 SFV** adicionales. Los avances al tercer trimestre se detallan a continuación:

En Agosto de 2020 el Korea-Exim Bank, solicita realizar una revisión de costos, por lo que PRONADERS a través del Proyecto “Pro-Energía Rural”, en conjunto con la Empresa Constructora “Joint Venture of Top and Joeun and Korbi” y la Empresa Supervisora “Dohwa” se hizo un nuevo análisis de costos de estos **2,347 Sistemas Fotovoltaicos**. De acuerdo a este nuevo análisis de costos, se detectaron que varios de los equipos (Panel Solar y Batería) han bajado de precio, por lo que se realizó un nuevo cálculo de SFV a ser instalados con los Fondos de Contingencia. La nueva cantidad de SFV a Instalar es ahora de 2,347, aumentando en 264 con respecto a su ampliación original (2,083 SFV). Todavía se está a la espera que la Gerencia General de la Empresa Constructora gire la notificación de aceptación de esta propuesta, la que posteriormente se remitirá al Corea-Exim Bank para su aprobación.

Se continúa con la Socialización con Autoridades Municipales de los departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, sobre la Ampliación de Electrificación Solar de 2,347 Sistemas Fotovoltaicos para Viviendas, Así como, la Planificación en el Levantamiento de Fichas Socioeconómicas de 2,347 Familias que serán beneficiadas en la Ampliación de los 2,347 Sistemas Fotovoltaicos de Electrificación Solar.

#### **d) SECTOR EDUCACIÓN:**

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven).

Los avances al tercer trimestre en los proyectos son los siguientes:

#### **Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación**

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Al trimestre no presenta ejecución física en ninguna de las actividades programadas en el SIAFI.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, el Programa no contó desde el inicio del año 2020 con personal técnico contratado, debido a que la Dirección de Adquisiciones de SEDUC, estuvo resolviendo temas con la ONCAE, en relación al Plan de Adquisiciones y Contrataciones Consolidado (PACC).

Durante el año 2020, a raíz de la Pandemia COVID-19 no se logró realizar las actividades planificadas en el PACC y POA 2020, que conllevan al logro y ejecución física y financiera del Programa PROMINE, debido a las restricciones por contención del gasto mediante las Circulares DGP-003-2020 con fecha 23 de marzo de 2020, y DGIP-003-2020 con fecha 31 de marzo de 2020. Lo anterior considerando que el Programa realiza su ejecución mediante las visitas a centros educativos y realizar la Formulación, Supervisión y Recepción de Proyectos de Infraestructura Educativa ejecutados por SEDECOAS, así mismo confirmar la implementación de la normativa de Planificación de la Infraestructura de Centros Educativos.

Al Tercer Trimestre, no se logró la ejecución física y financiera del Programa, ya que se espera la autorización interna en SEDUC de modificación presupuestaria con la cual se llevarán a cabo los procesos para la contratación del personal técnico, administrativo y de legal.

**Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

• **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven:**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales del occidente del país: Se está dando atención a 11,600 educandos bajo el Convenio para la Prestación de Servicios Técnicos para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica mediante Modalidad Flexible en los departamentos de Copan, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara. El total de educandos fue beneficiado con paquetes didácticos, de los cuales 7,419 están siendo atendidos por los gestores educativos contratados por el proyecto y la diferencia a través del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) de la Secretaría de Educación (SEDUC). Actualmente, se está trabajando en la formulación del Convenio con el IHER para el año 2021.
  - Por otra parte, se cuenta con la no objeción de las primeras 24 carpetas de pre factibilidad para la construcción de 3 módulos escolares en igual número de escuelas. En este contexto se inició el proceso de contratación para la empresa constructora y la firma supervisora; las cuales se espera puedan iniciar las obras en el mes de febrero de 2021. De esta manera se logrará la construcción de los módulos en 9 escuelas adicionales a las planificadas (15) para ese año. Adicionalmente, está en proceso de formulación 9 carpetas nuevas para lograr llegar a 33.
- ✓ Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos:  
Está por contratarse la universidad internacional que apoyará a la Universidad Pedagógica Nacional en la formulación del currículo de formación inicial de docentes actualizado con más horas de práctica y la revisión de módulos de pedagogía. A continuación, se detallan los avances a la fecha:
- Primera versión del Plan de Estudios del Diplomado en Docencia para la Innovación en el Tercer Ciclo de Educación Básica, Diseño del Diplomado, que incluye la estructura del mismo, el perfil de egreso, la estructura Curricular, la calendarización, la práctica profesional y el perfil del Formador de Formadores de Docentes para el Tercer Ciclo de Educación Básica, Caracterización de la población docente que labora en el Tercer Ciclo de Educación Básica en la zona de influencia del Proyecto a partir de la base de datos de la Ficha de Docentes aplicada en 8 departamentos del país (Copán, Cortés, Francisco Morazán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa Bárbara).
- ✓ Componente 3: Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC:  
Se han conformado tres de los cuatro equipos técnicos bajo los temas de: Coordinar y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; Liderar la transformación de la formación docente para promover el aprendizaje activo; Ampliar la visión de aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a las escuelas.

**Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**

• **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV**

PROMINE tiene por objetivo general fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 41 proyectos de los cuales, 21 ya cuentan con la factibilidad institucional y con sus respectivas no objeciones por parte del organismo financiador, de los cuales 11 proyectos están en ejecución con un avance físico del 50% en promedio. Debido a la emergencia COVID-19 (Coronavirus) muchos procesos se paralizaron, sin embargo, a la fecha se ha avanzado en los procesos de contratación de 7 proyectos y por comprometer 3 proyectos cuyo monto contratado asciende a L152.4 millones esto con la finalidad de avanzar en la ejecución.

**Proyecto Ejecutado por Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM):**

• **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, (FN 000057-11 UPNFM):**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, y al Sistema de Información Financiera Integrado (SIAFI), no se registra avances en la ejecución física en este III Trimestre y a pesar de ya contar con la Licencia Ambiental y de presentar en este Trimestre el 99.% de la documentación y requisitos solicitados por parte de la alcaldía de San Pedro Sula para la obtención del permiso de construcción todavía no se cuenta con la aprobación de dicho permiso, dado que la declaración de la Emergencia Sanitaria por el COVID19 se ha complicado por parte de la Alcaldía San Pedro Sula en la emisión de este permiso.

El Proyecto fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario, desde el año 2019 a la Empresa Diseño, Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET), El monto a pagar a la constructora DICONSET según contrato es de L 38,473,450.10. La vigencia del contrato es del 16 de octubre de 2019 al 15 de diciembre de 2020, se le pagó el anticipo por L.7.7 millones; A la fecha, solo se ha realizado el pago del anticipo al contratista (DICONSET). No hay pagos adicionales debido a que la obra no ha iniciado la orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los dos permisos antes mencionados. Para este Contrato se solicitará ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN; por el desfase causado primero por la problemática de la Licencia Ambiental y el Permiso de Construcción, así como la situación de la Pandemia.

Así mismo, se suscribió contrato con la Compañía Supervisora del proyecto a la Empresa INDES S. de R.L. por el Consejo Superior Universitario. El monto a pagar a la empresa supervisora INDES según contrato es de L 1.9 millones. La vigencia del contrato es del 20 de diciembre de 2019 al 31 de marzo de 2021. Para este Contrato de Supervisión se solicitará ampliación al proyecto con nuevo cronograma de ejecución, en base a la solicitud de ampliación de tiempo del proyecto de la UPNFM ante La SEFIN.

**Proyecto Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA):**

- **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)” (BCIE 2069):**

Los principales avances del proyecto a nivel de componentes se describen a continuación

**Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:** La planta está construida al 100%. De los equipos complementarios se obtuvo la dispensa a finales de septiembre de 2020 y se hizo la recepción total, quedando pendiente la realización de los servicios complementarios como la finalización de la instalación, capacitación y puesta en marcha, pero debido a que el personal es extranjero, debido a las restricciones por la Pandemia de COVID.19, se está a la espera que mejoren las condiciones. Para el suministro e instalación del generador eléctrico ya se recibió el bien y las obras complementarias, tiene un avance físico del 95%.

**Construcción de Granja Avícola:** Se ha avanzado en las Obras Preliminares y las Estructuras

**Construcción de Planta Purificadora de Agua:** Se ha avanzado en las Obras Preliminares y Cimentación; asimismo se ha realizado trabajos de construcción.

**Equipamiento:** Se realizó el proceso de comparación de precios se invitaron a siete empresas oferentes de los cuales tres enviaron ofertas, pero en la revisión el comité de licitaciones declaró fracasado el proceso puesto que todas las empresas participantes sobrepasaron el monto máximo disponible.

**e) SECTOR SALUD:**

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, y el Programa de Apoyo a la red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente.

Los avances se muestran en la Secretaría de Salud y AEPAS-H

**Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).**

- **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, (BID 3723/BL-HO):**

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 31% de avance físico al III Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel:
  - Se alcanzó el 100% de la meta física.
  - Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM.
  - Adquisición de Materiales Accesorios y Bombas de Rociado.

- ✓ Gestores descentralizados de Segundo nivel:
  - Se programó la Firma de 3 convenios de gestión para el segundo nivel de atención
  - Se mantiene la prestación de servicios con los hospitales con quienes se firmó Convenios en el 2019 (Hospital Enrique Aguilar Cerrato y Hospital Leonardo Martínez); Se firmó Convenio de prestación de Servicios con el Gestor Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP).
  
- ✓ Fortalecimiento de Hospitales:
  - Hospitales priorizados cuentan con los lineamientos para la organización de los servicios hospitalarios
  - Otros logros: Entrega parcial de equipo médico a los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato.
  
- **Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:**

Al III Trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD), cuenta con un 88% de avance físico (37 Convenios de Gestores Descentralizados de primer y segundo nivel de atención, suscritos de 42 Programados; así como la contratación de 5 consultores para la Unidad Ejecutora), así mismo se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
  - Equipos de respuesta Rápida (ERR) contratados en varias regiones para el control de brotes (18 regiones sanitarias beneficiadas para contratar ERR).
  
- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
  - Firmados 37 Convenios de Gestión: 16 de primer nivel y 21 de segundo nivel.
  - Realizado el Primer Desembolso a 28 Gestores: 13 de primer nivel y 15 de segundo nivel por un monto de L225.5 millones.
  
- ✓ Administración del Programa:
  - Unidad Ejecutora contratada en 100%.

- **Hospital María de Especialidades Pediátricas, (ITALIA-HOS/MARIA):**

Dentro de las actividades reportadas por la unidad ejecutora se encuentran las siguientes:

Se reporta avance en las metas físicas en un 98% para el Lote 9 y un 57% de equipo Biomédico en el Lote 3. A la fecha no se reporta ejecución financiera, ya que para poder proceder al pago son necesarias las actas de recepción provisional las cuales se encuentran en firma en el Hospital María.

Durante el tercer trimestre se gestionó la sexta ampliación de plazo de ejecución al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de poder cumplir con los compromisos administrativos y financieros en relación a los contratos de suministros No. HN.001-2019-SS y No. HN.002-2019-SS correspondientes a los Lotes 3 y 9 respectivamente, con la Empresa Althea S.p.A.

- **Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, (EDCF No. HND-4) Fondos de Eximbank Korea:**

En aspectos de ejecución física, el proyecto no reportó avances, debido a que el diseño del Proyecto al momento de la revisión no cumplía con los requerimientos básicos de acuerdo a la normativa internacional de arquitectura hospitalaria según al informe que emitió la Organización Normativa Internacional de la Salud.

Durante el año 2019, se realizó visita in situ identificando; el área del terreno (8.0 manzanas), el cual fue donado por la Corporación de Bienes y servicios (CORBISE) a favor de la Secretaría de Salud e inscrito bajo el número 39 del tomo 1293 en el Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas del Departamento de Choluteca, se identificó que en el año 2015 se realizaron trabajos de nivelación y compactación, muro de Contención, 2 pozos de abastecimiento de agua, alcantarillado sanitario (42 tapaderas) y conformación de la carretera todo con fondos nacionales de contraparte, actualmente no se está realizando ningún tipo trabajo en el sitio del Proyecto.

La SEFIN, mediante Oficio DGCP-DEM-650/2019 de fecha 01 de Noviembre de 2019 envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar dichos recursos; quien mediante Oficio No. HND-4/19-4418 de fecha 18 de Diciembre de 2019 por parte del Korea Eximbank, requiere informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo.

**Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:**

El Proyecto tiene como Objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional. Se espera beneficiar al menos a 425,045 habitantes de los departamentos de **Lempira** (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); **Intibucá** (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); **La Paz** (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); **Ocotepeque** (Belén Gualcho); **Copán** (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copan Ruinas); **Choluteca** (Concepción de María, Duyure); **Olancho** (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); **Comayagua** (Comayagua); **Santa Bárbara** (Santa Bárbara); **Francisco Morazán** (Tegucigalpa).

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- ✓ Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales:

Para este período se garantizó la cobertura de atención a 425,045 personas, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención. Así mismo se logró la atención por parte de gestores descentralizados en el marco de la pandemia COVID-19.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:



- 763 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación.
- 731 puérperas recibieron al menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma.
- 880 mujeres tuvieron su parto y recibieron atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto.
- 833 partos institucionales atendidos.
- 21,667 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas.
- 2,741 niños que asisten a la reunión mensual de Atención Integral a la Niñez Comunitario (AIN-C).

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 2,165 atenciones de consulta externa.
- 10,481 atenciones de emergencia.
- 3,213 atenciones por complicaciones obstétricas.
- 877 atenciones por complicaciones neonatales.
- 2,846 partos atendidos.

✓ Componente II: Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud:

En este componente se logró la elaboración del Estudio de Pre-inversión y Programa Médico Arquitectónico para la construcción del nuevo bloque médico infantil del Hospital Regional de Occidente.

✓ Componente IV: Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.

Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel

#### **f) SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO y RIEGO**

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego. Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

#### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):**

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):**

Al tercer trimestre de este año, el proyecto presenta una ejecución financiera de 27%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

**El subproyecto sistema de Riego Sulaco:** En este trimestre, las actividades en la construcción del sistema de riego Sulaco, se han basado en fundición de presas, instalación de toma granjas, realización de pruebas hidrostáticas, instalación de tuberías, construcción de pedestales, instalación de cinchos para proteger tuberías, trabajos en puente sub proyecto Tascalapa, sin embargo los avances se consideran muy bajos en relación a lo planificado.

Durante el III Trimestre se han realizado con éxito las pruebas hidrostáticas de 16,054.77 metros lineales de tubería, para un acumulado a la fecha de 46,492.21 metros lineales de tubería aprobada con éxito, que representa un 35.79% del valor total contratado de 129,889.67 metros lineales.

Avances en Sitios de Presa. Durante el III Trimestre se fundieron 564 M3 de concreto, distribuidos así: 346 m3 en la presa de Maralito, 16 m3 en la presa de Siguapa y 202 m3 en la presa de Tascalapa. El proyecto Sulaco en general a la fecha presenta un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,456.91 M3 de un total contratado de 6,599.17 M3, lo que representa un 82.69% de avance.

Avances en Realización de Pruebas Hidrostáticas. Durante el III Trimestre se han realizado varias pruebas hidrostáticas, saliendo con éxito un total de 15,044.21 metros lineales y se tiene un acumulado a la fecha de 46,492.21 metros lineales que representa un avance a la fecha de un 35.79%.

Subproyecto Sistema de Riego de Olomán: Se continúa a la espera que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), emita la “No Objeción” al Diseño presentado con la alternativa del uso de un Equipo de Bombeo. Sin esta “No Objeción” no se puede dar la Orden de Inicio al contratista.

Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos: Beneficiara a 215 productores de riego alrededor de 112.96 hectáreas, se elaboró y revisó observaciones realizadas por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) las bases de licitación del proyecto de pequeño riego, para las rutas No. 1 y No. 2. Se revisó contrato de construcción del diseño y construcción de los proyectos de pequeño riego correspondiente a Lamaní (Lote No. 2) encontrándose inconsistencias en el mismo.

Subproyecto Sistema de Riego de Selguapa: No presenta avance de obra, aunque se ejecutaron obras en el canal principal, tuberías de distribución y tubería terciaria, en el caso de trabajos de campo las Cias SATO y SAYBE están elaborando actividades, con estrictas medidas de seguridad para los trabajadores y empleados de dichas empresas pero con poco personal.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1, IN-(DL98134500295569L) Fondos de Exim Bank India:**

El proyecto no presenta ejecución física ni financiera debido a que el Exim Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero..

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental “PROLENCA”, (FIDA-I-899-HN, FIDA-II-200000125200 y GEF-FSS-05-HN):**

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

**Componente 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:** Durante el tercer trimestre, se retomó el trabajo con las empresas que están realizando esta consultoría de

formulación e implementación de PFO, destinando el mes para la actualización de cuerpos directivos, tramites de PIN SIAFI y documentación de personerías jurídicas, es importante mencionar que se está trabajando de acuerdo a un protocolo de bioseguridad que se elaboró en coordinación con las empresas consultoras.

Formulación de 100 planes de inversión y se reportaron 20 planes de fortalecimiento organizacional mismos que fueron reportados en los sistemas SIAFI y GPR.

**Componente 2. Desarrollo Productivo y De Negocios:** Se realizaron reuniones de seguimiento con los 14 técnicos que están brindando los servicios de asistencia técnica a 48 organizaciones que ya tienen sus desembolsos FIDA y GEF, se realizaron giras de monitoreo y seguimiento a las inversiones que se están realizando.

En estas giras se supervisaron proyectos de infraestructura, cultivo de café y tiendas de consumo, además se revisaron procesos de compras y recopilación de contrapartidas. Se ha desembolsado a 21 organizaciones del lote de 90 y 10 organizaciones del lote de 59.

**Componente 3. Infraestructura Rural:** Durante el tercer trimestre se avanzó en la rehabilitación de caminos rurales terciarios, en una Longitud de 13.70 Km en el municipio de Gracias, Departamento de Lempira. El Proyecto Durante el año 2020 ha generado un total de 524 empleos. El Proyecto presenta al III trimestre una ejecución financiera del 43%.

#### **g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA:**

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente por la cantidad de **L559.3 millones** para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un **21%** de ejecución (**L117.2 millones**) para el tercer trimestre de 2020. Las principales metas ejecutadas al tercer trimestre son:

##### **Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad:**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

Las actividades realizadas al III trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:

**Componente:** Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- Diseño para la construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara y Diseños prototipos de Jefaturas Departamentales y Municipales de Policía. Estado: entrega del Etapa IV Diseño-Formulación de ET, Costos, Cronograma y Permisos (entregados en agosto 2020 los productos finales de diseño).
- Licitación Pública Internacional (LPI); Construcción de Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida. Estado: Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación de las propuestas técnicas.

## *Dirección General de Inversiones Públicas*

- Licitación Pública Internacional (LPI) Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de San Pedro Sula departamento de Cortés y en el municipio de La Vegas departamento de Santa Bárbara. Estado: Publicación de llamado a Licitación Pública Internacional (LPI), Recepción y Apertura de ofertas 09 de noviembre 2020.
- Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Unidad Metropolitana Policial SPS y Municipal Las Vegas, Santa Bárbara. Estado: recepción ofertas 09 de noviembre 2020.
- Contratación de la Empresa de Supervisión para la Construcción de Jefaturas Municipales en Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. Estado: en proceso de negociación de contrato, probable adjudicación la primera semana del mes de noviembre 2020.
- Contrato para la Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. Estado: Obra recepcionada en trámites de enmienda de cierre. Avance físico: 100%; Avance Financiero: 90%.
- Licitación Pública Nacional (LPN) para la Adquisición de dos Generadores Eléctricos, para la Subsecretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales y para la Unidad de Modernización SEDS. Estado: En adjudicación de contrato.
- Licitación Pública Nacional (LPN) para la adquisición de Servidores, Licenciamiento, Baterías de portátiles y Refacciones para impresoras para el fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales y Modernización. Estado: en proceso de adjudicación de contrato.
- Licitación Pública Nacional (LPN) para la adquisición de Mobiliario para la UMEP No. 2- Belén, la Unidad de Gestión y Apoyo a los Gobiernos Locales, la Unidad de Tutoría y Mentoría del Servicio Policial y la Dirección Modernización. Estado: en proceso de adjudicación de contrato.

### **Componente: Efectividad policial**

- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. Estado: En firma de contrato con la Empresa LEICA.
- Contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado: En ejecución de contrato.
- Contrato para el Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO). Estado: Producto final entregado.
- Contrato para compra e instalación del generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO-TAMARA. Estado: Obra e instalación entregada y en funcionamiento.
- Contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI. Estado: En ejecución de contrato.

- Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI.
  - Desarrollo los servicios de capacitación y primera visita documental, formando efectivos de la Dirección Policial de Investigación DPI, en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
  - Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, un Sistema de Gestión para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración ISO 17025:2017 y un Sistema de Gestión para los diferentes organismos que realizan la inspección ISO 17020:2012.

Estado: En ejecución de contrato.

- Contrato adquisición de Insumos y Equipo para la DPI
  - Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias inflamables.
  - Dos (2) estantes para almacenamiento de sustancias corrosivas.
  - Dos (2) Muflas Eléctrica.

Estado: Insumos y Equipo recepcionado por la DPI.

### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS 522-0501-4):**

Monto del Convenio es de \$14.6 millones, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11.7 millones; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$2.9 millones (efectivo: \$2.1 millones y especies: \$800,000.00), al 30 de septiembre cuenta con un presupuesto vigente de L 145.3 millones y una ejecución de L 46.2 millones que representa el 32%, para la rehabilitación de 6 centros escolares y 2 Unidades Departamentales de Prevención y Seguridad Comunitaria de la Policía Nacional, entre otros proyectos.

Por el estado de emergencia emitido mediante decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, a la fecha se han priorizado proyectos de Infraestructura y Equipamiento de establecimientos de salud con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia que atraviesa el país, según PCM-077-2020.

### **h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE:**

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo y la gestión de riesgo de desastres, a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres. Los avances al tercer trimestre se muestran a continuación:

### **Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:**

El Proyecto beneficiará a una población de 29,741 habitantes en el uso y gestión del capital natural, está focalizado en los departamentos de **Comayagua** (Comayagua, Esquías, La Trinidad, San Jerónimo y San José de Comayagua), **Francisco Morazán** (Distrito Central, El

Porvenir, Guaimaca, San Ignacio, Tatumbla, Valle de Ángeles, Vallecillo, Marale y Orica), **Cortés** (Santa Cruz de Yojoa) y **Yoro** (Victoria).

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al III trimestre se describen a continuación:

- ✓ Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:
  - El avance acumulado al 30 de septiembre 2020, es la elaboración de 37 planes de restauración, equivalentes a 31,843.43 hectáreas (93.66%); de los cuales, se aprobaron 34 planes, equivalentes a 30,459.34 hectáreas (89.57%); con convenios suscritos 30 planes, equivalentes a 29,571.10 hectáreas (86.97%) de los cuales se encuentran en ejecución 26 planes, equivalentes a **28,267.23 hectáreas (83%)**, de la meta programada (34,000 hectáreas) comprometiéndose recursos por L. 291.36 millones (97% del monto presupuestado) en inversión en mano de obra en los Planes de Restauración (PR) en ejecución, de los cuales se transfirieron a junio 2020 L. 52.2 millones (US\$ 2.1 millones).
  -
- ✓ Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:
  - Se elaboró el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento de las investigaciones, para ser sometido a no objeción del BID.
  - En ejecución la carta acuerdo SEFIN-ICF-UNACIFOR para el diseño del Programa de Capacitación en salud y sanidad forestal; se han recibido 2/4 de los entregables establecidos.
- ✓ Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS
  - Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las cuales finalizan en el mes de diciembre 2020. Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático, En ejecución contrato para el estudio de factibilidad de la conformación de fondos de agua o compensación de servicios ambientales.
- ✓ Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías
  - En ejecución los contratos para el levantamiento de la línea base del indicador de impacto CO2 a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática. En proceso de contratación, la consultoría de apoyo al monitoreo del indicador hídrico a ser coordinado por ICF con el asesoramiento de expertos en la temática. En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración.

#### **Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):**

- **El Proyecto Adaptación Al Cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR), (DCI-AL-4/2012/023-5 I0) KFW/UE:**

Durante el III Trimestre se reporta una ejecución física según SIAFI de un 0% y financiera de un 31% en relación al trimestre.

Según Unidad Ejecutora Durante el III Trimestre presenta una ejecución física de 100% y financiera de un 76.8% en relación al trimestre.

Según la Unidad Ejecutora nos muestra las actividades relevantes ejecutadas siguientes:

Actividades relevantes:

- Se han oficializado en las municipalidades de Iruya y Dulce Nombre de Culmí los reglamentos del funcionamiento de la administración municipal RFAM para la correcta aplicación de los mantenimientos catastrales.
- Se ha dado seguimiento a los planes de Vida de Jocomico y Las Marías Pech mediante evaluación de los componentes ejecutados por cada territorio, siendo la principal debilidad la gobernanza del territorio.
- Fortalecida la unidad para el mantenimiento de los Contratos de Usufructo Familiar en la zona de amortiguamiento de la Biosfera del Río Plátano, se ha incorporado un módulo de Contrato de Usufructo Familiar CUF dentro del SIT2 "Sistema de Información Territorial" de las municipalidades.
- Se ha apoyado acciones de monitoreo en la Biosfera del Río Plátano BRP principalmente para estudios de felinos y sus principales presas, además de la compra de imágenes satelitales que permitan la elaboración de estudios multitemporales para la evaluación de pérdidas o ganancias en la cobertura (este año se realizó un análisis multitemporal 2015-2019).

### **Proyecto Ejecutado por Comisión Permanente de Contingencias (COPECO):**

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

El avance físico obtenido al III Trimestre del 2020 es satisfactorio a pesar de la Pandemia del Covid-19, y con la reapertura de la reactivación económica se presentan resultado en las actividades siguientes:

Construcción de 6 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortes, Cortes, ii) Choloma, Cortes, iii) San Antonio de Cortes, Cortes, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro, Tela Atlántida Los contratos fueron firmados por un monto de L.62.5 millones incluyendo orden de cambio y cuya ejecución física está en un **80%**, la ejecución financiera es un **60%**, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 10 de Noviembre de 2020.

Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L.8.4 millones y cuya ejecución física se encuentra en 80%.

Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L.14.2 millones, y su avance físico es de 90%, este contrato tiene fecha de finalización 30 de octubre de 2020.

Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. Los contratos en ejecución firmados, suman un monto de L.12.5 millones, las fechas de entrega de bienes serán en los meses de octubre y noviembre del 2020.

Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoría social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, estos contratos están finalizados.

## i) SECTOR COMUNICACIONES

### **Proyecto Ejecutado por Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL):**

- **El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, (FP-HONDUTEL-22102) Fondos Propios:**

El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, presenta un 0% de ejecución financiera (L0.00) en lo que ha transcurrido del año. El proyecto no presenta ejecución debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP (Internet Protocolo), La Dirección Red IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

Se continuará con los procesos de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

### **1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Tercer Trimestre del Año 2020**

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
	La declaratoria de emergencia nacional por COVID19, según decreto ejecutivo No. 005-2020, de febrero del presente año, en el cual se determinó establecer toque de queda absoluto en el territorio nacional a partir de marzo de 2020, ocasionó la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales.	Las unidades ejecutoras deberán de realizar las modificaciones a sus planes operativos y planes de ejecución de sus proyectos, a fin de dar continuidad a las obras pendientes, ampliar fechas de extensión de contratos, o suspensión de contratos.



Área	Problemas	Acciones
Técnica	<p>Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.</p>	<p>Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.</p>
	<p>La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución</p>	<p>Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.</p>
	<p>Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.</p>	<p>Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.</p>
Administrativa-Financiera	<p>Retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales.</p>	<p>Revisar los artículos de las Normas de ejecución Presupuestaria, específicamente aquellos que afectan la ejecución de los proyectos.</p>
	<p>Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.</p>	<p>Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.</p>

<b>Área</b>	<b>Problemas</b>	<b>Acciones</b>
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
<b>Legal</b>	Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión.	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción. Aplicación de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos.

















ANEXO  
SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS  
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE 2020  
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Nro Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado III Trimestre				Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)	
	Total - 002 - Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven				-	-		188,774,008	188,774,008			40,175,740	40,175,740	21%		40,175,740	40,175,740	21%		61,643,599	61,643,599	33%
4	003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL	BID 4619/BL-HO	19/06/2019 - 31/05/2024		-	-		308,847,107	308,847,107			-	-	0%		-	-	0%		101,890,979	101,890,979	33%
	Total - 003 - PROYECTO DE MEJORA DE LA GESTION Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD MATERNO-NEONATAL				-	-		308,847,107	308,847,107			-	-	0%		-	-	0%		101,890,979	101,890,979	33%
1	<b>0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán</b>					<b>26,407,987</b>		<b>26,407,987</b>	<b>26,407,987</b>			-	-	<b>0%</b>		-	-	<b>0%</b>		-	-	<b>0%</b>
1	003 - Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM	FN 0000057-11 UPNFM	02/01/2012 - 02/12/2020	26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987			-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
	Total - 003 - Construcción de Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula de la UPNFM			26,407,987		26,407,987	26,407,987		26,407,987			-	-	0%		-	-	0%		-	-	0%
1	<b>0703 - Universidad Nacional de Agricultura</b>				-	-		<b>26,109,000</b>	<b>26,109,000</b>			<b>5,439,655</b>	<b>5,439,655</b>	<b>21%</b>		<b>5,192,168</b>	<b>5,192,168</b>	<b>20%</b>		<b>5,439,655</b>	<b>5,439,655</b>	<b>21%</b>
1	005 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)	BCIE 2069	30/06/2015 - 30/07/2020		-	-		26,109,000	26,109,000			5,439,655	5,439,655	21%		5,192,168	5,192,168	20%		5,439,655	5,439,655	21%
	Total - 005 - INCLUSIÓN SOCIAL A LA EDUCACIÓN SUPERIOR E IMPULSO DE LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE (UNA/PINPROS)				-	-		26,109,000	26,109,000			5,439,655	5,439,655	21%		5,192,168	5,192,168	20%		5,439,655	5,439,655	21%
<b>81</b>	<b>Total general PIP</b>			<b>1,152,983,768</b>	<b>11,468,496,657</b>	<b>12,621,480,425</b>	<b>1,276,072,400</b>	<b>10,504,126,188</b>	<b>11,780,198,588</b>	<b>239,023,591</b>	<b>2,879,217,028</b>	<b>3,118,240,619</b>	<b>26%</b>	<b>91,200,602</b>	<b>1,294,110,240</b>	<b>1,385,310,842</b>	<b>12%</b>	<b>308,576,571</b>	<b>3,870,244,743</b>	<b>4,178,821,314</b>	<b>35%</b>	
1	Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II)	N/A	N/A	1,013,000,000	-	1,013,000,000	1,644,700,000	-	1,644,700,000	101,500,000	-	101,500,000	6%					101,500,000	-	101,500,000	6%	
1	Fondos Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	N/A	N/A	4,500,000,000	-	4,500,000,000	4,500,000,000	-	4,500,000,000	711,460,000	-	711,460,000	16%					711,460,000	-	711,460,000	16%	
1	Programa de Infraestructura Vial	N/A	N/A	2,500,000,000	-	2,500,000,000	3,243,000,022	-	3,243,000,022	3,111,983,124	-	3,111,983,124	96%					3,111,983,124	-	3,111,983,124	96%	
5	Proyectos APP'S/	N/A	N/A	4,576,900,000	-	4,576,900,000	4,906,100,000	-	4,906,100,000	630,175,907	-	630,175,907	13%					630,175,907	-	630,175,907	13%	
<b>89</b>	<b>Total general</b>			<b>13,742,883,768</b>	<b>11,468,496,657</b>	<b>25,211,380,425</b>	<b>15,569,872,422</b>	<b>10,504,126,188</b>	<b>26,073,998,610</b>	<b>4,794,142,623</b>	<b>2,879,217,028</b>	<b>7,673,359,650</b>	<b>29%</b>					<b>4,863,695,602</b>	<b>3,870,244,743</b>	<b>8,733,940,345</b>	<b>33%</b>	

Fuente: SIAFI al 30/09/2020, Circular No. CGG-665-2020 y Circular No. CGG-524-2020 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.  
\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).
