



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

Informe General de la Inversión Pública

I Trimestre, Año 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2020

Contenido

| | |
|--|----|
| INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020..... | 3 |
| PRESENTACION | 3 |
| I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL I | |
| TRIMESTRE 2020 | 4 |
| 1.1 Inversión Pública Global 2020 | 4 |
| 1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público | 6 |
| 1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel de Sector | 7 |
| 1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP´s)..... | 8 |
| 1.5 La Inversión Pública a Nivel de Gabinete Sectorial..... | 9 |
| 1.6 Financiamiento de la Inversión..... | 9 |
| GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS..... | 10 |
| GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL: | 18 |
| GABINETE ECONÓMICO..... | 28 |
| GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA:..... | 33 |
| 1.7 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el primer trimestre del año 2020..... | 36 |

INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

PRESENTACION

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2020. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal 2020 asciende a **L25,211,380,425**, que incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), Programa de Infraestructura Vial, por un monto de **L4,576,900,000 y L2,500,000,000** respectivamente, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que asciende a **L4,500,000,000** y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por un monto de **L1,013,000,000**. Del monto total de la Inversión Pública aprobado para la gestión 2020 los Proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP) suman un monto de **L12,621,480,425** y que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH).

Al Primer Trimestre la Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de **L26,224,830,280** para la ejecución de 75 proyectos (incluidos cinco proyectos financiados a través de la modalidad Asociaciones Público-Privadas (APP) y tres Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) y 67 proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP).

El presupuesto vigente ajustado de la Inversión Pública al primer trimestre refleja un aumento global de **L1,013,449,855** respecto al presupuesto aprobado, esto debido a incrementos en los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por la cantidad de **L329,200,000**, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por la cantidad de **L631,700,000 y L950,000,022** en el Fideicomiso de Infraestructura Vial. Asimismo, el PIP muestra un presupuesto vigente ajustado de **L11,724,030,258** lo que refleja una disminución de **L897,450,167** respecto al aprobado por el Congreso Nacional.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL I TRIMESTRE 2020

1.1 Inversión Pública Global 2020

El presupuesto global de la Inversión Pública al Primer Trimestre del 2020 reporta un presupuesto vigente ajustado de **L26,224,830,280** que representa el **3.9% del PIB¹** para el 2020, el cual muestra un aumento global de **L1,013,449,855** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

Dicho aumento es debido a las adiciones en los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por la cantidad de L329,200,000, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por la cantidad de L631,700,000 y L950,000,022 en el Fideicomiso de Infraestructura Vial; y a la reducción de L 897,450,167 en el PIP. Ver cuadro No.1

Cuadro No. 1
Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de Marzo de 2020
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Sector Público | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente Ajustado | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
|-----------|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|
| 58 | Administración Central | 12,240,320,620 | 11,386,702,532 | 712,853,794 | 6% |
| 10 | Resto del Sector Público | 381,159,805 | 337,327,726 | 1,435,081 | 0% |
| 68 | Sub total PIP | 12,621,480,425 | 11,724,030,258 | 714,288,875 | 6% |
| 1 | Fondo de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza Extrema | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | 450,000,000 | 10% |
| 5 | APP's */ | 4,576,900,000 | 4,906,100,000 | | 0% |
| 1 | Programa de Infraestructura Vial | 2,500,000,000 | 3,450,000,022 | 1,252,072,760 | 36% |
| 1 | Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) | 1,013,000,000 | 1,644,700,000 | | 0% |
| 76 | Total General | 25,211,380,425 | 26,224,830,280 | 2,416,361,635 | 9% |

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-175-2020 y Circular No. CGG-2187-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.
*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

En relación al PIP, que muestra un presupuesto vigente ajustado de **L11,724,030,258**, lo que refleja una disminución de **L897,450,167** respecto al aprobado, de los cuales **L738,623,811** corresponden a Crédito Externo; **L85,583,084** a Donaciones Externas y finalmente **L73,243,272** Fondos Nacionales.

Esta situación obedece a la facilitación de espacio presupuestario durante el presente trimestre, para el traslado de espacio presupuestario de fondos a instituciones con estructura presupuestaria sin proyecto, específicamente para casos de fuentes externas (crédito externo y donaciones); tales como: la incorporación de L738,600,000 para continuar con el proceso de cancelación del pago del Pasivo Laboral a los empleados del SANAA, traslado de L27,940,000 para la Secretaría de Seguridad para el Programa de Promoción de Paz y Convivencia, traslado de L42,255,737 al Instituto de Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal ICF, para el Programa de Apoyo Europeo al Sector Forestal de Honduras (EuroFor)/ (PAPSFOR) y L 7,695,540 Fondos de aporte de Honduras al Plan Trifinio, en el Marco del Programa de Protección de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas en la Región del Trifinio. Entre otros.

Por su parte en la fuente 11 Tesoro Nacional, se debe a la aplicación de la Circular No. 003-DGP-2020 en aplicación al PCM 20-2020 de fecha 16 de marzo de 2020, el cual el establece

¹ El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2020 asciende a L.657,737,000,000, según cifra proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

que con el propósito de mantener una disciplina presupuestaria acorde con la Ley Orgánica del Presupuesto y con las metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas a aplicar en todas las Instituciones del Sector Público No Financiero una reducción en sus presupuestos que le permita obtener al menos el 2% del total del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal vigente. Asimismo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) queda facultada a realizar todas las operaciones presupuestarias necesarias para la aplicación del presente decreto.


Dado lo anterior, se procedió a la reducción del presupuesto de gasto operativo contenido en los Grupos de Gasto Servicios no Personales, Materiales y Suministros, Bienes Capitalizables, aplicando reducción en las estructuras de las Instituciones Descentralizadas como ser la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones Hondutel y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 31 de marzo del 2020 por la cantidad de **L2,416,361,635** reflejando un **(9%)** a nivel de devengado. El mismo incluye ejecución del Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) por la cantidad de **L450,000,000** y el Programa de Infraestructura Vial, su ejecución asciende a **L1,252,072,760** según el Sistema de Administración Financiera (SIAFI), para la ejecución de 76 proyectos detallados así: 58 para la Administración Central, 10 para el Resto del Sector Público, 5 de Asociaciones Público Privadas, 1 para el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor y 1 del Fondo Vial, y 1 para el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2).

El mayor porcentaje del PIP se concentra en los proyectos ejecutados por la Administración Central en los Gabinetes: Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas **(64%)**; el Social con **18%** y el Económico con **15%**, alcanzando en su conjunto, el **97%** de la inversión Pública para la gestión; en menor proporción se observa el resto de los Gabinetes.

En el transcurso del Primer Trimestre se han incorporado cuatro proyectos al PIP; tales como: proyecto nuevo Fortalecimiento Integral de la Red de Atención de Traumas y Urgencias de Tegucigalpa (INVESTH) y proyectos de arrastre Proyecto de Infraestructura Rural (FHIS), Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa De Copán (INSEP), Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. (IHCIETI).

Cabe resaltar que en el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

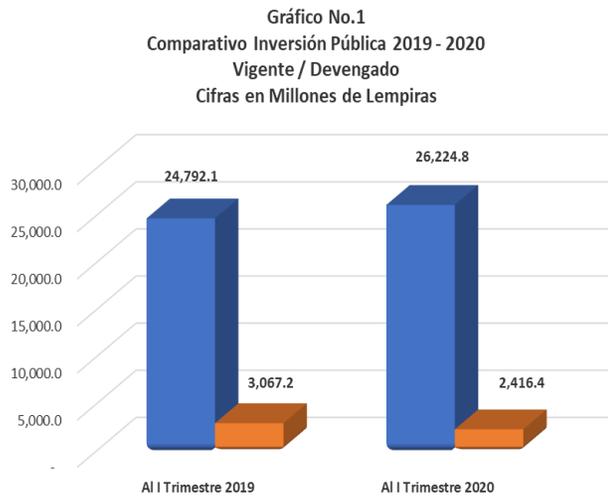

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-175-2020 y Circular No. CGG-2187-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.
Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al Primer Trimestre del 2020 a nivel de devengado incluye (Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor); muestra una reducción de 3 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre del año 2019 (12%), lo anterior se debe a retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales, por otra parte, a partir del 16 de marzo del presente año la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno por el

COVID 19 y las medidas de contención del gasto establecidas mediante Decreto Ejecutivo Numero PCM-020-2020, obligó a las instituciones a limitar la ejecución en varios rubros, como los indicados en la circular DGP-003-2020.

Adicionalmente, las restricciones en la aprobación de cuotas de compromiso, no les permitió a las Unidades Ejecutoras realizar los pagos de compromisos únicamente los sueldos y salarios. Dichas medidas han sido consideradas con el propósito de ejecutar fondos estrictamente para la emergencia nacional y controlar el gasto y déficit fiscal. Sin embargo, se han efectuado traslados de estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se pretende lograr que la ejecución de la Inversión Pública 2020 sea ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestaria.


1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente ajustado al Primer Trimestre del 2020, ascendió a **L26,224,830,280** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de las instituciones de la Administración Central, con **99%** específicamente en los proyectos ejecutados por INVEST-H, ENEE, INSEP, SAG, SESAL y SEDIS, proyectos APP, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Fondo Infraestructura Vial, y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), El resto del Sector Público alcanza apenas el **1%** de la Inversión.

La distribución del PIP de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. Asimismo, refleja una ejecución de **L714,285,875** representando un **6%** respecto al presupuesto vigente global.

En términos financieros del Programa de Inversión Pública, se registran mayores niveles de ejecución en INVEST-H **L319,808,674**; La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), **L84,778,588.16**; La Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG **L78,083,568**; La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social **L65,841,297**; y La Secretaría de Salud **L53,861,002** quienes en su conjunto suman **L603,373,133**; es decir que concentran el **91%** del total del presupuesto ejecutado correspondiente al PIP registrados en el SNIPH, (**L 714,288,875**); por otra parte, el Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), y el Programa Vial suman **L 1,702,072,759** de presupuesto ejecutado, haciendo un total de **L2,416,361,635**.

Gráfico N°2
Inversión Pública por Estructura del Sector Público
Cifras en Millones de Lempiras

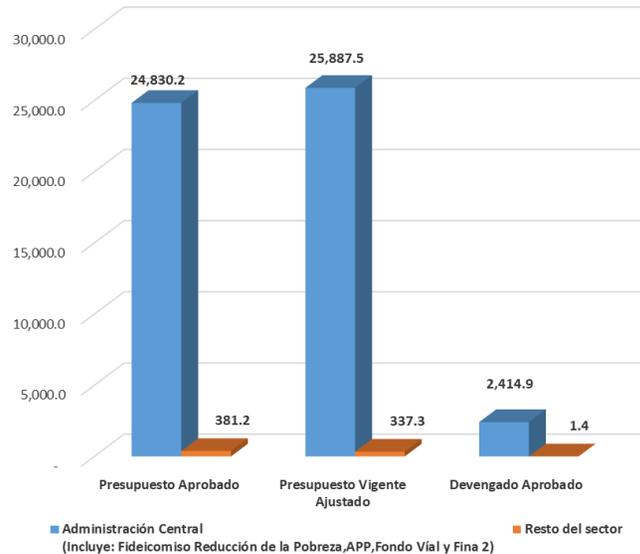


Fuente: SIAFI, Circular No. CCG-175-2020 y Circular No. CCG-2187-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019. Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

Para el ejercicio fiscal 2020 en las Normas de Ejecución Presupuestarias, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel de Sector

En cuanto a la ejecución a nivel sectorial, el Sector de Carreteras cuenta con el mayor porcentaje de ejecución L1,553.0 millones, **(64.3%)**; es el que concentra el mayor monto de ejecución presupuestaria, incluye el Plan de Infraestructura Vial a través del Fideicomiso ; seguido el Sector de Protección Social con L514.5 millones **(21.3%)**; de participación en relación al total del presupuesto ejecutado; incluye el fideicomiso de Fondo Social para la Reducción de la Pobreza; seguido el Sector de Desarrollo Productivo L124.8, millones **(5.2%)**; y en menor proporción el resto de los sectores como ser: Salud, **(3.1%)**; Riego, **(1.5%)**, Educación **(1.4%)** y Modernización del Estado con un **(1.3%)** y en menor proporción los sectores de recursos forestales y Ambiente y Seguridad y Defensa, con menos del **1%** de ejecución en cada uno de estos sectores. Ver gráfico No.3.

Gráfico No. 3
Distribución Sectorial: Inversión Pública Al 31 de Marzo de 2020
Presupuesto Ejecutado: L 2,416.4
 Cifras en Millones de Lempiras

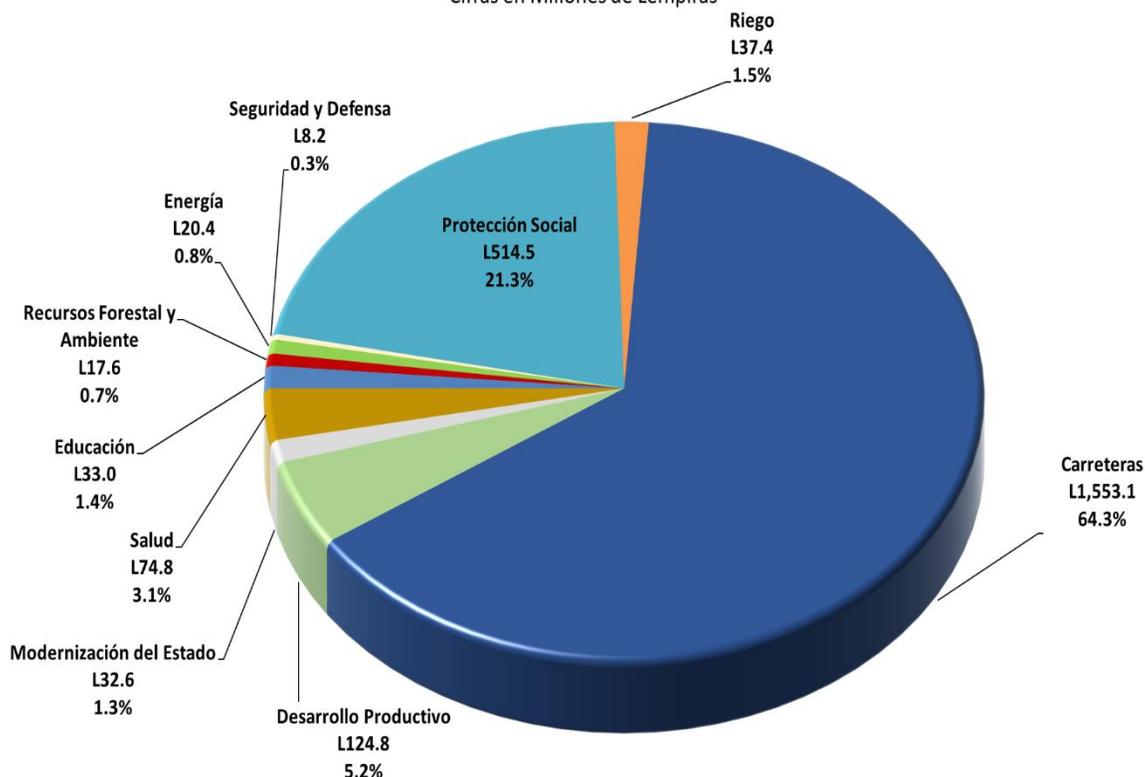


1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's)

Al primer trimestre de 2020, la Ejecución a nivel de fideicomisos y APP's, asciende a **L 1,702,072,760**, representando un **11.7%** respecto al presupuesto vigente de **L14,500,800,022** asignados a estos. Dicha ejecución corresponde al Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), por la cantidad de **L450,000,000** representando un **10%**, respecto al presupuesto vigente (**L4,500,000,000**) según el SIAFI y el Fideicomiso de Infraestructura Vial con una ejecución de **L1,252,072,760** representativo de **36%** de ejecución, respecto al presupuesto vigente (**L3,450,000,022**). Cabe mencionar que La Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), no reportó ejecución con respecto al presupuesto asignado para los proyectos APP's, los cuales cuentan con presupuesto vigente de **L4,906,100,000**, **0%** de ejecución. Asimismo, el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de **L1,644,700,000**, **0%** de ejecución, el Fiduciario **BANHPROVI** informó que no hay ejecución en el primer trimestre 2020, respecto a los fondos asignados.

1.5 La Inversión Pública a Nivel de Gabinete Sectorial

En el marco de la reforma a la Ley General de la Administración Pública, Según Decreto Ejecutivo número PCM-009-2018 se conformaron Gabinetes Sectoriales que agrupan las instituciones de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones. En el gráfico No.4 se muestra la Inversión Pública distribuida en diferentes Gabinetes.

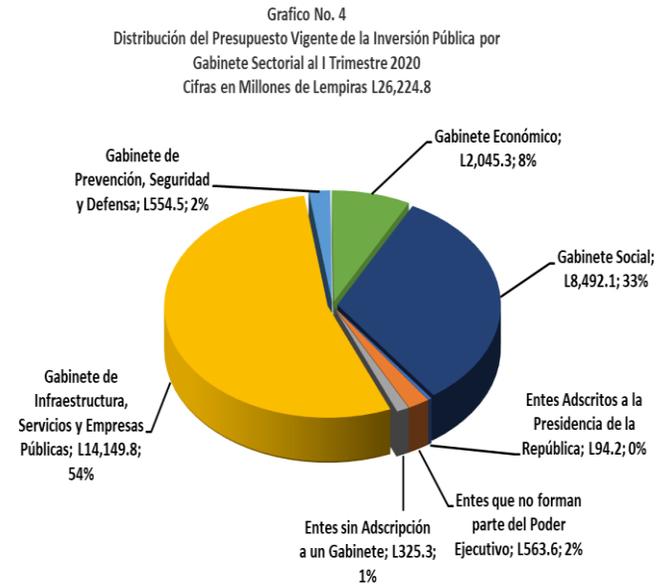

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-175-2020 y Circular No. CGG-2187-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019. Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

A nivel de presupuesto vigente el Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas cuenta con el mayor porcentaje de participación **54%**, Incluye (el Plan de Infraestructura Vial y Proyectos APP's), el

Gabinete Social con el **33%** de participación, contempla (el Fondo Social Reducción de la Pobreza Vida Mejor y el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), seguido el Gabinete Económico con un **8%** y en menor porcentaje el resto de los gabinetes.

1.6 Financiamiento de la Inversión

El **59.4%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente Ajustado es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor, APP's, Plan de Infraestructura Vial y Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), y el **41.6%** por fondos externos; de estos el 85% es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el 15% por donaciones (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.2

Cuadro N° 2
Programa de Inversión Pública: Clasificación Fuente de Financiamiento al 31 de Marzo del 2020
Cifras en Lempiras

| Fuente de Financiamiento | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente Ajustado | Devengado Aprobado | % de Ejec. (Ejecutado/Vigente) |
|---|-----------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fondos Nacionales | 1,152,983,768 | 1,079,740,496 | 112,478,213 | 10% |
| 11 - Tesoro Nacional | 975,118,394 | 955,118,394 | 111,606,147 | 12% |
| 12 - Recursos Propios | 177,865,374 | 124,622,102 | 872,066 | 1% |
| Fondos Externos | 11,468,496,657 | 10,644,289,762 | 601,810,662 | 6% |
| 21 - Crédito Externo | 9,775,652,668 | 9,037,028,857 | 487,382,098 | 5% |
| 22 - Donaciones Externas | 1,692,843,989 | 1,607,260,905 | 114,428,564 | 7% |
| Total general | 12,621,480,425 | 11,724,030,258 | 714,288,875 | 6% |
| Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)** | 4,500,000,000 | 4,500,000,000 | 450,000,000 | 10% |
| Proyectos APP*/ | 4,576,900,000 | 4,906,100,000 | | 0% |
| Programa Vial | 2,500,000,000 | 3,450,000,022 | 1,252,072,760 | 36% |
| Fina 2** | 1,013,000,000 | 1,644,700,000 | | 0% |
| Sub Total | 12,589,900,000 | 14,500,800,022 | 1,702,072,760 | 12% |
| Gran Total | 25,211,380,425 | 26,224,830,280 | 2,416,361,635 | 9% |

Fuente: SIAFI, **Circular No. CGG-175-2020 y Circular No. CGG-2187-2019 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo */ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destacan la INVEST-H, INSEP, ENEE, SAG, SEDIS orientado a la construcción de carreteras, proyectos de energía, construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, Microempresas).

En seguimiento a las Normas de Ejecución Presupuestaria del Año 2020, en su Artículo 28, que literalmente expresa que; “Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones, el Formulario (FMP-05) denominado “Documento de Modificación Presupuestaria” generado por el SIAFI, tendrá el mismo efecto de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.....

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Gabinete se muestran a continuación:

GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

El Gabinete Sectorial Infraestructura Servicios y Empresas Públicas está conformado por 6 Instituciones Públicas y son: Fondo Hondureño de Inversión Social (**FHIS**), Inversión Estratégica de Honduras (**INVEST-H**), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (**INSEP**), Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (**ENEE**) y La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (**HONDUTEL**).

Al Primer Trimestre el Gabinete de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas cuenta con un presupuesto vigente ajustado de **L5,745,006,030**, su ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2020, asciende a **L458,055,864 (8%)** según SIAFI. La Distribución de la Inversión del Gabinete está concentrada en: Inversión Estratégica de Honduras (**INVEST-H (53.5%)**); Empresa Nacional de Energía Eléctrica (**ENEE (20.9%)**) Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (**INSEP (13.6%)**); Fondo Hondureño de Inversión Social (**FHIS (8.8%)**); Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS (2.6%)**) y en menor porcentaje La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) con un (**0.2%**) de inversión.

Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVEST-H:

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID_2470/BL-HO-1 y BID_2470BL-HO-2):**

La Programación del trimestre incluía pagos de obra y supervisión de tramos (Choluteca Guasaule), por un monto de US\$502,067.31, pero debido al retraso en la aprobación de la reforma de algunos artículos por parte del Congreso Nacional, impidió la realización de modificaciones presupuestarias del grupo 40000 por lo que, no se logró incluir las estructuras requeridas en el presupuesto vigente de INVESTH. Adicionalmente, la programación incluía

de US\$763,360.04 por devolución de la retención del tramo Júcaro Galán-El amatillo. Sin embargo, se determinó realizar el pago hasta que la supervisión de su Visto Bueno a la reparación de las obras.

Durante el primer trimestre del 2020, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) continúan dando mantenimiento a 735 km de caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca, de los cuales se reportan 315 km en el trimestre.

- **Programa de Integración Vial Regional II, (BID-3815/BL-HO):**

En cuanto al Programa de Integración Vial Regional II, el avance físico al 31 de marzo es el siguiente: Lote A “La Barca - Potrerillos”- 99.08%, Lote B” Potrerillos-Pimienta”- 100 %. Un global de 99.50% de avance en los 23 km de longitud, pendiente las actividades de cierre y pagos finales por estimaciones, el programa tiene fecha fin el 29 de mayo de 2020.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, (BCIE 2116 y BCIE-2205):**

La obra física del Tramo “El Quebrachal-Goascorán” se encuentra finalizada, mismas que consistieron en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica de 46.18 km. Es importante hacer notar que debido a que, al cierre del 2018, ya se contaba con 29 km con carpeta asfáltica terminada.

Para el 2020, se encuentran pendientes de trámite de pago USD 56,086.09, correspondiente al Informe Mensual No. 1 de la supervisión del proyecto y el pago de la estimación No.1 del contratista por un valor de USD 32,781.8

- **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID y TF017904):**

Durante el 2020, el proyecto se encuentra en proceso de cierre y en implementación de la estrategia de salida para consolidar capacidades productivas de los productores beneficiados con sistemas de riego en los 6 departamentos de la zona de influencia.

Se superó la meta de eventos durante el trimestre, alcanzando 2,568 visitas/eventos, los eventos relacionados con los temas de producción agrícola y pecuaria continuaron siendo los de mayor asistencia, seguidos por los eventos en las áreas de manejo de recursos naturales, postcosecha, género, habilidades de negocios, finanzas y crédito, e información de mercado.

A través de los gestores descentralizados de servicios de salud (GDSS) se alcanzaron un total de 14,166 niños atendidos en la vida del proyecto. Más de 880 continuaron con ese apoyo durante el primer trimestre del 2020. A la fecha esta actividad vinculada a nutrición ha sido finalizada.

- **Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, tramo Neteapa – Danlí. (BID_2470/BL-HO-1 y BID_2470BL-HO-2 BID-3815/BL-HO):**

El 11 de junio de 2019, se aprobó la Nota de Prioridad del proyecto y se completó su registro en el SNIPH. Asimismo, en dicho mes se realizó la incorporación de espacio presupuestario en la presente gestión, el 26 de agosto se dio la orden de inicio a las obras del tramo Neteapa – Danlí.

Al primer trimestre del 2020, El Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, Tramo Neteapa- Danlí con una longitud de 34.92 km, presenta los siguientes avances físicos: 14.32% en el lote A (Estación 54+240 - Estación 74+240) y 18.49% en el lote B (Estación 74+240 a la 89+160), un global de 16.1%.

En relación a los productos a nivel de actividad obra de Conservación del Patrimonio Vial, se desarrollaron actividades de conservación en 430.8 km de accesos a cabeceras municipales. Asimismo, 694.74 km de la red vial pavimentada recibieron mantenimiento rutinario con atención de microempresas asociativas de conservación vial (MEACV); en más de 590 de esos kilómetros se desarrollaron actividades de bacheo asfáltico.

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO**

Con referencia al Proyecto Ciudad Mujer, se encuentra en construcción el Centro Ciudad Mujer en la ciudad de Choluteca, presentando al 31 de marzo un avance físico de 27%.

- **Programa de Infraestructura Vial (Fideicomiso)**

En relación a los productos a nivel de actividad obra de Conservación del Patrimonio Vial, desarrollados bajo el Fideicomiso de Infraestructura Vial el cual tiene una asignación Presupuestaria Vigente de L3,450.00 millones.

Durante el primer trimestre del 2020, se desarrollaron actividades de conservación en 430.8 km de accesos a cabeceras municipales.

Asimismo, 694.74 km de la red vial pavimentada recibieron mantenimiento rutinario con atención de microempresas asociativas de conservación vial (MEACV); en más de 590 de esos kilómetros se desarrollaron actividades de bacheo asfáltico.

Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):

- **Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Valladolid-la virtud-Mapulaca con una longitud aproximada de 30 km localizado en el departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):**

El proyecto inició su ejecución a partir del 19 de septiembre 2019 donde se le otorgó la orden de inicio al supervisor, , el Contratista presentó una ejecución física acumulada del 68.13% y una ejecución financiera acumulada del 68%, el proyecto tiene un plazo de ejecución de 25 meses.

Al 31 de marzo del 2020 se han pavimentado 22.69 km con concreto hidráulico. Lo que denota la buena ejecución que ha tenido el contratista desde que inició el proyecto.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF).**

Al Primer Trimestre de 2020 el proyecto presenta un avance físico de 98.75% este porcentaje ya solo corresponde al Lote No.3, el cual corresponde a la pavimentación con concreto asfáltico entre la estación 55+820 hasta la estación 56+960 y las obras de mitigación de la falla geológica entre dichas estaciones 55+820.

En la parte financiera se estuvo gestionando los fondos tanto externos como nacionales, en donde la SEFIN le incorporó un monto de crédito externo por la cantidad de L187 millones y L14 millones de donación. Asimismo, se gestionaron fondos nacionales por un monto de L7.0 millones, para finalizar el proyecto, la SEFIN informó que deben identificar los recursos dentro del presupuesto asignado en la institución.

Se otorgó Ampliación de plazo a diciembre del 2020. Pero, BEI recomendó una ampliación a junio de 2021 para terminar estudios sobre las fallas geográficas en el tramo 3 del corredor de occidente.

A la fecha se continúan ejecutando obras en el Lote No.3, las cuales consisten en la pavimentación con concreto asfáltico aproximadamente de 800 metros lineales, ubicados en la falla geológica entre las estaciones 55+820 y 56+960. De igual forma se están realizando las obras de mitigación geológica en dichas estaciones.

Al 31 de marzo, se realizó la supervisión de la construcción ejecutada por el contratista, dichos trabajos corresponden a la supervisión de la pavimentación con concreto hidráulico entre la estación 55+820 hasta la estación 56+960 y la supervisión de las obras de mitigación de la falla entre las estaciones antes mencionadas.

En la parte financiera se gestionaron los fondos necesarios para finalizar la supervisión del proyecto, sin embargo, el proceso se detuvo debido a la crisis actual que sufre el país causada por el COVID-19, desde el 16 de marzo a la fecha.

Se logró gestionar el reasentamiento de las familias afectadas quedando pendiente el trámite de pago al contratista, debido a la crisis actual que azota el país.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros, (Fondos Nacionales 0000003-13):**

El proyecto inició su ejecución en el año 2013, de manera intermitente hasta el 2016 donde fue suspendido debido a la falta de recursos presupuestarios. Durante dicho tiempo de ejecución se logró ejecutar 6.5 kilómetros de una longitud total de 9 km.

El Proyecto logró completar la pavimentación de los 9 km de carretera que estaban contemplados en el objetivo del proyecto. El avance físico representa un 74% según el alcance contemplado en la nota de prioridad.

Para el primer trimestre del año 2020, este proyecto no cuenta con ejecución financiera debido a que el proyecto requiere de la aprobación por parte del Congreso Nacional a las modificaciones No. 4 de los contratos de la Empresa Constructora y Supervisión.

Mientras tanto, INSEP deberá gestionar la aprobación de estas modificaciones para continuar con la ejecución física y financiera.

- **Construcción de infraestructura en áreas deportivas y de convivencia social en: Colón, Intibucá, Yoro, Copán, Ocotepeque, Atlántida y Comayagua.**

El proyecto tiene un presupuesto aprobado de L15,000,000 y una programación anual de 2,450 m2. Se estaba trabajando en bases de licitación y términos de referencia de los contratos para los proyectos, procesos que se han detenido ya que a partir del 16 de marzo no se está laborando por la pandemia del Covid-19. Por lo que no hubo ejecución física ni financiera.

- **Construcción y pavimentación de 11,040 metros lineales de calles en los departamentos de: Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca, Cortes, Comayagua, Copan, Atlántida, Colon, Intibucá, Lempira, Ocotepeque, Yoro, Santa Bárbara y Valle.**

El proyecto tiene un presupuesto aprobado de L 101,199,951 y una programación anual de 11,040 ML, Equivalente a 11.04 Km. Se estaba trabajando en bases de licitación y términos de referencia de los contratos para los proyectos, procesos que se han detenido ya que a partir del 16 de marzo no se está laborando por la pandemia del Covid-19. Por lo que no hubo ejecución física ni financiera.

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional, (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Los principales avances alcanzados al primer trimestre se resaltan: Evaluación final del contrato de préstamo, Auditoría Final del Proyecto con "Opinión Limpia", Equipo de cómputo para el Centro Nacional de Despacho (CND), Contenedor para archivo de la documentación del contrato de préstamo adquirido, Auditoría Externa del Proyecto realizada y con la donación GRT/SX-16864-HO avance de obra de 77% en la Construcción y Ampliación de las Subestaciones Eléctricas de Progreso y Toncontín (230-138 kV).

- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverl - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Se ha comprobado que todas las 38 estaciones hidroclimatológicas están en funcionamiento y transmitiendo ya datos. Para el mes de abril únicamente falta un pendiente menor: (i) la Instalación de escalas en Jícaro y Jacagua, al igual que completar toda la

documentación final del proyecto (incluyendo los manuales de operación del sistema, planos AsBuilt, etc.)

La fecha de finalización de la estaciones hidroclimatológicas, es el 24 de abril del 2020. A pesar del estado de emergencia sanitaria vigente no se contempla una ampliación a la fecha estimada ya que se han finalizado todas las obras, y actualmente los equipos se encuentran ya en operación.

La Auditoria del año 2019 para el Proyecto, fue emitida con "Opinión Limpia", entregado el Informe al Banco el 13 de marzo del año 2020, mediante Oficio UCP-235-III-2020; mismo que ya cuenta con No Objeción No. CID/CHO/396/2020.

Las Subestaciones Eléctricas de Cañaverál y Río Lindo rehabilitadas a finales del año 2019, se encuentran en proceso de elaboración de Orden de Variación final.

Prestamo 3435/BL-HO: El Avance Físico del Proyecto es del 82% y el Financiero del 81% quedando pendientes temas claves con el Contrato de "Sistema de Excitación" para el contratista ANDRITZ Hydro y Contrato de "Obras del Canal de YURE" y con el Prestamo JICA-HO-P6; los Contratos con la Japonesas Hitachi y Toshiba para la finalización Física y Financiera de las obras.

- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica**

El proyecto fue incorporado en este primer trimestre al Programa de Inversión Pública logrando los avances en el Documento de Licitación, Plano y Presupuesto de la Obra del Paquete 1/3 del "Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito"; a solicitud del BID, en actualización a la versión más reciente (abril 2019) del Documento Estándar de Licitación (DEL) para la contratación de obras con contratos de precios unitarios, mediante licitación pública internacional (LPI) en proyectos financiados total o parcialmente por el BID.

Se encuentra en proceso la presentación de ofertas por parte de las Firmas Consultoras que integran la lista corta para la "Supervisión y Gestión del "Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura -San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito"

Proyecto Ejecutado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS):

- **Proyecto De Energía Renovable Para El Desarrollo Rural Sostenible Pro-Energía Rural, (EDCF No. HND-5) Fondos de Korea Eximbank:**

En el 2020 el Proyecto se encuentra en la etapa de Operación, Mantenimiento y Soporte de los Sistemas Fotovoltaicos para Viviendas, Escuelas y Centros de Salud, de igual manera se desarrollan diversos planos laborales y de ejecución como:

- Supervisión de Juntas de Energía las cuales son las autoridades comunitarias encargadas de dar auto sostenibilidad al Proyecto y velar por el excelente funcionamiento de los sistemas solares.

- Supervisión de sistemas fotovoltaicos instalados en Vivienda, Escuelas y Centros de Salud, requisito principal para realizar la recepción de obra.
- Recibimiento de repuestos de equipos en Aduanas y Bodegas.
- Capacitación de técnicos solares para instalación e inventarios de equipo fotovoltaico.
- Además de procesos administrativos fundamentales del Proyecto.

Durante el primer trimestre se han realizado supervisiones de los sistemas Fotovoltaicos en los 6 departamentos (Ocotepeque, Copan, Lempira, Intibucá, Santa Barbara, La Paz), así como la supervisión de Juntas de Energía en los departamentos, donde realizo la creación de Juntas de Energía de las cuales al primer trimestre del 2020 se refleja un 100% respecto a las metas.

Dentro de los avances físicos más relevantes del Proyecto, se destacan los siguientes:

1.Instalación de 21,036 Sistemas Fotovoltaicos para viviendas, 416 Escuelas y 34 Centros de Salud en los Departamentos de Ocotepeque, Copan, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, lo cual refleja un 100% en la ejecución física del Proyecto.

2.Creación de cronograma de Supervisión y Seguimiento de 129 Juntas de Energía en los departamentos de Ocotepeque, Copan, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, para lograr el objetivo principal del componente de organización y empoderamiento, estableciendo en las comunidades los conocimientos necesarios para que puedan ahorrar y logren que sus equipos fotovoltaicos puedan durar hasta 30 años con calidad y buen estado.

3.La Supervisión de 336 Instalaciones de Sistemas Fotovoltaicos, reflejando un porcentaje de Ejecución de un 50.90% con respecto al total de meta de supervisión para el año 2020. cabe destacar que en la supervisión realizada hasta la fecha se ha determinado el buen nivel de calidad en Instalaciones en los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Copán, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, requisito fundamental para la recepción de obra y Carta de Intención para una Segunda Fase del Pro-Energía Rural.

Proyecto Ejecutado por Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL):

- **El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, (FP-HONDUTEL-22102) Fondos Propios:**

La reducción del presupuesto en un 38.9%, a la Institución más las limitantes existentes de flujo de efectivo de la empresa conllevaran a la no disponibilidad de fondos que acortaron significativamente aún más la disponibilidad de presupuesto de inversión, afectando los alcances proyectados de la ejecución física y financiera, para este primer trimestre se dio 0% de ejecución según SIAFI.

Los alcances que no se han logrado y considerando que el proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación ha sido diseñado como un plan integral de desarrollo de las infraestructuras de telecomunicaciones, se trasladó su ejecución para el presupuesto 2020, siempre limitado y priorizado con lo que permita el monto de inversión disponible en el año.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS):

• **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

A continuación, véase los avances por productos al 31 de marzo de 2020:

• Los Proyectos de integración urbana el cual incluyen: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, colonias 25 de enero, Australia, Nueva España, Nueva Galilea, a la fecha, las actividades preliminares: entrega de sitio, construcción de bodegas, levantamientos topográficos, toma de muestras para estudios de suelos (calicatas) y capacitación de personal en la aplicación de medidas del PGAS (Plan de Gestión Ambiental y Social) y seguridad en barrios socialmente vulnerables al mes de marzo de 2020 se tiene la instalación de servicios básicos de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y pavimentación de calles en sectores de los barrios beneficiados; el porcentaje de avance físico de este producto es de un 14% y tiene un avance financiero de 40% en relación al monto contratado que es de L 128,592,322.09.

• El proyecto de equipamiento social el cual incluye, Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, Ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, Ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, Construcción Centro Comunal, Colonia Australia y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de enero, al mes de marzo de 2020 se tiene un avance físico promedio del 48% y un avance financiero del 28% en relación al monto contratado que es de L 10,967,584.51.

• El Programa de Deportes y Valores: consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al trimestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o jóvenes con discapacidad y mujeres que practican el baile de Zumba. En el programa participan 1,337 niños y jóvenes en 16 secciones deportivas de 2 horas, impartidas de lunes a viernes.

• **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS 522-0501-4):**

El propósito de esta actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Por el estado de emergencia a nivel nacional emitido mediante Decreto, se suspendió la ejecución de proyectos, lo que conllevó a una reprogramación de las actividades. A la fecha se está trabajando en el desarrollo de un plan de contingencia con el organismo financiador con el objetivo de hacer frente a los desafíos en esta etapa de emergencia.

- **Programa Infraestructura Rural (BCIE), Agua y Saneamiento, (BCIE-1736):**

Proyecto que consiste en Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

Se solicitó a lo interno del SEDECOAS/FHIS una modificación de aprovechamiento de espacio presupuestario, disminuyendo así el espacio del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB) y creando espacio para PIR, con el fin de mantener el equilibrio presupuestario a nivel institucional, por la cantidad de L5000,000.

Actualmente se encuentra en etapa de cierre y en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento con un 99% de avance físico. En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución de un (1) subproyecto: Pavimentación del Casco Urbano del Municipio de Magdalena.

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/ KFW SE-FHIS FASE III y IV, (2014 67 414 (KFW) / FHIS – SE y SE/FHIS VIII No.2008-66-178):**

PROMINE tiene por objetivo general, fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la Secretaría de Educación y la gestión local participativa, así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico).

Con relación a la Fase IV, actualmente no se ha finalizado la construcción de 11 subproyectos que estaban en ejecución debido a la suspensión en campo por la emergencia suscitada por el COVID-19 (Coronavirus), sin embargo, a principios del trimestre se comenzaron actividades de capacitación en el Departamento de Gracias a Dios, asimismo, se finalizó la formulación de seis subproyectos de infraestructura en este mismo Departamento, así como desembolsos a los Comités Ejecutores de los Proyectos (CEP).

GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL:

Este Gabinete Sectorial Social lo conforman 17 instituciones de las cuales cinco (5) instituciones: Secretaría de Salud (**SESAL**), Secretaría de Educación (**SEDU**), Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (**SEDIS**), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**UPNFM**), Universidad Nacional de Agricultura (**UNA**) y la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, ejecutan 16 programas y proyectos de inversión pública.

El Gabinete tiene un presupuesto vigente ajustado de **L2,150,745,830** en el primer trimestre logró una ejecución de **L131,140,465**. Equivalente el **6%** respecto al presupuesto vigente. La Distribución de la Inversión del Gabinete, está concentrada mayormente en la Secretaría de Salud (**SESAL**) (**46%**), Secretaría de Desarrollo e Inversión Social (**SEDIS**) (**31%**); Secretaría de Educación con un (**21%**) seguida la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**UPNFM**) (**1%**) y en menor proporción el resto de las instituciones.

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación y salud.

Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan las Traslaciones a las Familias de Extrema pobreza. Entre estos se encuentran.

• **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (BID 3371/BL-HO):**

Durante este primer trimestre en el Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica: se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones. En el primer trimestre de 2020, se efectuó el pago de las obras de ampliación para el Tercer Ciclo en: 19 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Copán (2), La Paz (6), Lempira (3), Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes, Lempira (3), Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes, y de los 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes.

De igual manera, se realizó el pago final del 20% por concepto de supervisión de obras de infraestructura de los diecinueve (19) Centros de Educación Básica (CEB) y la estimación No.3 de la supervisión de las obras en 34 Centros de Educación Básica en los departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en dieciséis (16) lotes. en los CEBs Gracias a Dios, Valle de Ángeles, Opatoro, La Paz. CEB 4 de junio, Santiago, Santa Ana, La Paz. CEB José Cecilio del Valle, San Isidro, Santa Ana, La Paz.

Se recepcionaron 16 CEB en los departamentos de Copán (3 CEB) en los municipios de San José (1 CEB) San Nicolás (1 CEB) San Antonio (1 CEB), Intibucá 1 CEB: municipio de Colomoncagua, La Paz 5 CEB: Santa Ana (2 CEB), Santiago de Puringla (2 CEB) y Opatoro (1 CEB), Lempira: 1 CEB, Ocotepeque 3 CEB: San Jorge (1 CEB), Encarnación (2 CEB), Santa Bárbara, 3 CEB: San Marcos (2 CEB) y Nueva Frontera (1 CEB)-Adicionalmente, se efectuó el pago de honorarios de cuatro (4) Ingenieros Supervisores de infraestructura en los Centros de Educación Básica.

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):**

En el primer trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)**, se realizó el pago por L2,878,173.48 de la comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de TMC a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 30 de diciembre del 2019.

Se efectuó el pago de la Comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2019, Dominio Urbano a los participantes del Programa.

El **Componente Fortalecimiento Institucional**: Entre las actividades realizadas bajo el componente de Fortalecimiento Institucional en el primer trimestre de 2020, se continuó apoyando la implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva Local para los hogares participantes del Programa Bono Vida Mejor, a través de:

- Dos (2) consultores para apoyar la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva para los hogares participantes del PBVM,
- Tres (3) consultores a nivel local para la identificación de la oferta institucional para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva,
- Un (1) consultor para apoyar los procesos de Gestión Administrativa para la Implementación de la Estrategia de Inclusión Productiva.

Con el objetivo de garantizar la operatividad del PBVM tanto a nivel central como a nivel comunitario, se continuó con los servicios de dieciséis (16) Coordinadores Departamentales y ciento setenta y uno (171) Gestores Sociales, quince (15) Oficiales de Atención al Participante, cuatro (4) Técnicos en Seguimiento de Auditoría, cuarenta y uno (41) Digitadores SSIS/PRAF y dos (2) supervisores de Digitadores, un Asistente Operativo de la Dirección de TMC.

Adicionalmente, se asignaron viáticos de las giras realizadas con los propósitos: i) dar seguimiento a la Estrategia de Inclusión Productiva de las familias participantes del Programa Bono Vida Mejor, vinculada a al Programa Nacional de Alimentación en los Departamentos de Cortés, La Paz, Lempira y Santa Bárbara, ii) supervisar, verificar, cargar bienes nacionales, hacer entrega de suministros y material visual al personal operativo de campo en los departamentos de Choluteca, Valle, El Paraíso, Atlántida, Yoro, Colón y Olancho, iii) seguimiento a la estrategia de Inclusión Productiva de los hogares participantes del Bono Vida Mejor, participando en jornadas de trabajo en territorio propuesto para la extensión de la estrategia, en el Departamento de Santa Bárbara, iv) supervisión, verificación de inventario y entrega de material visual del Programa Bono Vida Mejor, en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Santa Bárbara y Cortés.

El **Componente Piloto de Superación de Pobreza**: En el primer trimestre 2020, no se programó ejecución física ni financiera para el periodo reportado.

- **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

Dentro del Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano y de la Implementación de la Estrategia de Transición Integrada, Se efectuó el pago de la Comisión bancaria correspondiente a la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2019, Dominio Urbano a los participantes del Programa.

Cabe mencionar, que se llevaron a cabo las reuniones con el Instituto Hondureño de Educación por Radio (IHER), para poder iniciar el proceso para la oferta de 11vo y 12vo grado para los participantes del PBVM. También, se iniciaron los procesos para la contratación del personal de la Secretaría de Educación.

- **Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor**

Al primer trimestre de 2020 el Fideicomiso de **Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor** logró alcanzar el 10% de ejecución financiera (**L450.0 millones**), respecto a **L4,500,0. millones** asignados, los principales logros físicos durante el trimestre fueron enfocados en atenciones inclusión y bienestar social a Personas con Discapacidad el número de beneficiados se muestran en el siguiente detalle:

- **500** personas del sector discapacidad atendidas a través de **Transferencias Monetarias no Condicionadas**, realizadas de manera trimestral, con el propósito de contribuir a mejorar su educación, salud y rehabilitación.
- **1,237** participantes beneficiados con la **Emisión de Carnet**, que les permite gozar de los beneficios que la ley les otorga en términos de descuentos, en diferentes, lugares comerciales, tales como transporte interurbano, servicios aéreos, espectáculos públicos, teatro, cines, estadios, consultas médicas. Dichas emisiones de carnet se realizaron en 17 departamentos del país a excepción de Islas de la Bahía.
- **403** participantes sensibilizados en el trato y abordaje a las personas con discapacidad, desarrollándose talleres en los departamentos de Comayagua, Lempira y Olancho.
- **524** personas con discapacidad beneficiadas nivel nacional con ayudas técnicas (Silla de Ruedas, Muletas, Bastones blanco y de Apoyo, Andadores, Colchones y donas Anti escara y Prótesis) de acuerdo a su discapacidad. La cual se llevó a cabo en 16 departamentos del país, excepto Colón e Islas de la Bahía, población a la que se le brindó autonomía mediante la movilización para la realización de sus actividades diarias.
- **14** intervenciones médicas domiciliarias directas a personas con discapacidad, que adolecen de capacidad de moverse, realizando intervenciones a personas que por encontrarse inmobilizadas necesitan asistencia médica, ayudas técnicas, pañales y medicamentos. Todas estas atenciones médicas psicológicas y técnicas se llevaron a cabo en el marco de la emergencia nacional del COVID19.

Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO**

1) Centro Ciudad Mujer Kennedy

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Desde el inicio del Programa al 31 de marzo del presente año, se han atendido 181,462 mujeres, de las cuales 43,461 fueron nuevos ingresos (24.0%) del total y 138,001 (76.0%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en el 2020 un promedio diario de 268 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 341,880 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

2) Centro Ciudad Mujer Choloma

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año, se han atendido 80,806 mujeres, de las cuales 22,499 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 58,307 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 160 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 196,112, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

3) Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 59,477 mujeres, de las cuales 16,704 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 42,773 (72%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 220 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 139,088 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

4) Centro Ciudad Mujer La Ceiba

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 34,702 mujeres, de las cuales 22,215 fueron nuevos ingresos (64%) del total y 12,487 (36%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 151 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 84,133 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

5) Centro Ciudad Mujer Juticalpa

Es el quinto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 21 noviembre del 2019 con todos sus módulos. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 9,213 mujeres, de las cuales 4,504 fueron nuevos ingresos (49%) del total y 4,709 (51%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en

los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 80 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 27,388 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

En el primer trimestre del presente año se han atendido 8,521 mujeres, de las cuales 4,013 fueron nuevos ingresos (47%) del total y 4,508 (53%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 24,709 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez. Durante este trimestre se realizaron las siguientes actividades con el fin de fortalecer el centro:

6) Ciudad Mujer Móvil

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 31 de marzo del presente año se han atendido 9,701 mujeres, de las cuales 8,978 fueron nuevos ingresos (92.2%) del total y 723 (7.8%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 15,496 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Proyecto Ejecutado por Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM):

- **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, (FN 000057-11 UPNFM):**

El Proyecto consiste en la construcción un edificio de tres plantas con un total de 3,240 metros cuadrados de construcción el cual contara con 35 espacios disponibles; con el cual se espera satisfacer la demanda de servicios educativos a nivel superior en la formación de docentes en la zona Norte. Realiza su intervención en el Departamento de Cortés (San Pedro Sula), contribuirá a incrementar la cobertura en 1,960 estudiantes, 147 profesores y 39 empleados administrativos en el Centro Universitario Regional de San Pedro Sula.

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Elaborar un informe del Estudio de Pre inversión de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS.
- Elaborar 4 informes de Administración y Gestión del Proyecto de Edificio de Talleres y Laboratorios SPS.
- 2,235 metros cuadrados de obra en la Construcción de Edificio de Talleres y Laboratorios de SPS.

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, no se registra avances en la ejecución física en este I Trimestre 2020 debido a las dificultades con la aprobación de permiso ambiental y el permiso de construcción, los cuales no se entregaron por motivo de la Declaración de la Emergencia Sanitaria (COVID19) por lo que la Alcaldía San Pedro Sula suspendió sus actividades por mandato de SINAGER.

El Proyecto fue adjudicado por el Consejo Superior Universitario, desde el año 2019 a la Empresa Diseño, Construcción y Servicios Técnicos (DICONSET), a la cual se le entregó el anticipo por L.7.7 millones; la orden de inicio se dará inmediatamente después de la consecución de los permisos antes mencionados. Así mismo, se suscribió contrato con la Compañía Supervisora.

- **Construcción del Edificio Multifuncional de Deporte y Cultura en el Centro Universitario Regional de Nacaome:**

- La Constructora Celaque siguió laborando en la Construcción del Edificio a pesar de la cuarentena por lo que no se esperan más retrasos en la Obra.
- En este periodo se continua con la fundición de elementos estructurales (castillos) en ejes 1, 9, 10 y eje I, se trabaja en la sobreelevación que corresponde al escenario (sobreelevación diagonal), pegado de bloque sisado en todos los ejes transversales y longitudinales, fundición de solera de corona en ejes 9 y 10/ C y K. Se inicia la construcción de paredes de bloque de 4”.
- La actividad de construcción de paredes de 6” y 4” ha finalizado hasta nivel de solera intermedia, instalación de tuberías en vestidores y baños, compactado de material granular en área central.
- Se continua con el encofrado y fundición de columnas de concreto en los ejes C-9, L-9 y H-1, en estructura de techo se encuentran elaborando armadura 01, fundición de solera superior en vestidores 1 eje C y eje 10´, finalizada la compactación de material en área interna de cancha y escenario, armado y colocado de solera superior en eje K y eje 10´en vestidores.
- Construcción de firme de concreto en áreas internas: bajo graderías, escenario, vestidores y baños, encofrado y fundido de graderías entre los ejes H y K, se realiza prueba hidrostática en instalaciones hidráulicas, fundición de gradas laterales en escenario, inicio de repellos, encofrado y fundición de columnas tercer tramo, elaboración de armadura 02.
- Se continúa la prefabricación en tierra las armaduras metálicas del techo.

Proyectos Ejecutados por La Secretaría de Educación (SEDUC:)

- **Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):**

- para el Primer Trimestre se han realizado las siguientes acciones conforme a la planificación de productos esperados:

Producto 1: Convenios/ carta acuerdo de servicios educativos:

- Actualmente en periodo de presentación de ofertas para la contratación de “Servicios Profesionales de Consultoría para la Asistencia Técnica que Contribuya al Fortalecimiento de la Dirección General de Modalidades Educativas, en la Formación de Habilidades para el Emprendimiento”. [Con fecha aplazo al 04 de mayo 2020].

- En proceso de contratación de consultorías para la generación de insumos para la Estrategia de Comunicación para promover el cambio de paradigma y posicionamiento del Proyecto Joven, previo a la situación de emergencia sanitaria nacional, se avanzó en el proceso de contratación de un consultor para Desarrollar la Producción Audio Visual del Proceso de Atención y Cobertura, enmarcado en el convenio en mención. Basada en lo anterior y considerando, que pese a la situación de emergencia que abate a nuestro país por el COVID19, el sistema educativo continúa atendiendo con diferentes modalidades, por lo que se hace necesaria la documentación audiovisual del cumplimiento del convenio en mención, así como, la divulgación de los resultados y mensaje de motivación para la permanencia en el sistema escolar.

Producto 2: Escuelas con Módulos de tres aulas del tercer ciclo construidas y equipadas.

- Presentación para No Objeción al BID de 12 de Carpetas Pre factibilidad.
- Están en proceso de formulación 12 nuevas carpetas de pre factibilidad.
- Se llevó a cabo una gira de campo para identificar la situación legal de un tercer grupo de CEBs, del cual se obtuvo documentación legal de 10 CEBs.
- En proceso de conformación de lista corta de la Firma Supervisora de las primeras 24 Obras de Infraestructura Educativa.
- En solicitud de No Objeción a documentos de licitación para la Construcción de Obras de Infraestructura Educativa (12 Centros de Educación Básica).

Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia.

- En ejecución la consultoría para la Implementación de Intervenciones Educativas Integrales para la Prevención de Violencia, Embarazo y Migración.

Producto 2.6: Piloto de aprendizaje de matemáticas asistido por computador implementado.

- En proceso de selección de cantidad de alumnos para el Piloto, e identificación de CEBs.

• **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

Para el año 2020, se programó en el Plan Operativo Anual (POA-Presupuesto SIAFI) las siguientes actividades:

- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase IV).
- Supervisión de 30 Centros Educativos con proyectos de Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Ocotepeque, Lempira, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios. (Fase IV).
- Diseño y formulación de 15 proyectos de Obra de Infraestructura Escolar (Fase V).
- Fortalecer con material didáctico, 200 Centros Educativos a nivel de Bachilleratos Técnicos Profesional (BTP). (Fase V)
- Supervisión de 528 Centros Educativos con proyectos Obra de Infraestructura Educativa en los niveles Pre básica y Básica en los Departamentos: Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Gracias a Dios. (Fase V). No presenta ejecución en ninguna de sus actividades y su ejecución financiera no es relevante.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).

- **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, (BID 3723/BL-HO):**

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 39% de avance físico al I Trimestre, misma que corresponde a la intervención en 39 municipios en apoyo a la Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, conforme al siguiente detalle:

Gestores Descentralizados de Primer nivel: Contratación de Recurso Humano para el seguimiento y monitoreo de las actividades de la IREM. Adquisición de motores para lanchas, para el departamento de Gracias a Dios, a fin de facilitar el traslado de los equipos de foco para la identificación y seguimiento de casos en áreas postergadas.

Gestores descentralizados de Segundo nivel: sus logros son: 23,694 atenciones de Consulta Externa, 12,954 atenciones de Emergencia, 5,739 egresos, 4,220 atenciones de Complicaciones Obstétricas, 1,050 atenciones de Complicaciones Neonatales, 3,114 atenciones de partos institucionales, 1,395 atenciones en métodos de planificación familiar.

Fortalecimiento de Hospitales: Entrega parcial de equipo médico a los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Enrique Aguilar Cerrato

- **Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal” BID 4619/BL-HO:**

El Proyecto tiene como Objetivo contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad de respuesta de los servicios de salud a nivel nacional.

Cuenta con intervención en los Departamentos de Lempira (Candelaria, Tomalá, La Virtud, Candelaria, San Juan Guarita, Mapulaca, Cololaca, Piraera, Tambla, Valladolid, Virginia); Intibucá (San Miguelito, San Antonio, Colomoncagua, Dolores, San Marcos de la Sierra, Camasca, Yamaranguila, Magdalena, San Francisco de Opalaca, Concepción, Santa Lucía); La Paz (La Paz, Aguantequerique, Guajiquiro); Ocotepeque (Belén Gualcho); Copán (Copán, Cabañas, Santa Rita, San Jerónimo, Copán Ruinas); Choluteca (Concepción de María, Duyure); Olancho (Juticalpa, Dulce Nombre de Culmí); Comayagua (Comayagua); Santa Bárbara (Santa Bárbara); Francisco Morazán (Tegucigalpa).

Con estas intervenciones, se han priorizado los siguientes Hospitales: Hospital Escuela Universitario (HEU) en Tegucigalpa, Hospital de Santa Rosa de Copán de Occidente, Hospital San Francisco en Juticalpa Olancho, Hospital de Santa Bárbara Integrado, Hospital Santa Teresa de Comayagua y el Hospital Suazo Córdova de La Paz.

De acuerdo a los reportes de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), no se reporta avance físico al I Trimestre en obras, debido a que la programación física será reportada como producto final contra entrega de obras completas y en funcionamiento; adicionalmente se realizaron las siguientes actividades en el siguiente componente:

Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales:

54,349 atenciones de consulta externa, 955 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de Gestación, 829 púerperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma, 902 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días postparto, 3,005 citologías realizadas, 40 Niños menores de 59 meses atendidos con diagnóstico de neumonía que fueron manejados de acuerdo a norma, 166 Niños menores de 59 meses atendidos con diagnóstico de diarrea que fueron manejados de acuerdo a norma, 915 partos institucionales, 765 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas, 3,055 de madres a quienes se les brindó consejería cara a cara por las monitoras.

• **Hospital María de Especialidades Pediátricas, (ITALIA-HOS/MARIA):**

- Se reporta avance en las metas físicas para el primer trimestre en un 65%, en relación a equipo entregado en el Hospital María correspondiente a los lotes 3 y 9. Dentro de los equipos recibidos se encuentran los siguientes: camillas de ortopedia, camillas de transporte, camillas para quemados, ventiladores mecánicos, bombas de infusión, generador eléctrico entre otros.
- A la fecha no se reporta ejecución financiera, debido a que se encuentra en gestión el proceso de solicitud de desembolso conforme al “Anexo A” del Convenio de financiamiento, para remitir al Organismo Financiero (Cassa Depositi e Prestiti - CDP).
- En gestión con SEFIN (Crédito Público), el trámite de Delegación de Firma por parte de la UAFCE.
- Confirmación de ampliación de plazo por parte de Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

• **Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, (EDCF No. HND-4) Fondos de Eximbak Korea:**

En fecha 16 de febrero de 2012 el Gobierno de Honduras suscribió convenio de préstamo EDCF No. HND-4, con el Export–Import Bank de Corea, para la realización del Proyecto de Construcción del Hospital Regional del Sur de Choluteca, por un Monto de US\$36.1 millones de los cuales US\$33.0 millones corresponden a Crédito Externo y US\$3.0 millones como contraparte nacional.

El Proyecto reflejó ejecución en forma intermitente en el período comprendido entre los años 2013 y 2018; ejecutando un total de L.95.1 millones (alrededor de US\$3.8 millones) registrando una ejecución financiera del 11%; de este monto ejecutado corresponden L.68.2 millones de la Contraparte Nacional (90% en relación al Monto contratado para fondos nacionales) y L.26.9 millones de recursos de Crédito (3% del Monto contratado del préstamo).

La Secretaría de Finanzas, envió Oficio al Organismo Financiero (Corea) para desobligar los recursos de este préstamo, dando respuesta que requieren informe de cierre del Proyecto por parte de la SESAL, considerando que durante 7 años el proyecto no se pudo llevar a cabo. El proyecto no presenta ejecución física ni financiera al primer trimestre 2020. A pesar

de que cuenta con un presupuesto vigente por la cantidad de L260.5 millones de los cuales L258.9 millones corresponden a fondos externos.

Proyecto Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA):

- **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)” (BCIE 2069):**

Se finalizó la Construcción del edificio de vivienda para estudiantes mujeres con la contratación de la empresa Cresco S de R.L. y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA. En cuanto al equipamiento se contrató a la empresa Cummins S de R.L., la cual tiene pendiente por ejecutar US\$27,443.35 de US\$34,279.85, (20%) avance financiero, (0%) avance físico. El proyecto cuenta con un presupuesto vigente de L26.1 millones, los cuales fueron incorporados en el presente año y no presenta ejecución financiera de dichos recursos.

Cabe mencionar, que los avances reportados están actualizados al 31 de diciembre del 2019, debido a que la incorporación de los recursos para el Proyecto se dio justo antes de la declaratoria de emergencia producto de la pandemia mundial COVID-19.

GABINETE ECONÓMICO

Este Gabinete lo conforman veintinueve (29) instituciones:

De las cuales siete (6) Instituciones están ejecutando proyectos de Inversión Pública: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**) con **59.6%** de participación, Secretaría de Finanzas (**SEFIN**) **24.1%**, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (**STSS**) con **11.6%**; Instituto Nacional de Conservación Forestal (**ICF**) con **4.2%** y en menor porcentaje el Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (**IHCIETI**) y Centro Nacional de Educación para el Trabajo (**CENET**).

Al Primer Trimestre 2020 el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente ajustado de **L1,225,692,559** y un presupuesto devengado que asciende a **L107,842,763 (9%)**. Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas y culturales. Al primer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):

Protección del Medio Ambiente en Río Plátano (MC-PROTEP) – Donación de KFW

Durante el Primer Trimestre se reporta una ejecución física de 100% de las metas programadas para dicho trimestre y financiera de un 1.7%.

El proyecto cuenta con un presupuesto vigente asignado por el orden de L51,546,070

Según la Unidad Ejecutora reporta actividades relevantes ejecutadas tales como:

- Mantenimiento Catastral (MCAT) en el territorio adyacente a la zona ambiental de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano RHBRP, detallado de la siguiente manera: en Dulce Nombre de Culmí la oficina de catastro municipal recibió solicitudes de mantenimiento catastral, en la que un 90% la población presentó sus solicitudes con todos los requisitos completos. Según la jefatura del catastro municipal esto se atribuye al empoderamiento por parte de la población en el tema, así como a la diseminación masiva sobre el proceso MCAT y de los requisitos que deben acompañar las solicitudes respectivas, a través de la publicación mediante afiches y mensajes de radio.
- Los casos de mantenimiento catastral resueltos siempre bajo el soporte de los Especialistas Catastrales (ESC), todos fuera de la RHBRP y realizados con base al trabajo de campo y gabinete. En Iriona con el acompañamiento y la orientación profesional de los ESC se recibieron nuevas solicitudes de mantenimiento, todas con requerimiento de realizar el levantamiento catastral en campo.
- Se actualizaron los recursos didácticos que incluye documentación y un video demostrativo a nivel de uso e instalación de la herramienta con base en sugerencias de las oficinas de catastro de Iriona y Dulce Nombre de Culmí.
- La corporación municipal de Juan Francisco Bulnes aprobó cinco nuevas certificaciones en dominios pleno dentro del ejido del municipio, todas emitidas con el respaldo de la información profesional del catastro municipal.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):

• **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):**

El Proyecto al primer trimestre presenta una ejecución de 9%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto.

El subproyecto sistema de Riego Sulaco: durante este período se ha trabajado en la línea de conducción del sub proyecto Tascalapa, como también en la fundición de las presas, específicamente en los canales de limpieza y desarenador, pruebas hidrostática y colocación de válvulas parcelarias.

Instalación Tubería de Conducción: se instalaron 3,162.18 metros lineales de tubería de conducción, para un acumulado a la fecha de 7,970.34 metros lineales, de un total contratado equivalente a 8,570.34 metros lineales, lo que representa un avance a la fecha de 92.99%.

Instalación Tubería de Distribución: se instalaron 2,792.62 metros lineales de tubería de Distribución, para un acumulado a la fecha de 34,726.81 metros lineales, de un total contratado equivalente a 35,326.81 metros lineales, lo que representa un avance a la fecha de 98.30%.

Instalación Tubería de Terciaria: se instalaron 14,037.90 metros lineales de tubería Terciaria, para un acumulado a la fecha de 86,380.91 metros lineales, de un total contratado equivalente a 86,718.65 metros lineales, lo que representa un avance a la fecha de 99.61%.

Instalación Diferente Tuberías Sistema de Riego Sulaco: se instalaron 19,992.70 metros lineales de tuberías de Conducción, Distribución y Terciaria, para un acumulado a la fecha

de 129,078.06 metros lineales, de un total contratado equivalente a 130,615.80 metros lineales, lo que representa un avance a la fecha de 98.82%.

Mostrando un avance la construcción de la presa de Maralito: 80.66%, Siguapa: 80.10%, y Tascalapa: 78.50%

El subproyecto Sistema de Riego de Olomán: se continúa a la espera que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), emita la “No Objeción” al Diseño presentado con la alternativa del uso de un Equipo de Bombeo.

El subproyecto Sistemas de Riego de pequeños Proyecto: en revisión proceso de la licitación Internacional, para hacer el lanzamiento público.

El subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián: En relación a la ejecución física, se encuentra en un 16.26%, en este tipo de proyectos donde el suministro de tubería representa más del 50% del costo total del mismo. En estos momentos la ejecución se ve afectada por la falta de autorización de la ejecución de la línea de conducción principal del proyecto por los problemas de servidumbre suscitados en el mismo y la pandemia del Covid 19.

El avance financiero del Contratista en esta etapa se encuentra en un 32.91% equivalente a un pago total de L19, 441,155.75, el cual lo determina en gran medida el desembolso del anticipo (20%) de L13, 976,722.14.

El subproyecto Sistema de Riego de Selguapa: presenta un avance de 1.536.65 ml (1.5 KM) que representa el 3% de avance, el acumulado es de 2,972.65 ml (3.0 KM) representando un avance acumulado del 5%.

El proyecto al primer trimestre presenta una ejecución financiera de L.37.3 millones que representa el 9% del presupuesto aprobado.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1, IN-(DL98134500295569L) Fondos de Exim Bank India:**

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora se muestran las siguientes:

- Acondicionamiento del plantel en el 9no. Batallón de Infantería.
- Compra y acondicionamiento del reservorio para irrigación superficial.
- Tramitación de dispensa definitiva para maquinaria y repuestos a importar.

A la fecha se ha llevado a cabo reuniones para activar el proyecto en conjunto con la oficina presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP.

El proyecto no presenta ejecución financiera ni física al primer trimestre 2020 debido a que el EXIM Bank de la India solicito a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras) previo a la aprobación de la Adenda No 2 la que extiende el periodo de ejecución del proyecto, mientras el Exim Bank no apruebe la adenda no se puede solicitar desembolso.

Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, Permiso ambiental, Pago de la comisión de la carta de crédito (contratista) estos últimos puntos actualmente están en proceso, el punto focal es la

aprobación de la adenda por el Exim Bank. En ese sentido, se tendrá reunión en mes de abril con el contratista para solucionar las diferencias para que pueda ejecutar.

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental “PROLENCA”, (FIDA-I-899-HN, FIDA-II-200000125200 y GEF-FSS-05-HN):**

Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara). El proyecto en sus inicios presentó dificultades para arrancar la ejecución por eso el porcentaje de ejecución físico financiero poco satisfactorio. En el primer trimestre del 2020, cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L193,318,230 y una ejecución de L40,718,371, representando el 21.06% respecto al vigente.

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

Componente 1. Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones rurales:

- Se revisaron las bases y se remitieron la no objeción del FIDA para iniciar con la publicación del concurso para la elaboración de 65 planes de inversión los cuales fueron aceptados sin objeción.
- Se continuo con la documentación de organizaciones beneficiarias para las actualizaciones de membresías, juntas directivas, trámites de personerías jurídicas, obtención de RTN, PIN SIAFI y aperturas de cuentas.
- Se realizaron giras de supervisión a las empresas que se encuentran formulando 130 planes de fortalecimiento organizativo y 100 Planes de Inversión.

Componente 2. Desarrollo Productivo y de Negocios

Principales actividades desarrolladas

- Se realizaron reuniones de seguimiento de asistencia técnica a las organizaciones que ya tienen los desembolsos FIDA y GEF.
- Se realizaron giras de verificación de avances de los planes de inversión a las diferentes comunidades que se están implementando los planes de inversión

Componente 3. Infraestructura Rural

Las actividades en ejecución son las siguientes:

- En proceso rehabilitación de Caminos Rurales Terciarios (13.7 km) en los municipios de Yarula y Santa Elena, Departamento de La Paz, se ha avanzado en trabajos de mecanización, compra de alcantarillas, se pagó del primer desembolso de los proyectos.
- En proceso rehabilitación de Caminos Rurales Terciarios, tramo (10.70 km) Santa Elena El Carrizal –Quiscamote – Azacualpa – Guasore; tramo: Llano Alegre – Aguanqueterique y Santa Elena - Aguacinga, Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz, se ha avanzado en trabajos de mecanización, compra de alcantarillas.

- En proceso de rehabilitación de Caminos Rurales Terciarios, tramo (10.50 km) Desvío Malean – Aradas – Adoberos – Huertas – Núcleo – Medina; y tramo: Malean y Cojore, Municipio de Yarula, Departamento de La Paz. Esta actividad presenta un avance físico de ejecución de 26%.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Finanzas (SEFIN):

- **Manejo Sostenible De Bosques, (BID3878/BL-HO):**

Para el primer trimestre del 2020 cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L 194,218,327 y una ejecución de L9,781,124, representando el 5% del presupuesto asignado.

Las Principales metas físicas acumuladas son:

Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo

- Se han elaborado 36 planes de restauración, equivalentes a 31,609.46 hectáreas (93%), de los cuales, se han aprobado 29 planes equivalentes a 28,926.04 hectáreas (85%).
- En ejecución 21 planes de restauración en 13 municipios de la zona de influencia del proyecto, equivalentes a 25,805 hectáreas (76%) con una inversión del proyecto de mano de obra L. 246.90 millones (82%), de los cuales se transfirieron durante el 2019 L. 43.8 millones (USD 1.8 millones).
- Se inició la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución.
- Diseñado el Módulo de Monitoreo del Proyecto en la plataforma SIGMOF de ICF.
- En proceso de entrega el equipo protección, seguridad y prevención de incendios, materiales e insumos para la producción de plantas para las organizaciones.
- En proceso de contratación firma para diseño del programa piloto de incentivos en bosque privado.
- En proceso de contratación firma para el diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones, Visibilidad y Sensibilización del Proyecto

Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático

- En el marco del Convenio Marco Interinstitucional SEFIN, ICF y UNACIFOR, se han suscrito cartas de acuerdo, lográndose a la fecha lo siguiente:
- Finalizado el Diplomado en Salud y Sanidad Forestal, certificando a 41 técnicos del sector.
- Elaborado el Catálogo de 30 Líneas de Investigación de plagas y enfermedades forestales, manejo forestal sostenible y especies resilientes al cambio climático y el Manual de Procedimientos de Acceso a Financiamiento.
- Elaborado el Diagnóstico de los Bancos de Germoplasma Existentes y el Estudio de Factibilidad Técnico y Financiero para la Implementación y Sostenibilidad del Banco de Germoplasma en diferentes escenarios.

- En ejecución la Carta Acuerdo para la Provisión de Cajas Entomológicas.
- Entregado el equipo de laboratorios entomológicos del ICF y las universidades (UNAH y UNACIFOR).
- En ejecución Contrato para el Diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT).
- En ejecución 2 contratos de apoyo a la clasificación de LB de incendios forestales.
- Entregadas ferómonas y trampas para operar el Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT).

Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS

- Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas, las cuales finalizan en el mes de marzo 2020.
- En Ejecución el Certificado de Fundamentos de Cambio Climático para 25 funcionarios públicos, el cual finaliza en el mes de junio 2020.
- Diseñado el mecanismo financiero y operativo para acceder a financiamiento climático y diseñada estructura de la Unidad de Gestión Económica y Financiera de Cambio Climático (UGEFCC) en la Secretaría de Finanzas.

GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA:

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente ajustado por la cantidad de **L554,531,464** para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un **9%** de ejecución (**L14,243,223**) para el primer trimestre de 2020. Las principales metas ejecutadas son:

Proyecto Ejecutado por Comisión Permanente de Contingencias (COPECO):

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

En marzo de 2013, se le dio efectividad al proyecto y desde entonces a la fecha, se ejecutó USD \$18,321,126. El 100% de los alcaldes de la región I Valle de Sula conocen la labor del proyecto. Después de la Reestructuración del Proyecto (08 de abril de 2019) el proyecto posee la totalidad del Crédito 5190-HN por USD26.0 millones. De los cuales se ha ejecutado el 70.47%. El compromiso del GOH con el Banco Mundial, es la ejecución del 100% del crédito al 30 de junio de 2020 fecha de cierre del proyecto.

Al primer trimestre de 2020 cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L141,723,125 alcanzando una ejecución de L11,066,340; el cual representa el 8% de ejecución respecto a su presupuesto asignado. Cabe mencionar que en este periodo se le incorporó un monto de L33,423,125 a fin de lograr las metas físicas programadas para el presente año.

El avance físico obtenido al primer trimestre del 2020 fue lento, debido a que muchos de los procesos comenzados en 2019, fueron terminados en enero del 2020. El proyecto avanzó en las actividades prioritarias y con mayor impacto en los indicadores de resultados tales como:

- Construcción de 2 medidas estructurales (Obras) y su respectiva supervisión en los municipios de: i). Pimienta, Cortés y ii) Quimistán, Santa Bárbara. Se finalizaron el 100% físico y financiero. Estas medidas fueron adjudicadas en 2019 y fueron trasladadas para el 2020, como parte de la reprogramación de fondos, por la reducción de fondos de la SEFIN en 2019.
- Adjudicación de 5 medidas estructurales en los municipios y su respectiva supervisión de: i) Puerto Cortés, Cortés, ii) Choloma, Cortés, iii) San Antonio de Cortés, Cortés, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro. Los contratos ya fueron firmados por un monto de L 54,980,113 y cuya ejecución física está en un 8%, la ejecución financiera es un 10% debido a que muchas de ellas tramitaron su anticipo de obra, estas medidas estructurales tienen fecha de finalización 15 de junio de 2020.
- Fortalecimiento institucional a través de la construcción de parque solar de COPECO Central. El Contrato está firmado, por un monto base de L8,422,821, y cuya ejecución física quedó al 20%. Este Contrato tiene fecha de finalización 30 de mayo de 2020.
- Fortalecimiento institucional de la construcción del edificio de CENAOS-COPECO. El Contrato está firmado por un monto de L. 12,876,065, y su avance físico es de 10%, este contrato tiene fecha de finalización 15 de junio de 2020.
- Fortalecimiento institucional compra de mobiliario y equipo, equipo de cómputo y repuestos, vehículos, equipo de comunicación, reparación de radar de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra publicado y está en espera de recepción de ofertas para el 15 de mayo. con un monto base de L25.0 millones.
- Evaluación final del proyecto, están contratadas las consultorías de Levantamiento de Datos para la evaluación final, especialista en Gestión de Riesgos para la evaluación final del proyecto, auditoría social, evaluador económico, evaluador de medidas de reducción de la vulnerabilidad, por un monto de L3.2 millones y su ejecución física está en un 25%. El informe final tiene fecha de entrega el 15 de junio de 2020.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad:

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

El programa tiene como objetivo contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos; los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

Al primer trimestre de 2020 cuenta con un presupuesto vigente ajustado de L412,808,339 logrando una ejecución de L 3,176,883 (3%) respecto a su presupuesto.

A continuación, véase las actividades realizadas al cierre del primer trimestre de la gestión 2020:

Componente: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios.

- En ejecución, contrato para la elaboración del Diseño para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales San Pedro Sula y Municipalidad de Las Vegas, Santa Bárbara: Etapa II: Anteproyecto Diseñado.
- En proceso, Supervisión para la Construcción de dos Unidades Metropolitanas Policiales San Pedro Sula y Municipalidades de Las Vegas, Santa Bárbara; Yoro, Yoro; Tela, Atlántida y Olanchito Yoro. Presentación de expresiones de interés programada para finales del abril 2020.
- En ejecución, contrato para la Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH: Avance físico: 35%; Avance Financiero: 44.06%
- En ejecución, contrato de un (1) Consultor para el Fortalecimiento de la Subsecretaría de Asuntos Interinstitucionales.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Investigación y Estudios para el fortalecimiento del CEASCI.
- En ejecución, contrato de un (1) Especialista en Convivencia y Seguridad Ciudadana.
- Contrato finalizado, un (1) experto para la elaboración de estrategia y guiones artísticos para la producción audiovisual de la campaña para la Policía Nacional de Honduras.

Componente: Efectividad policial

- En ejecución, contrato de un (1) Especialista para asesorar a la DNEP en implementar reforma integral del Sistema Educación Policial.
- En ejecución, contrato para la adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO.
- Producto final entregado, Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO).
- Obra e instalación culminada, adquisición de Suministro e instalación de generador eléctrico y construcción de obras para planta de tratamiento de aguas residuales en ANAPO- TAMARA.
- En proceso, contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO. Presentación de Propuestas programada al 15 de abril 2020

Dirección General de Inversiones Públicas

- En proceso, contratación de obras para la construcción del Campus Academia Nacional de Policía (ANAPO). Apertura de ofertas programada para el día 22 de abril 2020.
- Informe Final presentado, Capacitación Especializada para funcionarios de laboratorio de Balística y Documentología de la DPI. Capacitación de IBIS TRAX HD3D dirigido a personal del DPI (12) en la adquisición y análisis de resultados de balas y casquillos.
- En ejecución, contrato para el Mantenimiento del Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS) de la DPI.
- En ejecución, Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI.
- Desarrollo de los servicios de capacitación y primera visita documental, formando efectivos de la Dirección Policial de investigación DPI, en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
- Documentación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, un Sistema de Gestión para Laboratorios de Ensayo y/o Calibración ISO 17025:2017 y un Sistema de Gestión para los diferentes organismos que realizan la inspección ISO 17020:2012.

1.7 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el primer trimestre del año 2020

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

| Área | Problemas | Acciones |
|----------------|---|---|
| Técnica | <p>Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.</p> | <p>Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.</p> |
| | <p>La declaratoria de emergencia nacional por COVID19, según decreto ejecutivo No. 005-2020, de febrero del presente año, en el cual se ha determinado establecer toque de queda absoluto en el territorio nacional a partir de marzo de 2020. ocasionó la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades</p> | <p>Las unidades ejecutoras deberán de realizar las modificaciones a sus planes operativos y planes de ejecución de sus proyectos, a fin de dar continuidad a las obras pendientes, ampliar fechas de extensión de contratos, o suspensión de contratos.</p> |
| | <p>La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución</p> | <p>Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.</p> |
| | <p>Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.</p> | <p>Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.</p> |
| | <p>Retrasos en las aprobaciones por parte del Congreso Nacional de las Normas de Ejecución presupuestaria específicamente en su artículo No 3. Afectando a las unidades ejecutoras de proyectos en realizar modificaciones y ajustar sus planes operativos anuales.</p> | <p>Revisar los artículos de las Normas de ejecución Presupuestaria, específicamente aquellos que afectan la ejecución de los proyectos.</p> |

| Área | Problemas | Acciones |
|---------------------------|--|---|
| Administrativa-Financiera | Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores. | Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde. |
| | El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento. | La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos. |
| | Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión | Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras. |
| Legal | Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión. | Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción. Aplicación de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos. |
