



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Agricultura y
Ganadería
(SAG)**

Al Segundo Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 34.23% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (L.2,156.7 millones), La SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobado Congreso Nacional para inversión para el año 2020 de L.730.4 millones para la ejecución de seis proyectos con una ejecución financiera que se detalla en el siguiente cuadro No.1

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2020 Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	730,449,182
Presupuesto Vigente	738,369,182
Devengado II Trimestre	247,797,707
% Ejecución (Devengado II Trim-2020 / Vigente)	33.56%
Devengado Anual	309,914,255
% Ejecución	41.97%
Comprometido	309,914,255
% Ejecución Comprometido	41.97%

Fuente: SIAFI, 31/06/2020


Al segundo trimestre del presente año, el presupuesto vigente de la SAG, asciende a L.738.3 millones, de lo cual reporta una ejecución de L.309.9 millones que representa el 41.97% del presupuesto vigente.

Los Proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo facilitar a los productores los mecanismos e infraestructura necesaria para la productividad de granos básicos a fin de contribuir en proporcionar facilidades de producción agrícola a los productores nacionales en pro de los habitantes de la República de Honduras.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está concentrada en cinco (5) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

Dicho presupuesto es financiado en un 95% con fondos externos (Créditos y donaciones) L.700.8 millones de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 32%, seguido por

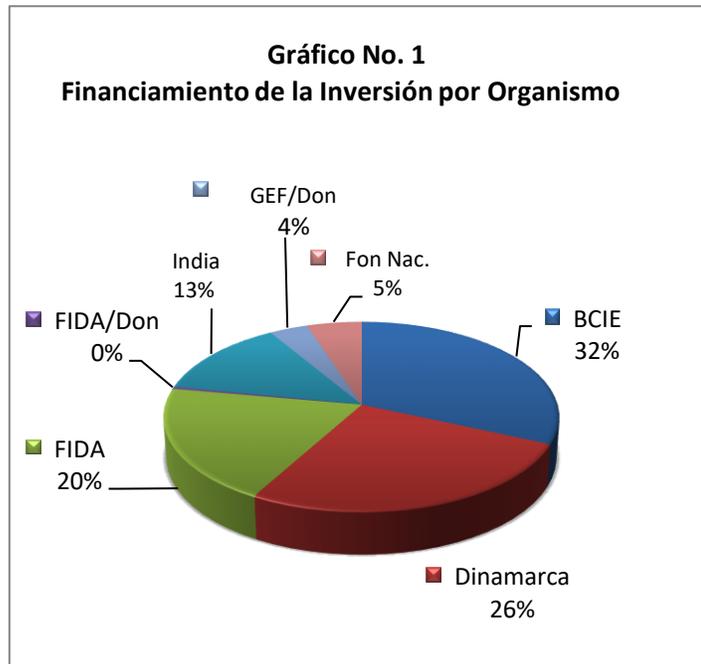

Dinamarca L.195.8 con un 26%, Fida con 20% y en menor porcentaje India 13% y fondos de donación de GEF L.26.1 millones y para fortalecimiento de la UAP por un monto de L.3.0 de Fida y fondos nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) L.37.5 millones equivalente al 5% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No.1

A continuación, se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Fondos de Contrapartida.

El proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género, el Proyecto beneficiara a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectáreas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego (Sulaco, Oloman, San Sebastian, Selguapa y Pequeños proyectos de Riegos) en los Departamentos de Yoro, Comayagua y Francisco Morazan, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Al segundo trimestre de este año, el Proyecto presenta una ejecución financiera de 19%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	1,207,598,551	2013-2021	
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2019	396,166,822	496,646,968	41.13%
II Trimestre 2020	250,348,504	47,530,319	18.99%
Acumulado Vida del Proyecto	646,515,326	544,177,288	49.65%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

El subproyecto sistema de Riego Sulaco: durante este período se ha trabajado en la línea de conducción del sub proyecto Tascalapa, como también en la fundición de las

presas, específicamente en los canales de limpieza y desarenador, pruebas hidrostática y colocación de válvulas parcelarias.

Debido a la Pandemia COVID-19, las actividades en la construcción del sistema de riego Sulaco, se reactivaron a partir del 12 del mes de mayo del presente año, realizando en primer lugar actividades relacionadas a logística de bioseguridad en las zonas de trabajo por parte del contratista; posteriormente se elaboró un plan de trabajo por 15 días, realizando reuniones con el contratista, la supervisión y la UTL cada 15 días para su verificación y formular el siguiente plan cada 15 días, sin embargo los avances se consideran muy bajos con menos del 1%, realizándose actividades en Fundición de Presas, Instalación de Tuberías, Pruebas Hidrostáticas e Instalación de Hidrantes o Toma Granjas.

Avances en Sitios de Presa.

En los sitios de presa se realizaron algunas actividades como ser preparación de bordas para desvío del agua que permita trabajar en el otro extremo de la represa, se han preparado en 2 oportunidades bordas en los sub proyectos Maralito y Tascalapa en las cuales las crecidas de los rios las han destruido, lo que ha atrasado el trabajo planificado, sin embargo se continua con la elaboración de las mismas, esta vez con material de roca grande para evitar sean arrastradas por las crecidas, en cuanto a fundición en los sitios de presa, a la fecha se han fundido un total de 61 m3 distribuidos así, Sub Proyecto Maralito 11 m3, Sub Proyecto Siguapa 2 m3, Sub Proyecto Tascalapa 48 m3.

En el Sub Proyecto Maralito, se instalaron 11 toma granjas de los cuales 7 están finalizados, de un total de 63 por instalar en los 3 sub proyectos.

Al mes de junio, se instalaron 80 metros lineales de tubería de distribución, específicamente en el sub proyecto Tascalapa sumado al total 129,158.10 metros lineales de tubería instalada, lo que representa un 98.88% del valor total contratado. En los demás sub proyectos de Maralito y Siguapa ya se instalaron las tuberías en un 100%.

En proceso la instalación de Hidrantes o Toma Granjas, el contratista inició la instalación con el Sub Proyecto Maralito, en el cual corresponde la instalación de 15 que según diseño lo componen 15 módulos de riego, así mismo se continuara con el Sub Proyecto Siguapa que corresponden 21 Toma Granjas y por último el Sub Proyecto Tascalapa que lo componen 33 Módulos de Riego para un total de 69 toma granjas a instalar.

Avances en Realización de Pruebas Hidrostáticas.

Durante el II trimestre, se han realizado varias pruebas hidrostáticas, saliendo con éxito un total de 4,510.38 metros lo que representa un avance de 3.45% del total contratado, por lo cual a la fecha informada del mes de junio, se cuenta con 26,739.31 metros lineales de tubería aprobada con éxito, que representa un 20.46% del valor total contratado.

El subproyecto Sistema de Riego de Olomán: Durante este II Trimestre no se ejecutó ninguna actividad en el Sistema de Riego de Olomán. debido a que la Empresa constructora no movilizó maquinaria y equipo por la pandemia del Covid -19

El subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos :

La SAG, realizó reunión para presentar los proyectos de pequeño riego (PPR-PDABR) que serán abastecidos con cosecha de agua, beneficiando a 215 productores y aplicando riego a 112.96 hectareas, esta pendiente la la licitación del proceso.

Se revisó Contrato de Supervisión de Diseño y Construcción de Sistemas de Pequeño Riego (PPR-PDABR) correspondiente a Lamaní (Lote No. 2) para Manifestarle a la empresa ganadora del concurso (VIELCA Ingenieros S.A.) los cambios suscitados al mismo, se esta a la espera de licitar al proyecto.

El subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián: En relación a la ejecución física, se encuentra en un 16.26%, en este tipo de proyectos donde el suministro de tubería representa más del 50% del costo total del mismo.

En estos momentos la ejecución se ve afectada por la falta de autorización de la ejecución de la línea de conducción principal del proyecto por los problemas de servidumbre suscitados en el mismo y la pandemia del Covid 19.

El subproyecto Sistema de Riego de Selquapa: presenta un avance de 1.536.65 ml (1.5 KM) que representa el 3% de avance, el acumulado es de 2,972.65 ml (3.0 KM) representando un avance acumulado del 5%.

El proyecto al segundo trimestre presenta una ejecución financiera de L.47.5 millones que representa el 18.99% del presupuesto vigente.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donacion GEF) Este proyecto comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	576,079,308	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2019	113,721,809	177,584,120	30.83%
II Trimestre 2020	171,166,493	55,020,645	32.14%
Acumulado Vida del Proyecto	284,888,302	232,604,765	40.38%

Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara). El proyecto en sus inicios presentó dificultades para arrancar la ejecución por eso el porcentaje de ejecución físico financiero es bastante bajo

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:

Durante el segundo trimestre se culminó con la elaboración de 130 planes de fortalecimiento organizativo (PFO), estos ya han sido aprobados por las Organizaciones beneficiarias (OB) la implementación de los mismos se ha retrasado por las situaciones que se han presentado a causa de la pandemia del Covid19.

Se continuó con la documentación de organizaciones beneficiarias para las actualizaciones de membresías, juntas directivas, trámites de personerías jurídicas, obtención de RTN, PIN SIAFI y aperturas de cuentas.

COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo y De Negocios

Principales actividades desarrolladas:

Asistencia técnica

Se realizaron reuniones de seguimiento con los 13 técnicos que están brindando los servicios de asistencia técnica a 47 organizaciones que ya tienen sus desembolsos FIDA y GEF. Cumpliendo con las recomendaciones de SINAGER.

La SAG, realizó giras de monitoreo y seguimiento a las inversiones que se están realizando en los municipios de Colomoncagua, Camasca, Concepción del departamento de Intibucá y los municipios de Yarula, Santa Elena y San José del departamento de La Paz, proyectos de infraestructura, cultivo de café y tiendas de consumo, además se revisaron procesos de compras y recopilación de contrapartidas.

Acompañamiento en los procesos de liquidación de las 59 Organizaciones Beneficiarias, 21 ya finalizaron las inversiones y liquidaron los fondos FIDA y GEF, 30 que están en proceso de liquidación, 4 OB que están ejecutando fondos y 3 OB que todavía les hace falta un desembolso.

COMPONENTE 3. Infraestructura Rural

Durante el segundo trimestre no se avanzó con la ejecución de los tres proyectos de caminos mismos que se encuentran paralizado producto de la Emergencia Covid-19. Durante el mes de junio se recibió el dictamen legal favorable al convenio con el Fondo Cafetero Nacional, así mismo se envió el trámite para pago del primer desembolso y reanudar los trabajos en campo durante el mes de julio los proyectos se encuentran con porcentajes de avance del 26, 12 y 12% respectivamente.

El Proyecto Durante el año 2020 ha generado un total de 524 empleos.

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) financiado con fondo de Prestamo del Banco Centroamericano de Integración Económica)

El Programa EMPRENDESUR, tiene como objetivo principal apoyar a mejorar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso a los mercados nacionales e internacionales

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	745,785,000	2013 -2020	2010-2020 2012-2020
Descripción	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	741,285,005	543,537,718	73%
II Trimestre 2019	20,573,579	19,170,921	93%
Acumulado Vida del Proyecto	761,858,584	562,708,639	75%
Nota: Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

- 11 Planes de inversión implementándose por organizaciones beneficiarias
- 11 Convenio suscritos con las organizaciones beneficiarias.
- Durante el año 2020, se ha dado seguimiento a los proyectos de riego, hasta el momento reportando 1,111 hectáreas con cultivos bajo sistemas de riego, entre ellos la Okra y café especial, además de otros rubros como hortalizas como; plátano, pasto de corte para ganado lechero, ajonjolí, maíz y frijol, en los departamentos (Cholulteca, Valle y Francisco Morazán) en un total de 22 municipios.
- Se encuentra en la etapa final las obras de siete centros de acopio de organizaciones: ESM Buena Esperanza, ESM Guanacaure, Caja Rural de Ahorro y Crédito (CRAC) Siempre Viva, APROTAP, Red de Mujeres, ESMASAMA y Cooperativa Zambrano.
- Se cuenta con un 80% de la construcción de la planta de alimentos concentrados de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Pespire, Cholulteca.
- Se logró la Instalación de geo membranas para la producción de tilapia en las empresas Camino Hacia El Progreso (8); Tilapias de El Porvenir (6) y Emprendedores de Buena Vista (3) para la producción total anual de 188,000 libras.

Durante el segundo trimestre 2020 se ha reportado la generación de 618 empleos temporales y auto empleos de 9 organizaciones.

El Proyecto presenta al II trimestre una ejecución financiera del 93.18%. se programa su finalización y cierre del proyecto el 30 de septiembre del 2020

Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán

- El proyecto consiste en dotar de equipo de riego a 311 productores del Municipio de Olanchito, Yoro; con este proyecto se incorporarán 3,110 hectáreas bajo riego.
- La ejecución financiera al segundo trimestre asciende L.188,192,370 representativos del 99.32% del presupuesto vigente.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán	724,575,600	2017-2020	
	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	523,196,690	518,761,921	71.60%
II Trimestre 2020	195,820,998	188,192,370	96%
Acumulado Vida del Proyecto	719,017,688	706,954,291	98.32%
Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

Es de observar, que este proyecto se ejecuta bajo la modalidad llave en mano, en el cual los productos serán entregados por el Contratista al final del proyecto (entregará equipos, obras físicas y los resultados esperados), es de mencionar, que este proyecto le afectado la pandemia del Covid-19 debido que no han podido realizar las instalaciones del equipo de riego el cual se encuentran en Olanchito, Yoro listo para ser instalado por tanto, a la fecha no presenta ejecución física.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1

El objetivo del programa es modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	582,235,100	2013-2022	
	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	298,623,899	205,286,440	35.26%
II Trimestre 2020	97,363,072	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	395,986,971	205,286,440	35.26%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

Estado actual del Proyecto:

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

- Acondicionamiento del plantel en el 9no. Batallón de Infantería.
- Compra y acondicionamiento del reservorio para irrigación superficial.
- Tramitación de dispensa definitiva para maquinaria y repuestos a importar.

El proyecto no presenta ejecución financiera y física debido a que el EXIM Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero.

Detalle de Proyectos avance físico anexo No.3

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Reuniones de seguimiento físico y financiero del proyecto.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución acumulada al segundo de L.309.9 millones que representa el 41.97% del presupuesto vigente.

- Al segundo trimestre el Proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos y financieros con el organismo financiador.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013 y con una ejecución acumulada financiera de 49.65% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 85% de tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años a noviembre 2021.
- A la fecha los proyectos presentan una baja ejecución debido a que los procesos de licitación se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por los proyectos.

RECOMENDACIONES

- La SAG como ejecutora de proyectos debe realizar de forma eficiente los procesos de Licitación dado que se están fracasando los mismos conllevando a desfases del proyecto en tiempo y cumplimiento de la meta.
- Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP, para que remitan la información solicitada en el tiempo oportuno.
- Para mejorar la ejecución se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos en la medida que las circunstancias del país lo permitan, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Se recomienda tomar medidas sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta una baja ejecución, el mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución transcurrido de 5 años y al segundo trimestre 2020 no reporta ejecución física ni financiera.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.
- Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social alimentario.
- Para hacer el gasto público eficiente y transparente se recomienda priorizar las inversiones con indicadores y condicionar las transferencias institucionales con resultados entregables trimestralmente.

- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003 2020 debido a la pandemia y decreto de emergencia dado por el Gobierno de Honduras.

SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS								
Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública								
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2020								
ANEXO No. 3								
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2020		
			Prog.	Ejecución	% Ejecución	Prog.	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Agricultura y Ganadería								
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas	CONVENIO	13.00	-	0.0%	13.00	-	0.0%
PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	PLAN DE INVERSIÓN	160.00	-	0.0%	60.00	-	0.0%
	Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	PLAN	80.00	-	0.0%	-	-	
	Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.	CONVENIO	80.00	-	0.0%	40.00	-	0.0%
	Asistencia técnica a Productores rurales de las organizaciones beneficiarias.	ASISTENCIA TÉCNICA	100.00	-	0.0%	-	-	
	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	KILÓMETRO	10.00	-	0.0%	-	-	
	Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación.	HECTÁREA	100.00	-	0.0%	-	-	
	Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.(FIDA II)	CONVENIO	20.00	-	0.0%	15.00	-	0.0%
	Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. (FIDAII)	KILÓMETRO	45.00	-	0.0%	25.00	-	0.0%
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	Capacitación impartidas en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	CAPACITACIÓN	46.00	-	0.0%	-	-	
	Capacitaciones brindadas a Productores/as de asociaciones de regantes (Organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias).	CAPACITACIÓN	70.00	-	0.0%	10.00	-	0.0%
	Capacitaciones impartidas en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial).	CAPACITACIÓN	44.00	-	0.0%	13.00	-	0.0%
	Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.	CONTRATO	260.00	-	0.0%	-	-	
	Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)	KILÓMETRO	169.00	-	0.0%	57.00	-	0.0%
PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	Proceso de construcción de los módulos de riego.	PORCENTAJE	20.00	-	0.0%	11.00	-	0.0%
	Informes técnicos sobre avances de las obras, elaborados	INFORME	4.00	-	0.0%	1.00	-	0.0%
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).	Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	TALLERE DE CAPACITACION	9.00	-	0.0%	5.00	-	0.0%
	Auditoria externa realizada al proyecto	INFORME	1.00	-	0.0%	-	-	
PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	Sistemas de riego recibidos	SISTEMA DE RIEGO	58.00	-	0.0%	28.00	-	0.0%
	Capacitaciones brindadas a productores en el uso del equipo de riego.	CAPACITACIÓN	38.00	-	0.0%	3.00	-	0.0%

Fuente SIAFI: 30/06/2020

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS															
Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública															
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2020															
Anexo No. 4															
Cifras en Lempiras															
No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado II Trimestre			
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	21 - Crédito Externo	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			730,449,182	37,542,285	700,826,897	738,369,182	211,435	309,702,820	309,914,255	41.97%	184,846	247,612,860	247,797,707	33.56%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	2015-2020	-	-	20,573,579	20,573,579		19,170,921	19,170,921	93.18%	-	19,170,921	19,170,921	93.18%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	119,090,162	-	97,357,829	97,357,829		32,372,313	32,372,313	33.25%	-	15,664,718	15,664,718	16.09%
		FIDA-II-20000012520		56,000,000	-	47,660,596	47,660,596		6,791,325	6,791,325	14.25%	-	299,957	299,957	0.63%
		GEF-FSS-05-HN		18,228,068	-	26,148,068	26,148,068		15,857,007	15,857,007	60.64%	-	8,904,849	8,904,849	34.06%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014 - 13/12/2020	436,671,344	37,542,285	212,806,219	250,348,504	211,435	47,318,884	47,530,319	18.99%	184,846	15,380,045	15,564,891	6.22%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569	16/06/2016 - 30/08/2022	97,363,072	-	97,363,072	97,363,072		-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	01/06/2018 - 01/04/2020	3,096,536	-	3,096,536	3,096,536		-	-	0.00%	-	-	-	0.00%
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	ING-BANK-CREDITO-S/N	2016-2020	-	-	195,820,998	195,820,998		188,192,370	188,192,370	96.10%	-	188,192,370	188,192,370	96.10%
Fuente SIAFI: 30/06/2020															
