



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARÍA DE FINANZAS

# **Informe General de la Inversión Pública Al I Trimestre, Año 2021**

**Tegucigalpa M.D.C      Honduras C.A.**

**Abril, 2021**

## Contenido

<b>INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021</b> .....	3
PRESENTACION .....	3
<b>I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2021</b> .....	4
<b>1.1 Inversión Pública Global 2021</b> .....	4
<b>1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público</b> .....	6
<b>1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión</b> .....	7
<b>1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's)</b> .....	8
<b>1.5 Financiamiento de la Inversión</b> .....	9
<b>1.6 EJECUCIÓN FISICA A NIVEL DE SECTORES:</b> .....	9
<b>a) SECTOR CARRETERAS:</b> .....	9
<b>b) SECTOR DE PROTECCION SOCIAL:</b> .....	13
<b>c) SECTOR ENERGIA:</b> .....	17
<b>d) SECTOR EDUCACIÓN:</b> .....	19
<b>e) SECTOR SALUD:</b> .....	21
<b>f) SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO y RIEGO</b> .....	24
<b>g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA:</b> .....	26
<b>h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE:</b> .....	28
<b>i) SECTOR MODERNIZACION DEL ESTADO:</b> .....	31
<b>1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Primer Trimestre del Año 2021</b> .....	33

## **INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021**

### **PRESENTACION**

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera de la Inversión Pública correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio fiscal 2021. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional para la Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal asciende a **L24,023.4 millones**, el cual incluye **L12,408.1 millones** para el Programa de Inversión Pública; se adiciona la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada por un monto de **L3,048.8 millones**, así como el Programa de Solidaridad y Protección Social para la Reducción de la Pobreza, que asciende a **L4,500.0 millones**, **L2,850.0 millones** para proyectos de Infraestructura Vial y **L1,087.3 millones** del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA), de igual manera Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L40.0 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones** y Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía por un monto de **L50.0 millones**.

Al Primer Trimestre del 2021, la Inversión Pública, alcanza un presupuesto Vigente de **L23,780.6 millones** para la ejecución de **81** proyectos, incluidos **5** proyectos financiados a través de la modalidad Asociaciones Público-Privadas (APP) **L2,590.3 millones** y **6** Fideicomisos; el Fideicomiso de Infraestructura Vial **L2,800.0 millones**, Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) **L4,500.0 millones**, Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) **L968.3 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamentos de Islas de la Bahía **L50.0 millones**, Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida **L39.2 millones**, y Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte **L40.0 millones**; y **70** proyectos que conforman el Programa de Inversión Pública (PIP), que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) con un presupuesto vigente de **L12,792.8 millones**

El presupuesto vigente de la Inversión Pública al Primer Trimestre refleja una disminución global de **L242.7 millones**, respecto al presupuesto aprobado, esto debido a disminuciones por la cantidad de **L627.4 millones** en los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP) por la cantidad de **L458.4 millones**, el Fideicomiso de Infraestructura Vial **L 50.0 millones** y en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA) por la cantidad de **L119.0 millones**, sin embargo en el PIP su presupuesto vigente de **L12,792.8 millones** muestra un aumento de **L384.6 millones** respecto al aprobado por el Congreso Nacional, distribuido así: **L316.2 millones** de crédito externo, **L24.9 millones** donaciones externas y **L43.5 millones** de fondos nacionales.

Lo anterior obedece a incorporaciones de Crédito Externo a los proyectos de Salud, por un monto de **L300.0 millones** e incorporaciones de nueva donación para las Secretaría de Seguridad por **L 40.3 millones** y a la Dirección Nacional de Ciudad Mujer por la cantidad de **L3.7 millones**, incorporación del proyecto de INSEP por **L 45.0 millones** de fondos nacionales. Por otra parte, se han realizado disminuciones en donaciones en apoyo a los programas de Apoyo Presupuestario que no tienen categoría de proyectos por la cantidad de **L87.9 millones**, dentro de estos se encuentran: Eurosan Desarrollo Local, Euroempleo, Eurosan Budget, por mencionar algunos.

## I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL PRIMER TRIMESTRE 2021

### 1.1 Inversión Pública Global 2021

El presupuesto global de la Inversión Pública al Primer Trimestre del 2021 reporta un presupuesto vigente de **L23,780.6 millones** que representa el **3.6% del PIB<sup>1</sup>** para el 2021, el cual muestra una disminución global de **L242.7 millones** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

En el cuadro No.1 se ve reflejado la disminución debido a las proyecciones de los fondos de inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), por la cantidad de **L458.4 millones**, en el Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) por un monto de **L119.0 millones y L50.0 millones** en el Fideicomiso de Infraestructura Vial; y el aumento de **L384.6 millones** en el PIP. Dichos aumento se reflejan en Crédito Externo por un monto de **L316.2 millones** y de Donaciones por la cantidad de **L24.9 Millones**, por su parte en la Fuente 11 Tesoro Nacional, se refleja un aumento de **L43.5 millones**, producto de incorporación de fondos del proyecto de Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua Ejecutado por INSEP.

**Cuadro No. 1**  
**Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 31 de Marzo de 2021**  
Cifras en Millones de Lempiras


Sector Público	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecutado (Devengado)/ Vigente
Administración Central	10,660.0	10,764.1	1,251.6	12%
Resto del Sector Publico	1,748.1	2,028.7	9.4	0%
<b>Sub-Total PIP</b>	<b>12,408.1</b>	<b>12,792.8</b>	<b>1,261.0</b>	<b>10%</b>
Fondo Social Reducción dela Pobreza (Vida Mejor)*//	4,500.0	4,500.0	239.0	5%
Proyectos APP's	3,048.8	2,590.3	71.7	3%
Programa de Infraestructura Vial	2,850.0	2,800.0	0.5	0%
Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA II) *//	1,087.3	968.3	-	0%
Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte	40.0	40.0	-	0%
Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colon y Atlántida	39.2	39.2	-	0%
Fideicomiso: Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía	50.0	50.0	-	0%
<b>Total General</b>	<b>24,023.4</b>	<b>23,780.6</b>	<b>1,572.3</b>	<b>7%</b>

**Fuente:** SIAFI,\*// Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público- Privada (SAPP). \*//Circular No. CGG-003-2021,CGG-354-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019

<sup>1</sup> El Producto Interno Bruto (PIB) estimado para el año 2021 asciende a L657,737,000,000, según cifra proporcionadas por la DPMF/SEFIN.

El Plan de Inversión Pública en su conjunto, muestra una ejecución financiera al 31 de marzo del 2021 por la cantidad de **L1,572.3 millones** reflejando un **7%** de ejecución a nivel de devengado, para la ejecución de **87** proyectos el cual incluye ejecución del Fondo Social Reducción de la pobreza (Vida Mejor) por la cantidad de **L239.0 millones** y el Programa de Infraestructura Vial, por **L0.5 millones** de ejecución según el Sistema de Administración Financiera (SIAFI), proyectos de Alianzas Público Privadas por **L71.7 millones**, el resto de los Fideicomisos de Inversiones y Asignaciones (FINA 2), Fideicomiso Nacional de Apoyo y Promoción del Deporte, Fideicomiso de Mejoramiento de la Infraestructura Vial de los Departamentos de Colón y Atlántida y el Fideicomiso Mejoramiento de la Infraestructura y Servicios del Departamento de Islas de la Bahía, no presentan ejecución. Por otra parte los proyectos que están registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH) cuentan con una ejecución de **L1,261.0 millones**, representando un **10%** respecto a su presupuesto vigente.

Gráfico No.1  
Comparativo Inversión Pública 2020 - 2021  
Vigente / Devengado  
Cifras en Millones de Lempiras

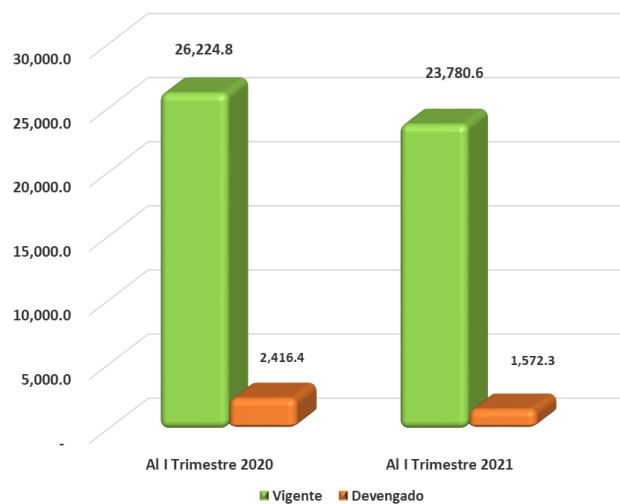

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-003-2021 y Circular No. CGG-354-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.  
Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al Primer Trimestre del 2021 a nivel de devengado muestra una reducción de 2 puntos porcentuales (7%) en comparación con el primer trimestre del año 2020 (9%), lo anterior se debe a retrasos en las ejecuciones por parte de las unidades ejecutoras ocasionadas en su mayoría por la Emergencia Sanitaria declarada por el Gobierno de Honduras a través del Decreto PCM-05-2020, ampliado y modificado a través del Decreto PCM-023-2020 y PCM-146-2020 al 31 de diciembre del 2021, mediante el cual se prorroga la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales "ETA" e "IOTA", hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, en la infraestructura vial y sector productivo del País. situación que ha ocasionado los lentos procesos de adquisiciones, la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades programadas en sus Planes Operativos Anuales. Por lo que se deberán de buscar mecanismos para agilizar la ejecución de proyectos, ya que la baja ejecución impacta directamente en la economía del país.

En el primer trimestre la mayoría de los centros económicos del país, iniciaron con la apertura de sus negocios pero con restricciones y medidas de bioseguridad condicionadas por SINAGER, por lo que, la ejecución de los proyectos siempre se ve afectada a causa de la pandemia mundial ocasionada por el COVID 19, lo cual impacta directamente en la ejecución del PIP en su mayoría los proyectos orientados a generar un beneficio económico en el país.

A su vez, en el transcurso del Primer Trimestre se han incorporado al Plan de Inversión Pública **7 proyectos de arrastre** como ser: -1) Alianza Para El Corredor Seco (USAID-GAFSP), 2) Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio - Goascorán Sección II y III, 3) Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua, 4) Proyecto de

Transporte Público para el Distrito Central (Tegucigalpa - Comayagüela), 5) Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa, 6) Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres, 7) Honduras Salud Mesoamérica GRT/HE-16838-HO; y **2 proyectos nuevos**: 1) Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II), 2) Servicios de Desarrollo Empresarial y un Entorno Favorable para las Empresarias de Honduras.

En el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.

Adicionalmente, las restricciones en la aprobación de cuotas de compromiso, hasta cierto punto afectan la ejecución de los proyectos en cuanto a honrar compromisos que no se encuentran en la proyección original de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del presente año. Dichas medidas han sido consideradas con el propósito de ejecutar fondos estrictamente para la emergencia nacional y controlar el gasto y déficit fiscal. Sin embargo, se han efectuado traslados de estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se pretende lograr que la ejecución de la Inversión Pública 2020 sea ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestaria.


**Cabe señalar que la responsabilidad de ejecutar los recursos es exclusiva de la Unidad Ejecutora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2, numeral 34, del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigente (Acuerdo Ejecutivo No. 188-2020) de fecha 17 de abril 2020, el cual literalmente dice:**

***"UNIDAD EJECUTORA: Es la unidad responsable de la ejecución, vigilancia y alcance de los objetivos y metas, con los recursos y los costos previstos. Desde el punto de vista de la administración presupuestaria constituye el área de una dependencia o entidad, con facultades para adquirir, contratar y cubrir compromisos. Esta figura orgánica y funcional se establece para efectos del ejercicio presupuestario, en su aceptación más amplia, representa el ente responsable de la administración y ejecución de los programas, sub programas y proyectos."***

Para el ejercicio fiscal 2021 en las Normas de Ejecución Presupuestarias, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.

## **1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública por Estructura del Sector Público**

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de presupuesto vigente al Primer Trimestre del 2021, ascendió a **L23,780.6 millones** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de las instituciones de la Administración Central, con **91%** específicamente en los proyectos ejecutados por INVEST-H, SESAL, ENEE, INSEP, SAG, y SEDIS, proyectos APP, y los Fideicomisos, El resto del Sector Público alcanza el **9%** de la Inversión.

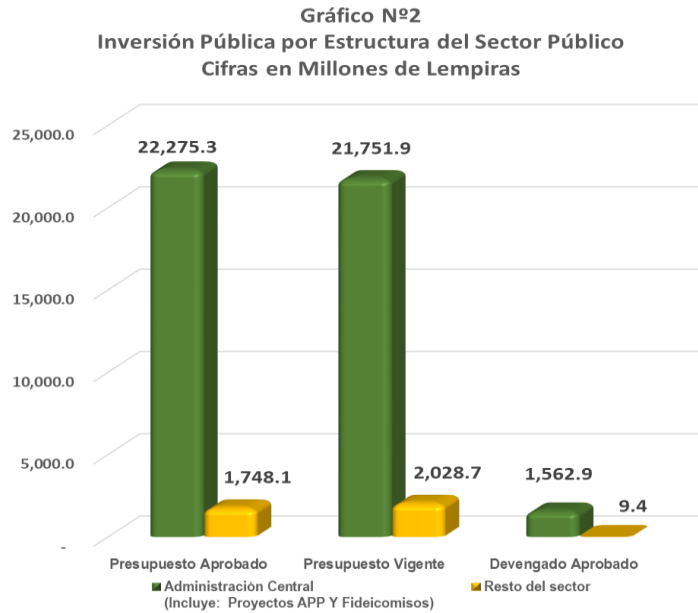


Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-003-2021 y Circular No. CGG-354-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019. Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

La distribución del PIP para el año 2021 de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. El cual muestra un Presupuesto Aprobado por la cantidad de **L24,023.4 millones**; detallado para la Administración Central (AC) **L22,275.3 millones** y el Resto del Sector Público (RSP) **L1,748.1 millones**; por otra parte; el Presupuesto Vigente asciende a **L23,780.6 millones** de los cuales **L21,751.9 millones** corresponden a la AC y **L2,028.7 millones** para el (RSP). Asimismo, refleja una ejecución de **L1,572.3 millones** (**L1,562.9 millones AC** y **L9.4 millones RSP**) representando un **7%** respecto al presupuesto vigente global.

### 1.3 La Inversión Pública a Nivel de Sector de Inversión

En cuanto a la inversión Sectorial, el **Sector Protección Social** cuenta con el mayor porcentaje de inversión con **L7,944.0 Millones (33%)** incluye el fideicomiso de Fondo Social para la Reducción de la Pobreza, apoyando las iniciativas de Gobierno tales como Criando con amor, Vivienda Saludable, Guías de Familia, Ecofogones, Merienda Escolar, Bolsa Solidaria Adulto Mayor, entre otras; la institución que ejecuta proyectos en apoyo a este sector es La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), con una inversión de **L992.3 millones** para la ejecución de algunos proyectos tales como: Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social (Bono Vida Mejor), Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Integración de la Protección Social, y otros programas de Atención a Personas con Capacidades Especiales y Adultos Mayores en Situación de Vulnerabilidad.

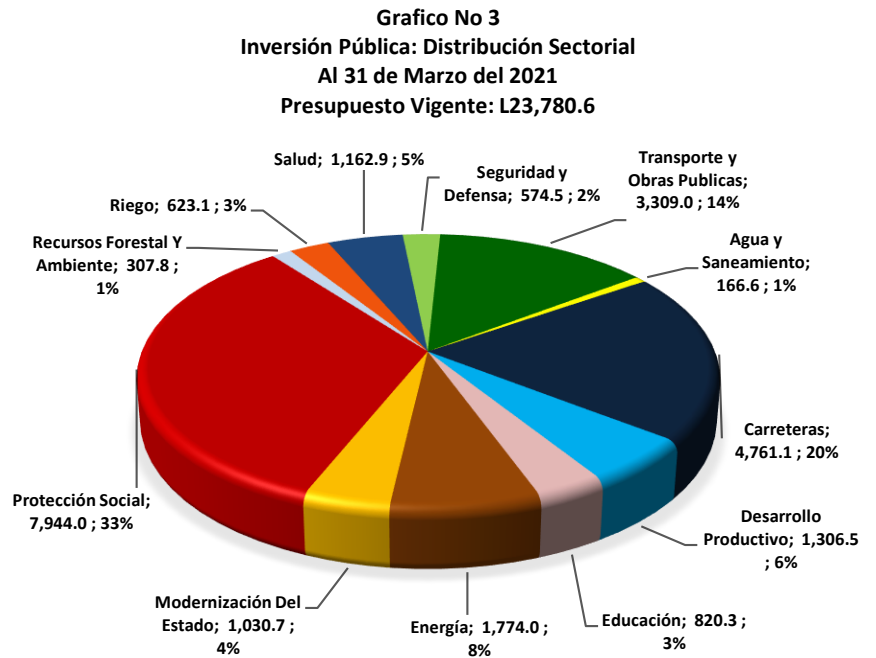

Seguido el **Sector Carretero** con una inversión **L4,761.1 millones (20%)**, incluye el Plan de Infraestructura Vial a través del Fideicomiso, los proyectos financiados a través de Alianzas Público Privada (APP's); para la ejecución del Corredor Lenca las principales instituciones que concentran este sector son INVESTH con una inversión de **L1,115.2 millones** para la ejecución de los principales proyectos Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, el Programa de Integración Vial Regional II, Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danlí, tramo Neteapa – Danlí entre otros, e INSEP con **L616.4 millones**, para ejecutar algunos de los proyectos como ser: Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: La Entrada - Copán Ruinas - El Florido y La Entrada - Santa Rosa de Copán, Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua, Construcción y Pavimentación con Concreto Hidráulico del Tramo Carretero Valladolid-La Virtud-Mapulaca con una Longitud Aproximada de 30 Km Localizado en el Departamento De Lempira, Corredor Turístico Distrito de los Lagos Etapa 1: Rehabilitación con Concreto Hidráulico Tramos: 1-Cañaverál-Río Lindo-Caracol Sección 1.

Seguido del **Sector de Transporte y Obras Públicas** con **L3,309.0 millones (14%)** el cual incluye algunos proyectos de APP's como la construcción del Aeropuerto de Palmerola, Centro Cívico y la obra de construcción siglo XXI. Asimismo la ejecución de proyectos como: La Construcción Obras de Facilitación de Acceso al Recinto Portuario en Puerto Cortés **(ENP)**.

Siguiéndole el **Sector Energía L1,774.0 millones (8%)**; para la ejecución de los proyectos de: Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Regional (MER). Electrificación Rural en Lugares Aislados y Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica.

El **Sector Productivo L1,306.5 millones, (6%)**; en apoyo a la población más vulnerable de la zona del corredor seco, con el proyecto Alianza Para El Corredor Seco (USAID- GAFSP), proyecto Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II, beneficiando a los agricultores mediante la cadena agrícola, Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental Pro-Lenca, y el apoyo productivo a través del Fideicomiso de Inversiones y Asignaciones (FINA 2) para la cosechas de agua.

Con una menor inversión en el **Sector Salud L1,162.9 millones, (5%)**; para ejecutar proyectos principalmente en apoyo a la emergencia por el COVID 19, entre los principales proyectos se encuentran: Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (Covid - 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras, Programa Apoyo a La Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, Proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-Neonatal.

#### **1.4 Inversión Ejecutada a Nivel de Fideicomisos y Alianzas Público Privadas (APP's)**

Al Primer Trimestre de 2021, la Ejecución a nivel de fideicomisos y APP's, asciende a **L311.2 millones**, representando un **3%** respecto al presupuesto vigente de **L10,988 millones** asignados a estos. Dicha ejecución corresponde al Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), por la cantidad de **L239.0 millones** representando un **5.3%**, respecto al presupuesto vigente (**L4,500.0 millones**) según el SIAFI y el Fideicomiso de Infraestructura Vial con una ejecución de **L0.5 millones** representativo de **0%** de ejecución, respecto al presupuesto vigente (**L2,800.0 millones**). Mientras que la superintendencia de Alianzas Público Privadas reporta una ejecución de **L71.7 millones (3%)** en proyectos APP's, los cuales cuentan con presupuesto vigente de **L2,590.4** de ejecución, el resto de los fideicomisos no cuentan con ejecución en el presente periodo.



## 1.5 Financiamiento de la Inversión

El **57.7%** de la Inversión Pública Global del Presupuesto Vigente es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor, APP's, Plan de Infraestructura Vial y Fideicomisos de y el **42.3%** por fondos externos; de estos el **87.5%** es financiado por crédito externo (Fuente 21) y el **12.5%** por donaciones (Fuente 22). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.2.

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destacan Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS), orientado a la construcción de carreteras, Empresa Nacional de Energía Eléctrica para proyectos de energía, Fondo Hondureño de Inversión Social, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, Secretaría de Agricultura y Ganadería para la construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas) entre otras.

Cuadro No. 2

### Inversión Pública: Clasificación por Fuente de Financiamiento

Cifras en Millones de Lempiras

Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	% Ejecución (Ejec./Vig.)
Fondos Nacionales	12,743.7	12,159.7	354.0	3%
Crédito Externo	9,861.5	10,177.7	1,152.1	11%
Donaciones Externas	1,418.2	1,443.2	66.2	5%
<b>TOTAL PLAN DE INVERSIÓN</b>	<b>24,023.4</b>	<b>23,780.6</b>	<b>1,572.3</b>	<b>7%</b>

Fuente: SIAFI, Circular No. CGG-003-2021 y Circular No. CGG-354-2021 emitidas por la SCGG en cumplimiento al Decreto Ejecutivo PCM-044-2019.

\*/ Cifras proyectadas, proporcionadas por la Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privadas (SAPP).

En seguimiento a las Normas de Ejecución Presupuestaria del Año 2021, en su Artículo 27, que literalmente expresa que; "Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones, el Formulario (FMP-05) denominado "Documento de Modificación Presupuestaria" generado por el SIAFI, tendrá el mismo efecto de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.....

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Sector se muestran a continuación:

## 1.6 EJECUCIÓN FÍSICA A NIVEL DE SECTORES:

### a) SECTOR CARRETERAS:

Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos de construcción de carreteras ejecutados a través de INVESTH e INSEP entre los cuales están:

**Proyectos ejecutados por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)**

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2):**

Durante el primer trimestre se avanzó en el proceso de contratación de la firma consultora que estará a cargo de la supervisión de las obras de reparación de acuerdo a la solución propuesta en los resultados del Estudio de Ingeniería Forense de la Estructura de Pavimento desarrollado por el National Center for Asphalt Technology (NCAT), en el tramo I y II de Corredor Pacífico (Choluteca – Júcaro Galán – EL Amatillo). Actualmente se ha realizado la Invitación a presentar propuesta a la oferta mejor evaluada, esperando recibir la misma en el mes de abril 2021 y firmar contrato en mayo del presente año.

- **Programa de Integración Vial Regional II BID 3815/BL-HO**

Actualmente se está en gestión de la recepción final y el traspaso de las obras al Concesionario Vial para su respectivo mantenimiento, con el cual se está negociando la reparación de las obras que fueron dañadas durante el paso de la tormenta tropical IOTA.

- **Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte, Segmentos I y II (Sección 2ª), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio ( BCIE-2098):**

Durante el periodo se trabajó en la revisión de la información soporte que se anexará al Acta de Entrega Parcial de Bienes al Concesionario del Corredor Logístico (COVI), quien será el encargado de su mantenimiento y que incluye entre otras cosas el Inventario Vial, resultados de deflectometría, resultados de Índice de Rugosidad, resultados de Índice de fricción superficial, resultados de retroreflectividad; esperando realizar la misma durante el mes de abril 2021.

- **Rehabilitación y Mejoramiento del Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-Danli, tramo Neteapa – Danlí. (BID\_2470/BL-HO-1 y BID\_2470BL-HO-2 BID-3815/BL-HO):**

Al 31 de marzo de 2021, el Lote B (Estación 74+240 a la 89+160) de 14.92 km se encuentra finalizado en un 100% y el Lote A (Estación 54+240 - Estación 74+240) presenta un avance físico de 90.09%, la fecha de finalización del proyecto está fijada para el 26 de abril de 2021.

- **Programa de Infraestructura Vial (Fideicomiso):**

Lo que respecta a los proyectos que se ejecutan bajo la modalidad del Fideicomiso Vial no se encuentra registrado en el SNIPH debido a que en su mayoría corresponde a obras de mantenimiento de la Red Vial Pavimentada y No Pavimentada.

En relación a los proyectos de la Dirección de conservación del Patrimonio Vial, al 31 de marzo de 2021 la Dirección desarrolló las siguientes actividades:

En el Programa de Acceso a Cabeceras Municipales de la Red Vial No Pavimentada, El Programa incluye un universo de 4,204.57 km, de los cuales se han intervenido 3,576.42 km (85.06%), y los kilómetros finalizados acumulados por 3,285.14 Km que equivale al 78.13% del total programado desde los años 2019 y 2020 y durante primer trimestre del presente año, trabajando en 81.00 km y contando 83.32 finalizados.

Mediante el Programa de Acceso Zonas Productivas (Cafetaleras) se atenderán 1,520.50 km, distribuidos en 11 departamentos del país y agrupados 6 (Seis) Zonas y en 57 Lotes. El año pasado se realizó el proceso de adjudicación y contratación de los lotes, en el cual se contrató la cantidad de 1,089.78 Km, iniciando la ejecución de los mismos en el mes de enero del presente año, la ejecución acumulada al mes de marzo del 2021 es de 62.25 Km correspondiente al 6% de total programado.

En relación a la implementación del “Programa de Apoyo al sector Productivo Cafetero y Aceleración Económica (Grupo 2), el cual tiene su origen en el Decreto Legislativo No. 31 -2020, y en la denominada Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social Frente a los Efectos del Coronavirus Covid-19, se requirió la contratación de empresas consultoras y constructoras, que desarrollen obras de limpieza de derecho de vía, remoción de derrumbes menores, suministro, transporte y colocación de alcantarillas TCR 30" Ø, limpieza de alcantarillas y otras estructuras de drenaje, conformación de carretera de tierra, construcción, reparación y mantenimiento de estructuras menores, conformación de carretera balastada sin reposición de dicho material, reposición de capa balasto 15.00 cm, reparación de zonas inestables y la consideración de trabajos imprevistos.

Las obras serán construidas conforme a las especificaciones técnicas, normas y parámetros, en una longitud de atención aproximada de 1,520.0 Km. Distribuidos en 13 departamentos del país y agrupados 8 (ocho) Zonas en 21 Lotes. Durante el proceso de contratación directa, se contrató la cantidad de 1,382.70 km, iniciando la ejecución desde el mes de enero del presente año, la ejecución acumulada al mes de marzo del 2021 es de 168.51 Km correspondiente al 11% de total programado.

En relación al Programa “Estudios y Diseños de Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales y Zonas Turísticas” Red Vial Oficial No Pavimentada, con este Programa se planifica que en un periodo de seis años sean mejorados aproximadamente 3,000 km para conectar eficientemente a 180 Cabeceras Municipales.

El Programa de Pavimentación de Accesos a Cabeceras Municipales se ha dividido en 12 Lotes, que están localizados en los 18 departamentos del país. Cabe destacar que se ha entregado un acumulado al mes de marzo la cantidad de 92 tramos que totalizan una longitud de 925.51 km entregados de los 960.80 km que pertenecen al Grupo 1.

Respecto a la Red Vial Oficial Pavimentada, el Programa de Bacheo y Sellos Asfálticos en la Red Vial Pavimentada, hasta el mes de marzo se presenta una ejecución de avance de obra en el Programa de Bacheo de 22 Km de 653.81 Km (en un total de 28 Lotes) equivalente al 3% de lo programado y en el Programa de Sellos Asfálticos se ejecutaron 2.39 Km de 793.19 Km (20 Lotes) que equivale al 0.30%, ya que durante este trimestre se realizó en su mayoría el pago de los anticipos.

Programa de Conservación Rutinaria de Limpieza del Derecho de Vía con Atención a través de las Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV's), las microempresas están conservando rutinariamente la cantidad de 2,780 Km de la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) con una cobertura en 16 Departamentos a Nivel Nacional, al mismo tiempo se tuvo una ejecución física en el mes de marzo de 1,192.24 Km, a través de 3 o 4 incursiones (pasadas en los tramos contratados).

**Proyectos ejecutados por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):**

- **Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero Valladolid-la virtud-Mapulaca con una longitud aproximada de 30 km localizado en el departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):**

El Proyecto se encuentra en su etapa final. Actualmente, está pendiente de finalizar el tramo carretero ubicado en el municipio de la Virtud, departamento de Lempira. El Proyecto cuenta con un compromiso de L 83.9 millones para el pago de estimaciones según avance de obras.

El plazo del proyecto finaliza el 17 de junio del presente año.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF).**

El Proyecto presenta un avance financiero ejecutado estimado a la fecha del presente informe de 99.90%, calculado en base al monto total de las obras del contrato (\$ 41.4 millones) y el avance físico del proyecto es de 98.16%. En el mes de marzo, el Banco Europeo de Inversiones autorizó la ampliación de plazo de desembolsos al convenio BEI-FI No. 84859 la cual fue solicitada por la Secretaria de Finanzas a través de oficio DGCP-FE-494/2020 de fecha 15 de mayo de 2020.

Las actividades realizadas en el periodo están: Demolición de accesos fisurados, Fundición de accesos vehiculares mediante concreto hidráulico, Inicio de levantamientos topográficos de zonas de estudio geotécnico por parte de la empresa, SGH, sitios: 23+900; 30+800;32+400, Sello de juntas de Contracción mediante material asfáltico, levantamientos topográficos de zonas de estudio geotécnico por parte de la empresa SGH, sitios: 49+000; 50+050; 50+250; 50+550; 51+000; 51+800 y 52+200.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros, (Fondos Nacionales 0000003-13):**

INSEP por medio de Oficio DM 0115-2021 de fecha 04 de febrero de 2021 solicita la ampliación de plazo de cierre del Proyecto al 31/12/2021, en el cual remitieron el Decreto Legislativo No. 175-2020 donde fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,478 las modificaciones No. 4 de los contratos de Construcción y Supervisión del Proyecto. Para el año 2021, el proyecto requiere un presupuesto de L74 millones para finalizar las obras.

- **Construcción a cuatro (4) carriles del bulevar de Comayagua, etapa II: estación 2+500 - hacia desvío de Ajuterique, con una longitud aproximada de 1 km, localizado en la ciudad de Comayagua.**

Durante el I Trimestre de 2021 se realizaron las siguientes obras:

Demoliciones de la infraestructura e instalaciones desalojada por los ciudadanos invasores en el sector izquierdo del proyecto entre las estaciones 3 +070 y 3 +180, mediante un proceso de retiro de los materiales y demolición de las estructuras de concreto para posteriormente realizar la limpieza y conformación de la franja liberada.

Hasta la fecha la ENEE y EEH no han realizado el despeje o corte de energía eléctrica del circuito de La Aurora L317 solicitado y programado por el contratista para poder reubicar los postes y conductores, lo cual ha provocado atraso en los trabajos finales de terracería, colocación y compactación de sub base y base, así como la carpeta de pavimento de concreto hidráulico en los tramos de ubicación de los postes del sistema existente. El proyecto presenta un avance físico del 65%

#### **b) SECTOR DE PROTECCION SOCIAL:**

Los principales rubros de inversión están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables. Al Primer Trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

#### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):**

La inversión de la institución se concentra en siete (8) proyectos relevantes que apoyan las Traslaciones a las familias de extrema pobreza así mismo fortaleciendo la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación; proyectos de los cuales tres (4) son financiados con fondos externos y el resto con fondos nacionales.

- **Programa de Apoyo a la Red de Protección Social III (3371/BL-HO)**

Durante este primer trimestre en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**: se continuó con el fortalecimiento de la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V: Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones**, en el primer trimestre de 2021, se realizó la contratación de cuatro (4) Ingenieros supervisores que apoyan la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes Inmuebles de la Secretaría de Educación, en el seguimiento y supervisión del avance de las obras de infraestructura para la ampliación del tercer ciclo de Educación Básica. De igual manera, se realizaron los pagos de los procesos de ampliación de las Obras para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán(5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes y de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en siete (7) Centros de Educación Básica (CEB) del departamento de Santa Bárbara, distribuidos en un único lote. Del mismo modo, se efectuó el pago en concepto de Supervisión de obras de infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en el departamento de Santa Bárbara.

En este período se han recepcionado seis (6) Centros de Educación Básica conforme al siguiente detalle: (i) CEB Anselmo Pérez; Dolores, Copán; (ii) CEB Juan Ramón Medina, San Rafael, La Paz; (iii) CEB Marco Aurelio Soto, Santiago de Puringla, La Paz; (iv) CEB Presentación Centeno, Macuelizo, Santa Bárbara; (v) CEB Ramón Rosa, Macuelizo, Santa Bárbara y (vi) CEB Ramón Rosa, La Cumbre, Santa Bárbara

Es importante mencionar que este proyecto se encuentra en etapa de cierre, proceso que se debe cumplir en tiempo y forma.

- **Proyecto de Integración de la Protección Social (6401-HN)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Mundial el 17 de julio 2019, cuyo objetivo es Mejorar los resultados del componente urbano del Programa TMC y fortalecer la integración del sistema de protección social para los más pobres.

**Componente de Transferencias Monetarias Condicionadas Urbano**, Al final del primer trimestre se ha efectuado la entrega en 38,051 hogares; según detalle por departamento: Atlántida (1,545 hogares), Colón (1,132 hogares), Comayagua (3,084 hogares), Copán (1,080 hogares), Cortés (4,345 hogares), Choluteca (2,663 hogares), El paraíso (3,071 hogares), Francisco Morazán (11,376 hogares), Intibucá (828 hogares), La Paz (1,347 hogares), Olancho (2,299 hogares), Santa Bárbara (154 hogares), Valle (1,309 hogares) y Yoro (3,818 hogares) con una inversión de L108,998,490.00.

**Componente Fortalecimiento del Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas y el Sistema de Entrega**, con el propósito de fortalecer el Sistema de Información Gerencial (SIG) se efectuó el pago de dos (2) Consultores en Seguimiento y Apoyo a los Requerimientos de Programación, Analista en Infraestructura de Servidores y Base de Datos del Sistema de Información Gerencial, Analista Programador de Monitoreo y Seguimiento del Programa del Sistema de Información Gerencial-SIG, dos (2) Programadores Senior DRA para el Mantenimiento del Sistema Informático Gerencial Bono Vida Mejor y dos (2) Analistas programadores para el mantenimiento del SIG.

**Gestión del Proyecto:** se efectuó el pago por servicios de auditoria externa en concepto de Revisión de Cumplimiento sobre las Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa de Integración de la Protección Social, correspondiente al año 2019.

- **Programa de Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (5008/BL-HO)**

Convenio de Préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en fecha 29 de junio del 2020, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los hogares en situación de pobreza extrema, así como promover su generación de capital humano.

**Componente Transferencias Monetarias Condicionadas:** se continuo con la entrega de TMC correspondiente al año 2020, a la fecha se cuenta con datos preliminares en vista que la entrega aún continua la entrega y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), no ha efectuado la liquidación financiera.

A la fecha se han beneficiado 19,414 hogares con una inversión de L122,7 millones, según detalle por departamento: Colón 133 hogares, Copán 4,596 hogares, El Paraíso 10,762 hogares, Francisco Morazán 196 hogares, Intibucá 3,161 hogares y Santa Bárbara 566 hogares.

**Componente Fortalecimiento Operativo e Institucional de la SSIS:** se continuó apoyando la operatividad del PBVM, para lo cual, se cuenta con los servicios de un (1) Supervisor de Digitadores, treinta y ocho (38) Digitadores, ciento sesenta y cuatro (164) Gestores Sociales, catorce (14) Coordinadores Departamentales; (4) Técnicos en Apoyo a Auditoria en apoyo al Programa Bono Vida Mejor, catorce (14) Oficiales de Atención al Participante, veintidós (22) digitalizadores y un Asistente Operativo de la Dirección de Transferencias Monetarias.

**Componente Fortalecimiento de la Oferta de los Servicios Educativos:** se realizó la recontractación de las consultorías que apoyan operativa y técnicamente a la Unidad de

Corresponsabilidad de SEDUC.

**Componente Administración y Auditorías del Proyecto:** se realizó la continuidad de servicios de las consultorías del personal que conforman la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) de la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS), quienes garantizan la operatividad del Programa.

- **Fideicomiso: Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida Mejor**

La información que se refleja en el presente Informe del Fideicomiso de Protección Social es indicativa ya que no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIPH).

El Fideicomiso de Protección Social cuenta con presupuesto de L2,770.9 millones para la SEDIS está fundamentado en 16 Proyectos de inversión, de los cuales al primer trimestre solamente presentan ejecución tres proyectos que se detallan a continuación:

1. **Guías de Familia: (Monto Presupuestado L974.5 millones)**, ejecución financiera de L245.7 millones, beneficiando a 44,717 familias.
2. **Mejores Familias: (Monto Presupuestado L235.0 millones)** ejecución financiera de L58.7 millones, beneficiando a 6,258 familias participantes.
3. **Bolsa Solidaria Adulto Mayor: (Monto Presupuestado L150.0 millones)** ejecución financiera de L17.5 millones, beneficiando a 48,852 beneficiarios personas adultas mayores.

Es importante mencionar que los proyectos que no presentan ejecución, reprogramaran la ejecución física y financiera para los siguientes trimestres del año, esto debido a la emergencia mundial de la Pandemia COVID-19.

**Proyecto Ejecutado por la Dirección Nacional Ciudad Mujer:**

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

- i. **Centro Ciudad Mujer Tegucigalpa**

Durante el trimestre se han atendido a 10,023 mujeres, de las cuales 2,857 fueron nuevos ingresos (28.5%) del total y 7,166 (71.5%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 25,644.

- ii. **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Durante el trimestre se han atendido a 6,826 mujeres, de las cuales 2,189 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 4,637 (68%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,643.

**iii. Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Durante el trimestre se han atendido a 10,664 mujeres, de las cuales 4,513 fueron nuevos ingresos (42.3%) del total y 6,151 (57.7%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 30,491.

**iv. Centro Ciudad Mujer La Ceiba**

Durante el trimestre se han atendido a 9,029 mujeres, de las cuales 3,852 fueron nuevos ingresos (43%) del total y 5,177 (57%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 18,775.

**v. Centro Ciudad Mujer Juticalpa**

En este trimestre del presente año se han atendido 7,188 mujeres, de las cuales 2,522 fueron nuevos ingresos (35%) del total y 4,666 (65%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos,

**vi. Ciudad Mujer Móvil**

Durante este trimestre se han atendido 2,618 mujeres, atendiendo un promedio diario de 58 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 3,124 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

**Proyecto ejecutado por La Inversión Estratégica de Honduras, (INVEST-H),**

- **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)” BID 3371/BL-HO.**

En fecha de 01 de marzo del 2021, finalizó contractualmente la construcción del Centro Ciudad Mujer en la ciudad de Choluteca, el cual comprende un área de construcción de 3,400.96 metros cuadrados, en un terreno de aproximadamente dos y media manzanas. Los edificios que forman el complejo se denominan de la siguiente manera: Atención a la Violencia, Autonomía Económica, Salud Sexual y Productiva, Cuidado Infantil, Atención a las Adolescentes, Recepción y Cafetería. El complejo también cuenta con un cuarto de bombas, una cisterna para aguas lluvias, cisterna para agua potable, un cuarto de máquinas, un cuarto para desechos y una caseta para vigilancia.

**Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Se muestran los avances por productos al 31 de Marzo de 2021:

**Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios. Los Proyectos de integración urbana** el cual incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos, muestran un avance físico global de 64.7% para 4 proyectos.



**El proyecto de equipamiento social** con un avance físico global del 80.6% el cual incluye obras de ampliación, construcción y reparación en 6 proyectos.

Se finalizó el diseño de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 3,035, predios.

**c) SECTOR ENERGIA:**

El Sector destina su inversión a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, mediante los Proyectos de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo, Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER), Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables, Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica, Electrificación Rural en Lugares Aislados y Sistemas Fotovoltaicos de la Red. Los avances al primer trimestre se presentan a continuación.

**Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):**

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional, (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Durante el Primer Trimestre 2021 el proyecto se encuentra en ejecución logrando la ampliación y puesta en Operación de la Subestación El Progreso ampliada de 300MVA a 450MVA y de la Subestación Toncontín Etapa I ampliada de 75MVA a 150MVA, Líneas de Transmisión las Flores-Erandique y Danlí-Chichiste, de los 211 predios, se tiene 150 predios pagados o compensados, que corresponden al 71%, 37 predios con Expediente Cerrado o en proceso de cierre por diferentes situaciones complejas legales, administrativas y financieras (ausencia física de beneficiarios por estar en EE. UU.; rechazo de valor de compensación; declaratoria de herederos; hipotecas no resueltas, etc.), y 24 predios pendientes incluidos en el plan de acción que finalizó en marzo del 2021.

- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

El Avance Físico del Proyecto al primer trimestre del 2021 es del 89% y el Financiero del 94%, se otorgó ampliación de plazo para el último desembolso de este contrato de préstamo por parte de SEFIN y BID, en el Proyecto "Suministro, Instalación, Pruebas, Puesta en Servicio y Servicio Post Venta (4) Sistemas de Excitación Estática Digital para Generador Síncrono y (4) Transformadores de Excitación para la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán", a la fecha se lleva un avance de 70%, sin contratiempos de importancia alta y la Firma Auditora ha avanzado en su revisión documental hasta el mes de octubre de 2020; por lo tanto, solo le quedan los meses de noviembre y diciembre para concluir su revisión correspondiente a dicho año.

- **Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica ( BID 4598/BL-HO 4599/SX-HO)**

Durante el Primer Trimestre 2021 se hizo la Adjudicación del Contrato “Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura-San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito”, Suscripción de Convenio para la Regularización de Pagos a Propietarios de Terrenos y Servidumbres con cargo al Préstamo, entre la ENEE y la UAP-IP, Primer pago del bien inmueble ubicado en Calpules (terreno), donde se construirá la Subestación de Calpules, Departamento de Cortes, en el marco del Convenio Interinstitucional Suscrito, Primer desembolso de pago para la compensación por afectación de servidumbre de las líneas de transmisión de San Buenaventura y San Pedro Sula Sur, en el marco del Convenio Interinstitucional Suscrito, La adquisición del Terreno de la Victoria ya cuenta con Dictamen Presupuestario que fue remitido a la Dirección General de Bienes del Estado y El Dictamen Presupuestario del Terreno de Sitio pasó a la Secretaría General de la SEFIN para continuar con el trámite respectivo.

**Proyecto Ejecutado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS):**

- **Proyecto De Energía Renovable Para El Desarrollo Rural Sostenible Pro-Energía Rural, (EDCF No. HND-5) Fondos de Korea Eximbank:**
  - i. Preparación e impresión del material didáctico para la Socialización de los 2,347 SFV.
  - ii. Se continúa en forma virtual con la Socialización con Autoridades Municipales de los 4 departamentos de Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz, sobre los 2,347 SFV para Viviendas y de las 59 JE.
  - iii. Levantamiento base, revisión y digitalización de las Fichas Socioeconómicas de 2,347 Familias en los 4 departamentos que serán beneficiadas con la Ampliación de los 2,347 SFV.
  - iv. Se continúa con los cronogramas de supervisión de la instalación de 2,347 SFV en Viviendas.
  - v. Se continúa trabajando en la Revisión del Diseño Final de los nuevos Sistemas Fotovoltaicos a instalar (2,347 SFV) en viviendas adicionales, dichas modificaciones servirán para optimizar el desempeño, eficiencia y potencia, lo cual vendrá a fortalecer los equipos.

El proyecto “**PRO ENERGIA RURAL**” ya finalizó la I etapa de Operación, Mantenimiento y Soporte a los **21,486** Sistemas Fotovoltaicos de la Red. En Agosto de 2020 el Korea-Exim Bank, realizó una revisión de costos de los **2,347 SFV** adicionales en conjunto con la Empresa Constructora “Joint Venture of Top and Joeun and Korbi” y la Empresa Supervisora “Dohwa”.

Continúa pendiente la aprobación de la Transferencia entre Categorías de Inversión por parte del Organismo del Exim Bank of Korea; ya que la Unidad Ejecutora del proyecto se encuentra subsanando documentación requerida por las nuevas autoridades del Organismo del Exim Bank of Korea.

**d) SECTOR EDUCACIÓN:**

Este sector apoya la mejora de la calidad educativa a través de la capacitación a docentes, construcción de Aulas mediante los proyectos de Infraestructura escolar y Proyecto de Mejora de la Calidad educativa (proyecto Joven), Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras.

Los avances al primer trimestre en los proyectos son los siguientes:

**Proyecto Ejecutado por la Secretaría de Educación**

• **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Ejecutora, en el marco del PROMINE/KFW en relación a las actividades realizadas desde el ámbito de la Supervisión de Infraestructura, Seguridad Alimentaria y Temas Administrativos, presenta el Desarrollo de 7 consultorías en el fortalecimiento a la ejecución del PROMINE (Fase IV) y visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para la supervisión y seguimiento de proyectos en ejecución.

En relación a la ejecución de la Fase V, se espera recibir el primer desembolso en el presente año, el cual dará la apertura al inicio de las actividades programadas.

• **Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN):**

En fecha 16 de junio de 2020, el Gobierno de Honduras suscribe con la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Alianza Mundial para la Educación (AME), Acuerdo de Financiamiento (No. 6560-HN) y Acuerdo de Subvención (No. TF0B2218-HN) respectivamente para el financiamiento por un monto total de US\$39.5 millones. El proyecto consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SEDUC) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

De acuerdo a lo reportado por la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), durante el primer trimestre se honró el pago de los consultores (Coordinador general del Proyecto y especialista financiero), así mismo se realizaron avances en los procesos de contrataciones para la UCP (avance en 90 de la contratación de 1 Oficial técnico de DIGECEBI y UCP; avance en 90% de la contratación de 1 consultor en Asesor Legal; contratada consultoría para Oficial Técnico Especialista en Formación Permanente; avance en 55% (6/11 consultores pendientes para UCP).

**Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

• **Proyecto Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo: Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO)**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

**Componente 1: Cobertura de servicios del tercer ciclo de Educación Básica con énfasis en zonas rurales del occidente del país.**

Producto 1.1: Convenios/contratos de prestación de servicios educativos en Modalidad Alternativa para el tercer ciclo firmados: Este convenio busca ampliar la cobertura del tercer ciclo de Educación Básica en centros educativos de comunidades rurales de los departamentos de Intibucá, La Paz, Lempira, Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque que no tienen posibilidades de acceso a los servicios educativos de este ciclo bajo la oferta tradicional, atendiendo un aproximado de 11,574 educandos en 275 Centros Educativos Básicos (CEBs). Por otra parte, se ha formulado y está en proceso de solicitud de No Objeción el Convenio Interinstitucional #2 Para la Atención del Tercer Ciclo de Educación Básica Mediante Modalidad Alternativa Flexible (Metodología IHER) entre la AEPAS-H SEDUC e IHER para el año lectivo 2021 en nuevos CEBs en las áreas periurbanas ubicados en las zonas de focalización y en los Departamentos de Cortés y Francisco Morazán beneficiando a un máximo de 1,600 educandos en edades comprendidas entre 15 y 21 años, con una modalidad alternativa a distancia.

Producto 1.2: Escuelas con módulos de tres aulas del tercer ciclo construidos y equipados: Para apoyar el fortalecimiento de la cobertura escolar en tercer ciclo, a la fecha se concluyó la formulación de 42 carpetas de factibilidad de proyectos de infraestructura educativa para igual número de Centros Educativos Básico (CEB), de las cuales 27 conformadas tienen No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y para las cuales se han iniciado procesos de contratación de firma consultora de supervisión y empresa constructora. Por otra parte 15 están en proceso de solicitud de No Objeción; y las restantes 8 están en proceso de formulación.

**Componente 2: Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios educativos.**

Producto 2.5: Escuelas con programas de mejora del clima escolar implementado, incluyendo prevención de embarazo y violencia, se está ejecutando la consultoría para la formulación e implementación de una estrategia de prevención de violencia, embarazo adolescente y migración irregular; la cual fue acordada con la SEDUC a través de la Sub Dirección General de Educación para la Prevención y Reinserción Social (SDGEPRS).

Luego de enfrentar los desafíos y limitantes de la crisis generada por la pandemia Covid-19 y los huracanes ETA e IOTA, se acordó con SDGEPRS se requiere el apoyo técnico para la adecuación de los contenidos educativos ya diseñados a un ambiente virtual.

**Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS)**

• **Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE) FASE IV**

Con relación a la Fase IV, actualmente se han considerado 44 proyectos de los cuales, 34 se encuentran formulados (de estos 27 están contratados y el resto en proceso de contratación), 7 en formulación, 2 no factibles y 1 pendiente de formulación.

Los principales avances en este trimestre se describen a continuación:

- Se completó la modificación interna y traslado de recursos al PROMINE en su fase IV al fin de poder iniciar la ejecución financiera de la misma.
- Se completó la contratación de la Consultoría de Apoyo para la Implementación del PROMINE fase V, dando como esto inicio a dicha fase.

- Se finalizó uno de los dos proyectos que se encontraban planificados, en vista que se tuvo un desfase en la ejecución para el segundo proyecto y será finalizado en la tercera semana de abril.

### **Proyecto Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA):**

- **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)” (BCIE 2069):**

Los principales avances del proyecto a nivel de componentes se describen a continuación

#### **Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Dormitorios para Estudiantes Mujeres H-V1:**

Se finalizó la Construcción del edificio de vivienda para estudiantes mujeres con la contratación de la empresa Cresco S de R.L. y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA. En relación al contrato del Generador Eléctrico, no se ha recibido el equipo, debido a que se hizo una orden de cambio para la instalación, por lo que se tuvo que cancelar la orden de compra exonerada ya que cambio el monto de contrato.

#### **Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:**

La planta está construida a un 100%, Los equipos de procesamiento de la planta ya fueron entregados al 100% por el Consorcio HONDUTEC (hondureña) – NUEVOS RECURSOS (Colombia), se realizó la instalación y puesta en marcha de los equipos, ya se hizo la recepción provisional, están pendientes la entrega de documentos finales para el cierre de financiero del proyecto.

#### **Sub-Proyecto: Construcción De Granja Avícola:**

El proyecto no realizó pagos en los meses de enero hasta marzo de 2021, debido a que el proyecto no se encontraba habilitado en el Sistema de Administración Financiera (SIAFI). Se solicitó una ampliación de plazo hasta el 30 de abril de 2021. Se encuentra en proceso de No objeción por el BCIE, una orden de cambio.

#### **Sub-Proyecto: Construcción De Planta Procesadora De Granos Y Cereales:**

El sub proyecto reporta un avance del 59%, se está trabajando en la solicitud de una ampliación de plazo hasta el de 7 de mayo de 2021 y una modificación de contrato debido a que se incorporarán fondos de contrapartida y de crédito externo provenientes del BCIE para la culminación de actividades pendientes.

### **e) SECTOR SALUD:**

Sus intervenciones van orientadas al mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País, a través de la contratación de gestores en el Primer Nivel y Segundo Nivel de atención mediante el proyecto de Mejora de la Gestión y Calidad de los servicios de salud materno-neonatal, y el Programa de Apoyo a la red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente y Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras. Los avances se muestran en la Secretaría de Salud y AEPAS-H.

**Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).**

- **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, (BID 3723/BL-HO):**

Según lo reportado por la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP), cuentan con un 100% de avance físico al I Trimestre, misma que corresponde a la planificación de ejecución en 10 municipios hasta el mes de julio del año 2021, conforme al siguiente detalle:

- ✓ Gestores descentralizados de Primer nivel: Garantizar la atención de servicios en 10 municipios priorizados:
    - Publicación para la Educación y Contratación de Gestores.
    - Realizar las adquisiciones de Bienes e Insumos en apoyo a la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria.
    - Desarrollar los procesos de contrataciones de Obras, y Consultorías
    - Recepción de Ofertas de los procesos de Equipo de Cómputo, Insumos de Entomología, Kit de Colvol y Mobiliarios para Centros de Microscopia.
    - En ejecución la Reparación de Insectario Nacional.
    - Finalización de las Impresiones de Materiales educativos de malaria.
  - ✓ Gestores descentralizados de Segundo nivel: Firma de 3 convenios de gestión para el segundo nivel de atención:
    - Seguimiento y monitoreo a la continuidad en la prestación de servicios con los Hospitales, Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.
    - Fortalecidos los Servicios hospitalarios en: Planificación Familiar, Plan de Parto, Embarazos, Atención Integral en la Niñez (AIN-C); en los hospitales Enrique Aguilar Cerrato y Leonardo Martínez.
    - Firmados los Convenios de prestación de Servicios con los Gestores: Fundación Manos Transformando el Puerto (FUMATREP), Fundación Gestora de Servicios de Salud Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES-HEAC) y Fundación de Apoyo al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela.
  - ✓ Fortalecimiento de Hospitales: Adquisición de Equipo Médico Sistema de Radiografía Digital, Estacionario, Accesorios y Servicios Conexos:
    - Elaboración de Especificaciones Técnicas y NO Objeción del Banco.
    - Elaboración del Documento Base y su Publicación.
  - ✓ Gestión del Proyecto y Auditoría: Contratación e Informe de auditoría del Proyecto:
    - Contratación de la Auditoría con el Tribunal Superior de Cuentos (TSC).
- 
- **Proyecto Respuesta Inmediata de Salud (RISP) para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID – 19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras:**

Al I Trimestre, cuenta con un 100% de avance físico que corresponde a 10 Informes de los Consultores de la Unidad Ejecutora; así mismo, se suscribieron “Adendas de Tiempo” a 45 Convenios con Gestores de primer y segundo nivel; se firmó un nuevo convenio con Leonardo Martínez para habilitación de 50 camas. Se desarrollaron “Adendas de Presupuesto” a 15

Convenios con Gestores de Primer y Segundo Nivel. Adicionalmente, se lograron avances significativos en otras actividades:

- ✓ Conducción de la respuesta a nivel del país:
  - Equipar sala situacional para vigilancia epidemiológica.
  - Contratación de Consultor para el apoyo a la implementación de procesos para el plan de vacunación.
- ✓ Detección y seguimiento de los casos:
  - Entrega de 40,800 Mascarillas al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).
  - Se firmaron 13 Adendas a Convenios de Primer Nivel para Equipos de Respuestas Rápida (ERR).
  - Contrato adjudicado para el Mejoramiento de la Infraestructura del Laboratorio Nacional.
- ✓ Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios de salud:
  - Elaborado de nuevos Convenios con gestores para atención en el primer y segundo nivel, en lo relacionado con adendas de tiempo y financiamiento.
  - Seleccionada la Empresa Consultora para el proceso de Telemedicina.
  - Publicado el Documento de licitación internacional para adjudicación de 26 ambulancias.
  - Acuerdo Firmado para la Adquisición de la Vacuna COVID.

**Proyecto Ejecutado por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto: “Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno Neonatal”:**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

- ✓ **Componente 1:** Fortalecimiento de la gestión y calidad de los servicios obstétricos neonatales.

Para este período se garantizó la cobertura de atención a una población de 425,045 habitantes, a través de la prestación de servicios de salud con gestores descentralizados en el primer y segundo nivel de atención.

A través de los gestores descentralizados de primer nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 899 embarazadas captadas antes de las 12 semanas de gestación.
- 725 puérperas que recibieron por lo menos 5 atenciones prenatales por personal calificado de acuerdo a los criterios de la norma.
- 828 mujeres que tuvieron su parto y que recibieron una atención puerperal por personal calificado dentro de los 3 a 7 días post-parto.
- 832 partos institucionales atendidos.
- 34,060 visitas domiciliarias a población prioritaria o en riesgo realizadas.
- 4,455 niños que asisten a la reunión mensual de AIN-C.

A través de los gestores descentralizados de segundo nivel se brindaron entre otras las siguientes atenciones:

- 3,185 atenciones de consulta externa.
- 11,357 atenciones de emergencia.
- 3,691 atenciones por complicaciones obstétricas y 963 por complicaciones neonatales.
- 2,758 partos atendidos.

✓ **Componente II:** Mejoramiento de la Infraestructura de los Servicios de Salud.

En este componente se logró la no objeción por parte del BID a los documentos de solicitud de propuesta, para la contratación de la firma de diseño para la construcción de 5 obras hospitalarias.

✓ **Componente III:** Mejoramiento del Equipamiento de los Servicios de Salud.

Para este periodo se logró la no objeción a las especificaciones técnicas para lanzar el proceso de adquisición de ultrasonidos fijos y móviles para uso de Equipos de Salud Familiar.

✓ **Componente IV:** Fortalecimiento Institucional, Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información.

Se cuenta con las asistencias técnicas programadas para la implementación del programa en las regiones sanitarias y para el seguimiento y monitoreo de gestores de primer y segundo nivel.

✓ **Componente V:** Administración y Evaluación del Programa.

En ejecución la auditoría financiera por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

## **f) SECTOR DESARROLLO PRODUCTIVO y RIEGO**

Los principales rubros de inversión están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, incremento los ingresos de las poblaciones rurales en el Corredor Seco a fin de prepararse para los efectos del cambio climático y abordar la inseguridad alimentaria. Al primer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

### **Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):**

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):**

Al primer trimestre, el proyecto presenta una ejecución financiera de L.13.8 millones 3.9%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

**Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora son:**

**El subproyecto Sistema de Riego Sulaco:** Durante el primer trimestre, en Sitios de Presa se fundieron 15 m<sup>3</sup> de concreto; 28 m<sup>3</sup> en la presa de Maralito, en la presa de Sigüapa no presenta avance y 60 m<sup>3</sup> en la presa de Tascalapa, el proyecto Sulaco presenta en general un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,536.91 M<sup>3</sup> de un total contratado de 6,599.17 M<sup>3</sup>, lo que representa un 83.90% de avance.



**Avances en Realización de Pruebas Hidrostáticas.** Se han realizado varias pruebas hidrostáticas, saliendo con éxito un total de 37,956.71 metros lineales con un acumulado a la fecha de 84,448.72 metros lineales que representa un avance a la fecha de un 41%.

**Subproyecto Sistema de Riego de Olomán:** Se continúa a la espera de la emisión de la No Objeción por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Diseño presentado con la alternativa del uso de un Equipo de Bombeo.

**Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos:** Se revisó y se corrigió el contrato del diseño y construcción de los proyectos de pequeño riego correspondiente a Lamaní (Lote No. 2), actualmente se está a la espera de la documentación por parte de la empresa Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA) para proceder a la firma del contrato del proyecto antes mencionado.

**El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián:** La SAG se encuentra trabajando en la agilización y normalización de la elaboración de los convenios de servidumbre de los Proyectos San Sebastián y Selguapa, se está trabajando para que se puedan realizar estos convenios de servidumbre lo más pronto posible; la Unidad ejecutora realizó verificación de memoria de cálculo suministrada por el Supervisor como por el Contratista de la estimación No.9 presentada del Proyecto Selguapa.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1, IN-(DL98134500295569L) Fondos de Exim Bank India:**

Para el primer trimestre no se programó meta financiera, sin embargo, el proyecto requiere realizar pagos que no están contemplados en el convenio financiero como ser, la contratación de especialista ambiental y pagos referentes a los permisos ambientales, compra de reservorio, Carta de Crédito (BCH-EXIM Bank de India), adecuación de predio que servirá como bodega, costos de trámite de exención de impuesto y gastos de monitoreo.

Este proyecto no tiene presupuesto de Fondos Nacionales y requieren recursos en ese sentido, se están haciendo gestiones con SEFIN para identificar fondos por un monto de L.25.0 millones para actividades de Carta de Crédito.

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental “PROLENCA”, (FIDA-I-899-HN, FIDA-II-200000125200 y GEF-FSS-05-HN):**

Actualmente se están implementando inversiones en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara). En sus inicios, el proyecto presentó dificultades para arrancar la ejecución, por lo que el porcentaje de ejecución físico financiero es bastante bajo.

Durante el primer trimestre se ha obtenido un porcentaje de ejecución del 11.32% con fondos FIDA equivalente a L.26.4 millones para la ejecución de fondos GEF se espera la incorporación presupuestaria. Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora son las siguientes:

**COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:**

Formulación de 65 Planes de inversión, estado de observaciones por parte del FIDA y está en

proceso para realizar la subsanación, Elaboración e implementación de 65 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género, esta actividad se encuentra pendiente No objeción por parte del organismo. Al primer trimestre se suscribieron 32 convenios con las organizaciones (hombres, mujeres, jóvenes y etnias) beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión.

**COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo y de Negocios:**

Desembolsos realizados a 29 Organizaciones Beneficiadas (OB) con planes de inversión aprobados por un monto de L12.1 millones. En el primer trimestre se generaron 1,159 empleos a personas miembros de Organizaciones Beneficiadas de estos empleos 610 beneficiarios son hombre y 549 son mujeres. En la ejecución de los Planes de Inversión se está brindando asistencia técnica a 66 Organizaciones beneficiándolas con asistencia técnica en el área organizativa, empresarial, productiva, género, inclusión social y comercialización.

**COMPONENTE 3. Infraestructura Rural:** Rehabilitación de Caminos Terciarios Rurales y Caminos de Acceso: En proceso de firmas de convenios para el mejoramiento de 46.4 km de caminos terciarios: en La Esperanza, (14.9 km) San Marcos de la Sierra (13.8 km), Yamaranguila (8 km) en Intibucá y Gracias, Lempira (9.7 km).

**Proyecto ejecutado por Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)**

• **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID y TF017904):**

El proyecto se encuentra en la implementación de una estrategia de salida para consolidar las capacidades productivas de los productores beneficiados con sistemas de riego en los 6 departamentos de la zona de influencia del proyecto. Dicha estrategia incluyó la incorporación de US\$ 8.0 millones (L.200.00 millones, en cumplimiento a los Decretos PCM-030-2020 y PCM-041-2020) de fondos nacionales adicionales para ejecutar acciones de emergencia de reactivación productiva como respuesta a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo que implicó ampliar la fecha de cierre de las firmas implementadoras, que originalmente tenían contemplado finalizar en diciembre de 2020 hasta el segundo semestre de 2021.

La ejecución de los remanentes de los fondos de USAID, se amplió hasta el segundo semestre del 2021 con la firma de la Carta de Ejecución No. 36, para comprometer la totalidad de los mismos en las reparaciones requeridas en los distritos de riego que sufrieron daños por las tormentas tropicales ETA e IOTA. Los fondos nacionales se encuentran comprometidos para cubrir las acciones de emergencia para reactivación del sector agroalimentario en el Corredor Seco, incluyendo bonos agrícolas, mercados bioseguros, centrales de abasto con bioseguridad y centros de acopio con bioseguridad.

En el primer trimestre de 2021, se reportan 1,720 visitas de asistencia técnica a productores con hectáreas de riego para la producción de granos básicos, hortalizas y frutas. Adicionalmente se instalaron 8 mercados bioseguros en el Corredor Seco (Marcala, La Esperanza, Yamaranguila, Gracias, Cucuyagua, Copán Ruinas, El Nispero, San Francisco del Valle) contribuyendo a la comercialización local con todas las medidas de bioseguridad

**g) SECTOR SEGURIDAD Y DEFENSA:**

Para el presente año ejecuta proyectos, a fin de contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos Las principales metas ejecutadas al primer trimestre son:

**Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad:**

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

Las actividades realizadas al I trimestre que reporta la Unidad Ejecutora son las siguientes:

**Componente: Atención y Servicio al Ciudadano en Materia de Convivencia Ciudadana en Municipios.**

- En ejecución la Construcción y supervisión para las Jefaturas Policiales, en los municipios de Yoro y Olanchito, departamento de Yoro y Tela, departamento de Atlántida. Estado en Olanchito, Contrato suscrito con la Empresa CACORA; avance físico: **2%**; avance financiero: **20%** (Anticipo); avance diseño urbanístico: **90%**. **Tela:** Contrato suscrito empresa Geo-Construcciones, avance físico: **1.5%**; avance financiero: **20%** (Anticipo), avance diseño urbanístico: **60%**. \*Ambos en trámite de licencia ambiental para orden de inicio.
- En ejecución la Construcción de Jefaturas Policiales, en el municipio de San Pedro Sula, Cortés y en el municipio de Las Vegas, Santa Barbará, Estado: **Las Vegas, SB:** Contrato suscrito empresa Salvador García; avance físico: **3%**; avance financiero: **20%** (Anticipo) **La Puerta, SPS:** Contrato suscrito empresa SIT, avance físico: **1%**; avance financiero: **20%** (Anticipo). \*Ambos en trámite de licencia ambiental para orden de inicio.
- Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH. Estado: Obra terminada (Físico: 100%; Financiero: 85.67%).
- Remodelación de las Jefaturas Policiales para el fortalecimiento de los Servicios de atención integral para Violencia Intrafamiliar (VIF) y el Módulo de Atención Integral Especializado, (MAIE), en Nacaome, de acuerdo con el protocolo de servicios (Con fondos COSUDE). Estado: **Diseños y presupuesto elaborados en UTI, VIF Nacaome.** Avance: 100%. **Diseños y presupuesto elaborados en UTI, VIF Choluteca.** Avance: 40%. \*Se prevé lanzar el proceso de licitación en fecha 03 mayo 2021.

**Componente: Efectividad policial**

- Adquisición de Kits de reactivos para pruebas toxicológicas para aspirantes ITP y ANAPO. Estado: **Contrato en ejecución empresa DICOSA.** Avance físico: 37%; Avance Financiero: 37%. Contrato en ejecución empresa INTERSEG. Avance físico: 70%; Avance Financiero: 64%.
- Contratación para el Mantenimiento y actualización de tres escáneres forenses para laboratorios de investigación criminal y servicios de capacitación. Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa LEICA (Fabricante). Avance físico: 60%; Avance Financiero: 20%.

- Contrato para la capacitación y asistencia técnica para la Gestión de la Calidad con Normas ISO: 9001-2015; 17020-2012; 17025-2017, para Laboratorios de la DPI. Estado: Contrato terminado, suscrito empresa INLAC. Avance físico: 100%; Avance Financiero: 100%.
- Adquisición de reactivos para uso en investigación y levantamiento de indicios en escenas del crimen para la DPI. Estado: Contrato en ejecución, suscrito empresa INTERSEG con fecha 19 de marzo del 2021. Avance físico: 0%; Avance Financiero: 0%.
- Construcción de un Complejo Especializado para la Simulación de Intervenciones Policiales, ubicado en la Ciudad de La Paz (Con fondos COSUDE). Estado: Proceso publicado. Recepción y apertura de ofertas 06 de mayo.

### **Proyecto ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social**

- **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS 522-0501-4):**

A la fecha se reporta siete (7) proyectos finalizados en el primer trimestre del 2021, sumando un total de 25 proyectos del plan de trabajo, se están ejecutando dos (2) proyectos, para la educación y la seguridad ciudadana a través de la recuperación de espacios y apoyo a la infraestructura de los operadores de justicia del país. Se llevaron a cabo capacitaciones a los comités y personal de mano de obra en temas de Bioseguridad, también se ha fortalecido a las comunidades beneficiarias en temas de Género, cumpliendo los indicadores del Plan de monitoreo y Plan de Género del programa.

### **h) SECTOR RECURSOS FORESTALES Y AMBIENTE:**

Contempla la Reforestación y restauración de 34,000 hectáreas en zonas afectadas por el gorgojo y la gestión de riesgo de desastres, a través del Programa Manejo Sostenible de Bosques y el Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres y la Implementación de las Medidas de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales en las Áreas Protegidas mediante el proyecto de Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB). Los avances al primer trimestre se muestran a continuación:

### **Proyectos Ejecutados por la Agencia Estratégica de Proyectos Productivos, Ambientales y Sociales de Honduras (AEPAS-H).**

- **Proyecto Manejo Sostenible de Bosques:**

De acuerdo a la Unidad Ejecutora, los Logros alcanzados al I trimestre se describen a continuación:

Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo:

- El avance acumulado a marzo 2021 de 40 Planes de Restauración (PR) elaborados equivalentes a 32,614.02 hectáreas (has), lo que representa un 96% en relación a la meta

del proyecto (34,000 has). De estos, se han aprobado 36 planes equivalentes a 31,146.96 hectáreas (91.6%); con convenios suscritos 34 planes, equivalentes a 30,869.44 hectáreas (90.8%) y en ejecución 31 planes, equivalentes a 30,689.44 hectáreas (88 %).

- Se han comprometido recursos por L302.2 millones en inversión (apoyo) en mano de obra en PR en ejecución, de los cuales se transfirieron a marzo 2021 L118.3 millones.
- Se continuó con la entrega del equipo para protección, seguridad y prevención de incendios y materiales e insumos para la producción de plantas, para las organizaciones beneficiarias de los planes de restauración en ejecución.
- En ejecución el contrato para el “Diseño de un programa piloto de incentivos para la restauración de Bosques privados en Honduras”, ejecutado por la firma Sud Austral Consulting, S.p.A.

Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático:

- Elaborados y en proceso de revisión los Términos de Referencia-TDR para la realización de 7 investigaciones de salud y sanidad forestal priorizadas por el ICF.
- Finalizada la Carta Acuerdo SEFIN (AEPAS-H)-ICF-UNACIFOR para el Diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal. Entregado, revisado y aprobado el 4to y último producto de la consultoría (Propuesta de contenido didáctico de los temas de mayor relevancia y prioridad, para el diseño del Programa de Capacitación en Salud y Sanidad Forestal).
- Finalizado el contrato para el Diseño del Sistema de Prevención y Alerta Temprana (SPAT); aprobados 4/5 de los entregables establecidos en el contrato. Se realizó la entrega del 5to y último producto (Sistema de Alerta Temprana para el gorgojo descortezador del pino en Honduras-SAT), mismo que está en proceso de revisión y ajustes.
- Adjudicado el proceso de adquisición de equipo de infotecnología, para el Sistema de Alerta Temprana a Plagas (pendiente firma de contrato).

Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS

- Se certificaron 24 funcionarios públicos en fundamentos de Cambio Climático.
- En ejecución contrato para el estudio de prefactibilidad para el diseño de mecanismos financieros para la compensación por servicios ambientales en cuencas prioritarias para la provisión de agua en Honduras, en desarrollo a través de The Nature Conservancy.

Componente 4 y 5: Gestión del Proyecto y Evaluaciones y Auditorías

- Adjudicado el proceso de adquisición de equipo hidrometeorológico para el monitoreo del indicador hídrico (pendiente firma de contrato).
- En ejecución la consultoría para el Diseño de la Metodología y Protocolos para el Monitoreo de la Biodiversidad y Ecología de los Bosques de Pino afectados por la plaga del gorgojo y bajo restauración.

**Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):**

- **Proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de áreas Protegidas de Honduras - SINAPH (LIFEWEB): (KFW BMZ-No. 2011 65 984)**
- Con apoyo del Asesor Técnico Principal del Proyecto se comenzó el proceso administrativo para la elaboración y actualización de planes de manejo en 4 nuevas áreas protegidas (Reserva de Vida Silvestre Cuero y Salado, Reserva Forestal (RF) Guanaja, Monumento Natural Marino Cayos Cochino y Refugio de Vida Silvestre Guaimoreto).
- En el mes de febrero se logró la revisión y ajustes al Manual Operativo del Proyecto (MOP), como parte del comité de apoyo al proyecto Fortalecimiento del SINAPH (Lifeweb).
- Con la identificación de las necesidades para fortalecimiento logístico y operativo del ICF (a nivel Central y Regional) en el área de influencia del proyecto, se presentó la No Objeción del Plan de Adquisiciones, Compras y Contratos (PACC) al KFW. Se está a la espera del desembolso para ejecutar el PACC.
- Culminación del proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2021 y Plan de Adquisición del Proyecto y solicitud de no objeción enviada por oficio ICF-DE-089-2021 al KFW y aprobación durante el mes de marzo.
- Se realizó un documento de Diagnóstico de capacidades para la planificación de la gestión de áreas protegidas ejecutándose en un 100%, presentando el documento de diagnóstico que lleva por nombre "Evaluación Preliminar Sobre El Estado De Gestión De Las Áreas Protegidas Del Litoral Atlántico De Honduras".

**Proyecto Ejecutado por Comisión Permanente de Contingencias (COPECO):**

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

El avance físico obtenido al I Trimestre del 2021 es satisfactorio a pesar de la Pandemia del Covid-19, las Tormentas ETA e IOTA y las medidas para la reapertura de la reactivación económica del país, el resultado en las actividades es el siguiente:

- Construcción de una medida de mitigación estructural y su respectiva supervisión en el municipio de: San Antonio de Cortés, Departamento de Cortés la cual fue finalizada al 100%. Con un costo total de L14.1 millones, el cual incluye L13.0 millones por el pago del Contrato de Construcción y L1.1 millones por el pago del Contrato de Supervisión.
- Construcción de una medida de mitigación estructural y su respectiva supervisión en el Municipio de El Negrito, Departamento de Yoro, la cual fue finalizada al 100%. Con un costo total de L12.1 millones, el cual incluye L10.9 millones por el pago del Contrato de Construcción y L1.1 millones por el pago del Contrato de Supervisión.
- Se coordinó con las autoridades de COPECO, el BM y la SEFIN, la priorización de las actividades a ser incorporadas en los Planes de Atención de Emergencias (PAE) del Componente Contingente de Repuesta a Emergencias CCRE; la identificación de las necesidades prioritarias fueron incluidas en borradores diferenciados, revisados de forma

conjunta por las instituciones antes mencionadas. El proyecto se encuentra en su etapa de cierre al 30 de junio de 2021, más 4 meses de periodo de gracia.

**i) SECTOR MODERNIZACION DEL ESTADO:**

Sus inversiones están destinadas para la ejecución del Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria, el cual está orientado a mejorar los niveles de recaudación tributaria con miras a generar el espacio fiscal necesario para financiar gastos prioritarios y el Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate), orientado a mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña cuyo objetivo central es el documento de identificación de 6,692,680 personas y la actualización de la base de datos del Registro Nacional de las Personas. Los avances en la ejecución al primer trimestre se detallan:

**Proyecto Ejecutado por el Registro Nacional de las Personas (RNP):**

**• Proyecto Modernización del Documento Nacional de Identificación en Honduras (Identifícate) (BCIE 2235-TRAMO B):**

Durante el primer trimestre del 2021, se continuó con el mapeo, actividad que además de permitir recolectar información de base para la buena planificación, levantar listados de ciudadanos y de organizaciones de sociedad civil dispuestos a realizar veeduría hacia lo interno del proyecto, éstos insumos fueron solicitados y verificados por la ONG, Asociación para una Sociedad más Justa, ASJ, quien elaboró un informe de veeduría y lo presentó al proyecto, en donde se le está dando la atención debida por medio de la unidad de monitoreo para seguimiento y cumplimiento de los hallazgos y recomendaciones.

- Al 31 de marzo del 2021 el proyecto ha generado 5,105.046 ciudadanos enrolados a nivel nacional de una meta de 5,502,433 equivalente a un 92.78%.
- El 22 de enero del 2021 dio inicio la entrega al RNP, de las cuales se han recibido 4,597,052 tarjetas preimpresas, suspendida el 4 de marzo del mismo año por problemas de incremento de casos de Covid-19, a la fecha del informe se han entregado 1,729,505 nuevas identidades que representa el 37.62%, las cuales se va continuar la entrega en el mes de mayo del 2021.
- El Proyecto ha generado la contratación de 3,690 empleados entre personal técnico administrativo y enroladores, (1,863 hombres y 1,827 mujeres) para que se desplieguen en los diferentes departamentos y municipios a nivel nacional desde el 01 de Julio de 2020.
- El proyecto Identifícate desarrolló las actividades de campo a través del proceso de mapeo con cobertura a nivel nacional. Esto se logró gracias a la buena planificación realizada por el equipo técnico del proyecto concentrado en el Centro Nacional de Operaciones.
- Los bienes y servicios que fueron adquiridos han sido esenciales para que los coordinadores y supervisores nacionales contaran con las herramientas e insumos necesarios para movilizarse en todo el país y cumplir con los objetivos planteados (personal contratado, vehículos rentados, servicios de telefonía móvil, combustible, salarios y estipendio).
- Es importante reconocer que la situación generada por COVID-19 impactó en los avances del proyecto, mientras se alcanzaron avances significativos a marzo 2020.

**Proyecto Ejecutado por el Servicio de Administración de Rentas (SAR):**

- **Proyecto Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria (BID 3541/BL-HO):**

En lo referente a las actividades del componente 1 “Reingeniería de los Procesos de la Administración Tributaria”, en el 2019 se logró el 100% del cumplimiento de la ejecución tanto física como financiera.

**Componente 2.1 “Modernización de los Sistemas”** específicamente en cuanto al Proceso No. LPI-SAR-BID-002-2020-PFIOAT-140 “Sistema de Información Integrado del Servicio de Administración de Rentas (SIISAR)”, durante el periodo reportado se concluyó la evaluación técnica y económica de las ofertas recibidas, una vez obtenidas las No Objeciones del BID. Se llevó a cabo la negociación con el proveedor que cumplió los criterios de calificación y respondió sustancialmente a los requisitos solicitados en el Documento de Licitación; El monto final acordado entre las partes para desarrollar la solución asciende a US\$12.2 millones. En el mes de abril se notificará oficialmente la adjudicación y se enviará al proveedor el contrato para su respectiva firma.

En virtud que la ejecución del contrato conlleva 30 meses más 6 meses de garantía, para el desarrollo de la solución, sobrepasando de esta forma el periodo de gobierno, se solicitará la aprobación ante el Congreso Nacional durante el II trimestre del 2021.

**Componente 2.2** En relación a la Infraestructura Tecnológica de Software y Física del SAR cuyo objetivo es la automatización de los procesos realizados por la Dirección Nacional de Talento Humano (DNTH) y la Dirección Nacional de Administración Financiera (DNAF), contando con un 70% de avance global de la revisión.

En relación con el Sistema Integrado de Bienes y Talento Humano ERP, durante el periodo reportado se continuaron las revisiones de hallazgos, incidentes y errores en los módulos correspondiente a la Dirección Nacional de Talento Humano (DNTH) y la Dirección Nacional de Administración Financiera (DNAF).

Durante el periodo reportado, se logró adjudicar una Licitación Pública Internacional, la totalidad de 8 artículos a 5 empresas participantes, por un monto total de US\$0.7 millones, para la adquisición de licencias y soportes que se requieren para la sostenibilidad de la plataforma tecnológica de la institución en la que se alojan las bases de datos claves a fin de cumplir con los objetivos estratégicos del SAR, mediante la cual se brindan todos los servicios automatizados para los colaboradores y los Obligados Tributarios. A la fecha se ha ejecutado el 71% del monto programado.

En la misma línea y bajo el mismo propósito, se logró la contratación del soporte SAN Hitachi, por un monto de US\$0.2 millones, que abarca el periodo de un (1) año a fin de fortalecer el equipo que aloja el ambiente de producción y contingencia del Sistema de Gestión Tributaria.

**Componente 2.3** En cuanto a la actividad Fortalecimiento de Capacidades Técnicas de la Dirección Nacional de Tecnología (DNT), el documento licitatorio se encuentra en revisión y el proceso está programado para ser adjudicado en el III trimestre del año 2021.



**Componente 3** (Producto 4). En cuanto a la Consultoría para la Implementación de un Plan de Gestión del Cambio Organizacional en el Servicio de Administración de Rentas (SAR), se tiene programado su inicio en el II trimestre del año 2021.

### 1.7 Factores que Han Incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el Primer Trimestre del Año 2021

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La declaratoria de emergencia nacional por COVID19, según decreto ejecutivo No. 005-2020, PCM-023-2020 y PCM-146-2020 ampliado al 31 de diciembre del 2021, Decreto Ejecutivo PCM-147-2021, emitido el 29 de diciembre 2020, mediante el cual se prorroga la vigencia de la declaratoria de Estado de Emergencia a nivel nacional, por los efectos de las fuertes lluvias ocasionadas por las Tormentas Tropicales “ETA” e “IOTA”, hasta el 31 de diciembre del 2021, decretada en todo el territorio nacional, en la infraestructura vial y sector productivo del País. Ocasionó la paralización de las obras ejecutadas por los proyectos. Así como las actividades programadas en sus Planes Operativos	<p>Las unidades ejecutoras deberán de realizar las modificaciones a sus planes operativos y planes de ejecución de sus proyectos, a fin de dar continuidad a las obras pendientes, ampliar fechas de extensión de contratos, o suspensión de contratos.</p> <p>Buscar mecanismos para agilizar la ejecución de proyectos, ya que la baja ejecución impacta directamente en la economía del país.</p>
	Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.

Área	Problemas	Acciones
	<p>La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras de proyectos, ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución</p>	<p>Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.</p>
	<p>Lentos procesos de adquisiciones y contrataciones, desfasando la ejecución oportuna de los proyectos.</p>	<p>Realizar una revisión de los posibles puntos débiles en los procesos de adquisiciones, prever tiempos para cada proceso y tomar en cuenta los tiempos que estipulan los organismos de financiamiento.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Administrativa-Financiera</b></p>	<p>Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.</p>	<p>Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.</p>
	<p>El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.</p>	<p>La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.</p>
	<p>Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión</p>	<p>Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.</p>
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"><b>Legal</b></p>	<p>Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión.</p>	<p>Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción. Aplicación de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos.</p>



ANEXO I  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado I Trimestre)				Ejecutado (Devengado Anual)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Compr./Vig.)
14	021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio	BCIE - 2098	26/08/2018 30/11/2021	-	2,500,000	2,500,000	-	2,620,000	2,620,000	-	377,953	377,953	14	-	377,953	377,953	14	-	550,000	550,000	21
	<b>Total 021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio</b>			-	<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>	-	<b>2,620,000</b>	<b>2,620,000</b>	-	<b>377,953</b>	<b>377,953</b>	<b>14</b>	-	<b>377,953</b>	<b>377,953</b>	<b>14</b>	-	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>21</b>
15	022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	BCIE 2177	2/1/2008 31/12/2021	-	289,286,723	289,286,723	-	289,286,723	289,286,723	-	67,930,035	67,930,035	23	-	67,930,035	67,930,035	23	-	67,930,035	67,930,035	23
	<b>Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I</b>			-	<b>289,286,723</b>	<b>289,286,723</b>	-	<b>289,286,723</b>	<b>289,286,723</b>	-	<b>67,930,035</b>	<b>67,930,035</b>	<b>23</b>	-	<b>67,930,035</b>	<b>67,930,035</b>	<b>23</b>	-	<b>67,930,035</b>	<b>67,930,035</b>	<b>23</b>
<b>13</b>	<b>0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos</b>			<b>580,657,648</b>	<b>37,753,908</b>	<b>618,411,556</b>	<b>625,657,648</b>	<b>37,753,908</b>	<b>663,411,556</b>	<b>38,516,701</b>	<b>46,393,401</b>	<b>7</b>	<b>38,516,701</b>	<b>46,393,401</b>	<b>7</b>	<b>184,997,387</b>	<b>192,874,087</b>	<b>29</b>			
1	006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN	FN-23959-1	15/3/2021 15/12/2022	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 006 - CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ANEXO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN</b>			<b>25,000,000</b>	-	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	-	<b>25,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACION, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA	FN-24039-1	2/5/2021 30/09/2021	22,000,000	-	22,000,000	22,000,000	-	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 007 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO POLIDEPORTIVO EN EL INSTITUTO SUPERACION, II ETAPA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE QUIMISTAN, DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA</b>			<b>22,000,000</b>	-	<b>22,000,000</b>	<b>22,000,000</b>	-	<b>22,000,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira	FN-24057-1	1/1/2021 31/12/2021	5,269,000	-	5,269,000	5,269,000	-	5,269,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira</b>			<b>5,269,000</b>	-	<b>5,269,000</b>	<b>5,269,000</b>	-	<b>5,269,000</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	FN-23879-1	2/3/2021 05/04/2022	77,401,192	-	77,401,192	77,401,192	-	77,401,192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.</b>			<b>77,401,192</b>	-	<b>77,401,192</b>	<b>77,401,192</b>	-	<b>77,401,192</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.	FN-24020-1	10/3/2021 10/08/2021	10,425,461	-	10,425,461	10,425,461	-	10,425,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.</b>			<b>10,425,461</b>	-	<b>10,425,461</b>	<b>10,425,461</b>	-	<b>10,425,461</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C	FN-24002-1	1/4/2021 31/10/2021	81,839,965	-	81,839,965	81,839,965	-	81,839,965	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total 027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTEPEQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C</b>			<b>81,839,965</b>	-	<b>81,839,965</b>	<b>81,839,965</b>	-	<b>81,839,965</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de Paraiso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazan, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque, Lempira, Comayagua y Choluteca.	FN-24084-1	1/1/2021 31/12/2021	150,165,746	-	150,165,746	150,165,746	-	150,165,746	4,603,977	-	4,603,977	3	4,603,977	-	4,603,977	3	22,148,122	-	22,148,122	15
	<b>Total 028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de Paraiso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazan, Santa Barbara, Intibucá, Valle, Atlántida, Ocotepeque, Lempira, Comayagua y Choluteca.</b>			<b>150,165,746</b>	-	<b>150,165,746</b>	<b>150,165,746</b>	-	<b>150,165,746</b>	<b>4,603,977</b>	-	<b>4,603,977</b>	<b>3</b>	<b>4,603,977</b>	-	<b>4,603,977</b>	<b>3</b>	<b>22,148,122</b>	-	<b>22,148,122</b>	<b>15</b>
8	116 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13	18/11/2013 18/01/2022	-	-	-	45,000,000	-	45,000,000	20,938,812	-	20,938,812	47	20,938,812	-	20,938,812	47	45,000,000	-	45,000,000	100
	<b>Total 116 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA</b>			-	-	-	<b>45,000,000</b>	-	<b>45,000,000</b>	<b>20,938,812</b>	-	<b>20,938,812</b>	<b>47</b>	<b>20,938,812</b>	-	<b>20,938,812</b>	<b>47</b>	<b>45,000,000</b>	-	<b>45,000,000</b>	<b>100</b>
9	121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BE-FI No.84859	1/1/2016 30/06/2021	1,797,480	37,753,908	39,551,388	1,797,480	37,753,908	39,551,388	89,340	7,876,700	7,966,040	20	89,340	7,876,700	7,966,040	20	89,340	7,876,700	7,966,040	20
	<b>Total 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN</b>			<b>1,797,480</b>	<b>37,753,908</b>	<b>39,551,388</b>	<b>1,797,480</b>	<b>37,753,908</b>	<b>39,551,388</b>	<b>89,340</b>	<b>7,876,700</b>	<b>7,966,040</b>	<b>20</b>	<b>89,340</b>	<b>7,876,700</b>	<b>7,966,040</b>	<b>20</b>	<b>89,340</b>	<b>7,876,700</b>	<b>7,966,040</b>	<b>20</b>
10	144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD E MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	FN-INSEP-23245	17/7/2018 19/07/2021	100,300,000	-	100,300,000	100,300,000	-	100,300,000	7,275,180	-	7,275,180	7	7,275,180	-	7,275,180	7	83,927,924	-	83,927,924	84
	<b>Total 144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD E MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.</b>			<b>100,300,000</b>	-	<b>100,300,000</b>	<b>100,300,000</b>	-	<b>100,300,000</b>	<b>7,275,180</b>	-	<b>7,275,180</b>	<b>7</b>	<b>7,275,180</b>	-	<b>7,275,180</b>	<b>7</b>	<b>83,927,924</b>	-	<b>83,927,924</b>	<b>84</b>
146 - CONSTRUCCIÓN A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA I: ESTACION 2+500 - HACIA DESVÍO DE AUTIERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME	FN-INSEP-23441-1		1/12/2019 01/08/2021	37,577,959	-	37,577,959	37,577,959	-	37,577,959	5,609,392	-	5,609,392	15	5,609,392	-	5,609,392	15	33,832,001	-	33,832,001	90







