



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

## Informe de Avance Físico y Financiero

### ***Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)***

Al Tercer Trimestre 2021

Tegucigalpa, M.D.C

Honduras, C.A.

Septiembre, 2021

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

El Programa de Inversión Pública de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) representa el 97% del Sector Energía (1,774,021,709); Al Tercer Trimestre 2021 el Presupuesto Vigente de la institución asciende a L.1,722,489,696.00. Dicho presupuesto corresponde 6 proyectos de los cuales 4 son financiados con Donaciones y 2 con Crédito Externo, los cuales en su conjunto lograron ejecutar L.303,332,451.56 representativos del 18 % del presupuesto vigente al Tercer Trimestre, tal y como se muestra en el cuadro No. 1.

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 82 % corresponde a Crédito Externo, 10% a Donaciones y el 8% a recursos propios. En la siguiente gráfica se observa el presupuesto vigente desglosado por Fuente Financiamiento.

Cuadro No. 01


#### Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2021

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,722,489,696.00
Presupuesto Vigente	1,722,489,696.00
Devengado III Trimestre-2021	57,756,012.01
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2021 / Vigente)</b>	<b>3%</b>
Devengado Anual	303,332,451.56
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>18%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	514,556,492.04
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>30%</b>

Fuente: SIAFI, 30/09/2021

Gráfico #1  
Financiamiento de la Inversión por Organismo  
Cifras en Millones de Lempiras

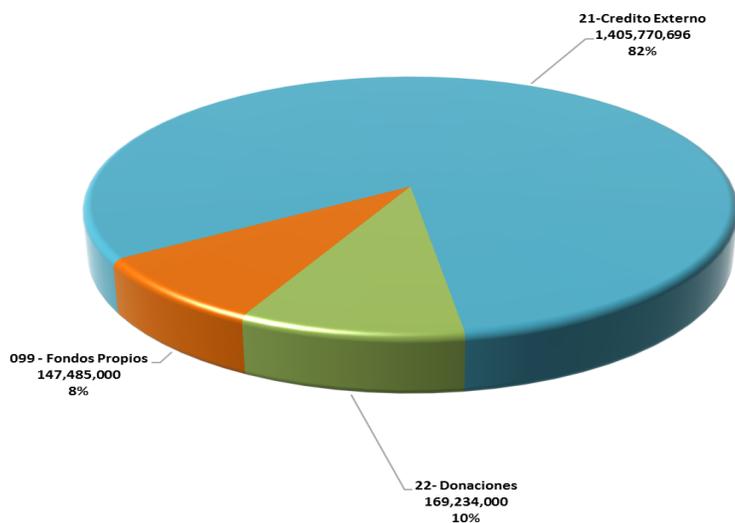

La inversión de la ENEE está destinada a la construcción, operación y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas, inversión en obras relacionadas con la integración de Honduras al SIEPAC, electrificación de viviendas y transmisión eléctrica teniendo como propósito mejorar y ampliar la cobertura del servicio eléctrico para contribuir al crecimiento y desarrollo económico y social del país, actualmente la ENEE cuenta con una Comisión Interventora que revisa los aspectos técnicos, legales y financieros de la Institución, incluyendo la ejecución de los proyectos de Inversión.

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión del año 2021 se concentra en los siguientes proyectos:

#### Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional (MER)- BID

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	BID -3103/BL-HO	<u>"724,350,895.00"</u>		14/05/2014
	BID- GRT/SX-16864-HO	554,940,395.00		14/03/2023
		169,410,500.00		
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	40,400,000.00	40,400,000.00	1,080,476.19	3%
Acumulado 2021	40,400,000.00	40,400,000.00	3,499,998.12	9%
Acumulado Vida del Proyecto*/	724,350,895.00	724,350,895.01	688,443,123.42	95.04 %
Observaciones: Durante el Tercer Trimestre del 2021 el proyecto se encuentra en ejecución obteniendo los resultados en el informe final de la resolución de los Pasivos Ambientales y Sociales, LT de Las Flores-Erandique y Danlí-Chichicaste, para solicitar desembolso al BID y realizar los pagos pendientes del Convenio, la Recepción y evaluación del Proceso AIHMER-13-LPI-B- "Adquisición de Medidores para Sistema de Medición Comercial para la Red de Transmisión Nacional", Auditoría del año 2020 con "Opinión Limpia" y Suscripción del Contrato No. 065/2021 Auditoría Ambiental.				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

#### Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaverál-Río Lindo

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN-OC-14905-HO	<u>4,049,540,189.00'</u>		26/03/2015-26/12/2017
	BID 3435/BL-HO	<u>10,890,675.00</u>		28/05/2015-28/11/20
	JICA HO-P6	<u>556,635,500.00</u>		26/03/2015-24/07/2024
	ATN/JF-17247-HO	<u>3,276,011,846.00</u>		
		<u>10,890,675.00</u>		
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	744,235,696.00	747,446,196.00	3737,155.60	0%
Acumulado 2021	744,235,696.00	747,446,196.00	21685,799.32	3%

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
Acumulado Vida del Proyecto*/	4,049,540,189.00	4,049,540,189.00	616,513,273.53	15%

Observaciones: se ha tenido avances en el III Trimestre del 2021 con la finalización de la firma del Contrato con la empresa Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, para el proyecto Lote-I Equipo Generador de la Central Hidroeléctrica Cañaveral (Adquisición e Instalación de los Equipos Principales y Auxiliares) y Negociación finalizada para firma de Contrato de consultoría de la Batimetría del Lago de Yojoa y Consultoría técnicas para analizar la calidad de agua e identificar fuentes de contaminación deterioro ambiental del Lago de Yojoa.

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

### Proyecto de Apoyo al Plan Estratégico de Acceso Universal a Electricidad

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
<b>012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD</b>	ATN/OC-16427-HO.	<u>10,890,675.00'</u>		16/03/2018 28/12/2022
		10,890,675.00		
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	10,000,000.00	12,459,500.00	5,772,284.31	46%
Acumulado 2021	10,000,000.00	12,459,500.00	5,772,284.31	46%
Acumulado Vida del Proyecto*/	10,890,675.00	10,890,675.00	5,858,520.74	54%

Observaciones: Durante el Tercer Trimestre 2021 el proyecto se encuentra en ejecución, se suscribió la Orden de Compra a la Adquisición de Software para Diseño de Redes de Distribución y Capacitación – Dired-CAD y los procesos "Director y Supervisor de Obras Electromecánicas del Proyecto "Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación con Energías Renovables mediante Micro Redes en Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios y Guanaja, Departamento de Isla, Supervisión Externa de Obras Civiles del Proyecto "Diseño y Construcción de Equipo, Instalación y Pruebas para Sistemas de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna y Guanaja

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

### Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
<b>021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS</b>	ATN/SX-16689-HO	<u>20,014,640.50'</u>		20/09/2018 20/09/2021
		20,014,640.50		
<b>Financiera</b>				

Ejecución al III Trimestre 2021: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

<b>ENERGÍAS RENOVABLES</b>	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
III Trimestre 2021	17,904,000.00	17,904,000.00	2,533,608.85	14%
Acumulado 2021	17,904,000.00	17,904,000.00	4,040,289.48	23%
Acumulado Vida del Proyecto*/	20,014,640.50	20,014,640.50	6,543,595.88	33%
Observaciones: Se dio la Orden de inicio del Contrato 069/2021 "Construcción de un Proyecto Piloto de Climatización con Energía Solar Térmica para la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo José Simón Azcona Hoyo" y en notificación de adjudicación al Consultor de la Consultoría para la "Elaboración de Guías y Procedimientos para la Incorporación de Buenas Prácticas Internacionales de Relacionamento Comunitario Anticipado (BPRCA) en Proyectos de Generación de Energía Renovable que fortalezcan el Componente Social."				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

### Electrificación Rural en Lugares Aislados

<b>Proyecto</b>	<b>Convenio</b>	<b>Costo Estimado Total HNL<sup>1</sup></b>		<b>Inicio - Fin</b>
<b>022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS</b>	BID-GRT/SX-17123-HO	<u>"155,373,630.00"</u> 155,373,630.00		28/12/2018
	<b>Financiera</b>			
		<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>
III Trimestre 2021	90,465,000.00	90,465,000.00	146,437.15	0%
Acumulado 2021	90,465,000.00	90,465,000.00	1,084,727.66	1%
Acumulado Vida del Proyecto*/	155,373,630.00	155,373,630.00	3,819,885.73	2%

Observaciones :En el III Trimestre esta proceso se solicitud de firma de adjudicación PERLA-30-LPI-B- para el "Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación Con Energías Renovables Mediante Micro Redes en Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios y Guanaja, Departamento de Islas de La Bahía", LOTE también se encuentra en proceso se solicitud de firma de adjudicación PERLA-29-LPI-B- para el "Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en el Corpus Y Concepción de María, Departamento de Choluteca" y en marcha el Contrato No. 068/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción, Operación y Supervisión de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta)

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

### APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

<b>Proyecto</b>	<b>Convenio</b>	<b>Costo Estimado Total HNL<sup>1</sup></b>	<b>Inicio - Fin</b>
<b>023- APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE</b>		<u>3,751,232,500.00'</u>	29/12/2018- 29/12/2023
	4598/BL-HO	<u>3,630,225,000.00</u>	
	4599/SX-HO	<u>121,007,500.00</u>	

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III Trimestre 2021	819,485,000.00	813,815,000.00	44,486,049.91	5%
Acumulado 2021	819,485,000.00	813,815,000.00	266,991,161.72	33%
Acumulado Vida del Proyecto*/	3,751,232,500.00	3,751,232,500.00	321,215,516.89	0%
<p>Observaciones: Durante el Tercer Trimestre 2021 se emitió la Orden de inicio del Contrato 039/2021 "Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV, Ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA, Construcción Línea de Transmisión San Buena Ventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV, Doble Circuito" (12/7/2021), en trámite de No objeción por parte de la CREE de la adjudicación de los contratos desde el 01 de septiembre de 2021: Proceso ENEE-59-LPI-O- "Ampliación de las Subestaciones: Miraflores, Laínez, Toncontín, Siguatepeque, Bellavista, Choloma y Construcción Subestación El Centro; Construcción Línea de Transmisión: Miraflores - Laínez, 138 kV y Bellavista - El Centro, 138 kV" (conocido como Paquete 2) y en no Objeción en el organismo financiador el informe de propuestas técnicas del proceso ENEE-61-SBCC-CF- "Supervisión y Gestión de los Proyectos Construcción de Ampliación de las Subestaciones: Miraflores, Laínez, Toncontín, Siguatepeque, Bellavista, Choloma, La Puerta, Bermejo, Comayagua, Santa Marta, Progreso y San Pedro Sula Sur; Construcción de las nuevas Subestaciones El Centro, Calpules, El Sitio, La Victoria; y Construcción de las Líneas de Transmisión 138 kV: "Miraflores-Laínez", "Bellavista-El Centro" y "San Pedro Sula Sur-Santa Marta-Progreso".</p>				

Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Elaboración de dictámenes de desembolso, ampliación de plazo y Transferencias de Categoría de Inversión.
- Reuniones semanales de monitoreo de Ejecución de los proyectos con la viceministra de inversión y crédito público, autoridades y empleados de la DGIP.
- Se tuvo reunión de revisión de cartera con el Banco de Interamericano de Desarrollo (BID) durante el mes de septiembre, con el proyecto apoyo al programa nacional de transmisión de energía eléctrica para agilizar la ejecución y ver que actividades están atrasando los avances en el proyecto y como tema de país.
- Monitoreo físico y financiero a los diferentes proyectos de la institución para elevar la ejecución durante último trimestre.

#### Conclusiones

- Se deben realizar las Incorporaciones presupuestarias conforme a las necesidades de los proyectos para evitar los sobregiros y la pérdida de los recursos financieros.

Ejecución al III Trimestre 2021: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

- Las reuniones de la DGIP, con los Organismo Financiadores y la Unidad de Gestión de Proyectos de la ENEE son de suma importancia para tratar temas de atrasos de los proyectos y para mejorar la ejecución de las actividades con el fin de que cada una finalice en tiempo y forma para que esto no implique atrasos en la ejecución y aumento de costos.
- El Estado de Emergencia Sanitaria Nacional declarado por Coronavirus COVID-19 a partir del 15 de marzo de 2020 mediante el cual se establecen las disposiciones, excepciones y restricciones de movilidad; ha afectado en la ejecución normal de las actividades, así como la apertura gradual de instituciones involucradas que no permitían - avanzar en diversos procesos, por ejemplo, la UAP-IP, MIAMBIENTE y la Banca Privada.

### **Recomendaciones**

- Se debe aplicar estrategias para la ejecución presupuestaria de los proyectos y la ejecución física de los mismos, se puede evaluar en términos globales si existe una adecuada relación entre ambos.
- Los tiempos de respuesta de la Dirección General de Control Franquicias a diversas solicitudes de dispensa de exoneración de los proyectos son tardíos lo que afecta la ejecución de los mismos (temas de debido cumplimiento contractual) debe ser más rápidos.
- Agilizar los tiempos de respuesta de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, debido que atrasan los procesos que a su vez afectan la ejecución y desembolsos; asimismo la UCP considera que las observaciones y comentarios que la CREE realiza no son vinculantes a la ejecución de los recursos del Contrato de Préstamo.
- La aprobación de los diferentes procesos de los proyectos por parte de la Comisión Interventora sigue siendo tardío debido a los diferentes cambios de persona en la misma como también en la delegación de la Firma Autorizada.

ANEXO II  
Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2021**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales
5	Agua y Saneamiento			-	1,085,876,163	1,085,876,163	-	467,990,614	467,990,614	-	80,288,844	80,288,844	17	-	77,704,630	77,704,630	17	-
2	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)			-	-	-	-	15,218,021	15,218,021	-	354,004	354,004	2	-	354,004	354,004	2	-
1	023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN		-	-	-	-	11,009,000	11,009,000	-	354,004	354,004	3	-	354,004	354,004	3	-
	Total 023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS			-	-	-	-	11,009,000	11,009,000	-	354,004	354,004	3	-	354,004	354,004	3	-
2	024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN		-	-	-	-	4,209,021	4,209,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana			-	-	-	-	4,209,021	4,209,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central			-	166,597,069	166,597,069	-	452,772,593	452,772,593	-	79,934,841	79,934,841	18	-	77,350,626	77,350,626	17	-
1	001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460		-	166,597,069	166,597,069	-	452,772,593	452,772,593	-	79,934,841	79,934,841	18	-	77,350,626	77,350,626	17	-
	Total 001 - Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa			-	166,597,069	166,597,069	-	452,772,593	452,772,593	-	79,934,841	79,934,841	18	-	77,350,626	77,350,626	17	-
2	0449 - Servicios Financieros de la Administración Central			-	919,279,094	919,279,094	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-
1	PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO URBANO DE AGUA POTABLE EN HONDURAS US 45.0			-	743,942,364	743,942,364	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-
2	PROYECTO SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS US 85.00			-	175,336,730	175,336,730	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	-
22	Carreteras			3,418,815,929	1,408,013,091	4,826,829,020	4,089,844,786	2,198,266,599	6,288,113,385	2,299,069,174	696,399,711	2,995,468,885	48	156,265,567	201,495,695	357,761,262	6	2,390,024,135
7	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)			-	1,116,879,945	1,116,879,945	561,000	923,745,578	924,306,578	554,897	590,022,220	590,577,117	64	554,897	170,259,945	170,814,842	18	554,897
1	010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II	BID-3815/BL-HO		-	42,293,952	42,293,952	-	35,101,748	35,101,748	-	13,406,042	13,406,042	38	-	5,111,483	5,111,483	15	-
	Total 010 - PROGRAMA VIAL DE INTEGRACION VIAL REGIONAL II			-	42,293,952	42,293,952	-	35,101,748	35,101,748	-	13,406,042	13,406,042	38	-	5,111,483	5,111,483	15	-
2	011 - CORREDOR PACIFICO-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL	BID_2470BL-HO-2		-	71,628,163	71,628,163	-	97,719,637	97,719,637	-	25,085,328	25,085,328	26	-	21,944,992	21,944,992	22	-
	Total 011 - CORREDOR PACIFICO-PROGRAMA DE INTEGRACION VIAL REGIONAL			-	71,628,163	71,628,163	-	97,719,637	97,719,637	-	25,085,328	25,085,328	26	-	21,944,992	21,944,992	22	-
3	013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI, FASE I:	BID-3815/BL-HO		-	302,025,782	302,025,782	-	246,713,096	246,713,096	-	160,085,718	160,085,718	65	-	-	-	-	-
	Total 013 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CORREDOR DE ORIENTE, CARRETERA TEGUCIGALPA-DANLI, FASE I:			-	302,025,782	302,025,782	-	246,713,096	246,713,096	-	160,085,718	160,085,718	65	-	-	-	-	-
4	015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	BCIE 2221		-	252,085,623	252,085,623	-	13,084,320	13,084,320	-	3,684,954	3,684,954	28	-	3,056,369	3,056,369	23	-
	Total 015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur			-	252,085,623	252,085,623	-	13,084,320	13,084,320	-	3,684,954	3,684,954	28	-	3,056,369	3,056,369	23	-
5	020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III	BCIE-2205		-	-	-	561,000	1,451,335	2,012,335	554,897	1,437,475	1,992,372	99	554,897	-	554,897	28	554,897
	Total 020 - CONSTRUCCION DEL CORREDOR LOGISTICO VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN SECCION II Y III			-	-	-	561,000	1,451,335	2,012,335	554,897	1,437,475	1,992,372	99	554,897	-	554,897	28	554,897
6	021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio	BCIE - 2098		-	2,500,000	2,500,000	-	1,841,500	1,841,500	-	1,277,803	1,277,803	69	-	449,600	449,600	24	-
	Total 021 - Ampliación y Mejoramiento de Carretera CA-5 Norte Segmentos I y II (Sección 2A), Tramo Las Mercedes-Empalme Villa de San Antonio			-	2,500,000	2,500,000	-	1,841,500	1,841,500	-	1,277,803	1,277,803	69	-	449,600	449,600	24	-
7	022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	BCIE 2177		-	289,286,723	289,286,723	-	402,948,584	402,948,584	-	267,811,901	267,811,901	66	-	96,299,136	96,299,136	24	-
	Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I			-	289,286,723	289,286,723	-	402,948,584	402,948,584	-	267,811,901	267,811,901	66	-	96,299,136	96,299,136	24	-
11	0120 - Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos			533,657,648	37,753,908	571,411,556	599,114,254	191,812,062	790,926,316	387,032,553	69,848,165	456,880,718	58	145,175,990	12,613,991	157,789,982	20	477,987,513
1	016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira	FN-24057-1		5,269,000	-	5,269,000	5,269,000	-	5,269,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 016 - Construcción y/o Rehabilitación de Obras de Drenaje en los Departamentos de Francisco Morazán y Lempira			5,269,000	-	5,269,000	5,269,000	-	5,269,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.	FN-23879-1		77,401,192	-	77,401,192	77,401,192	-	77,401,192	11,882,872	-	11,882,872	15	11,882,872	-	11,882,872	15	62,051,163
	Total 023 - Construcción del Puente Los Niños, con una Longitud Aproximada de 260 metros lineales, Localizado en Cantarranas, Departamento de Francisco Morazán.			77,401,192	-	77,401,192	77,401,192	-	77,401,192	11,882,872	-	11,882,872	15	11,882,872	-	11,882,872	15	62,051,163
3	024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTPEQUE.	FN-24020-1		10,425,461	-	10,425,461	10,425,461	-	10,425,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total 024 - RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JOCOMICO, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 25.4 ML, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ENCARNACIÓN DEPARTAMENTO DE OCOTPEQUE.			10,425,461	-	10,425,461	10,425,461	-	10,425,461	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTPEQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C	FN-24002-1		81,839,965	-	81,839,965	102,296,571	-	102,296,571	78,738,118	-	78,738,118	77	7,996,723	-	7,996,723	8	80,655,904
	Total 027 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LOS DEPARTAMENTOS VALLE, COMAYAGUA, INTIBUCÁ, EL PARAÍSO, LEMPIRA, COPÁN, OCOTPEQUE, ATLÁNTIDA, COLÓN, LA PAZ, YORO, FRANCISCO MORAZÁN, OLANCHO, CHOLUTECA, C			81,839,965	-	81,839,965	102,296,571	-	102,296,571	78,738,118	-	78,738,118	77	7,996,723	-	7,996,723	8	80,655,904

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales
5	028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Intibucá, Valle, Atlántida,	FN-24084-1		150,165,746	-	150,165,746	150,165,746	-	150,165,746	141,389,607	-	141,389,607	94	97,281,950	-	97,281,950	65	148,986,373
	<i>Total 028 - Obras de Construcción de Pavimentos de Concreto Hidráulico en Vías Urbanas en los Departamentos de Paraíso, Cortes, Olancho, Copan, La Paz, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Intibucá, Valle, Atlántida,</i>			150,165,746	-	150,165,746	150,165,746	-	150,165,746	141,389,607	-	141,389,607	94	97,281,950	-	97,281,950	65	148,986,373
6	116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA	FONDOS NACIONALES 0000003-13		-	-	-	45,000,000	-	45,000,000	22,566,614	-	22,566,614	50	-	-	-	-	45,000,000
	<i>Total 116 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CARRETERA CATACAMAS-CUEVAS DE TALGUA</i>			-	-	-	45,000,000	-	45,000,000	22,566,614	-	22,566,614	50	-	-	-	-	45,000,000
		BCIE-2156		-	-	-	-	34,569,655	34,569,655	-	30,423,301	88	-	12,613,991	-	12,613,991	36	-
7	121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN	BEI-FI No. 84859 DCI-ALA/2015/369-566 TA2015034 HN LIF		1,797,480	37,753,908	39,551,388	1,797,480	146,571,927	148,369,407	1,291,019	37,086,838	38,377,857	26	-	-	-	-	1,291,019
	<i>Total 121 - REHABILITACIÓN VIAL DEL CORREDOR DE OCCIDENTE: LA ENTRADA - COPAN RUINAS - EL FLORIDO Y LA ENTRADA-SANTA ROSA DE COPAN</i>			1,797,480	37,753,908	39,551,388	1,797,480	191,812,062	193,609,542	1,291,019	69,848,165	71,139,184	37	-	12,613,991	12,613,991	7	1,291,019
8	144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.	FN-INSEP-23245		100,300,000	-	100,300,000	100,300,000	-	100,300,000	95,207,281	-	95,207,281	95	22,956,119	-	22,956,119	23	98,970,745
	<i>Total 144 - CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL TRAMO CARRETERO VALLADOLID - LA VIRTUD ¿ MAPULACA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KM, LOCALIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.</i>			100,300,000	-	100,300,000	100,300,000	-	100,300,000	95,207,281	-	95,207,281	95	22,956,119	-	22,956,119	23	98,970,745
9	146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME	FN-INSEP-23441-1		37,577,959	-	37,577,959	37,577,959	-	37,577,959	32,502,691	-	32,502,691	86	5,058,326	-	5,058,326	13	37,577,959
	<i>Total 146 - CONSTRUCCION A CUATRO (4) CARRILES DEL BULEVAR DE COMAYAGUA, ETAPA II: ESTACION 2+500 - HACIA DESVIO DE AJUTERIQUE, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1 KM, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEPARTAME</i>			37,577,959	-	37,577,959	37,577,959	-	37,577,959	32,502,691	-	32,502,691	86	5,058,326	-	5,058,326	13	37,577,959
10	148 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN	FN-23931-1		21,033,049	-	21,033,049	21,033,049	-	21,033,049	3,454,351	-	3,454,351	16	-	-	-	-	3,454,351
	<i>Total 148 - CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, DE BULEVAR A CUATRO (4) CARRILES CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 544 Mts. Y CALLE DE ACCESO CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 429 Mts.; LOCALIZADO EN</i>			21,033,049	-	21,033,049	21,033,049	-	21,033,049	3,454,351	-	3,454,351	16	-	-	-	-	3,454,351
11	149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul	FN-24137-1		47,847,796	-	47,847,796	47,847,796	-	47,847,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Total 149 - Construcción y Pavimentación a Cuatro (4) Carriles de Bulevar Enrique Weddle (0.51 Kms) y Bulevar Chorotega (1.24 Kms), y Construcción y Pavimentación de Tramo de Conexión a dos (2) Carriles entre Bul</i>			47,847,796	-	47,847,796	47,847,796	-	47,847,796	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central</b>			-	-	-	-	<b>114,525,416</b>	<b>114,525,416</b>	-	<b>36,529,326</b>	<b>36,529,326</b>	<b>32</b>	-	<b>18,621,759</b>	<b>18,621,759</b>	<b>16</b>	-
1	001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)	BID-2465/BL-HO		-	-	-	-	114,525,416	114,525,416	-	36,529,326	36,529,326	32	-	18,621,759	18,621,759	16	-
	<i>Total 001 - PROYECTO DE TRANSPORTE PUBLICO PARA EL DISTRITO CENTRAL (TEGUCIGALPA - COMAYAGUELA)</i>			-	-	-	-	114,525,416	114,525,416	-	36,529,326	36,529,326	32	-	18,621,759	18,621,759	16	-
<b>1</b>	<b>0449 - Servicios Financieros de la Administración Central</b>			-	<b>253,379,238</b>	<b>253,379,238</b>	-	<b>968,183,543</b>	<b>968,183,543</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	PROYECTOS EN EL MARCO DEL GASTO DE MEDIANO PLAZO			-	253,379,238	253,379,238	-	968,183,543	968,183,543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>4620 - Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP)</b>			<b>35,158,281</b>	-	<b>35,158,281</b>	<b>35,671,895</b>	-	<b>35,671,895</b>	<b>28,649,877</b>	-	<b>28,649,877</b>	<b>80</b>	<b>10,534,679</b>	-	<b>10,534,679</b>	<b>30</b>	<b>28,649,877</b>
1	PROYECTOS APP - CORREDOR LENCA			35,158,281	-	35,158,281	35,671,895	-	35,671,895	28,649,877	-	28,649,877	80	10,534,679	-	10,534,679	30	28,649,877
<b>1</b>	<b>69270 - Fideicomiso de Infraestructura Vial</b>			<b>2,850,000,000</b>	-	<b>2,850,000,000</b>	<b>3,454,497,637</b>	-	<b>3,454,497,637</b>	<b>1,882,831,847</b>	-	<b>1,882,831,847</b>	<b>55</b>	-	-	-	-	<b>1,882,831,847</b>
1	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL			2,850,000,000	-	2,850,000,000	3,454,497,637	-	3,454,497,637	1,882,831,847	-	1,882,831,847	55	-	-	-	-	1,882,831,847
# REF	Desarrollo Productivo y Riego			# REF	# REF	# REF	# REF	4,584,956	215,374,899	219,959,855	# REF	# REF						
<b>6</b>	<b>0801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica</b>			<b>147,485,000</b>	<b>1,575,004,696</b>	<b>1,722,489,696</b>	<b>147,485,000</b>	<b>1,575,004,696</b>	<b>1,722,489,696</b>	<b>2,434,608</b>	<b>300,897,843</b>	<b>303,332,452</b>	<b>18</b>	<b>950,761</b>	<b>56,805,252</b>	<b>57,756,012</b>	<b>3</b>	<b>2,461,609</b>
1	012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD	ATN/OC-16427-HO-BID		-	10,000,000	10,000,000	-	12,459,500	12,459,500	-	5,772,284	5,772,284	46	-	5,772,284	5,772,284	46	-
	<i>Total 012 - APOYO AL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCESO UNIVERSAL A ELECTRICIDAD</i>			-	10,000,000	10,000,000	-	12,459,500	12,459,500	-	5,772,284	5,772,284	46	-	5,772,284	5,772,284	46	-
2	018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO	ATN/JF-17247-HO		-	10,465,000	10,465,000	-	8,005,500	8,005,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO</i>			-	10,465,000	10,465,000	-	8,005,500	8,005,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		BID 3435/BL-HO		128,000,000	32,493,500	160,493,500	128,000,000	38,163,500	166,163,500	1,724,779	13,238,531	14,963,310	9	733,500	2,047,630	2,781,130	2	1,751,757
		JICA HO-P6		-	573,277,196	573,277,196	-	573,277,196	573,277,196	-	6,722,488	6,722,488	1	-	956,026	956,026	0	-
	<i>Total 018 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO</i>			128,000,000	616,235,696	744,235,696	128,000,000	619,446,196	747,446,196	1,724,779	19,961,019	21,685,798	3	733,500	3,003,656	3,737,156	0	1,751,757
3	020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)	GRT/SX-16864-HO		-	40,400,000	40,400,000	-	40,400,000	40,400,000	-	3,499,997	3,499,997	9	-	1,080,476	1,080,476	3	-
	<i>Total 020 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)</i>			-	40,400,000	40,400,000	-	40,400,000	40,400,000	-	3,499,997	3,499,997	9	-	1,080,476	1,080,476	3	-
4	021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES	ATN/SX-16689-HO		-	17,904,000	17,904,000	-	17,904,000	17,904,000	-	4,040,288	4,040,288	23	-	2,533,609	2,533,609	14	-
	<i>Total 021 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES</i>			-	17,904,000	17,904,000	-	17,904,000	17,904,000	-	4,040,288	4,040,288	23	-	2,533,609	2,533,609	14	-
5	022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS	BID-GRT/SX-17123-HO		-	90,465,000	90,465,000	-	90,465,000	90,465,000	-	1,084,725	1,084,725	1	-	146,437	146,437	0	-
	<i>Total 022 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS</i>			-	90,465,000	90,465,000	-	90,465,000	90,465,000	-	1,084,725	1,084,725	1	-	146,437	146,437	0	-

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado III Trimestre)				Fondos Nacionales
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	
6	023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	BID-4598/BL-HO		19,485,000	757,960,000	777,445,000	19,485,000	752,290,000	771,775,000	709,830	254,614,629	255,324,459	33	217,261	44,276,439	44,493,700	6	709,852
		BID-4599/SX-HO		-	42,040,000	42,040,000	-	42,040,000	42,040,000	-	11,924,900	11,924,900	28	-	-	7,650	-	0
	<i>Total 023 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA</i>			<i>19,485,000</i>	<i>800,000,000</i>	<i>819,485,000</i>	<i>19,485,000</i>	<i>794,330,000</i>	<i>813,815,000</i>	<i>709,830</i>	<i>266,539,529</i>	<i>267,249,359</i>	<i>33</i>	<i>217,261</i>	<i>44,268,789</i>	<i>44,486,050</i>	<i>5</i>	<i>709,852</i>
