

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2022

Inversión Estratégica de Honduras
(INVEST-H)

Tegucigalpa, Honduras
Julio 2022

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


La Inversión Estratégica de Honduras, (INVEST-H), representa el 15% (L1,464.93 millones) del Presupuesto del Programa de Inversión Pública 2022 (L9,715.21 millones); su presupuesto de inversión vigente para el presente año y su ejecución financiera que alcanza el 6% se detallan en el cuadro: Programa de Inversión Pública al II Trimestre 2022.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,464,933,147
Presupuesto Vigente	1,462,721,885
Devengado II Trimestre-2022	14,886,150
% Ejecución (Devengado II Trim-2022/ Vigente)	1%
Devengado Anual	82,927,521
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	6%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	135,929,357
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	9%

Fuente: SIAFI, 30/06/2022

Gráfico No.6
Financiamiento de la Inversión por Organismo
Cifras en Millones de Lempiras

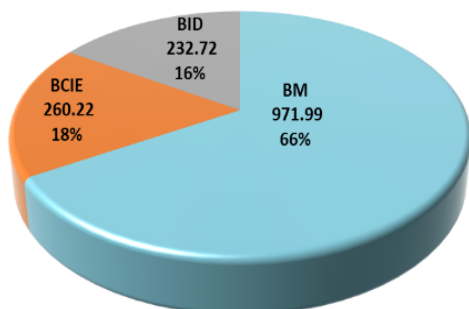

La totalidad del presupuesto del Programa de Inversión Pública de la INVEST-H es financiado por recursos externos; de los cuales la mayor parte proviene de préstamos del Banco Mundial (L971.9 millones), representando el 66%, del presupuesto total de la institución; seguido por los fondos del BCIE con una representación del 18% (L260.22 millones), y un 16% del BID (L232.7 millones) tal y como se muestra en el gráfico No. 6.

Durante el Segundo Trimestre del 2022, se ha tenido una ejecución de L14.88 millones representando el 1% de ejecución respecto al presupuesto Vigente. Lo anterior debido a que, hasta el 17 de junio del 2022, se nombró de manera oficial al Liquidador de la INVEST-H.


Ejecución histórica 2018-2022

La Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) en el periodo comprendido del año 2018 al 2022, ha administrado veinticuatro (24) proyectos de inversión pública los cuales han sido financiados con recursos otorgados por el BCIE, BID y BM. En donde en el año 2018 y 2019 ejecuto 15 proyectos denotando en las mayores asignaciones presupuestarias para la institución en los últimos años. Para la gestiones 2020-2021, han culminado los proyectos de Programa de Integración Vial Regional II, Proyecto Rehabilitación y Mejoramiento del

Corredor de Oriente, Carretera Tegucigalpa-DanlÍ, Proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Carretera CA-5 Segmento I y II, Proyecto Ciudad Mujer y COMRURAL en donde al segundo trimestre de cada año se tuvo una ejecución del 18% y 41% respectivamente. Por otra parte la ejecución del 18% al segundo trimestre del 2020, también está relacionada a la situación de Pandemia COVID-19.

Debido a la culminación de los proyectos, la asignación presupuestaria ha disminuido en relación al año 2019, en donde para el segundo trimestre alcanzaba una ejecución del 44%, de acuerdo a lo demostrado en el gráfico No.7.

Gráfico No.7
Comportamiento de la Inversión Pública
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H)
 Al 30 de junio 2018-2022
 Millones de Lempiras

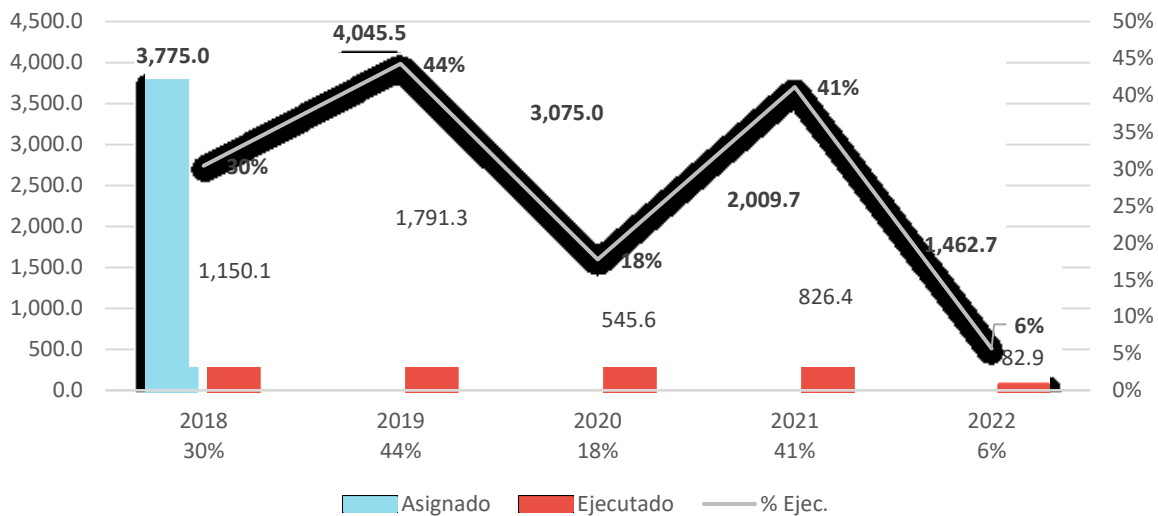

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

El Programa de Inversión Pública de la INVEST-H se concentra en 8 proyectos; los cuales conforman algunas de la inversiones más relevantes en apoyo a la infraestructura Productiva del país, entre los cuales se encuentran; el Proyecto de Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II), Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad, Proyecto de Seguridad Hídrica en El Corredor Seco de Honduras.

Cabe mencionar que los proyectos Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional, Alianza para El Corredor Seco (USAID-GAFSP) y el Proyecto Carretera Villa De San Antonio - Goascorán, Sección I, realizaron su cierre financiero en la presente gestión.

Ejecución al II Trimestre 2022; Inversión Estratégica de Honduras

La INVEST-H está en proceso de realizar la transición de los proyectos a las Instituciones correspondientes de acuerdo a lo indicado en el PCM 05-2022.

Corredor - Pacífico - Programa de Integración Vial Regional (BID 2470/BL-HO-1 y BID 2470/BL-HO-2)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Corredor - Pacífico - Programa de Integración Vial Regional	BID 2470/BL-HO-1 BID 2470/BL-HO-2	US\$
		Lempiras	3,226,059,950	26/03/2022
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	47,455,983	47,455,983	-	0.0
Acumulado 2022	47,455,983	47,455,983	17,397,900	36.7
Acumulado Vida del Proyecto */	3,226,059,950	3,226,059,950	3,008,861,069	93.3

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Fuente SIAFI 30/062022

Ambas Operaciones de financiamiento se encuentran totalmente desembolsadas; para el presente año, se cuenta con un Plan Operativo Anual (POA) monetizado en \$3.13 millones para el convenio BID 2470-2.

Debido a la situación de cierre de INVEST-H, el liquidador deberá de acelerar el proceso de cierre del proyecto por lo que es urgente la definición del proceso para completar pagos pendientes de realizar de Obra y Supervisión de las Reparaciones en el Corredor Pacifico Carretera CA-1 y realizar devolución de remanentes de saldos de contratos.

Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) IDA-6448-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	US\$
		Lempiras	1,815,112,500	12/4/2025
	Financiera			
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	671,331,116	671,331,116	12,380,206	1.8
Acumulado 2022	671,331,116	671,331,116	28,967,649	4.3
Acumulado Vida del Proyecto */	1,815,112,500	1,815,112,500	290,361,879	16.0

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Fuente SIAFI 30/062022

El proyecto ha tenido una ejecución presupuestaria acumulada del 15.3% sin embargo, para la presente gestión y en cumplimiento al PCM-005 de fecha 06 de abril del 2022, se debe

Ejecución al II Trimestre 2022; Inversión Estratégica de Honduras

concretar el procesos de transición de Organismo Ejecutor para que se puedan realizar las actividades programadas para la ejecución en la presente gestión en donde se realizará el seguimiento e implementación de 50 planes de negocio en el sector agrícola; 12 en los Departamentos de El Paraíso y Comayagua, 18 en Copán y 8 en Atlántida.

Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad 4940/BL-HO (HO-L1211) y 4936/BL-HO (HO-L1201)

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productividad	BID 4940/BL-HO	55,000,000		21/5/2020
	BID 4936/BL-HO		1,331,082,500	21/8/2025
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	74,355,910	74,355,910	1,199,015	1.6
Acumulado 2022	74,355,910	74,355,910	4,512,184	6.1
Acumulado Vida del Proyecto */	1,331,082,500	1,331,082,500	6,743,476	0.5

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Fuente SIAFI 30/062022

Para el año 2022, se tiene una estimación de desembolso de \$5.2 millones de los cuales se ha ejecutado \$4.81 millones.

En la actualidad se está realizando el proceso de Contratación de una entidad Sub Implementadora para los Sub Componentes 1, 2 y 3 para el Componente 1: FIRMAS (SBC) se encuentra Pendiente Negociación para firma de Contrato. Asimismo, se deberá realizar la Contratación de una entidad Sub Implementadora para el Sub Componente 4 correspondiente al Componente 1: FIRMAS (SBCC). En donde se encuentra pendiente de envío los TDRs para ser sometidos a la No Objeción del Banco, en cuanto a la Contratación de la Auditoría del Proyecto. Se encuentra pendiente envío de Informe de auditoría para No Objeción.

Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana IDA 6696-HN

Proyecto	Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	45,000,000		24/09/2021
			1,089,067,500	30/04/2025
Financiera				
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución
II Trimestre 2022	80,083,763	80,083,763	1,012,563	1.3
Acumulado 2022	80,083,763	80,083,763	2,197,293	2.7
Acumulado Vida del Proyecto */	1,089,067,500	1,089,067,500	3,014,140	0.3

Ejecución al II Trimestre 2022; Inversión Estratégica de Honduras

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Fuente SIAFI 30/062022

Para el 2022, el proyecto no reporta ejecución debido al que el Organismo Ejecutor se encuentra en un periodo de transición en cumplimiento al PCM-005 de fecha 06 de abril del 2022, por lo que se observa desfase en la ejecución del proyecto en la presente gestión; donde completaría la estructuración de la Unidad Ejecutora, la contratación del especialista ambiental, social y comunicaciones, así como la contratación de especialista del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS) y la adquisición de Equipo, mobiliario y vehículos. Asimismo, la contratación de la firma consultora internacional implementación Plan de Asistencia Técnica (PAT), la elaboración del diseño e implementación del PAT, el diseño y supervisión de obras mayores de rehabilitación de rápido impacto identificadas en los Planes de Inversión de Rápido Impacto (PIRRI) y Planes de Negocios entregados por los prestadores, La Contratación de dos especialistas temporales en rehabilitación de sistemas de agua potable (preparación aspectos técnicos documentos licitación y supervisión obras menores) y la Contratación de dos oficiales de adquisiciones.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Desarrollo de reuniones de seguimiento físico y financiero a proyectos.
- Apoyo en ajustes a la INVEST-H para el proceso de transición.
- Requerimiento de las Proyecciones Mensuales de ejecución para el Año 2022.
- Requerimiento de la Matriz Plurianual 2023-2026 para el proceso de Formulación presupuestaria 2023.

Conclusiones

- Es de suma importancia continuar con el seguimiento oportuno, de la ejecución física y financiera de los diferentes proyectos que son ejecutados por la INVEST-H debido que por la transición de los proyectos, los mismos han mermado sus alcances físicos y financieros.
- Para que la institución pueda realizar sus ejecuciones presupuestarias en los diferentes proyectos de inversión, se deberá de dar cumplimiento al PCM-005.
- La transición de los proyectos de la institución prevé serios problemas para el Gobierno de Honduras en cuanto a, los proyectos que deben finalizar su ejecución

en la presente gestión. Además, afectara la ejecución de los demás proyectos que conforman la cartera de proyectos de la institución.

Recomendaciones

- La institución deberá dar seguimiento y respuesta oportuna a los requerimientos de información necesaria para la preparación de Dictámenes Técnicos de Ampliación de Plazos, Transferencia entre Categorías de Inversión, Notas Técnicas para Incorporaciones Presupuestarias, Enmiendas y Notas de Prioridad, que permita facilitar la emisión de dichos dictámenes y la toma de decisiones.
- La INVEST-H deberá seguir paso a paso de manera ordenada y coordinada los procesos que conlleven a la transición de los proyectos.

Anexo Ejecución Financiera

ANEXO IV
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2022
Cifras en Lempias

No. Proy.	Sector / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado Anual)				Ejecutado (Devengado II Trimestre)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
2	AGUA Y SANEAMIENTO			-	154,439,673	154,439,673	-	154,439,673.00	154,439,673.00	-	8,320,523.10	8,320,523.10	5%	-	3,822,624	3,822,624	2%	-	8,368,346	8,368,346	5%
2	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)			-	154,439,673	154,439,673	-	154,439,673	154,439,673	-	8,320,523	8,320,523	5%	-	3,822,624	3,822,624	2%	-	8,368,346	8,368,346	5%
1	023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	IDA-6680-HN	12/06/2020 - 30/12/2025	-	74,355,910	74,355,910	-	74,355,910	74,355,910	-	6,123,230	6,123,230	8%	-	2,810,061	2,810,061	4%	-	6,133,346	6,133,346	8%
	Total 023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS			-	74,355,910	74,355,910	-	74,355,910	74,355,910	-	6,123,230	6,123,230	8%	-	2,810,061	2,810,061	4%	-	6,133,346	6,133,346	8%
2	024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	IDA 6696-HN	24/09/2021 - 30/04/2025	-	80,083,763	80,083,763	-	80,083,763	80,083,763	-	2,197,293	2,197,293	3%	-	1,012,563	1,012,563	1%	-	2,235,000	2,235,000	3%
	Total 024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana			-	80,083,763	80,083,763	-	80,083,763	80,083,763	-	2,197,293	2,197,293	3%	-	1,012,563	1,012,563	1%	-	2,235,000	2,235,000	3%
3	CARRETERAS			-	307,677,617	307,677,617	-	307,677,617	307,677,617	-	20,273,988	20,273,988	7%	-	-	-	0%	-	41,723,754	41,723,754	14%
3	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)			-	307,677,617	307,677,617	-	307,677,617	307,677,617	-	20,273,988	20,273,988	7%	-	-	-	0%	-	41,723,754	41,723,754	14%
1	011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	BID_2470BL-HO-2	26/1/2016 - 26/3/2022	-	47,455,983	47,455,983	-	47,455,983	47,455,983	-	17,397,900	17,397,900	37%	-	-	-	0%	-	38,847,666	38,847,666	82%
	Total 011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL			-	47,455,983	47,455,983	-	47,455,983	47,455,983	-	17,397,900	17,397,900	37%	-	-	-	0%	-	38,847,666	38,847,666	82%
2	015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	BCIE 2221	26/5/2021 - 26/6/2026	-	257,796,154	257,796,154	-	257,796,154	257,796,154	-	451,118	451,118	0%	-	-	-	0%	-	451,118	451,118	0%
	Total 015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur			-	257,796,154	257,796,154	-	257,796,154	257,796,154	-	451,118	451,118	0%	-	-	-	0%	-	451,118	451,118	0%
3	022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	BCIE 2177	2/1/2008 - 31/12/2022	-	2,425,480	2,425,480	-	2,425,480	2,425,480	-	2,424,970	2,424,970	100%	-	-	-	0%	-	2,424,970	2,424,970	100%
	Total 022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I			-	2,425,480	2,425,480	-	2,425,480	2,425,480	-	2,424,970	2,424,970	100%	-	-	-	0%	-	2,424,970	2,424,970	100%
3	DESARROLLO PRODUCTIVO			-	1,002,815,857	1,002,815,857	-	1,000,604,595	1,000,604,595	-	54,333,010	54,333,010	5%	-	14,886,150	14,886,150	1%	-	85,837,257	85,837,257	9%
3	0031 - Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)			-	1,002,815,857	1,002,815,857	-	1,000,604,595	1,000,604,595	-	54,333,010	54,333,010	5%	-	14,886,150	14,886,150	1%	-	85,837,257	85,837,257	9%
1	004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	Carta de Ejecución No. 7 USAID	29/1/2014 - 30/6/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	0%	
		TF017904	29/1/2014 - 30/6/2022	-	146,221,706	146,221,706	-	146,221,706	146,221,706	-	20,796,704	20,796,704	14%	-	1,306,930	1,306,930	1%	-	27,037,603	27,037,603	18%
	Total 004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)			-	146,221,706	146,221,706	-	146,221,706	146,221,706	-	20,796,704	20,796,704	14%	-	1,306,930	1,306,930	1%	-	27,037,603	27,037,603	18%
2	009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II)	IDA-6448-HN	12/4/2020 - 12/4/2025	-	671,331,116	671,331,116	-	671,331,116	671,331,116	-	28,967,649	28,967,649	4%	-	12,380,206	12,380,206	2%	-	50,174,559	50,174,559	7%
	Total 009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proy			-	671,331,116	671,331,116	-	671,331,116	671,331,116	-	28,967,649	28,967,649	4%	-	12,380,206	12,380,206	2%	-	50,174,559	50,174,559	7%
3	018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	4936/BL-HO	21/5/2020 - 21/8/2025	-	31,868,958	31,868,958	-	31,868,958	31,868,958	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	0%	
		4940/BL-HO	21/5/2020 - 21/8/2025	-	147,417,694	147,417,694	-	147,417,694	147,417,694	-	4,568,657	4,568,657	3%	-	1,199,015	1,199,015	1%	-	8,625,095	8,625,095	6%
		GRT/WE-18107-HO	21/5/2020 - 21/8/2025	-	5,976,383	5,976,383	-	3,765,121	3,765,121	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-	0%	
	Total 018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD			-	185,263,035	185,263,035	-	183,051,773	183,051,773	-	4,568,657	4,568,657	2%	-	1,199,015	1,199,015	1%	-	8,625,095	8,625,095	5%
8	Total general			-	1,464,933,147	1,464,933,147	-	1,462,721,885	1,462,721,885	-	82,927,521	82,927,521	6%	-	18,708,775	18,708,775	1%	-	135,929,357	135,929,357	9%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Anexo Ejecución Física

ANEXO V
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2022

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2022			
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución	
Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-HONDURAS)	004 - ALIANZA PARA EL CORREDOR SECO (USAID-GAFSP)	07 - Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 1	305 - PROYECTO	1,000	0	0%	1,000	0	0%	
		08 - Sub-proyectos de higiene en el hogar, Clúster 2	305 - PROYECTO	1,000	0	0%	1,000	0	0%	
		09 - Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 1	456 - NIÑO	1,500	0	0%	1,500	0	0%	
		10 - Atención de niños menores de 2 años por el proyecto ACS, Clúster 2	456 - NIÑO	1,500	0	0%	1,500	0	0%	
		11 - Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad, Clúster 1	127 - VISITA	500	0	0%	500	0	0%	
		12 - Visitas de asistencia técnica y capacitación para mejorar la productividad Cluster 2	127 - VISITA	500	0	0%	500	0	0%	
		13 - Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 1	305 - PROYECTO	45	0	0%	45	0	0%	
		14 - Sub-proyectos de planes de negocio, Clúster 2	305 - PROYECTO	85	0	0%	85	0	0%	
		009 - Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública	02 - Perfiles de planes de negocios aprobados	302 - PERFIL	60	0	0%	20	0	0%
		011 - CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL	03 - Fortalecimiento Institucional de ARSA y SENASA	991 - ACTA	2	0	0%	0	0	0%
			03 - Cierre financiero de obra del Tramo II, lote A: Júcaro Galán-Santa Elena realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
		015 - Libramiento Anillo Periférico CA-5 Sur	04 - Cierre financiero de la supervisión del Tramo II, lote A Júcaro Galán-Santa Elena realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%
			06 - Proceso para la contratación de las obras del tramo Libramiento Sur iniciado	425 - LICITACION	1	0	0%	0	0	0%
		018 - PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVIDAD	07 - Proceso para la contratación de la supervisión del tramo Libramiento Sur iniciado	364 - CONCURSO	1	0	0%	0	0	0%
	08 - Porcentaje del derecho de vía del tramo licitado del "Libramiento Sur" liberado		75 - PORCENTAJE	70	0	0%	0	0	0%	
	03 - Productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI, atención técnica en producción, mercado y/o nutrición con el apoyo de la intervención (PIDRyP) beneficiados		304 - PRODUCTOR	4,000	0	0%	0	0	0%	
	022 - PROYECTO CARRETERA VILLA DE SAN ANTONIO - GOASCORAN, SECCION I	04 - Acceso a Financiamiento para los productores rurales con el apoyo de la intervención (PIDRyP) otorgados	304 - PRODUCTOR	1,933	0	0%	0	0	0%	
		10 - Cierre financiero contrato de supervisión Villa de San Antonio -Goascorán Sección I, realizado	1007 - NUMERO DE UNIDAD	1	0	0%	0	0	0%	
	023 - PROYECTO DE SEGURIDAD HIDRICA EN EL CORREDOR SECO DE HONDURAS	02 - Asistencia técnica para la prestación de apoyo para la Gobernanza del Agua a nivel nacional, contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%	
		03 - Diseño para la construcción de obras de la represa JCV (Compuertas), contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%	
	024 - Fortalecimiento del Abastecimiento de Agua Urbana	05 - Supervisión de obra para la rehabilitación de los sistemas de agua, contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%	
		06 - Asistencia técnica para el fortalecimiento de los prestadores del servicio de agua potable (ERSAPS), contratada	155 - CONTRATO	1	0	0%	0	0	0%	

Fuente: SIAFI, 30/06/2022
