

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e  
Inversión Pública



Finanzas

Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

AL II TRIMESTRE 2023

***Secretaría de Educación  
(SEDOC)***

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2023

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

## 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) es la encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal.

Para el año 2023 la institución ejecuta 3 proyectos de inversión adscritos en el Programa de Inversión Pública.

En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera al término del II trimestre de la presente gestión.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, ofrendar servicios de salud, **educación**, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros.

Al segundo trimestre de 2023, la SEDUC reporta una ejecución presupuestaria a nivel de devengado anual de L23,649,153 (5%); orientados al apoyo en el diseño y formulación en conjunto con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), para la ejecución de obras de infraestructura escolar, así como la participación en la supervisión de centros educativos beneficiarios; así mismo la mejora de la capacidad institucional de la Secretaría para la gestión del Nivel Prebásica mediante el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico.

Cuadro No. 01

**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2022**


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	185,108,359
Presupuesto Vigente	483,855,487
Devengado II Trimestre-2023	18,669,879
<b>% Ejecución (Devengado II Trim-2023/ Vigente)</b>	<b>4%</b>
Devengado Anual	23,649,153
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>5%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	83,553,616
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)</b>	<b>17%</b>


Fuente: SIAFI, 30/06/2023

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El programa de inversión vigente de la SEDUC es financiado con recursos de Crédito Externo (32%) proveniente del Banco Mundial (BM), Donaciones Externas (6%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y Banco Mundial (BM); el restante (62) % con Recursos Nacionales como contraparte a la contribución del KFW y fondos del convenio con el Banco Central de Honduras (BCH). El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

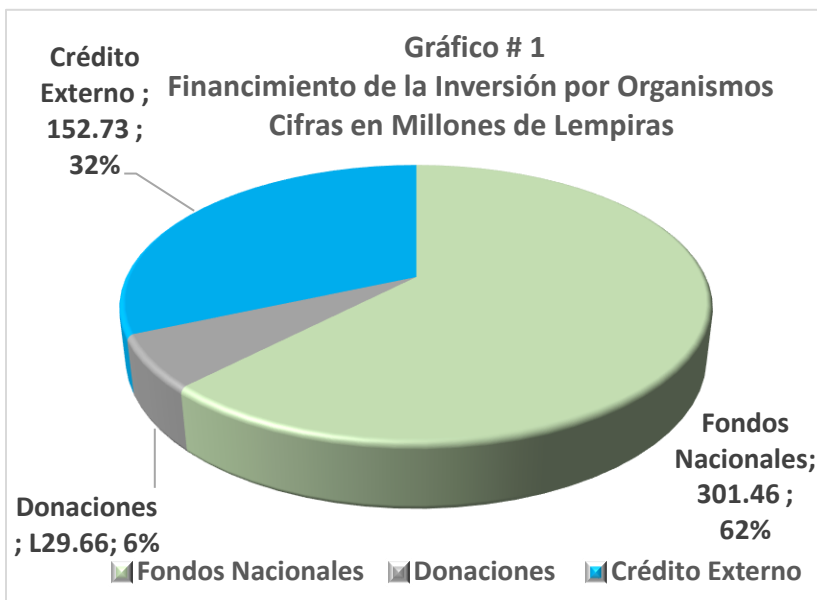

### 3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2019 – 2023):

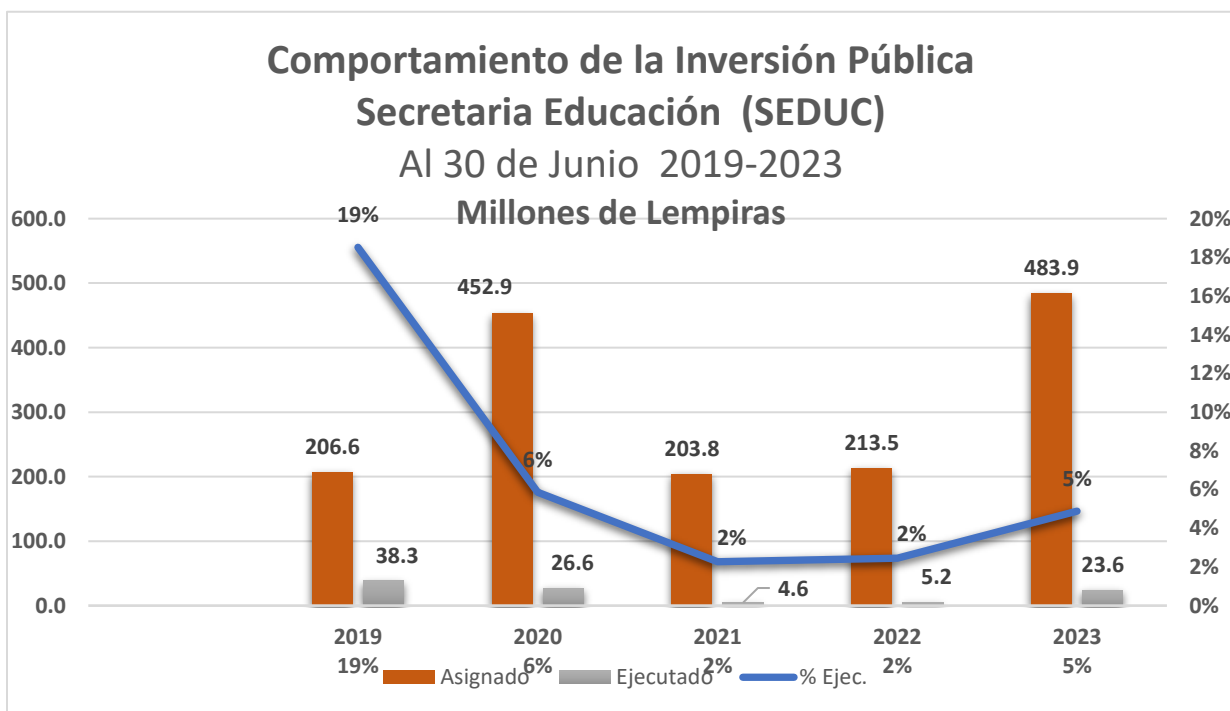

Al segundo trimestre de cada año en el periodo comprendido entre el 2019-2023, el Presupuesto de inversión de la SEDUC ha reportado incremento en sus asignaciones anuales debido a la incorporación de recursos provenientes de convenio con el Banco Central de Honduras (BCH) en comparaciones a otros años, así mismo la ejecución al inicio del segundo trimestre va ha ido en ascenso, se espera que para el tercer trimestre se ejecute la totalidad de los recursos de los

proyectos debido que se estarían adjudicando Obras de Infraestructura Escolar en las diferentes niveles educativos de Prebásica y Básica, como se puede ver en el año 2022 y en el 2023, como se muestra en el gráfico histórico.

En el período comprendido entre el 2019 y el 2023, el Programa de Inversión Pública de la SEDUC ha considerado la ejecución de al menos 3 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 32% con recursos de crédito externo, 6% recursos de donación externa y el 62% restante con recursos del Tesoro Nacional para los Proyectos.

### 3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

#### Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV Y V)” (Componente SEDUC):

El Programa se enfoca en dotar de infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, de la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	<u>L59,554,506.00'</u> L59,554,506.00		03/12/2015 31/07/2024
	<b>Financiera</b>			
		<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>
II Trimestre 2023	8,694,437.00	8,694,437.00	847,698.34	10%
Acumulado 2023	8,694,437.00	8,694,437.00	1,116,879.10	13%
Acumulado Vida del Proyecto*/	59,554,506.00	59,554,506.00	32,168,819.25	54%
<b>Observaciones:</b> Al segundo trimestre se reporta una ejecución financiera del 10% del presupuesto vigente teniendo atrasos debido conciliaciones de las cuentas del proyecto de la fase IV y V; la fase IV del programa tiene un componente de intervención para el departamento de Gracias a Dios con un monto de 3 millones de euros. También se extenderá el área de cobertura del programa a los municipios situados al oeste de la carretera CA5 de los departamentos de Comayagua, Francisco Morazán (excepto la parte urbana del Distrito Central), Valle y Choluteca.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto  
 Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L 24.7165 por US\$1.00

Para el segundo trimestre, se realizaron las siguientes:

- Visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, Calidad de Obra, Porcentajes de avance, verificación de Normativa, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos a continuación se detalla:

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Aldea	Municipio	Departamento	Monto del Proyecto (Todos los componentes)	% Avance Físico	%Avance Financiero
1	107716	Ampliación CEB Jesús María Rodríguez y CEPB La Independencia	Vivistorio	San José	Copán	L. 10,890,524.15	99.00%	98.57%
2	107732	Ampliación CEB La Fraternidad y CEPB Mi Esperanza	Estancia	Santa Ana	La Paz	L. 14,785,800.47	93.00%	97.00%
3	107735	Reposición CEB Francisco Morazán y JN Francisco Filiberto Isaula	El Encinal	La Paz	La Paz	L. 10,202,187.19	91.33%	97.54%
4	107912	Construcción Instituto El Progreso	Ciliantuque	Talgua	Lempira	L. 23,391,796.81	71.95%	96.39%
5	107884	Ampliación Instituto Jenry Santos Padilla	Los Planes	Santa Maria	La Paz	L. 17,459,885.12	95.02%	86.29%
6	107783	Reposición CEB Lucila Pérez	Las Peñas	La Unión	Lempira	L. 9,705,263.04	99.00%	99.50%
7	107750	Reparación CEB Profa. Olga Ondina López	Bo. La Cruz	La Unión	Copán	L. 9,967,797.31	53.50%	53.00%
8	107693	Ampliación CEB Dr. Miguel Paz Barahona y CEPB Jesús María Rodríguez	Bo. El Centro	Tambla	Lempira	L. 12,191,047.88	54.12%	60.43%
9	108114	Ampliación CEB Dr. Policarpo Bonilla	Bo. San Antonio	Belén Gualcho	Ocotepeque	L. 11,507,244.08	8.00%	8.50%
10	107990	Ampliación CEB 21 de octubre y JN Dr. Ramon Rosa	Quebrada Seca	Nueva Arcadia	Copán	L. 13,634,646.23	39.80%	35.00%

- Se recepcionaron y se dio seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a Centros Educativos del Programa PROMINE:

Nº	CODIGO	CENTRO EDUCATIVO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN	Situación Legal.	PORCENTAJE DE TRAMITE LEGAL
1	030100026	LEONCIO VALLE	COMAYAGUA	COMAYAGUA	ALDEA SAN JOSE DE PANE	Constancia de evalúo catastral registrado a favor de la secretaria de Educación (trámite de aprobación en conjunto con el IP acuse de recepción)	85%
2	081600003	INSTITUTO TECNICO FRANCISCO MORAZAN	FRANCISCO MORAZÁN	SABANA GRANDE	SABANA GRANDE	Falta inscripción en el Registro de la Propiedad. (trámite de aprobación en conjunto con el IP acuse de recepción)	85%
3	15050007	CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	OLANCHO	DULCE NOMBRE DE CULMI	MATA DE MAIZ	Convenio de usufructo a favor de la SEDUC en conjunto con ICF	80%

- Visitas de Pre-Factibilidad Técnica y Social de proyectos priorizados PROMINE faseV:

No	CENTRO EDUCATIVO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
1	CERRO GRANDE	FRANCISCO MORAZÁN	DISTRITO CENTRAL	CERRO GRANDE ZONA 2
2	INSTITUTO TECNICO FRANCISCO MORAZAN	FRANCISCO MORAZÁN	SABANA GRANDE	SABANA GRANDE
3	CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	OLANCHO	DULCE NOMBRE DE CULMI	MATA DE MAIZ

- Visita de Socialización y análisis técnico de Infraestructura en zona de influencia del Programa:

No	CENTRO EDUCATIVO	Departamento	Municipio
1	INSTITUTO TECNICO FRANCISCO MORAZAN	FRANCISCO MORAZÁN	SABANA GRANDE
2	CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	OLANCHO	DULCE NOMBRE DE CULMI

- Capacitaciones Levantamiento Plan Maestro de Infraestructura educativa.

Capacitación en el Departamento de Santa Bárbara

Municipios de:

San Luis

Protección

Naranjito

Macuelizo

Azacualpa

Nueva Frontera

**Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN)”:**

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
<b>010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS</b>	6560-HN TF0B2218-HN	"970,262,200.00" US\$39,500,000.00		31/07/2020 31/07/2025
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2023	176,413,922.00	176,413,922.00	7,364,497.17	4%
Acumulado 2023	176,413,922.00	176,413,922.00	12,074,590.99	7%
Acumulado Vida del Proyecto*/	970,262,200.00	970,262,200.00	19,859,193.46	2%
<b>Observaciones:</b> Al segundo trimestre la ejecución presupuestaria del proyecto asciende a L7,364,497.17.				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L24.7165 por US\$1.00

Al segundo trimestre de acuerdo con las principales actividades realizadas por la UCP por componentes, se reporta lo siguiente:

## **Componente 1: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SEDUC para la Gestión de la Educación Prebásica:**

- Se ha continuado desarrollando talleres bajo la modalidad virtual en el marco de las sesiones Introductorias de las Mesas de Trabajo denominadas: “Avanzando por la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras”, donde se continuó con la participación de las unidades de líneas de la secretaria Educación que están involucradas con el proyecto.
- Se ha tomado a bien crear alianzas estratégicas con actores claves comunitarios con el propósito de priorizar acciones dirigidas para el fortalecimiento de la educación prebásica en cada municipio focalizado por el proyecto.
- Seminario/Taller preparatorio para los facilitadores de la implementación del Programa de Fortalecimiento (sede Tegucigalpa).
- Adquisición de materiales (útiles de oficina, papel y cartulinas) para los seminarios/talleres de implementación del Programa de Fortalecimiento.
- En seguimiento a esta actividad, el BM ha comunicado a la UCP que el equipo Financiero del Banco, está revisando las pruebas de cumplimiento (cinco de seis) presentadas para hacer efectivo el desembolso del DLR 3.1 “Reorganización de las funciones de la Subdirección General de Educación Prebásica (SDGEPB)”.
- 

## **Componente 2: Actualización del Diseño Curricular para Todas las Modalidades de Atención del Nivel de Educación Prebásica y Mejora de las Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB.**

- El Banco Mundial proporcionará a la UCP asistencia técnica para brindar apoyo para el desarrollo con la actividad de la adquisición y distribución de materiales educativos para los espacios de aprendizaje en los centros de educación prebásica a nivel nacional, la cual tiene como propósito fortalecer el desarrollo integral del educando del nivel de Educación Prebásica.
- Los Términos de referencia (TDRs) para el desarrollo de esta consultoría individual de diseñar la estrategia de formación permanente para centros mentores y satélites articulada con el modelo de gestión de Redes Educativas están en proceso de No Objeción por parte del Banco Mundial.
- En lo referente al desarrollo de la consultoría “elaboración del diagnóstico de necesidades de capacitación de docentes y educadores del nivel de educación prebásica”, el consultor presentó su último producto a satisfacción de la Dirección General de Desarrollo Profesional.



### Componente 3: Mejoramiento de los Entornos Físicos de Aprendizaje en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que Atienden a niños(as) en Áreas Focalizadas.

- Adjudicado el proceso de evaluación la adquisición de Equipo Informático y Audiovisual para la Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes (DIGECEBI).
- En proceso de contratación, 20 ingenieros supervisores, mismos que darán seguimiento a la ejecución de la construcción, rehabilitación y/o ampliación de las 52 aulas.
- Contratados cuatro Consultores Especialistas en Verificación y Cumplimiento de Estándares Técnicos de Obras, estos consultores garantizarán el cumplimiento de la normativa establecida en el manual para la planificación y diseño de centros educativos (MPDCE).

### Componente 4: Gestión y Evaluación del Proyecto

- Se efectuó la contratación del proceso de la firma Auditoría Financiera, revisión de los Informes de seguimiento financiero (IFRs) y el uso de las Cuentas del Proyecto, para el periodo del 11 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2023.
- Seguimiento y apoyo técnico por parte de los equipos del Banco Mundial de los procesos claves del Modelo de Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (MCEP, revisión y elaboración de los diseños y herramientas curriculares del nivel de Educación Prebásica y el diseño y desarrollo del Diplomado en Capacidades Pedagógicas y Liderazgo para Docentes y Educadores de Educación Prebásica.

### Proyecto “Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I”:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL <sup>1</sup>		Inicio - Fin
011 - Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.	BCH - 24841 - 1	<u>"441,600,000.00"</u> 441,600,000.00		22/09/20133 1/05/2020
	<b>Financiera</b>			
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Devengado</b>	<b>% Ejec.</b>
II Trimestre 2023	-	298,747,128.00	10,457,683.02	4%
Acumulado 2023	-	298,747,128.00	10,457,683.02	4%
Acumulado Vida del Proyecto*/	441,600,000.00	441,600,000.00	49,174,613.02	11%

**Observaciones:** En el segundo trimestre se ha ejecutado 10,457,683.02 que representa el 4% del presupuesto vigente, se espera la adjudicación de 72 proyectos de educación básica para la construcción ampliación y rehabilitación de la Infraestructura educativa y en el área implementación de huertos escolares productivos, se adjudicará la licitación de 1,050 huertos escolares.

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 30/06/2023 (BCH): L24.7165 por US\$1.00

### 3.3.1 INVERSION SOCIAL

Referente al presupuesto asignado (L1,060,065,750.0) se ejecutaron L57,956,959.00 que representan el 5.5% del presupuesto vigente al segundo trimestre, los cuales se utilizarán en:

- Becas
- Material de Bioseguridad
- Matrícula gratis

### 3.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Al segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Se solicitó la proyección de ejecución de hasta diciembre para acelerar la ejecución de los proyectos.
- Incorporación Presupuestaria de los recursos con los fondos del convenio con el Banco Central de Honduras (BCH).
- Monitoreo y Seguimiento con las autoridades de la Secretaria de Educación y las unidades ejecutoras para que no existan atrasos de ejecución de los proyectos.

### Conclusiones

- El proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras logró continuar y normalizar la ejecución y varios procesos que se realizan en Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) y específicamente en el módulo del sistema Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos (UEPEX) de la SEFIN.
- Se desarrollaron y atendieron varias actividades y tareas con el fin de posibilitar la gestión fiduciaria de la Unidad Ejecutora y no generar atrasos internos, ya los factores exógenos que afectan la operación fiduciaria están fuera de control de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras.
- En el programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, la ejecución con fondos del programa dio inicio en el año 2012 y desde ese entonces la cooperación ha sido participe de la supervisión continua del manejo de los fondos, lo que ha generado confianza para aprobar más fases y beneficiar más centros educativos.

## Recomendaciones

- Mejorar la comunicación interna de las autoridades con las unidades ejecutoras.
- Los tiempos establecidos en las actividades de los proyectos deben cumplir para que no existan atrasos en el proyecto.
- Agilizar las exoneraciones de impuesto para que no exista atrasos en las adquisiciones de bienes y servicios.
- Cumplir con tiempos definidos en los procesos de licitaciones de obras de infraestructura educativa.

# ANEXOS

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2023**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al II Trimestre			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Ejecutado/ Vigente)
<b>0050 - Secretaría de Educación</b>			<b>2,716,013.0</b>	<b>182,392,346.0</b>	<b>185,108,359.0</b>	<b>301,463,141.0</b>	<b>182,392,346.0</b>	<b>483,855,487.0</b>	<b>11,184,862.1</b>	<b>12,464,291.0</b>	<b>23,649,153.1</b>	<b>4.9%</b>	<b>10,915,681.4</b>	<b>7,754,197.2</b>	<b>18,669,878.5</b>	<b>3.9%</b>
	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	-	152,731,792.0	152,731,792.0	-	152,731,792.0	152,731,792.0	-	12,074,591.0	12,074,591.0	7.9%	-	7,364,497.2	7,364,497.2	4.8%
		TF0B2218-HN	-	23,682,130.0	23,682,130.0	-	23,682,130.0	23,682,130.0	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS</b>		<b>-</b>	<b>176,413,922.0</b>	<b>176,413,922.0</b>	<b>-</b>	<b>176,413,922.0</b>	<b>176,413,922.0</b>	<b>-</b>	<b>12,074,591.0</b>	<b>12,074,591.0</b>	<b>6.8%</b>	<b>-</b>	<b>7,364,497.2</b>	<b>7,364,497.2</b>	<b>4.2%</b>
	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	BMZ 2016 68 763	2,716,013.0	5,978,424.0	8,694,437.0	2,716,013.0	5,978,424.0	8,694,437.0	727,179.1	389,700.0	1,116,879.1	12.8%	457,998.3	389,700.0	847,698.3	9.7%
	<b>Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)</b>		<b>2,716,013.0</b>	<b>5,978,424.0</b>	<b>8,694,437.0</b>	<b>2,716,013.0</b>	<b>5,978,424.0</b>	<b>8,694,437.0</b>	<b>727,179.1</b>	<b>389,700.0</b>	<b>1,116,879.1</b>	<b>12.8%</b>	<b>457,998.3</b>	<b>389,700.0</b>	<b>847,698.3</b>	<b>9.7%</b>
	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I.	BCH - 24841 - 1	-	-	-	298,747,128.0	-	298,747,128.0	10,457,683.0	-	10,457,683.0	3.5%	10,457,683.0	-	10,457,683.0	3.5%
	<b>Total PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I.</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>298,747,128.0</b>	<b>-</b>	<b>298,747,128.0</b>	<b>10,457,683.0</b>	<b>-</b>	<b>10,457,683.0</b>	<b>3.5%</b>	<b>10,457,683.0</b>	<b>-</b>	<b>10,457,683.0</b>	<b>3.5%</b>

# SECRETARIA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2023**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Proyectos obra de infraestructura educativa, en los niveles prebásica, básica y de man...	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	18	0	0%	0	0	-
		04 - Proyectos obra de infraestructura escolar diseñados y formulados.	305 - PROYECTO	6	0	0%	0	0	-
		05 - Educandos de educación media, dotados con herramientas pedagógicas (manuales té...	1016 - EDUCANDO	225	0	0%	0	0	-
	010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	08 - Modelo de la Calidad de la Educación Prebásica (MCEPB) Desarrollado e Implementad...	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	-
		09 - Promoción de la participación comunitaria en la educación prebásica.	25 - CONSULTA	6	0	0%	0	0	-
		10 - Mejora de la capacidad operativa, administrativa y técnica de los recursos humanos (R...	134 - EMPLEADO	7	0	0%	0	0	-
		11 - Mejora de la organización de los sistemas de planificación y monitoreo de la SE.	134 - EMPLEADO	97	0	0%	0	0	-
		12 - Apoyo a la implementación de prácticas pedagógicas mejoradas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	-
		13 - Actualización del diseño curricular del nivel de educación prebásica y materiales de apl...	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	-
		14 - Implementación de herramientas de medición para el desarrollo infantil y la calidad de l...	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	-
		15 - Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en los centros de educación prebá...	1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	253	0	0%	0	0	-
		16 - Gestión y Evaluación del proyecto.	149 - INFORME	253	0	0%	0	0	-
		17 - COMDE fortalecidos.	300 - ORGANIZACION	110	0	0%	0	0	-
	011 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I.	19 - Reconstrucción, rehabilitación o mejora de la infraestructura de centros educativos esco...	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0%	0	0	-
		20 - Centros educativos equipados con mobiliario escolar en los niveles de educación Pre B...	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0%	0	0	-
		21 - Administración de los recursos asignados al programa.	104 - RECURSO	1	0	0%	0	0	-
	<b>Total Secretaría de Educación</b>				<b>1154</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
