

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e
Inversión Pública



Finanzas

Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

AL III TRIMESTRE 2023

**Secretaría de Educación
(SEDOC)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2023

www.sefin.gob.hn



DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) es la encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal.

Para el año 2023 la institución ejecuta 3 proyectos de inversión adscritos en el Programa de Inversión Pública.

En el cuadro No. 1 se presenta el Presupuesto de Inversión y ejecución financiera al término del III trimestre de la presente gestión.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, considera en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, ofrendar servicios de salud, **educación**, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros.

Al tercer trimestre de 2023, la SEDUC reporta una ejecución presupuestaria a nivel de devengado anual de L65,721,082 (14%); orientados al apoyo en el diseño y formulación en conjunto con el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), para la ejecución de obras de infraestructura escolar, así como la participación en la supervisión de centros educativos beneficiarios; así mismo la mejora de la capacidad institucional de la Secretaría para la gestión del Nivel Prebásica mediante el fortalecimiento de las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico y la construcción, rehabilitación y/o ampliación de 52 aulas en los departamentos de Copán, El Paraíso, Lempira y Olancho, la intervención se está llevando a cabo en los Centros de Educación Prebásica que presentan déficit de infraestructura escolar.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2023


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	185,108,359
Presupuesto Vigente	483,855,487
Ejecutado III Trimestre	42,071,929
% Ejecución (Devengado III Trim-2023/Vigente)	9%
Ejecutado (Devengado Anual)	65,721,082
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	14%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	201,667,241
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente)	42%


Fuente: SIAFI, 30/09/2023

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El programa de inversión vigente de la SEDUC es financiado con recursos de Crédito Externo (32%) proveniente del Banco Mundial (BM), Donaciones Externas (6%) por parte del Gobierno Alemán (KFW) y Banco Mundial (BM); el restante (62) % proviene del Convenio de Crédito entre el Banco Central de Honduras y el Gobierno de la República por intermedio de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas que fue aprobado mediante el Decreto Ejecutivo No. PCM 18-2022, donde se autorizó un préstamo de mil millones de dólares (US\$1,000,000,000.0) con el propósito de financiar Inversión Pública. El financiamiento de la inversión para la Secretaría de Educación se refleja en el gráfico No. 1.

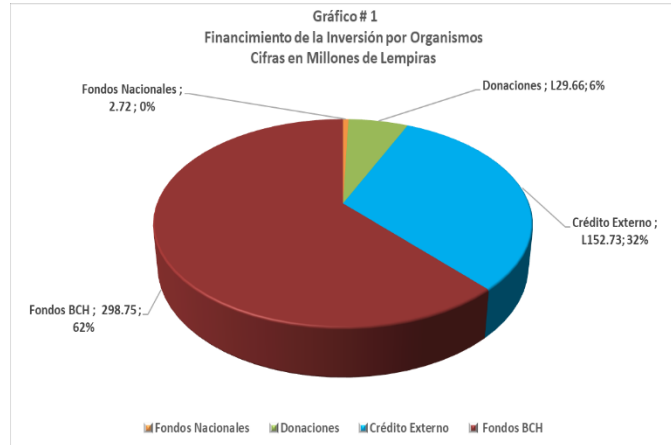

3.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN HISTÓRICA AL III TRIMESTRE (2019 – 2023):

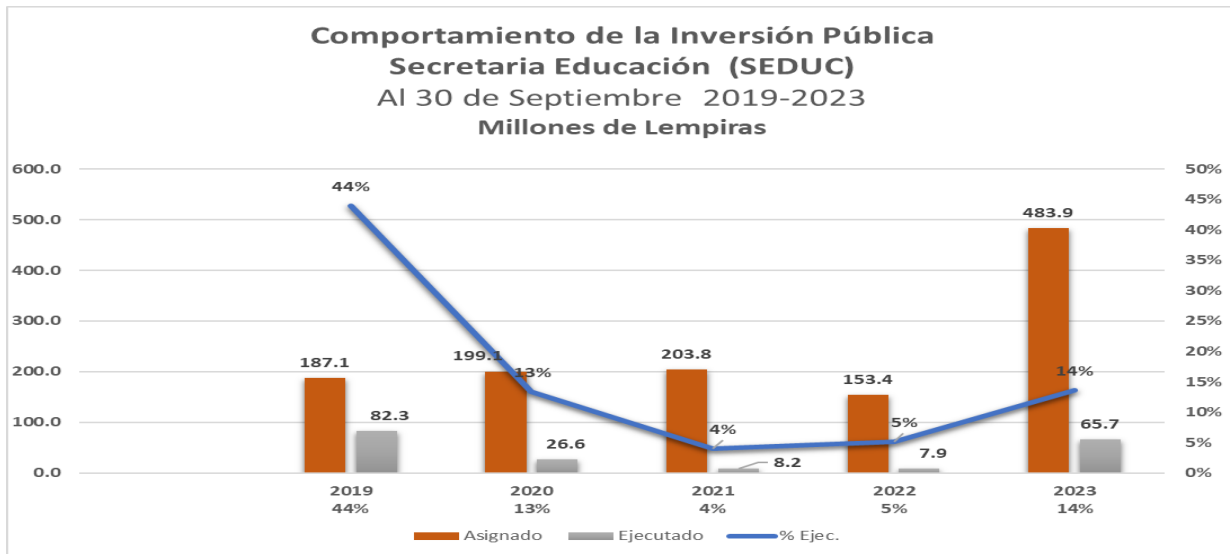

Al tercer trimestre histórico en el periodo comprendido entre el 2019-2023, el Presupuesto de inversión de la SEDUC ha reportado aumentos en sus asignaciones anuales, resaltando este comportamiento de manera significativa en el 2023 debido a la incorporación de recursos provenientes de convenio con el Banco Central de Honduras (BCH) como apoyo a las obras Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Huertos Escolares a nivel nacional. En comparación a otros años, la ejecución al inicio del tercer trimestre muestra un ascenso, se espera que para el cuarto trimestre se ejecute la totalidad de los recursos de los proyectos debido que se estarían adjudicando Obras de Infraestructura Escolar en los diferentes

niveles educativos de Básica y Prebásica, como se muestra en el año 2022 y en el 2023, como se muestra en el gráfico histórico.

En el período comprendido entre el 2019 y el 2023, el Programa de Inversión Pública de la SEDUC ha considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, de los cuales se han financiado en 62% con recursos del convenio BCH, 6% recursos de donación externa y el 32% restante con recursos de crédito externo de los Proyectos.

3.3 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV Y V)” (Componente SEDUC):

El Programa se enfoca en dotar de infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, de la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	"L59,554,506.00" "L59,554,506.00"		03/12/2015 31/07/2024
	Financiera			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
III -Trimestre 2023	8,694,437.00	8,694,437.00	728,791.58	8%
Acumulado 2023	8,694,437.00	8,694,437.00	1,845,670.68	21%
Acumulado Vida del Proyecto*/	59,554,506.00	59,554,506.00	32,897,610.83	55%
Observaciones: En el tercer trimestre reporta una ejecución financiera del 8% del presupuesto vigente, La ejecución con fondos del programa dio inicio en el año 2012 y desde entonces la cooperación ha sido participe de la supervisión continua del manejo de los fondos, lo que ha generado confianza para aprobar más fases y beneficiar más centros educativos en la zona de influencia del programa se ubica en los Departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, y de manera prioritaria los centros educativos de la zona de rural de estos Departamento.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L 24.7469 por US\$1.00

Para el tercer trimestre, se realizaron las siguientes actividades:

- Visitas de supervisión, verificación de calidad de materiales, Calidad de Obra, Porcentajes de avance, verificación de Normativa, verificación de actividades de proyectos, construcción de huertos educativos y productivos, generación de recomendaciones.

No.	Nombre del Proyecto	Municipio	Departamento	Monto del Proyecto (Todos los componentes)	% Avance Físico	%Avance Financiero
1	Reposición CEB José Trinidad Reyes y CEPB Nimina Baquedano	San Jorge	Ocotepeque	L. 8,738,715.51	99%	92%
2	Reparación CEB Francisco Morazán	Colomoncagua	Intibucá	L. 11,140,168.86	99%	99%
3	Ampliación CEB Jesús María Rodríguez y CEPB La Independencia	San José	Copán	L. 10,890,524.15	100%	100%
4	Ampliación CEB Cruta y JN En Marcha	Jesús de Otoro	Intibucá	L. 13,386,502.69	100%	100%
5	Reparación CEB Francisco Morazán y Jardín de Niños Carlos Emérito Portillo No.1 y No.2	San Fernando	Ocotepeque	L. 11,981,740.82	95%	100%
6	Ampliación CEB La Fraternidad y CEPB Mi Esperanza	Santa Ana	La Paz	L. 14,785,800.47	95%	97%
7	Reposición CEB Francisco Morazán y JN Francisco Filiberto Isaula	La Paz	La Paz	L. 10,202,187.19	90%	99%

- Se recepcionaron y se dio seguimiento de expedientes de Legalización correspondientes a Centros Educativos del Programa PROMINE:

No	Centro Educativo	Departamento	Municipio	Dirección	%
1	Leoncio Valle	Comayagua	Comayagua	aldea San José de Pane	85%
2	Instituto Técnico Francisco Morazán	Francisco Morazán	Sabanagrande	Sabana Grande	100%
3	CEB José Cecilio del Valle	Olancho	Dulce Nombre de Culmi	Mata de maíz	85%

- Implementación del primer bloque de Capacitación de proyectos priorizados PROMINE fase V:

No	CENTRO EDUCATIVO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
1	Instituto Técnico Francisco Morazán	Francisco Morazán	Sabanagrande	Sabanagrande
2	CEB José Cecilio del Valle	Olancho	Dulce Nombre de Culmi	Mata de maíz

- Capacitaciones Levantamiento Plan Maestro de Infraestructura educativa.

1.Capacitación en el Departamento de Olancho Municipios de:

- Juticalpa
- Catacamas
- Patuca
- Santa María del Real
- San Esteban
- Dulce Nombre de Culmí
- Salamá
- Silca
- Manto
- San Francisco de La Paz
- Gualaco
- San Francisco de Becerrera

Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN)”:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	6560-HN TF0B2218-HN	"970,262,200.00" "US\$39,500,000.00"		31/07/2020 31/07/2025
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
III -Trimestre 2023	176,413,922.00	176,413,922.00	10,155,140.68	6%
Acumulado 2023	176,413,922.00	176,413,922.00	22,229,731.67	13%
Acumulado Vida del Proyecto*/	970,262,200.00	970,262,200.00	30,014,334.14	3%
Observaciones: La ejecución financiera del III trimestre está vinculada a ejecución presupuestaria resultado de 250 pagos por concepto de consultorías, publicaciones, viáticos, combustible, materiales útiles de oficina y equipo de oficina, esta ejecución es producto de la elaboración de 36 Traspasos entre Cuentas con una ejecución financiera para el periodo por USD 360,693.96.				

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.7469 por US\$1.00

Al tercer trimestre conforme a lo reportado por la unidad ejecutora de proyectos se, se reportan los siguientes avances:

Componente 1: Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la SEDUC para la Gestión de la Educación Prebásica:

- Se presentó el documento de fundamentación sobre la propuesta de implementación de la “Red Comunitaria de Educación Prebásica”.
- Con relación al avance de la contratación de la firma encargada de la Construcción del Modelo de Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (MCEP), el equipo de Adquisiciones elaboró el documento base de licitación, mismo que ya cuenta con el dictamen de la Secretaría General de esta Secretaría.

Componente 2: Actualización del Diseño Curricular para Todas las Modalidades de Atención del Nivel de Educación Prebásica y Mejora de las Prácticas de Enseñanza en CEPB y CCPREB.

- Con relación al avance de la contratación de la firma encargada para hacer la revisión y elaboración de los diseños y herramientas curriculares del nivel de Educación Prebásica, este proceso continuó en evaluación de expresiones de interés de las firmas que participaron en dicho proceso. Se espera que la adjudicación de este proceso se realice en el cuarto trimestre
- Adquisición y distribución de materiales educativos para los espacios de aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a nivel nacional, se estará entregando el próximo año.
- El Diseño del diplomado Capacidades Pedagógicas para Docentes y Educadores en Educación Prebásica, se recibieron cinco expresiones de interés para este proceso del diplomado, obteniendo las siguientes ofertas: una (1) de ellas es una Organización No Gubernamentales (ONG), otra es fundación sin fines de lucro y tres firmas consultoras.

Componente 3: Mejoramiento de los Entornos Físicos de Aprendizaje en Centros de Educación Prebásica Seleccionados que Atienden a Niños(as) en Áreas Focalizadas.

- Publicado el proceso de “contratación de Contratistas para la Ejecución de Obras de Infraestructura Escolar en los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraíso”, la contratación se realizará mediante una competencia nacional utilizando la Solicitud de Ofertas (SDO) obras menores, que se especifica en las “Regulaciones de Adquisiciones para los Prestatarios de Financiamiento para Proyectos de Inversión.
- Contratado el Coordinador de Supervisión de Obras, el cual dará monitoreo y dirigirá a los ingenieros supervisores para asegurar el cumplimiento de la estrategia de supervisión de obras de la fase I.
- Contratados 14 ingenieros y arquitectos que garantizan el cumplimiento de los alcances contractuales definidos para cada proyecto de infraestructura; con base en la Normativa establecida en el Manual Para la Planificación y Diseño de Centros Educativos (MPDCE), Lineamientos para el Mejoramiento de la Infraestructura de la Educación Prebásica en Honduras y Diseños Arquitectónicos Bioclimáticos para Modelos de Referencia (DMR).

Componente 4: Gestión y Evaluación del Proyecto

- Durante este trimestre se concretó mediante la Orden de Inicio la revisión de los Estados Financieros, la Unidad Administrativa atendió y proporcionó todos los requerimientos administrativos y financieros, acordándose de común acuerdo realizar la Reunión de salida el jueves 03 de agosto con lo relacionado a la Auditoría Financiera del Periodo del 11 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2023”, además se lleva a cabo la Reunión de salida de la Auditoría.

Proyecto “Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I”:

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total HNL ¹		Inicio - Fin
Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.	BCH - 24841 - 1	"441,600,000.00" "441,600,000.00"		01/10/2022 01/01/2024
	Financiera			
		Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado
III-Trimestre 2023	-	298,747,128.00	31,187,996.39	10%
Acumulado 2023	-	298,747,128.00	41,645,679.41	14%
Acumulado Vida del Proyecto*/	441,600,000.00	441,600,000.00	80,362,609.41	18%
Observaciones: Al tercer trimestre el proyecto ha aumentado su ejecución financiera L31,1879,96.4 que equivale al 10% del presupuesto vigente del proyecto, debido a que se ha empezado con los procesos de adjudicación de obras Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Huertos Escolares a nivel nacional.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Anual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/09/2023 (BCH): L24.7469 por US\$1.00

Los avances físicos al tercer trimestre son:

- En proceso de firma los contratos para 1500 huertos escolares productivos y adjudicados 86 Centros Educativos de 112 para ser Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa y Huertos Escolares a nivel nacional

3.3.1 INVERSION SOCIAL

Referente al presupuesto asignado (L.1,031,950,800) se ejecutaron L 97,574,429 que representan el 9% del presupuesto vigente al tercer trimestre, los cuales se utilizaron en:

- Becas
- Material de Bioseguridad
- Matrícula gratis

3.5 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

En el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Acompañamiento contante a la SEDUC en el proceso de ejecución de los proyectos de la institución.
- Actualización mensual de Cuota de cumplimiento.

- Reuniones con las autoridades de la SEDUC, UCP y SEFIN-DGIP para seguimiento de las actividades de avance físico y financiera.

CONCLUSIONES

- Los resultados de todas las gestiones operativas en el tercer trimestre se han ido mejorando a través de la agilización de los diferentes trámites administrativos en la SEDUC.
- Se ha mejorado los tiempos de los procesos de adquisiciones de obras garantizando estándares de calidad en los proyectos de obras de infraestructura, mediante la supervisión permanente y el monitoreo en la etapa de ejecución-supervisión y cierre de los proyectos en cada centro educativo del nivel Media y Prebásica.
- Es importante mencionar que la inversión que hará el proyecto en los Centros focalizados para la construcción de obras, lo que garantizará en los niños espacios físicos accesibles, confortables, funcionales y seguros, adaptados a las diferentes zonas climáticas del país y se ajustaran a aspectos ambientales y culturales que lo requieran, todo enmarcado en la normativa vigente de infraestructura educativa del país.

RECOMENDACIONES

- Las especificaciones, descripciones de las obras y términos de referencia deben ser claros y suficientemente detallados para que no exista atrasos en los procesos adquisiciones de obras.
- Solicitar con anticipación la renovación del certificado de Exonerados para el Proyecto para que no exista atrasos en los procesos adquisiciones.
- Agilizar el proceso de adjudicación de los huertos escolares productivos

ANEXOS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2023
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) Anual				Ejecutado (Devengado) al III Trimestre			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigete.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Ejec./Vigete.)
3	0050 - Secretaría de Educación		2,716,013	182,392,346	185,108,359	301,463,141	182,392,346	483,855,487	42,621,950	23,099,132	65,721,082	14%	31,437,088	10,634,841	42,071,929	9%
1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	-	152,731,792	152,731,792	-	152,731,792	152,731,792	-	22,203,600	22,203,600	15%	-	10,129,009	10,129,009	7%
		TF0B2218-HN	-	23,682,130	23,682,130	-	23,682,130	23,682,130	-	26,132	26,132	0%	-	26,132	26,132	0%
	TOTAL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS		-	176,413,922	176,413,922	-	176,413,922	176,413,922	-	22,229,732	22,229,732	13%	-	10,155,141	10,155,141	6%
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	2,716,013	5,978,424	8,694,437	2,716,013	5,978,424	8,694,437	976,271	869,400	1,845,671	21%	249,092	479,700	728,792	8%
	TOTAL PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		2,716,013	5,978,424	8,694,437	2,716,013	5,978,424	8,694,437	976,271	869,400	1,845,671	21%	249,092	479,700	728,792	8%
3	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I	BCH - 24841 - 1	-	-	-	298,747,128	-	298,747,128	41,645,679	-	41,645,679	14%	31,187,996	-	31,187,996	10%
	TOTAL PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUC.		-	-	-	298,747,128	-	298,747,128	41,645,679	-	41,645,679	14%	31,187,996	-	31,187,996	10%

SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2023

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2023		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0050 - Secretaría de Educación	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Proyectos obra de infraestructura educativa, en los niveles prebásica, básica y de manera limitada en el nivel medio, de los departamentos de: Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara y Copán en la zona de occidente. Francisco Morazán, valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios supervisados.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	18	0	0%	0	0	0%
		04 - Proyectos obra de infraestructura escolar diseñados y formulados.	305 - PROYECTO	6	0	0%	0	0	0%
		05 - Educandos de educación media, dotados con herramientas pedagógicas (manuales técnicos para BTP-PAA y nueva oferta académica, licencias de simuladores virtuales).	1016 - EDUCANDO	225	0	0%	0	0	0%
	010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	08 - Modelo de la Calidad de la Educación Prebásica (MCEPB) Desarrollado e Implementado.	82 - SISTEMA	1	0	0%	0	0	0%
		09 - Promoción de la participación comunitaria en la educación prebásica.	25 - CONSULTA	6	0	0%	0	0	0%
		10 - Mejora de la capacidad operativa, administrativa y técnica de los recursos humanos (RRHH) para el nivel de Educación Prebásica.	134 - EMPLEADO	7	0	0%	0	0	0%
		11 - Mejora de la organización de los sistemas de planificación y monitoreo de la SE.	134 - EMPLEADO	97	0	0%	0	0	0%
		12 - Apoyo a la implementación de prácticas pedagógicas mejoradas.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		13 - Actualización del diseño curricular del nivel de educación prebásica y materiales de aprendizaje asociados, y su provisión.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		14 - Implementación de herramientas de medición para el desarrollo infantil y la calidad de los entornos de aprendizaje.	32 - DOCUMENTO	1	0	0%	0	0	0%
		15 - Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en los centros de educación prebásica existentes en áreas focalizadas.	1091 - ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	253	0	0%	0	0	0%
		16 - Gestión y Evaluación del proyecto.	149 - INFORME	253	0	0%	0	0	0%
		17 - COMDE fortalecidos.	300 - ORGANIZACION	110	0	0%	0	0	0%
	011 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I.	19 - Reconstrucción, rehabilitación o mejora de la infraestructura de centros educativos escolares en los niveles de educación Pre Básica, Básica y Media.	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0%	0	0	0%
		20 - Centros educativos equipados con mobiliario escolar en los niveles de educación Pre Básica, Básica y Media.	101 - CENTRO EDUCATIVO	87	0	0%	0	0	0%
		21 - Administración de los recursos asignados al programa.	104 - RECURSO	1	0	0%	0	0	0%
	Total 0050 - Secretaría de Educación				1,154	0	0%	0	0
