Secretaría de Finanzas Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública



Informe de Avance Físico y Financiero

AL IV TRIMESTRE 2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

Tegucigalpa, Honduras Enero, 2024

www.sefin.gob.hn

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La AMDC al IV Trimestre, reporta un presupuesto vigente de L309,906,685 para la ejecución de dos proyectos de inversión; los cuales forman parte de los sectores de Agua y Saneamiento, Transporte y Obras Públicas. De dicho presupuesto en el IV trimestre se alcanzó una ejecución de L38,731,353 correspondiente a un 12% de cumplimiento. En

Cuadro No. 01 **Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2023**Cifras en Lempiras

Descripción	Monto	
Presupuesto Aprobado	-	
Presupuesto Vigente	309,906,685	
Ejecutado IV Trimestre	38,731,353	
% Ejecución	130/	
(Devengado IV Trim-2023/Vigente)	12%	
Ejecutado (Devengado Anual)	76,530,100	
% Ejecución	25%	
(Devengado Anual / Vigente)	23%	


Fuente: SIAFI, 31/12/2023

cuanto a la ejecución anual, se registró un devengado de L76,530,100 correspondiente a un 25% con relación a su presupuesto vigente.

Financiamiento de la Inversión La totalidad del presupuesto del Programa de Inversión Pública de la AMDC es financiada por recursos externos; de los cuales la mayor parte proviene de préstamos del Banco Mundial (L253.45 millones), representando el 82% del presupuesto total de la institución; seguidamente por el Fondo para el Desarrollo Internacional (OFID) con una representación del 18% (L56.46 millones).

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR ORGANISMO CIFRAS EN MILLONES DE LEMPIRAS

GRÁFICO NO. 6




Ejecución histórica 2019-2023

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en el periodo comprendido del año 2019 al 2023, ejecutó tres (3) proyectos de inversión pública, de los cuales actualmente aún siguen en ejecución dos (2), los cuales son financiados con recursos otorgados por el BM y OFID. En el año 2021 se asignó la mayor cantidad de recursos presupuestarios a estos proyectos, y su ejecución fue mayor con respecto al periodo comprendido 2019-2023.

Para la gestión 2019, se culminó el Programa de Mitigación de Desastres Naturales en El Municipio Del Distrito Central.



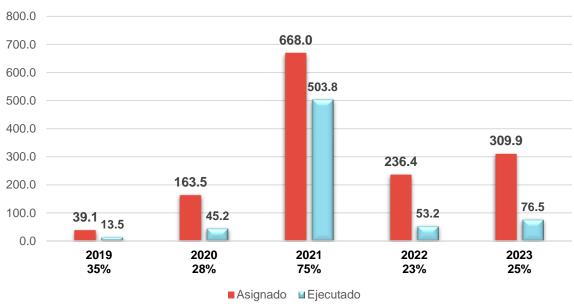

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

Los proyectos ejecutados por la AMDC se detallan a continuación:

Proyecto Para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa IDA-6460-HN

Proyecto		Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
Proyecto Para Fortalecer los Servicios de Agua		IDA-6460-HN	US\$	50,000,000	12/4/2020	
Potable de Tegucigalpa		1DA-0400-111V	Lempiras	1,238,575,000	12/4/2025	
	Financiera					
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución		
IV Trimestre 2023	-	253,447,736	27,944,588	11.0		
Acumulado 2023	-	253,447,736	40,185,600	15.9		
Acumulado Vida del Proyecto */	1,238,575,000	1,238,575,000	509,679,621	41.2		

^{*/} Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

SECRETARÍA DE FINANZAS

El proyecto busca aumentar la eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua en áreas seleccionadas de Tegucigalpa; Asimismo,se busca completar la transferencia del sistema de suministro de agua y saneamiento (SSAS) de Tegucigalpa al proveedor de servicios municipales recientemente establecido UMAPS bajo el gobierno municipal (AMDC) y resolver problemas críticos en el sistema SSAS de Tegucigalpa y la entrega de servicios.

En el IV trimestre del año 2023, se llevaron a cabo consultorías como ser del ámbito ambiental, sistemas de información, ingeniería y social. Se diseñaron y se mejoraron plantas de tratamiento en El Picacho, La Concepción y Los Laureles. Por otra parte, se realizaron actividades de: diseños, negociaciones, firmas de contrato y órdenes de inicio de estas.

Es importante indicar que el proyecto debió enfrentarse a retos que afectaron la ejecución del proyecto, como ser: Cambio del punto focal del Proyecto y la finalización del contrato del Especialista en Monitoreo y Evaluación, entregas tardías del producto final para el diseño y construcción de las tres plantas de tratamiento de agua potable, dificultad reiterativa para avanzar en los procesos de adquisición en especifico en los tiempos que toma a los comités de evaluación realizar su labor.

Programa Transporte Público para el Distrito Central

Proyecto		Convenio	Costo Total del Proyecto		Fecha de Inicio - Fin	
Programa de Transporte Público para el Distrito Central		IDA-6448-HN	US\$	46,727,369	30/12/2010	
			Lempiras	1,157,507,028	31/12/2023	
	Financiera					
	Aprobado	Vigente	Devengado	% Ejecución		
IV Trimestre 2022	-	56,458,949	10,786,765	19.1		
Acumulado 2022	-	56,458,949	36,344,500	64.4		
Acumulado Vida del Proyecto */	1,157,507,028	1,157,507,027.62	1,008,552,720	87.1		

^{*/} Presupuesto Aprobado = Costo Total del Proyecto Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto concede algunas de las intervenciones e inversiones más importantes para la infraestructura ciudadana, además, se enfoca en contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del área de intervención a través de la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura urbana y de transporte, al igual que el establecimiento progresivo de un sistema de transporte público integrado y eficiente para la movilización ordenada, rápida y masiva de la población.

SECRETARÍA DE FINANZAS

Al IV Trimestre, el proyecto finalizó las obras correspondientes al Puente John F. Kennedy, Terminación de Estación BTR IHMA, Terminación de la Estación Estadio Nacional (ETEN) y el Inicio de instalación de postes para semáforos, lo que ha generado un avance físico acumulado de 91.59%. Por otra parte, se avanzó en el proceso para contratar la firma que realizará la auditoría por la vida del Proyecto.

Al finalizar el año 2023 solamente quedan por realizar actividades de semaforización del Sistema.

3.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Acompañamiento físico y financiero constante
- Actualización mensual de Proyección de ejecución presupuestaria.

Conclusiones

 En vista que el Programa de Transporte Público para el Distrito Central no realizó los pagos finales correspondientes a la empresa encargada de Semaforización y Auditoria Final. Para 2024 tendrá que habilitar la estructura correspondiente del proyecto para realizar los pagos finales y elaborar el cierre del proyecto en el primer trimestre del 2024.

Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras deben incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo, de manera que su ejecución mejore año con año, dada la aplicación de buenas prácticas y sistematización de procesos.
- La AMDC debe revisar la programación física y financiera con el propósito de asegurar el cumplimiento de los pagos o estimaciones presentadas por las empresas y de este modo asegurar el pago de compromisos adquiridos.
