



Informe de Avance Físico y Financiero

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)

Al Cuarto Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero 2020

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 68.40% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (L.1,403.5 millones) La SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobado Congreso Nacional para inversión para el año 2019 de L.809,754,740 para la ejecución de seis proyectos con una ejecución financiera que se detalla en el cuadro No.1

Al Cuarto trimestre el presupuesto vigente de la SAG, asciende a L.1,005,240,900 de lo cual reporta una ejecución de L.916,142,600 que representa el 91% del presupuesto vigente.

Los Proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo facilitar a los productores los mecanismos e infraestructura necesaria para la productividad de granos básicos a fin de contribuir en proporcionar facilidades de producción agrícola a los productores nacionales en pro de los habitantes de la República de Honduras.

Secretaría de Agricultura y Ganadería
Cuadro No. 05
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2019
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	809,754,740
Presupuesto Vigente	1,005,240,900
Devengado IV Trimestre-19	341,806,230
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	34%
Devengado Anual	916,142,600
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	91%


Fuente: SIAFI, 30/12/2019 cifras preliminares

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está concentrada en seis (6) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural, desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.

Dicho presupuesto es financiado en un 98.50% con fondos externos (Créditos y donaciones) L.

985,240,914 de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 46%, seguido por Holanda con 40% y en menor porcentaje FIDA 9% y fondos de donación de GEF L.30,097,000 para fortalecimiento de la UAP por un monto de L.3,051,939 y fondos nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

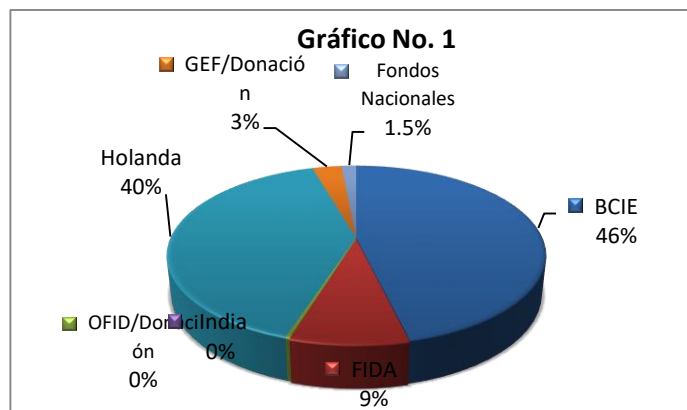

L.15,000,000 equivalente al 1.5% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No. 1.

A continuación se detallan los principales proyectos prioritarios de la institución:

➤ **Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)**

El Programa EMPRENDESUR, tiene como objetivo principal apoyar a mejorar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso a los mercados nacionales e internacionales.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	BCIE-2086 FIDA- 759 OFID-1418	745,785,000	2013 -2019 2010-2019 2012-2019	
Descripción	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2018	634,196,599	584,685,325	543,537,718	93%
IV Trimestre 2019	111,588,401	156,599,680	140,777,940	90%
Acumulado Vida del Proyecto	745,785,000	741,285,005	684,315,658	93%
Nota: Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

- Durante el año 2019 se generaron 5,175 empleos temporales y autoempleos con la participación de 84 organizaciones de cinco departamentos en el corredor seco de Honduras.
- Durante el 2019 se desembolsó a 84 organizaciones la suma de Lps 119,365,396.414 para la ejecución de planes de inversión, Planes de Desarrollo Organizacional (PDO), Plan de Negocio Sostenible (PNS) y Planes de Desarrollo Financiero (PDF).
- Se logró aprobar y desembolsar a 60 organizaciones de acuerdo al POA-SIAFI del 2019.
- Se culminó el Informe de Terminación del Programa (ITP) la cual se presentó al FIDA y la SAG como uno de los requisitos de cierre del Programa.
- Se beneficiaron a 200 familias con proyectos de micro riegos, los cuales recibieron el equipo de riego y recibieron la asistencia técnica respectiva.

- Se logró culminar 40.5 kilómetros de camino rural terciario que abarcaron los municipios de Guajiquiro, departamento de La Paz (32 KM), Plan de Jocote-Filipinas en Choluteca (3.5 KM).
- Se logró dar asistencia técnica especializada a 31 grupos organizados y que son beneficiarios de EmprendeSur en el manejo de cultivos bajo riego, en cosechas de agua, sistemas de riego, pozos, bombas y el respectivo seguimiento del Técnico de Riego del Programa.
- Con un grupo de 25 organizaciones se ha llegado a cultivar 1000 hectáreas de cultivos bajo riego, abarcando 22 municipios de los departamentos de Choluteca, Valle y Francisco Morazán.
- El Programa concluyó la evaluación de impacto, reflejando la población beneficiaria de la intervención sobre la base de 12,000 productores, insertos en las cadenas de
- Según la encuesta de evaluación de impacto, los datos de los ingresos recibidos en su mayoría se obtienen de las diferentes actividades agrícolas del ciclo productivo y en cuanto al empleo se ha encontrado que las organizaciones beneficiarias han generado un 74.7% en las oportunidades temporales que corresponde a 8,464 empleos, contra un 12.5% que equivale a 1,500 empleos en las organizaciones no beneficiarias. De igual forma la medición de los empleos permanentes para organizaciones beneficiarias es un 12.5% que equivale a 1,500 empleos permanentes y para las familias no beneficiarias en un 5.4% que representa 648 empleos.

El Proyecto presenta al IV trimestre una ejecución financiera del 89%.

✓ **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1**

El objetivo del programa es modernizar y aumentar la eficiencia de la agricultura del Valle de Jamastrán, para lograr el mejoramiento de los ingresos de los productores y contribuir a la seguridad alimentaria y al mejoramiento del nivel de vida de la población en el área rural.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	IN-DL98134500295569L	582,235,100	2013-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2018	205,286,372	205,286,372	205,286,440	35.26%
III Trimestre 2019	93,337,527	5.00	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	298,623,899	298,623,899	205,286,440	35.26%
Nota: La ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				



Estado actual del Proyecto:

- Se realizó visita e inspección al noveno Batallón de Infantería con el objeto de determinar la viabilidad de establecer el almacén de materiales en su predio, lo cual tuvo un resultado favorable, se solicitó al ministro de SEDENA su autorización y apoyo para este fin, posteriormente se realizó inspección en conjunto con el 1er Batallón de Ingenieros para determinar un presupuesto para acondicionamiento del plantel.
- Acondicionamiento del plantel en el 9no. Batallón de Infantería.
- Compra y acondicionamiento del reservorio para irrigación superficial.
- Tramitación de dispensa definitiva para maquinaria y repuestos a importar.

La Empresa Apolo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US\$.22.5 millones y se incrementó a US\$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apolo este incremento se debe a cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.

A la fecha se ha llevado a cabo reuniones para activar el proyecto en conjunto con la oficina presidencial OPSPT (Torre de Control) y la SEFIN DGIP y DGCP

El proyecto no presenta ejecución financiera y física al IV trimestre 2019 debido a que el EXIM Bank de la India solicito a la empresa Ejecutora Apollo International Limited, realizar ciertas actividades puntuales (entre ellas construcción del reservorio, perforación de pozos entre otras) previo a la aprobación de la Adenda No 2 la que extiende el periodo de ejecución del proyecto, mientras el Exim Bank no apruebe la adenda no se puede solicitar desembolso.

Además, está impidiendo avanzar en el proyecto otros puntos como ser tener listo el Plantel de Almacenamiento del contratista, Permiso ambiental, Pago de la comisión de la carta de crédito (contratista) estos últimos puntos actualmente están en proceso, el punto focal es la aprobación de la adenda por el Exim Bank.

en ese sentido, se tendrá reunión en mes de enero con el contratista para solucionar las diferencias para que pueda ejecutar.

El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)

El proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género.

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego en los Departamentos de

SECRETARIA DE FINANZAS

Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

El Proyecto al IV trimestre presenta una ejecución de 88.45%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de procesos administrativos financieros vinculados al Proyecto.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	BCIE-2101	1,207,598,551	2013-2019	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2018	647,310,346	396,166,822	213,079,498	17.64%
IV Trimestre 2019	448,679,873	320,592,550	283,626,940	88.45%
Acumulado Vida del Proyecto	1,095,990,219	716,759,372	496,706,438	45.32%
Nota: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

Es de observar que las actividades programadas del proyecto no presentan ejecución física, entre ellas; nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego, en parcelas de los productores, nuevas Hectáreas de tierra agrícolas con acceso a riego intrafinca, en parcelas de productores, capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización, canon de agua, desarrollo agroempresarial), contratos suscritos de comercialización y financiamiento, capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes (organización, administración, producción, asistencia técnica y normas parlamentarias), mostrando ejecución únicamente en:

El subproyecto de Riego Sulaco:

- 95 km de Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias)
- Mostrando un avance de 75 %, en la represa Maralito, 67% en Sigüapa y 72% en Tascalapa.
- 21.8 Kms en avance: Línea de Conducción es de 0.705 Km, línea de Distribución 1.7 Km y línea terciaria de 19.4 Km.

Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán

- El proyecto consiste en dotar de equipo de riego a 311 productores del Municipio de Olanchito, Yoro; con este proyecto se incorporarán 3110 hectáreas bajo riego.

- La ejecución financiera asciende L.399,789,120 representativos del 99% del presupuesto vigente.

Es de observar, que este proyecto se ejecuta bajo la modalidad llave en mano, en el cual los productos serán entregados por el Contratista al final del proyecto (entregará equipos, obras físicas y los resultados esperados), por tanto a la fecha no presenta ejecución física.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA

Este proyecto comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA	FIDA-899-HN GEF-SF-05-HN 200000125200	576,079,308	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2018	422,982,300	113,721,809	90,210,052	15.66%
IV Trimestre 2019	153,097,000	120,767,849	90,274,200	75.35%
Acumulado Vida del Proyecto	576,079,300	234,489,658	180,484,252	31.33%
Nota: La Ejecución financiera está basada en la ejecución del gasto según SIAFI.				

Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara).

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

COMPONENTE 1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES RURALES:

- Elaboración e implementación de 90 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con enfoque de equidad de género
- Elaboración e implementación de 10 Planes de Fortalecimiento Organizacional, con

- enfoque de equidad de género.
- Fortalecimiento de 442 personas en capacidades humanas mediante talleres de sensibilización en aspectos de Seguridad Alimentaria, con enfoque de Género y Adaptación al Cambio Climático a beneficiarios del Proyecto.
- Legalizar de 53 organizaciones mediante la obtención de Personería Jurídica (el pago corresponde al 90%, para este 2019, según contrato firmado)
- Se encuentra en proceso 41 actualizaciones de Juntas Directiva y 22 para trámite de organizaciones jurídicas beneficiarias y 30 en la subsanación.
- Se tiene en ejecución 54 Planes de Inversión en organizaciones beneficiado a 1610 beneficiarios.

COMPONENTE 2. DESARROLLO PRODUCTIVO Y DE NEGOCIOS

Principales actividades desarrolladas:

- Asistencia técnica a 59 organizaciones (incluye acompañamiento, capacitación técnica productiva y ambiental en la implementación de los Planes de inversión beneficiarias con Planes de Negocio y Planes de Desarrollo Productivo.
- Taller de Sensibilización de 270 miembros de las OB sobre inclusión de grupos socialmente excluidos en todos los procesos de la organización (8 talleres).
- Segundo Desembolso de fondos a 40 organizaciones para la implementación.
- Segundo Desembolso de fondos a 19 organizaciones de planes de negocio.
- En este año 2019 se lograron liquidar y solicitar el segundo desembolso de 16 OB que están con ejecutando PN y 15 OB que ejecutando PDP.

Durante el año con el apoyo a 59 OB se generaron 1,259 empleos.

COMPONENTE 3. INFRAESTRUCTURA RURAL

Las actividades en ejecución son las siguientes:

- Rehabilitación 42 km Caminos Terciarios de Caminos Rurales , tramo: PTRS – Pinal San José – Pinal San Antonio – El Zarzal – Cedros de Mejicapa – Camalote/Campuca, Municipio de Gracias, Departamento de Lempira, Santa Elena El Carrizal, Quiscamote, Azacualpa, Guasore; tramo: Llano Alegre – Aguanqueterique y Santa Elena, Aguacinga, Municipio de Santa Elena, Departamento de La Paz.
- Se ha realizado 70 Km de sistema de agua y Sistema de Riego.

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.3

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Realización de dictámenes entre categorías y ampliación de plazo de Proyectos.
- Se realizaron reunión de Revisión de Cartera programas y Proyectos con la Secretaria de Finanzas y Torre de Control con el objeto de revisar la problemática y búsqueda de soluciones.
- Realización de reuniones mensuales continuas para monitorear el cumplimiento de

los compromisos y alcanzar los resultados de los proyectos.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución acumulada al cuarto trimestre de L.916,142,600 que representa el 91% del presupuesto vigente
- Al cuarto trimestre el Proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013 y con una ejecución acumulada financiera de 45.32% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 97% de tiempo. (se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años septiembre 2021).

RECOMENDACIONES

- La SAG debe dar un estricto seguimiento a los procesos de licitación para asegurar tener resultados favorables en los mismos ya que muchos de los procesos son declarados fracasados.
- Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP, para que remitan la información solicitada en el tiempo oportuno.
- Para mejorar la ejecución se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Se recomienda tomar medidas sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta un ejecución muy baja. El mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución transcurrido de 5 años y al cuarto trimestre 2019 no reporta ejecución física ni financiera.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.
- Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social alimentario.
- Para hacer el gasto público eficiente y transparente se recomienda priorizar las inversiones con indicadores y condicionar las transferencias institucionales con resultados entregables trimestralmente.

SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública									
ANEXO No. 3									
Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al IV Trimestre, 2019									
Proyecto	Producto	Unidad de Medida	Anual			Trimestral			
			Programado	Ejecutado	% de Ejecución	Programado	Ejecutado	% de Ejecución	
Secretaría de Recursos Naturales (SAG)									
003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	02 - Caminos rurales terciarios rehabilitados	53 - Kilómetro	25	40.5	162	0	0	0	
	02 - Implementación del Plan de Asistencia Técnica	75 - Porcentaje	100	100	100	0	0	0	
	02 - Incorporación de hectáreas agrícolas al riego .	44 - Hectárea	100	1060	1060	0	400	0	
	03 - Asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros.	992 Asistencia Técnica	80	51	63.75	50	21	42	
	04 - Estudio de Evaluación de Impacto	149 - Informe	1	1	100	0	0	0	
	05 - Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.	149 - Informe	1	1	100	0	0	0	
			307	1253.5	408.3062	50	421	842	
005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PROLENCA	03 - Planes de inversión aprobados por el comité de aprobación de inversiones y organismos financiador.	1089 - Plan de Inversión	90	87	96.66667	10	0	0	
	04 - Planes de fortalecimiento organizacional aprobados por las organizaciones beneficiadas	264 - Plan	90	90	100	3	0	0	
	05 - Convenio suscritos con las organizaciones para financiamiento de sus planes de inversión.	26 - Convenio	45	46	102.22	2	0	0	
	06 - Asistencia técnica a Productores/as rurales de las organizaciones beneficiarias.	992 Asistencia Técnica	59	59	100	59	59	100	
	07 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso.	53 - Kilómetro	1	1	100	0	0	0	
	08 - Convenio suscritos con las organizaciones beneficiadas para el financiamiento de sus planes de inversión. FIDA II	26 - Convenio	18	26	144.44	0	0	0	
	09 - Rehabilitación de caminos terciarios rurales y caminos de acceso. FIDA II	53 - Kilómetro	38	42	110.53	3	0	0	
	10 - Área de bosque recuperada con manejo de regeneración natural y reforestación. FIDA II	44 - Hectárea	1	0	0	1	0	0	
				342	351	102.63	78	59	75.64
	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	01 - Capacitación en prácticas amigables con el medio ambiente y medidas de protección a las microcuencas.	1009 Capacitación	32	0	0	13	0	0
02 - Capacitaciones a Productores/as de asociaciones de regantes.		1009 Capacitación	71	0	0	0	0	0	
02 - Capacitaciones en diversificación agrícola (administración financiera, organización).		1009 Capacitación	44	0	0	0	0	0	
03 - Contratos suscritos de comercialización y financiamiento.		155 - Contrato	657	0	0	315	0	0	
06 - Líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias)		53 - Kilómetro	275	119.47	43.44	112	24	21.43	
07 - Contrato firmados con empresas constructoras de los sistemas de riego (proyectos de pequeño riego).		155 - Contrato	5	0	0	0	0	0	
				1084	119.47	11.02	440	24	5.45
010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	02 - Proceso de construcción de los módulos de riego.	75 - Porcentaje	80	0	0	80	0	0	
	03 - Informes técnicos sobre avances de las obras.	149 - Informe	2	0	0	2	0	0	
				82	0	0	82	0	0
011 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).	03 - Talleres de capacitación en temas administrativos, financieros, adquisiciones, monitoreo y evaluación.	1039 - Tallere de Capacitacion	8	0	0	4	0	0	
	04 - Sistema automatizado de información gerencial instalado.	498 Sistema de Informacion	1	0	0	0	0	0	
012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	02 - Desembolsos financieros en un 100% a la empresa ejecutora PAA PROJECT FINANCE .	75 - Porcentaje	35	32.52	92.91	0	0	0	
	03 - Solicitud de desembolso de pago directo realizada por la SAG al Organismo financiador, conforme a la factura recibida a la Empresa PAA PROJECT FINANCE.	500 - Solicitud	2	3	150	0	0	0	
	04 - Validada la documentación para la solicitud de desembolso de pago directo realizada por la SAG al Organismo financiador.	32 - Documento	3	1	33.33	1	1	100	
				40	36.52	91.3	1	1	100

Fuente: SIAFI

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2019

Anexo No 4

Cifras en Lempiras

No. Proj.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado	Vigente			Devengado Anual			% Ejecución
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			809,754,740	15,000,000	990,240,899	1,005,240,899	1,564,067	914,578,531	916,142,598	91%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN	02/02/2011 - 02/02/2020	111,588,401	-	156,599,675	156,599,675	-	140,777,943	140,777,943	90%
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	85,000,000	-	65,988,726	65,988,726	-	47,711,876	47,711,876	72%
		FIDA-II-200000125200	03/03/2014 - 31/03/2022	33,000,000	-	19,682,123	19,682,123	-	19,126,068	19,126,068	97%
		GEF-FSS-05-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	35,097,000	-	35,097,000	35,097,000	-	23,436,255	23,436,255	67%
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014 - 13/12/2020	448,679,873	15,000,000	305,592,549	320,592,549	1,564,067	282,062,878	283,626,945	88%
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMASTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	16/06/2016 - 30/08/2022	93,337,527	-	5,000	5,000	-	-	-	0%
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG	01/06/2018 - 01/04/2020	3,051,939	-	3,051,939	3,051,939	-	1,674,391	1,674,391	55%
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUÁN	ING-BANK-CREDITO-S/N	03/12/2018 - 03/08/2020	-	-	404,223,887	404,223,887	-	399,789,121	399,789,121	99%

Fuente: SIAFI al 30/12/2019 cifras preliminares
