



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

**Secretaría de Agricultura y
Ganadería
(SAG)**

Al Cuarto Trimestre, 2020

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Enero 2021

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) representa el 70% de la inversión del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico del presupuesto vigente (L.1,016.8 millones), La SAG cuenta con una asignación presupuestaria aprobado Congreso Nacional para inversión para el año 2020 de L.730.4 millones, alcando un vigente al cierre de la gestión de L.709.6 millones. con una ejecución financiera anual de L.441.4 millones que representan el 62.20% de cumplimiento; la disminución del presupuesto vigente y el aprobado se debe a disminución presupuestaria para el Proyecto Programa de Desarrollo Agrícola Bajo Riego en por el orden de L.20.8 millones. (Ver cuadro No.1).

Secretaría de Agricultura y Ganadería

Cuadro No. 1

Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2020
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	730,449,182
Presupuesto Vigente	709,675,955
Devengado IV Trimestre-2020	94,062,239
% Ejecución (Devengado III Trim. / Vigente)	13.25%
Devengado Anual	441,436,716
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)	62.20%


Fuente: SIAFI, 31/12/2020

Los Proyectos que ejecuta la Secretaría de Agricultura y Ganadería, tiene como objetivo facilitar a los productores los mecanismos e infraestructura necesaria para la productividad de granos básicos a fin de contribuir en proporcionar facilidades de producción agrícola a los productores nacionales en pro de los habitantes de la República de Honduras.

Es importante mencionar que al cuarto Trimestre del 2020, muestra una Reducción de L 190.4 millones del Presupuesto Aprobado (730.4 millones); esto como parte de una disciplina presupuestaria en materia de racionalización del gasto público que permita el uso eficiente de los recursos financieros, en cumplimiento al Decreto Legislativo No. 92-2020. No obstante, la ejecución de los proyectos impacta directamente en la ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP), dado que la mayoría de los proyectos están orientados a generar beneficios económicos al país.

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución está integrada por seis (6) proyectos relevantes orientados a mejorar el nivel de vida del sector rural (sistemas de riego, planes de negocios, construcción de caminos terciarios), desarrollo competitivo e infraestructura productiva con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas

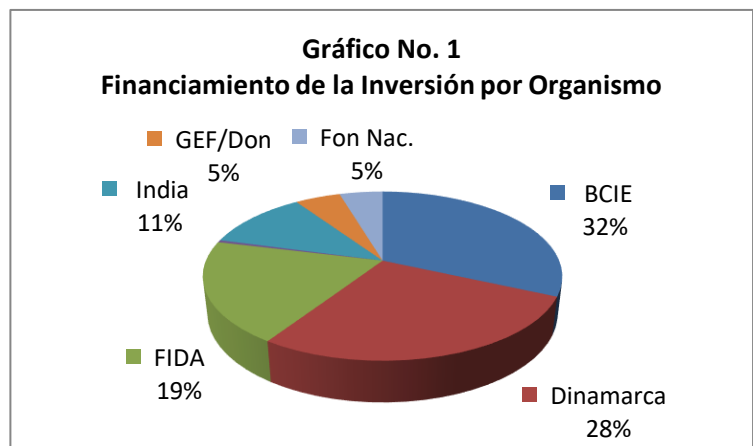

SECRETARIA DE FINANZAS

institucionales.

Dicho presupuesto es financiado en un 95% con fondos externos (Créditos y donaciones) L.676.7 millones de los cuales el BCIE es quien reporta mayor inversión, financiando el 32% de la cartera de proyectos de la institución, seguido por el Reino de Dinamarca con L.195.8 (28%), el FIDA con L.138.4 millones (19%) y en menor porcentaje India 11% (L.79.9 millones) y fondos de donación de GEF L.34.6 millones y para fortalecimiento de la UAP por un monto de L.3.0 millones de FIDA; y Fondos Nacionales de contraparte para el Proyecto Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) por un monto de L.32.9 millones equivalente al 5% del monto total del presupuesto vigente tal como se muestra en el gráfico No.1

A continuación, se detallan los principales proyectos ejecutados por la institución:

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR)	1,207,598,551	2013-2021	
Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2019	396,166,822	496,646,968	41.13%
IV Trimestre 2020	240,872,895	115,386,460	47.90%
Acumulado Vida del Proyecto	637,039,717	612,033,428	50.68%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El proyecto es Financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y Fondos de Contraparte nacional; el proyecto tiene como objetivo mejorar el nivel de vida de las familias beneficiarias mediante el incremento de los ingresos, generación de empleo y seguridad alimentaria, fomentando el desarrollo agrícola bajo riego, con enfoque de inclusión social y equidad de género. El Proyecto beneficia a 3,371 familias, con una área de regadío de 8,476 hectareas a través de 5 componentes: i) Rehabilitación, Construcción y Modernización de las áreas de riego ii) Asistencia técnica y Comercialización iii) Organización y Desarrollo Local iv) Gestión Ambiental v) Unidad Coordinadora del Programa.

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego (Sulaco, Oloman, San Sebastian, Selguapa y Pequeños proyectos de Riegos) en los Departamentos de Yoro, Comayagua y Francisco Morazan, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Al cuarto trimestre de este año, el proyecto presenta una ejecución financiera de 47.90%, correspondiente a pagos de estimaciones de los subproyectos en ejecución, además de

procesos administrativos financieros vinculados al proyecto.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora son:

El subproyecto sistema de Riego Sulaco: Durante el IV Trimestre en Sitios de Presa se fundieron 80 M3 de concreto; 28 m3 en la presa de Maralito, en la presa de Siguapa no presenta avance y 52 m3 en la presa de Tascalapa, el proyecto Sulaco presenta en general un avance acumulado total de fundición de concreto en presas de 5,536.91 M3 de un total contratado de 6,599.17 M3, lo que representa un 83.90 % de avance.

Se fundieron 65.05 m3 de concreto de obra toma, distribuidos así: 18 m3 en la presa de Siguapa y 47.05 m3 en la presa de Tascalapa, en general se han fundido un total de 551.51 m3 de un total contratado de 636.60 m3 que representa un avance del 86.63%.

En general en el proyecto Sulaco se tienen instalado 128,017.21 metros lineales de un total de 129, 889.67 contratados, equivalente a un avance general de 98.56%.

Avances en Realización de Pruebas Hidrostáticas.

Durante el IV Trimestre se han realizado varias pruebas hidrostáticas, saliendo con éxito un total de 35,956.71 metros lineales con un acumulado a la fecha de 82,448.72 metros lineales que representa un avance a la fecha de un 63.47%.

Avances en Instalación de Toma Granjas.

El Sub proyecto Maralito se instalaron 15 tomas granjas y 15 finalizadas con sus casetas, alcanzando el 100% de avance. Sub proyecto Siguapa 21 toma granjas instaladas y 21 finalizadas alcanzando el 100%.

En el Sub proyecto Tascalapa se instalaron 11 tomas granjas se finalizaron 5 de un total de 33 toma granjas por instalar.

Subproyecto Sistema de Riego de Olomán: Se continúa la espera la Emisión de la NO Objeción por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), al Diseño presentado con la alternativa del uso de un Equipo de Bombeo.

Subproyecto Sistemas de Riego de Pequeños Proyectos:

Se revisó y se corrigió el contrato del diseño y construcción de los proyectos de pequeño riego correspondiente a Lamaní (Lote No. 2), actualmente se está a la espera de la documentación por parte de la empresa Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA) para proceder a la firma del contrato del proyecto antes mencionado.

El Subproyecto Sistema de Riego de San Sebastián: Se adjudicó a la Empresa Servicios para el Desarrollo de la Construcción S. de R.L. (SEDECO) bajo la modalidad de Licitación Pública Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-LPI-1-05-2016 publicado el 19 de agosto de 2016 y en fecha 04 de septiembre de 2017 se firmó el contrato No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/Componente N°1/Correlativo 08 N°29, a quien

SECRETARIA DE FINANZAS

se le emitió la orden de inicio de este proyecto el 06 de noviembre de 2017, por un monto de \$2,989,008.26.

Se realizó la licitación Pública Internacional No. SAG-UAP-PDABR-BCIE 2101-CPI-1-12-2016 publicado el 06 de septiembre de 2016 para la supervisión del Sistema de Riego de San Sebastián, Comayagua, , resultando adjudicada la empresa Consultores Asociados de Honduras S. de R.L. de C.V. (CONASH) con quien se firmó el contrato No. SAG/UAP/PDABR/BCIE2101/Componente N°1/Correlativo 07 N°28 el 04 de septiembre de 2017, a quien se le emitió la orden de inicio de este proyecto el 18 de septiembre de 2017 por un monto de \$231,112.00.

Subproyecto Sistema de Riego de Selguapa: Se implementa un area a irrigar de 2,755 Has 3,939.65 mz, Beneficiando a 950 familias con la fuente de agua rio selguapa, Comayagua con un caudal a derivar 1,200 l/s (litros por segundo), fue adjudicado a la empresa Constructora SATO, C. V. de R.L, firmando el contrato el día 09 de agosto de 2019, orden de inicio el día 05 de septiembre de 2019, monto de \$ 9,848,978.22 y la empresa Supervisión Saybe y Asociados S. de R.L de C.V. por un monto de USD \$ 693,906.81.

La Unidad ejecutora realizó verificación de memoria de cálculo suministrada por el Supervisor como por el Contratista de la estimación No.9 presentada del Proyecto Selguapa.

Canal Principal Tramo I de 0+000.00 a 9+028.11, Limpieza de canal (0+000 - 9+028.11), Demolición de estructuras de concreto, excavación estructural no clasificada (toma granja),estructura de concreto Incluye (Concreto f'c =210 kg/cm²,encofrado, desencofrado, aditivos, colado, acabados, curado, vibrado, fabricado, trazado y marcado), suministro e instalación de tubo de PVC SDR 64 de 50 mm de diámetro para ventilación en cabezal de entrada y estructuras a rehabilitar y caminos.

Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental PROLENCA, (financiado por préstamo FIDA I y II FIDA y Donacion GEF)

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental "PROLENCA"	576,079,308	2013-2022 2015-2020 2015-2022	
Descripción	Presupuesto Vigente	Ejecutado	% Ejec.
Acumulado 2019	113,721,809	177,584,120	30.83%
IV Trimestre 2020	173,044,000	117,189,220	67.72%
Acumulado Vida del Proyecto	286,765,809	294,773,340	51.17%
Nota:La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Este proyecto comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los

departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Actualmente se están implementando inversiones en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara). El proyecto en sus inicios presento dificultades para arrancar la ejecución por eso el porcentaje de ejecución físico financiero es bastante bajo.

Las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

COMPONENTE 1. Desarrollo y Fortalecimiento de las Organizaciones Rurales:

Durante el cuarto trimestre, se retomó el trabajo con las empresas que están realizando la consultoría de formulación e implementación destinando el mes de noviembre para la actualización de cuerpos directivos, tramites de PIN SIAFI y documentación de personerías jurídicas; es importante mencionar que se está trabajando de acuerdo a un protocolo de bioseguridad que se elaboró en coordinación con las empresas consultoras.

Formulación de 100 planes de inversión, actualmente se cuenta con la no objeción por parte del FIDA de 51 convenios elaborados de este lote, además se obtuvieron 17 Personería Jurídica.

Se ejecutaron 20 Planes de Inversión de 100 formulados.

COMPONENTE 2. Desarrollo Productivo y De Negocios

Principales actividades desarrolladas:

Se realizaron reuniones de seguimiento con los 14 técnicos que están brindando los servicios de asistencia técnica a 48 organizaciones que ya tienen sus desembolsos FIDA y GEF, se realizaron giras de monitoreo y seguimiento a las inversiones. Se supervisaron proyectos de infraestructura, cultivo de café y tiendas de consumo, además se revisaron procesos de compras y recopilación de contrapartidas.

25 nuevo Convenios suscritos de cooperación firmados de las organizaciones.

Se han revisado proceso de liquidación a los organizaciones que finalizaron la ejecución de los fondos. A la fecha hay 42 Organizaciones Beneficiarias del primer lote que ya presentaron la liquidación y se les levantó el acta de cierre del proyecto.

COMPONENTE 3. Infraestructura Rural

Durante el cuarto trimestre se avanzó en la rehabilitación de 34,9 kilómetros caminos rurales terciarios: 13,7 km en el Municipio de Gracias, 10,7 en el Municipio de Santa Elena y 10,5 en el Municipio de Yarula.

Durante el año 2020 el Proyecto ha generado un total de 524 empleos.

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)	745,785,000	2013 -2020	2010-2020 2012-2020
Descripción	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	741,285,005	543,537,718	73%
IV Trimestre 2020	21,476,670	20,639,240	96%
Acumulado Vida del Proyecto	762,761,675	564,176,958	76%
Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.			

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Financiado con fondo de Prestamo del Banco Centroamericano de Integracion Economica tiene como objetivo principal apoyar a mejorar la generación de ingresos, empleos y la seguridad alimentaria de las organizaciones de productores, propiciando la inserción a cadenas de valor y el acceso a los mercados nacionales e internacionales. incrementando el empleo, la generación de ingresos y la seguridad alimentaria, a través del aumento en la producción agropecuaria y no agropecuaria y la inserción en las cadenas de valor, para acceder a mercados de mayor potencial formalizados, la cobertura del proyecto abarcó las regiones 11, 12, 13 de 5 departamentos y 64 municipios; Choluteca (16); Valle (9); La Paz (6); Francisco Morazán (20), El Paraíso (13).

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

1. Durante la ejecución del Programa se benefició a 39,080 familias a través de la Infraestructura Social Básica, Planes de Desarrollo Organizacional (PDO/PNS), Cajas Rurales, capacitaciones y otros.
2. Se realizaron 137 proyectos de competitividad en Planes de Negocios Sostenibles y Planes de Desarrollo Organizacional beneficiando 32,296 familias en caminos rurales de acceso, infraestructura e inversiones de desarrollo humano y las acciones de planificación territorial y municipal.
3. En cuanto a los proyectos de riego, al cierre de los mismos, se reporta 1,111 hectáreas que abarcan inversiones con sistemas de riego, cosechas de agua, sistemas de bombeo, tanques de almacenamiento, entre otros como la Okra y café especial, además de otros rubros como hortalizas varias, plátano, pasto de corte para ganado lechero, ajonjolí, maíz y frijol.
4. En este último semestre se culminó las obras de quince centros de acopio en las organizaciones: Empresa de Servicios Múltiples (ESM) El Corpus, ESM Agua Fría, Frutales de Pespire, ESM Frutales de la Tajeada, ESM Frutas Frescas de Tablones Arriba, ESM Curaren Centro, Indios de Ojojona y la EACP Pensando en el Futuro de Aguacatal Ojojona, Cooperativa Zambrano, ESM Guanacaure, APROTAP, CRAC Siempre Viva, ESM Buena Esperanza, Red de Mujeres y ESMASAMA.

5. Se logró la Instalación de geo membranas para la producción de tilapia en las empresas Camino Hacia El Progreso (8); Tilapias de El Porvenir (6) y Emprendedores de Buena Vista (3) para la producción total anual de 188,000 libras.

6. Se atendieron 11,387 productores organizados en capacitación y asistencia técnica especializada en producción, procesamiento, agregación de valor, cadenas de valor y acceso a mercados, siendo el 30% mujeres.

7. Se beneficiaron 30 Organizaciones de productores en cadenas de valor que acceden a los mercados por medio de la ejecución de Planes de Negocios Sostenibles.

8. 109 organizaciones de productores "vulnerables" mejoraron e iniciaron actividades productivas, empresariales y comerciales (agropecuarias y no agropecuarias)

9. 32 grupos de "jóvenes y mujeres" desarrollaron emprendimientos económicos locales, siendo el 30% grupos de mujeres.

10. 82 organizaciones de productores de las 139 existentes, se capitalizaron con inversiones en equipamiento e infraestructura productiva, de agregación de valor y de comercialización.

11. Se atendieron 358 km de tramos carreteros terciarios habilitados/rehabilitados beneficiando a organizaciones con planes de negocios.

12. 195 cajas Rurales participaron en los procesos de fortalecimiento de sus capacidades técnicas, organizacionales, administrativas e instrumentales en Servicios Financieros.

13. 85 organizaciones insertas en encadenamientos empresariales se vinculan y acceden a los Servicios Financieros Rurales existentes.

14. Capacitación a Municipalidades para mejorar sus capacidades institucionales, elaborando y ejecutando planes de desarrollo socioeconómico con enfoque territorial.

15. 5,600 productores de subsistencia organizados introducen tecnologías de cultivos adaptadas a sequías e implementan obras y prácticas de conservación de suelos.

16. 5,709 familias de productores organizados mejoraron sus sistemas de riego en 1,154 hectáreas de cultivos agrícolas o huertos familiares.

El Proyecto generó 8,464 autoempleos y 1,500 empleos permanentes, en promedio los salarios de los empleos generados oscilan entre los Lps 5,570 a 10,623.

Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1

SECRETARIA DE FINANZAS

Proyecto	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran	582,235,100	2013-2022	
Descripción	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
Acumulado 2019	298,623,899	205,286,440	35.26%
IV Trimestre 2020	79,959,190	-	0%
Acumulado Vida del Proyecto	378,583,089	205,286,440	35.26%

Nota: La Ejecución financiera esta basada en la ejecución del gasto según SIAFI.

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Entre las actividades físicas reportadas por la Unidad Ejecutora tenemos las siguientes:

El proyecto no presenta ejecución física ni financiera debido a que el Exim Bank India no ha otorgado visto bueno a la Adenda 2 para el reinicio de actividades y desembolsos lo que imposibilita el reinicio del proyecto, dado a la pandemia del Covid-19 no se ha podido realizar reuniones para solventar el problema financiero.

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Seguimiento a las Modificaciones presupuestarias presentadas por la SAG.
- Reuniones de seguimiento físico y financiero del proyecto.

CONCLUSIONES

- La SAG presenta una ejecución acumulada del periodo 2020 de L.441.4 millones que representa el 61.80% del presupuesto vigente.
- Al cuarto trimestre el proyecto de Jamastran no presenta ejecución física y financiera, debido a los diferentes problemas administrativos y financieros con el organismo financiador.
- El Proyecto PDABR se encuentra en el Programa de Inversiones Públicas desde el 2013 y con una ejecución acumulada financiera de 50.68% lo que demuestra una muy baja ejecución dado que ya ha transcurrido el 85% de tiempo ya se otorgó dictamen de ampliación de tiempo de dos años que finaliza en diciembre 2021.
- Al cierre de la gestión 2020 los proyectos reportaron una baja ejecución debido a que los procesos de licitación se han suspendido por la situación sanitaria del país debido a la Pandemia del Covid-19, impactando fuertemente en la inversión pública 2020 en los resultados y metas planificadas por los proyectos.

RECOMENDACIONES

- La SAG como ejecutora de proyectos debe realizar de forma eficiente los procesos de Licitación dado que se están fracasando los mismos conllevando a desfases del proyecto en tiempo y cumplimiento de la meta.
- Se debe mejorar la sinergia y coordinación entre la UAP-UCP, para que remitan la información solicitada en el tiempo oportuno.
- En aras de mejorar la ejecución, se recomienda elaborar un Plan de Acción con responsables y fecha de cumplimiento sobre los procesos pendientes y la ejecución de los proyectos.
- Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos en la medida que las circunstancias del país lo permitan, para cumplir con la programación establecida en el Plan Operativo Anual, Plan General de Inversión y en el Convenio suscrito de financiamiento.
- Se recomienda tomar las decisiones correspondientes sobre el Proyecto Valle de Jamastran, dado que presenta una baja ejecución, el mismo solamente ha desembolsado US\$8.8 millones (33.2%), valor extremadamente bajo por el tiempo de ejecución transcurrido de 5 años y al cuarto trimestre 2020 no reporta ejecución física ni financiera.
- Mejora en la eficiencia de los recursos asignados a la institución que permita el logro de metas programadas.
- Ordenar el funcionamiento institucional que conlleva a la sostenibilidad de los programas de transferencias condicionadas, esto plantea un desafío en la priorización del gasto público de las actividades especialmente de apoyo social alimentario.
- Los proyectos deberán tomar en consideración el ordenamiento de las finanzas públicas y sujetarse a fin de procurar una gestión eficiente en el uso de los recursos públicos según lo dispuesto en la Circular DGIP 003/004 2020 debido a la pandemia y decreto de emergencia dado por el Gobierno de Honduras.

SECRETARIA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
 Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE 2020
 Anexo No 4
 Cifras en Lempiiras

No.	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente			Devengado Anual				Devengado IV Trimestre			
				Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)
6	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería			730,449,182.00	32,947,958.00	676,727,997.00	709,675,955.00	1,643,191.68	439,793,524.57	441,436,716.25	62.20%	938,023.12	93,124,305.99	94,062,329.11	13%
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPRENDESUR)	FIDA 816-HN	02/02/2011 - 02/05/2020	-	-	21,476,669.00	21,476,669.00	-	20,639,242.81	20,639,242.81	96.10%	-	493,467.98	493,467.98	0.02
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	119,090,162.00	-	90,767,933.00	90,767,933.00	-	63,221,153.56	63,221,153.56	69.65%	-	22,283,069.19	22,283,069.19	0.25
		FIDA-II-200000125200	03/03/2014 - 31/03/2022	56,000,000.00	-	47,660,596.00	47,660,596.00	-	24,134,310.51	24,134,310.51	50.64%	-	12,719,972.46	12,719,972.46	0.27
		GEF-FSS-05-HN	03/03/2014 - 31/03/2022	18,228,068.00	-	34,615,468.00	34,615,468.00	-	29,833,761.46	29,833,761.46	86.19%	-	8,881,852.41	8,881,852.41	0.26
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	13/12/2014 - 13/12/2021	436,671,344.00	32,947,958.00	203,330,607.00	236,278,565.00	1,643,191.68	113,743,273.94	115,386,465.62	48.83%	938,023.12	48,716,531.95	49,654,555.07	0.21
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L	16/06/2016 - 30/08/2022	97,363,072.00	-	79,959,190.00	79,959,190.00	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP).	FIDA.2000001838	01/06/2018 - 01/04/2020	3,096,536.00	-	3,096,536.00	3,096,536.00	-	29,412.00	29,412.00	0.95%	-	29,412.00	29,412.00	0.01
6	012 - PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO EN LA RIBERA DEL AGUAN	ING-BANK-CREDITO-S/N	03/12/2018 - 03/08/2020	-	-	195,820,998.00	195,820,998.00	-	188,192,370.29	188,192,370.29	96.10%	-	-	-	-

Fuente: SIAFI al 31/12/2020
