



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

*Secretaría de Educación
(SEDOC)*

Tegucigalpa, Honduras

Abril, 2024

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

4.1 EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Educación (SEDUC) es la encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal.

El Gobierno actual ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a los siguientes objetivos: un sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la matrícula gratis y una merienda idónea; rehabilitar y repotenciar

sustancialmente de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En materia de Protección Social se ampliará y fortalecerán programas de becas, material de bioseguridad, matrícula gratis y merienda escolar que se focalizarán a fin de alcanzar a los sectores educativos de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Al primer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto vigente de **L1,848.05 millones** de los cuales se detalla **L749.30 millones** para la Inversión productiva; **L998.73 millones** para la inversión social y **L100.02 millones** para la formación bruta de capital. En cuanto a la ejecución presupuestaria del trimestre, la misma asciende a **L22.94 millones**, lo que representa el (1.2%) con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se realizó a través de (3) tres proyectos enfocados en Infraestructura

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	1,949,928,104
Inversión Productiva	749,302,012
Inversión Social	1,107,104,398
Formación Bruta de Capital	93,521,694
Presupuesto Vigente	1,848,048,323
Inversión Productiva	749,302,012
Inversión Social	998,730,278
Formación Bruta de Capital	100,016,033
Ejecutado I Trimestre	22,936,431
Inversión Productiva	9,126,141
Inversión Social	13,278,972
Formación Bruta de Capital	531,318
% Ejecución (Devengado I Trim-2024/Vigente)	1.2%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	74,896,619
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	4.1%

Nota: SIAFI, 31/03/2024

Escolar, Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras y la Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1

4.2 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


En cuanto al financiamiento de la Inversión Pública; el 65% corresponde a fondos provenientes de Tesoro Nacional expresado en términos monetarios con un monto de **L1,204.04 millones**, el 23% a recursos de Crédito Externo con un monto de **L427.2 millones**,

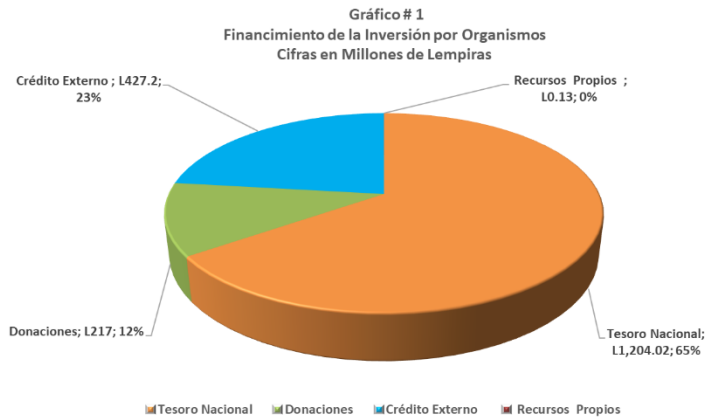

el 12% de recursos de Donaciones Externas por un monto de **L217 millones**, de Recursos Propios 0% con un monto de **L0.13 millones**. Dicha inversión es financiada por el Banco Mundial con el 35% y 65% Tesorería General de la República.

4.2 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2020-2024):

En los años del 2020 al 2024, los proyectos de Inversión Pública del SEDUC ha considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, de los cuales se ha financiado el 23% con recursos de Crédito Externo, 12% recursos de Donación Externa y el 65% restante con recursos del Tesoro Nacional.

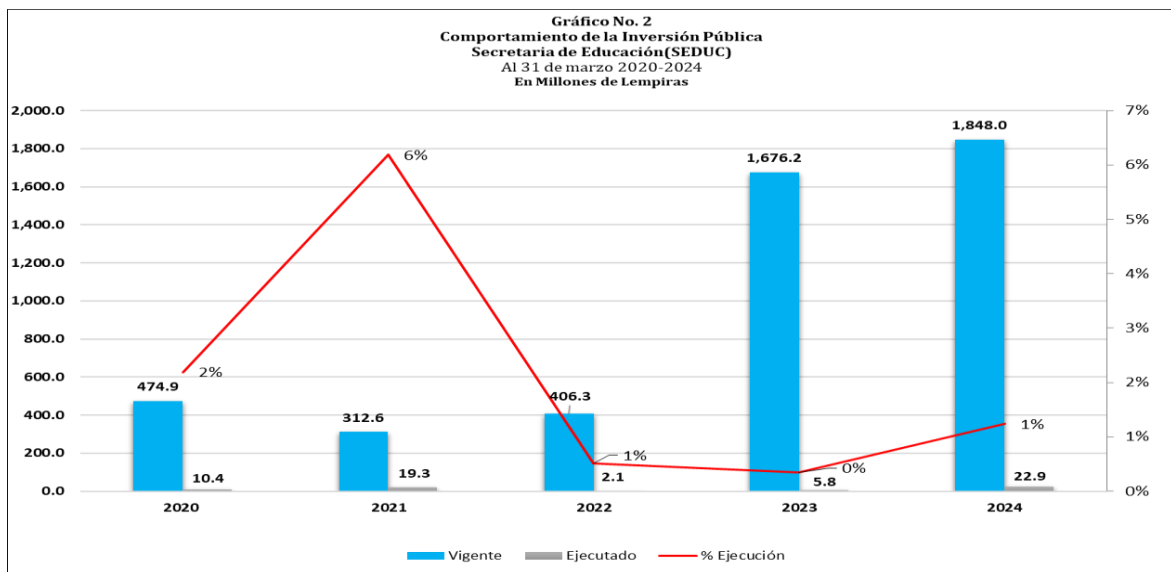

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa de los últimos años al 31 de marzo, en donde el pico más alto se registró en el año 2021, año en el que se incorporó al presupuesto de inversión pública el proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica entre ellos para atender la reparación y rehabilitación de escuelas Prebásicas a nivel nacional y para el 2022 proyectos de infraestructura en las zonas afectadas por Eta e Iota, sin embargo, pese a tener suficientes recursos la ejecución para los años 2021 y 2023 se vio afectada por la crisis ocasionada post pandemia del COVID-19. Cabe mencionar que la baja ejecución en el 2023 se debe en parte a procesos engorrosos de los organismos financiadores, así como la falta de personal clave en las unidades ejecutoras y la aprobación y publicación en el Diario Oficial la Gaceta del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.

4.3 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión en el primer trimestre del año 2024 se concentró en los siguientes proyectos:

1. Programa: “Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV Y V)” (Componente SEDUC)
2. Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN)
3. Proyecto “Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)

El Programa se enfoca en dotar de infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, de la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2024 son los siguientes:

SECRETARÍA DE FINANZAS

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Servicio de Contabilidad y Auditoría	Informe	1	0	0%	1	0	0
Supervisor y diseñador estructural de proyectos de infraestructura educativa	Informe	1	0	0%	2	2	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

La cooperación ha sido participe de la supervisión continua del manejo de los fondos, lo que ha generado confianza para aprobar más fases y beneficiar más centros educativos en la zona de influencia del programa se ubica en los Departamentos de Ocatepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, y de manera prioritaria los centros educativos de la zona de rural de estos departamentos.

Se han presentado inconvenientes derivados de la coejecución del proyecto con el FHIS, en donde el FHIS hace las obras de construcción y la SEDUC supervisa las obras; sin embargo, el FHIS no ha podido avanzar en la construcción y por ende lo cual la supervisión no ha logrado ejecución.

Al primer trimestre, el retraso en la aprobación del presupuesto de la República para año 2024 afectó la ejecución física porque se debe contar con la disponibilidad presupuestaria para poder adjudicar los procesos de adjudicación y mas tramites exigidos por organismos financieros.

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión Local (PROMINE), primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	US\$	2,414,555	03/12/2015
		Lempiras	59,554,506	31/7/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
I Trimestre 2023	9,619,065.00	9,619,065	968,480	10%
Acumulado 2023	9,619,065.00	9,619,065	968,480	10%
Acumulado Vida del Proyecto **	59,554,506	59,554,506	36,273,439	61%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.6648 por US\$1.00

2. Proyecto: “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN)”

El Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica, consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de Aulas Integrales	Aula	52	0	0%	52	0	0
Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB)	Lotes	4	0	0%	4	0	0%
Adquisición de equipo informático	Computadoras Portátiles	36	0	%	36	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Actualmente se encuentran en ejecución la totalidad de las 52 obras de Infraestructura Escolar, diseminadas en los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraíso” y que corresponden a la FASE I.

Es importante mencionar que, la inversión que hará el proyecto en los Centros focalizados para la construcción de obras garantizará en los niños espacios físicos accesibles, confortables, funcionales y seguros, adaptados a las diferentes zonas climáticas del país y se ajustaran a aspectos ambientales y culturales que lo requieran, todo enmarcado en la normativa vigente de infraestructura educativa del país.

Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica este proceso de Borrador de documento de Solicitud de ofertas en

revisión por parte del Equipo del Banco. Pendiente envió a no objeción para poder adjudicar los 4 lotes para 6 mil centros a nivel nacional.

Adquisición de equipo informático de las 36 computadoras portátiles se encuentra en proceso de adjudicación para finales de mayo estarían siendo adjudicadas.

A continuación, véase la ejecución financiera al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras	6560-HN/TF0B2218-HN	39,500,000	31/7/2020	
		970,262,200	31/7/2025	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
I Trimestre 2023	635,547,008	635,547,008	8,157,661	1%
Acumulado 2023	635,547,008	635,547,008	8,157,661	1%
Acumulado Vida del Proyecto **	970,262,200	970,262,200	139,685,334	14%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.6648 por US\$1.00

3. Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I

El proyecto consiste en mejorar la infraestructura y dotar de mobiliario escolar, equipo de conectividad, así como la implementación de huertos escolares en los Centros Educativos de 197 municipios priorizados de Honduras incrementando los índices de escolaridad para el año 2023.

Principales Metas Físicas, I Trimestre-2024							
Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			I Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Reconstrucción, Ampliación y/o Rehabilitación de Centros Educativos	Centro Escolar	32	0	0%	10	0	0

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/03/2024

Se ha iniciado los nuevos procesos de licitación para la adjudicación de 32 centros educativos para ser intervenidos durante el año fiscal 2024 este proceso licitación es basado Ley Contratación de Estado y se tiene que cumplir procesos obligatorios y exigidos por la ONCAE e tiene previsto para el II Trimestre 2024 ya estén en ejecución y sean entregados algunos.

A continuación, véase la ejecución financiera al primer trimestre 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.	BCH - 24841 - 1	US\$		1/10/2022
		Lempiras	441,600,000	31/12/2024
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	
I Trimestre 2023	104,135,939	104,135,939	0	0%
Acumulado 2023	104,135,939	104,135,939	0	0%
Acumulado Vida del Proyecto **	441,600,000	441,600,000	337,265,843	76%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2024 (BCH): L24.6648 por US\$1.00

4.3.1 PRINCIPALES ADQUISICIONES I TRIMESTRE 2024

1. Infraestructura escolar para la Reconstrucción, Ampliación y/o Rehabilitación de 32 Centros Educativos.
2. Servicios Profesionales de Contabilidad y Auditoría (PROMINE)
3. Servicios profesionales de Supervisor y diseñador estructural de proyectos de infraestructura educativa (PROMINE).
4. Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de 52 Aulas Integrales (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras)
5. Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB) (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras).
6. Adquisición de Equipo Informático (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras).

4.3.2 PROGRAMAS SOCIALES

Referente al presupuesto asignado (L 998,730,278) se ejecutaron L13,278,972 que representan el 1.3% del presupuesto vigente al primer trimestre, los cuales se utilizaron en:

- Becas
- Material de Bioseguridad
- Matrícula gratis

En el programa social de servicios educativos de prebásica, la Secretaría de Educación ejecuta mediante las 18 direcciones departamentales de educación la atención en el nivel de educación prebásica mediante el pago de capacitadores voluntarias de Centros Comunitarios de educación prebásica, y Centros de Educación Prebásica (Universalización de la Educación Prebásica). La ejecución de estos fondos se realiza mediante convenio con BANADESA que tarda tres meses en firmar, se realizan en dos pagos al año (junio y diciembre), en vista de que requiere de documentación soporte para realizar dichos pagos por cual este trimestre no ha habido ejecución.

Otro importante es el Programa Ciudad Mujer se desarrolla en seis (6) módulos, de los cuales la SEDUC tiene participación directa en dos (2), Modulo de Autonomía Económica (Atención de Mujeres en Rezago Escolar, con modalidades educativas alternativas). Módulo de Atención a las Adolescentes (orientación educativa y vocacional para adolescentes).

Referente al presupuesto asignado a la Formación Bruta de Capital Fijo (L 100,016,033) se ejecutaron L 531,318 que representan el 0.5% del presupuesto vigente al primer trimestre se utilizan en:

- Pupitres
- Mobiliario
- Archivadores
- Equipo Transporte para asistir a los centros educativos
- Construcción y Readecuación de centros educativos

4.4 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Se realizó la incorporación presupuestaria de los recursos del proyecto Infraestructura Escolar.

- Se efectuó la ampliación de plazo del proyecto Infraestructura Escolar porque había vencido el 1 de enero del 2024.
- Se solicitó la proyección de Ejecución Financiera.
- Se remitieron oficios para agilizar la ejecución presupuestaria.
- Revisiones de Cartera con el Banco Mundial del proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras.
- Reuniones con la Unidades Ejecutoras de Proyectos y la DGIP-SEFIN.

4.5 PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE-2024

- El proyecto de Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras tuvo atrasos en la ejecución de las obras, pero se estas implementadas reuniones con el banco mundial semanales para monitorear los avances de las obras y se tiene previsto para junio 2024 la entrega de las primeras aulas integrales.
- El proyecto Infraestructura Escolar ha tenido atrasos con el inicio de los procesos de adjudicación de las obras debido a los procedimientos que exigen la normativa legal, pero se ha hecho esfuerzo para implementación de acciones de seguimiento y monitoreo de los procesos de licitaciones.
- Se ha tenido atrasos en los programas sociales y formación bruta de capital fijo, pero se está tomando decisiones para agilizar los procesos de adquisiciones y pagos a lo interno de la Institución.

Conclusiones

- Durante el primer trimestre, se continuó con las gestiones Administrativas y Financieras, considerando la continuidad y periodicidad de los procesos, el enfoque de la gestión durante este periodo se orientó al eficiente control interno.
- El monitoreo y el seguimiento de cada uno de los proyectos de Inversión Pública y los Programas Sociales ayudara para que la educación Prebásica y Media se fortalezca en todos niveles y todos los niños y jóvenes tenga oportunidades para seguir educándose.

Recomendaciones

- Agilizar el proceso 64 Aulas en la construidas, rehabilitadas y/o ampliadas
- Acompañamiento del secretario de Estado y del equipo de la Secretaría en la ejecución de los proyectos para su terminación es de suma importancia.

- Solicitar con anticipación la renovación de exoneración en la DGFA del Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica
- Integración de procesos entre la UCP y las áreas técnicas y administrativas de la SEDUC.
- Diálogo permanente y sistemático entre la UCP y la gerencia del préstamo del BM, SEDUC y la SEFIN.

ANEXOS

ANEXO No.1

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2024

Cifras en Lempiras

No. Proy.	INSTITUCIÓN / PROYECTO	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado (Devengado) al I Trimestre			% Ejecución (Ejec./Vigte.)
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total General	
3	0050 - Secretaría de Educación		105,403,010	643,899,002	749,302,012	105,403,010	643,899,002	749,302,012	649,880	8,476,261	9,126,141	1.2%
1	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN	-	427,207,056	427,207,056	-	427,207,056	427,207,056	-	8,157,661	8,157,661	1.9%
		TF0B2218-HN	-	208,339,952	208,339,952	-	208,339,952	208,339,952	-	-	-	0.0%
	Total MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS		-	635,547,008	635,547,008	-	635,547,008	635,547,008	-	8,157,661	8,157,661	1.3%
2	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHis - SE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
		BMZ 2016 68 763	1,267,071	8,351,994	9,619,065	1,267,071	8,351,994	9,619,065	649,880	318,600	968,480	10.1%
	Total PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)		1,267,071	8,351,994	9,619,065	1,267,071	8,351,994	9,619,065	649,880	318,600	968,480	10.1%
3	PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I	BCH - 24841 - 1	104,135,939	-	104,135,939	104,135,939	-	104,135,939	-	-	-	0.0%
	Total PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I		104,135,939	-	104,135,939	104,135,939	-	104,135,939	-	-	-	0.0%
	0050 - Secretaría de Educación		1,107,104,398	-	1,107,104,398	998,730,278	-	998,730,278	13,278,972	-	13,278,972	1.3%
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL		100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	-	-	-	0.0%
	CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER		1,221,030	-	1,221,030	776,030	-	776,030	-	-	-	0.0%
	SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA		105,701,618	-	105,701,618	105,701,618	-	105,701,618	-	-	-	0.0%
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SEDUC		1,312,500	-	1,312,500	1,312,500	-	1,312,500	-	-	-	0.0%
	PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO		839,700,000	-	839,700,000	730,770,880	-	730,770,880	-	-	-	0.0%
	SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRO HONDUREÑOS		900,000	-	900,000	900,000	-	900,000	-	-	-	0.0%
	APOYO FINANCIERO A OTRAS INSTITUCIONES		158,169,250	-	158,169,250	159,169,250	-	159,169,250	13,278,972	-	13,278,972	8.3%
	0050 - Secretaría de Educación		93,521,694	-	93,521,694	100,016,033	-	100,016,033	531,318	-	531,318	0.5%

