



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2024

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-financiera de la Inversión Pública

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAI) es una institución autónoma, científica y técnica dedicada a la protección, investigación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural del país para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural de la sociedad hondureña.

Con el gobierno de la República pretende que la conservación y el disfrute del Patrimonio Cultural sean hechos en los que tenga cabida la más amplia participación ciudadana. Se busca también impulsar la visión de un país con una riqueza cultural capaz de convertirse en factor de cohesión e inclusión social de los/as hondureños/as. Para ello, el IHAI pretende en estos años de gobierno, impulsar las alianzas con los actores locales (municipalidades, gestores de la cultura, investigadores, instituciones educativas) y concebir una política de Patrimonio Cultural en el que se incluya la diversidad de culturas que han poblado y pueblan este territorio hoy llamado Honduras.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	28,456,126.0
Inversión Productiva	13,612,547.0
Formación Bruta de Capital	14,843,579.0
Presupuesto Vigente	27,613,343.0
Inversión Productiva	13,612,547.0
Formación Bruta de Capital	14,000,796.0
Ejecutado II Trimestre	2,972,274.4
Inversión Productiva	347,327.0
Formación Bruta de Capital	2,624,947.4
% Ejecución (Devengado II Trim-2024/Vigente)	10.8%
Ejecutado Anual	3,919,377.4
Inversión Productiva	347,327.0
Formación Bruta de Capital	3,572,050.4
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	14.2%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	3,919,377.4
Inversión Productiva	347,327.0
Formación Bruta de Capital	3,572,050.4
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	14.2%

Nota: SIAFI, 30/06/2024

Al segundo trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L27.6 millones**, reportando para Inversión productiva **L13.6 millones** y **L14.0 millones** para la formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de **L0.35 millones** en inversión productiva y **L3.5 millones** en

formación bruta de capital, lo que representa el **(10.8%)** con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (1) un proyecto enfocado en el fortalecimiento integral IHAH para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos en 9 departamentos del país y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 100% corresponde a fondos provenientes de fondos nacionales expresado en términos monetarios con un monto de **L27.6 millones**, Dicha inversión es financiada en su totalidad por la Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al II Trimestre (2022-2024):

En los años comprendidos entre el 2022 y el 2024, únicamente se ha considerado, la ejecución del proyecto Apoyo para la Defensa, Rescate, Manejo, Protección, Promoción, Mantenimiento, Valoración Histórica y Transmisión a las Generaciones Futuras de los Bienes que Conforman el Patrimonio Cultural de Honduras. financiados en su totalidad con recursos nacionales.

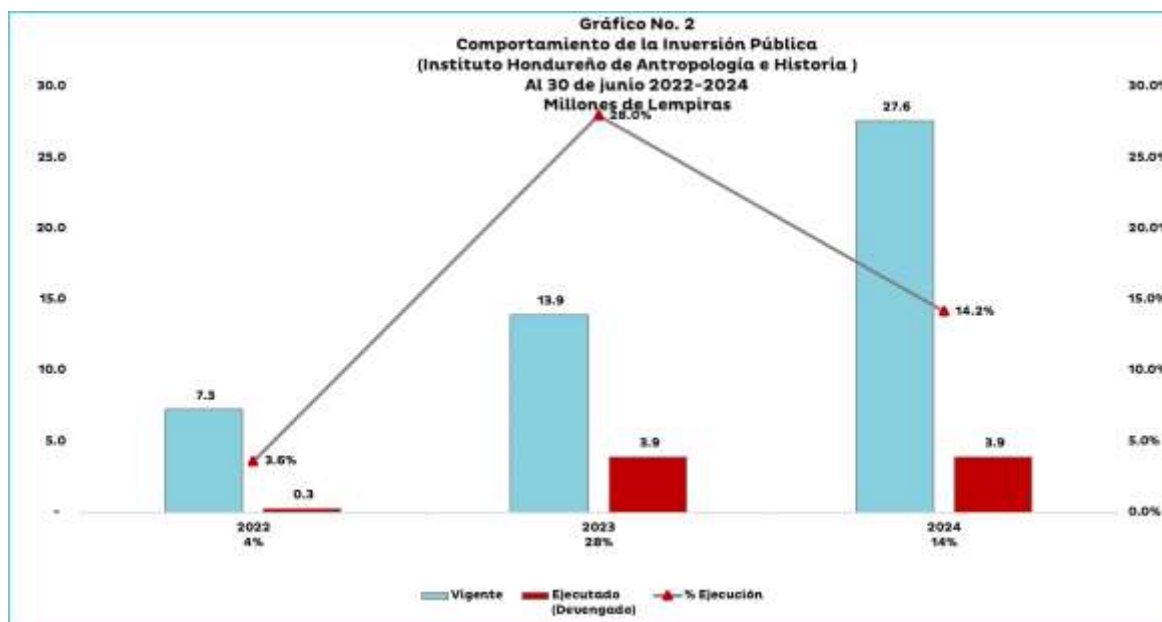

La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 de junio del 2022-2024, en donde se observa aumento en los niveles de ejecución siendo el año 2024 donde se reporta mayor inversión (L3.9

millones, que representan el 14.2%), en el 2022 la baja ejecución se debió en parte a procesos internos de la institución y cambios de autoridades; para el año 2023 se muestran un aumento de la ejecución debido que se pudo completar el personal en la unidad ejecutora, lo que agilizó los procedimientos internos y externos de la institución.

d. Principales Proyectos

En el segundo trimestre del año 2024, la inversión se concentró en un proyecto para fortalecimiento integral del instituto hondureño de antropología e historia, para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos, museos, archivos históricos e inmuebles de patrimonio en 9 departamentos del país, para los cuales se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

- 1. Proyecto fortalecimiento integral del instituto hondureño de antropología e historia, para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos, museos, archivos históricos e inmuebles de patrimonio 9 departamentos del país:**

El Proyecto contempla en restaurar y rehabilitar 5 inmuebles de patrimonio cultural de Honduras, 12 investigaciones, distribuidas en arqueológicas históricas y etnohistóricas, creado un Sistema de Gestión Documental elaborado e implementado un Plan Estratégico Institucional; dichos entregables se desarrollarán en 9 departamentos del país que abarca 16 municipios, en la zona de influencia del proyecto.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			II Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Estudio Estructural Museo Villa Roy	Informe	1	0	0%	1	0	0%
Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	0	0%	5	0	0%
Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas	Investigaciones	5	0	0%	5	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2024

Como se muestra en el cuadro anterior, el proyecto no reporta ejecución física; se ha contratado una empresa que firmó contrato el 05 de junio del presente año, los pagos aún no se han emitido, ya que esta empresa debe presentar informe preliminar, por eso esta actividad presentan un 0% de ejecución financiera, del 20% planificado.

De acuerdo con calendario restauración y rehabilitación de museos, sitios e inmuebles de patrimonio, estas actividades iniciaron a finales del II trimestre, en el caso del Museo de Comayagua se identificaron las acciones a considerar para la restauración, además se organizó comisión para la elaboración de los TDR para la contratación de compañía constructora y de supervisión y los demás inmuebles, se está avanzado en los procesos. En las investigaciones Arqueológicas, Históricas y Ethnohistóricas se han realizado contrataciones de 3 investigadores, se han realizado visitas de campo, entrevistas para tener listas para el III trimestres las investigaciones.

Con el proyecto, se beneficiarán 2,835,288 habitantes en 9 departamentos del País.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al segundo trimestre 2024 del Proyecto para Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de patrimonio 9 departamentos del país:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Fortalecimiento integral del instituto hondureño de antropología e historia, para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos, museos, archivos históricos e inmuebles de patrimonio 9 departamentos del país	FN-25617-1	US\$	0	01/04/2024
		Lempiras	L31,707,186.4	27/2/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Deuengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2024	13,612,547.0	13,612,547.0	347,327.0	2.6%
Acumulado 2024	13,612,547.0	13,612,547.0	347,327.0	2.6%
Acumulado Vida del Proyecto **	31,707,186.4	31,707,186.4	347,327.0	1.1%

d.1 Principales Adquisiciones al II Trimestre 2024

- Estudio Actualización Solución Geotécnica y Estructural para la Estabilidad.
- Restauración y Rehabilitación de Museos, Sitios e Inmuebles de Patrimonio
- Se Instalaron 2 accesos inclusivos para la movilización de sillas de ruedas y camillas.
- Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas
- Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH.
- compras de materiales y equipo

e. Gestión de la Inversión

- Proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera.
- Capacitaciones de la DGIP.
- Solicitud de Departamental y Municipal, para el ejercicio fiscal 2024.
- Modificaciones Presupuestarias.

f. Problemática y acciones durante el II trimestre-2024

- Atrasos en la Actualización del Estudio Solución Geotécnica y Estructural, se realizó visita y recorrido por parte del Ingeniero estructuralista de la empresa "Illian Engineering", con el fin de realizar levantamiento arquitectónico y actualización de estado de grietas, fisuras y fracturas de las paredes del inmueble.
- En el proceso de Restauración y Rehabilitación de Museos, Sitios e Inmuebles de Patrimonio se presentado demoras debidos a los tramites de procesos de licitaciones, pero se tomado acciones para agilizar los mismos como reuniones de seguimiento como ser la designación por parte de la Gerencia del IHAH de la comisión para elaborar los TDR.

V. Conclusiones

- La ejecución de este proyecto es de suma importancia, ya que fortalece al IHAH en el rescate y conservación del Patrimonio Cultural de Nuestra Nación que es un legado de nuestros antepasados.
- En el II Trimestre se realizó la contratación de empresas para la conservación del Patrimonio Cultural, contratación de

investigadores, archiveros, mantenimiento del Sitio Arqueológico Cerro Palenque y la administración del proyecto.

VI. Recomendaciones

- Se debe mantener reuniones continuas con las unidades ejecutoras, con el objetivo de mantener una mejor administración del proyecto.
- Agilización en los los procesos de contrataciones de obras, materiales y suministro y servicios
- Tener personal clave o principal del proyecto para que no exista atrasos en las actividades de este.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado II Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			Comprometido (Devengado + Compromiso)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Comp./Vig.)
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		13,612,547.00	13,612,547.00	13,612,547.00	13,612,547.00	347,327.04	347,327.04	2.6	347,327.04	347,327.04	2.6	347,327.04	347,327.04	2.6
1	FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS	FN-25617-1	13,612,547.00	13,612,547.00	13,612,547.00	13,612,547.00	347,327.04	347,327.04	2.6	347,327.04	347,327.04	2.6	347,327.04	347,327.04	2.6
	Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS		13,612,547.00	13,612,547.00	13,612,547.00	13,612,547.00	347,327.04	347,327.04	2.6	347,327.04	347,327.04	2.6	347,327.04	347,327.04	2.6
	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		14,843,579.00	14,843,579.00	14,000,796.00	14,000,796.00	2,624,947.39	2,624,947.39	18.7	3,572,050.33	3,572,050.33	25.5	3,572,050.33	3,572,050.33	25.5
	ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	1,481,236.00	1,481,236.00	571,969.77	571,969.77	38.6	571,969.77	571,969.77	38.6	571,969.77	571,969.77	38.6
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	1,481,236.00	1,481,236.00	571,969.77	571,969.77	38.6	571,969.77	571,969.77	38.6	571,969.77	571,969.77	38.6
	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.		1,211,032.00	1,211,032.00	6,796,296.00	6,796,296.00	1,244,844.54	1,244,844.54	18.3	2,191,947.48	2,191,947.48	32.3	2,191,947.48	2,191,947.48	32.3
	Total ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.		1,211,032.00	1,211,032.00	6,796,296.00	6,796,296.00	1,244,844.54	1,244,844.54	18.3	2,191,947.48	2,191,947.48	32.3	2,191,947.48	2,191,947.48	32.3
	ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO DEL TERRENO E INMUEBLE A INTERVENIR		13,612,547.00	13,612,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO DEL TERRENO E INMUEBLE A INTERVENIR		13,612,547.00	13,612,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		-	-	5,703,264.00	5,703,264.00	808,133.08	808,133.08	14.2	808,133.08	808,133.08	14.2	808,133.08	808,133.08	14.2
	Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		-	-	5,703,264.00	5,703,264.00	808,133.08	808,133.08	14.2	808,133.08	808,133.08	14.2	808,133.08	808,133.08	14.2

ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	001 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, ARCHIVOS HISTÓRICOS	02 - Estudio estructural y presupuesto del Terreno e Inmueble a Intervenir	547 - ESTUDIO	1	0	-	1	0	-
		04 - Número de acciones para estabilizar terreno y restaurar el inmueble del Museo Villa Roy, Tegucigalpa, Francisco Morazán	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		08 - Número de investigaciones Históricas y Etnohistóricas en varias zonas del país (San Antonio de Oriente, Cedros, Yamaranguila, El Corpus, Trujillo, La Paz, Yuscarán, comunidades garífunas de Colón)	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		12 - Integrado el Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH	149 - INFORME	3	0	-	1	0	-
		14 - Elaborar e implementar un Plan Estratégico Institucional	149 - INFORME	3	0	-	1	0	-

