



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAAH)

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-financiera de la Inversión Pública

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAA) es una institución autónoma, científica y técnica dedicada a la protección, investigación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural del país para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural de la sociedad hondureña.

El gobierno de la República pretende fomentar la conservación, participación y el disfrute del Patrimonio Cultural en la ciudadanía. Se busca también impulsar la visión de un país con una riqueza cultural capaz de convertirse en factor de cohesión e inclusión social de los/as hondureños/as. Para ello, el IHAA pretende impulsar las alianzas con los actores locales (municipalidades, gestores de la cultura, investigadores, instituciones educativas) y

concebir una política de Patrimonio Cultural en el que se incluya la diversidad de culturas que han poblado y el territorio hondureño.

Al tercer trimestre del 2024, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L28.7 millones**, concentrando **L13.6 millones** para Inversión productiva y **L15.1 millones** para la formación bruta de capital; con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de **L2.1 millones** en inversión productiva y **L5.2 millones** en formación bruta de capital, lo que representa el 25.3% respecto al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (1) un proyecto enfocado en el fortalecimiento integral del IHAA para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos en 9 departamentos del país y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del
2024
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	28,456,126.0
Inversión Productiva	13,612,547.0
Formación Bruta de Capital	14,843,579.0
Presupuesto Vigente	28,672,593.0
Inversión Productiva	13,612,547.0
Formación Bruta de Capital	15,060,046.0
Ejecutado III Trimestre	7,247,377.9
Inversión Productiva	2,087,424.9
Formación Bruta de Capital	5,159,953.0
% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)	25.3%
Ejecutado Anual	11,166,755.3
Inversión Productiva	2,434,751.9
Formación Bruta de Capital	8,732,003.3
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	38.9%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	11,166,755.3
Inversión Productiva	2,434,751.9
Formación Bruta de Capital	8,732,003.3
% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)	38.9%


Nota: SIAFI, 30/09/2024

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, la totalidad de los recursos proveniente de fondos nacionales expresado en términos monetarios con un monto de **L28.7 millones**, Dicha inversión es financiada en su totalidad por la Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2020-2024):

En el período comprendido entre el 2020 y el 2024, únicamente se ha considerado, la ejecución del proyecto Apoyo para la Defensa, Rescate, Manejo, Protección, Promoción, Mantenimiento, Valoración Histórica y Transmisión a las Generaciones Futuras de los Bienes que Conforman el Patrimonio Cultural de Honduras financiados en su totalidad con recursos nacionales.

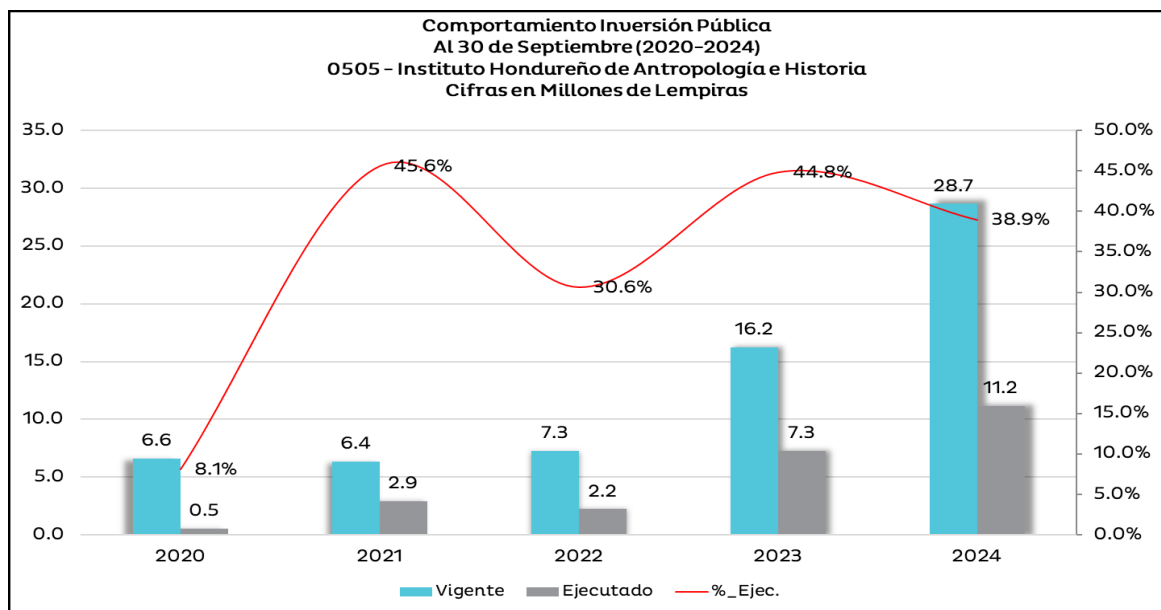

La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 de septiembre del 2020-2024, en ella se observa un incremento en los niveles de ejecución; siendo el año 2024 donde se reporta mayor inversión (L11.2millones), que representan el 38.9%; en el 2022 la baja ejecución se debió en parte a procesos internos de la institución y cambios de autoridades; para el año 2023 se muestran un aumento de la ejecución debido que se pudo completar el personal en la unidad ejecutora, lo que agilizó los procedimientos internos y externos de la institución.

d. Principales Proyectos

En el tercer trimestre del año 2024, la inversión se concentró en un proyecto para fortalecimiento integral del instituto hondureño de antropología e historia, para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos, museos, archivos históricos e inmuebles de patrimonio en 9 departamentos del país, para los cuales se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Proyecto Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio 9 Departamentos del País:

El Proyecto contempla la restauración y rehabilitación de 5 inmuebles de patrimonio cultural de Honduras, 12 investigaciones, distribuidas en zonas arqueológicas históricas y etnohistóricas, creando un sistema de gestión documental elaborado e implementado un Plan Estratégico Institucional; dichos entregables se desarrollarán en 9 departamentos del país que abarcan 16 municipios, en la zona de influencia del proyecto.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III-Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III- Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Estudio Estructural Museo Villa Roy	Informe	1	1	100%	1	1	100%
Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	2	29%	2	2	100%
Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas	Investigaciones	7	7	30%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

De acuerdo con la calendarización de la restauración y rehabilitación de museos, sitios e inmuebles de patrimonio, estas actividades están ejecutándose, se espera que a finales del IV trimestre estén concluidas mientras que otras finalizaran en el segundo trimestre 2025. Asimismo, se encuentran en ejecución las investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas.

Con el proyecto, se beneficiarán 2,835,288 habitantes en 9 departamentos del País.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al tercer trimestre 2024 Proyecto para Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de patrimonio 9 departamentos del país:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Fortalecimiento integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio en 9 Departamentos del País	FN-25617-1	US\$	0	01/04/2024
		Lempiras	L31,707,186.4	27/2/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Deuengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2024	13,612,547.0	13,612,547.0	2,087,424.9	15%
Acumulado 2024	13,612,547.0	13,612,547.0	2,434,751.9	18%
Acumulado Vida del Proyecto **	31,707,186.4	31,707,186.4	2,434,751.9	8%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

d.1 Principales Adquisiciones al III Trimestre 2024

- Estudio Actualización Solución Geotécnica y Estructural para la Estabilidad.
- Restauración y Rehabilitación de Museos, Sitios e Inmuebles de Patrimonio
- Se Instalaron 2 accesos inclusivos para la movilización de sillas de ruedas y camillas.
- Investigaciones Arqueológicas, Históricas y Etnohistóricas
- Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH.
- compras de materiales y equipo

e. Gestión de la Inversión

- Proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera SEFI-DGIP-DGP-IHAH.

- Modificaciones Presupuestarias.

f. Problemática y Acciones Durante el III trimestre-2024

- Los procesos de clasificación, descripción y digitalización del Patrimonio Documental y la compra de materiales y equipos se han retrasado; no obstante, se ha logrado avanzar gracias a las reuniones de monitoreo y seguimiento de cada uno de los procesos.
- Se han tenido atrasos en la restauración y rehabilitación del patrimonio del país debido a los procesos licitaciones; sin embargo, se han podido realizar algunas adjudicaciones como ser el Estudio Actualización Solución Geotécnica y Estructural para la Estabilidad y la Restauración y Rehabilitación de Museos, Sitios e Inmuebles de Patrimonio, y otras están en la etapa de ejecución y de recepción.

V. Conclusiones

- El proyecto es de suma importancia, ya que fortalece al IHAH en el rescate y conservación del Patrimonio Cultural de Nuestra Nación que es un legado de nuestros antepasados.
- Las contrataciones de las empresas para la conservación del Patrimonio Cultural, contratación de investigadores, archiveros, mantenimiento del Sitio Arqueológicos, y la administración del proyecto son avances muy relevantes que aportan en gran manera a la obtención de los entregables del proyecto.

VI. Recomendaciones

- Agilizar los procesos de contrataciones de obras, bienes y servicios.
- La comunicación interna entre autoridades institucionales, la unidad ejecutora y la SEFIN es fundamental para el éxito del proyecto.
- Reuniones de Monitoreo y Seguimientos con los actores involucrados.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2024
Cifras en Lempiras

No. Proy.	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado (Devengado III Trimestre)			Ejecutado (Devengado Anual)			
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		13,612,547	13,612,547	13,612,547	13,612,547	2,087,425	2,087,425	15.3%	2,434,752	-	2,434,752	17.9%
1	FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN,REHABILITACIÓN,ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLOGICOS	FN-25617-1	13,612,547	13,612,547	13,612,547	13,612,547	2,087,425	2,087,425	15.3%	2,434,752	-	2,434,752	17.9%
	Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN,REHABILITACIÓN		13,612,547	13,612,547	13,612,547	13,612,547	2,087,425	2,087,425	15.3%	2,434,752	-	2,434,752	17.9%
	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		14,843,579	14,843,579	15,060,046	15,060,046	5,159,953	5,159,953	34.3%	8,732,003	-	8,732,003	58.0%
	ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	2,302,486	2,302,486	181,461	181,461	7.9%	753,431	-	753,431	32.7%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	2,302,486	2,302,486	181,461	181,461	7.9%	753,431	-	753,431	32.7%

Fuente: SIAFI, 30/09/2024



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Instituto Hondureño de Antropología e Historia	001 - FORTALECIMIENTO INTEGRAL DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS, MUSEOS, ARCHIVOS HISTÓRICOS	02 - Estudio estructural y presupuesto del Terreno e Inmueble a Intervenir	547 - ESTUDIO	1	0	-	0	0	-
		04 - Número de acciones para estabilizar terreno y restaurar el inmueble del Museo Villa Roy, Tegucigalpa, Francisco Morazán	149 - INFORME	1	0	-	0	0	-
		08 - Número de investigaciones Históricas y Etnohistóricas en varias zonas del país (San Antonio de Oriente, Cedros, Yamaranguila, El Corpus, Trujillo, La Paz, Yuscarán, comunidades garífunas de Colón)	149 - INFORME	1	0	-	1	0	-
		12 - Integrado el Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH	149 - INFORME	3	0	-	1	0	-
		14 - Elaborar e implementar un Plan Estratégico Institucional	149 - INFORME	3	0	-	1	0	-
		17 - Administración y gestión del proyecto	459 - OPERATIVO	1	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024
