



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2024

**Secretaría de Educación (SEDUC)**

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2024

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS**

## IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Educación (SEDOC) es la encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del Sistema Educativo Formal del país.

El Gobierno de la República ha considerado dentro de sus prioridades atender proyectos enfocados a programas sociales y apuntar a un sistema capaz de brindar educación gratuita y universal, reinstaurando la matrícula gratis y una merienda idónea; rehabilitar y repotenciar sustancialmente de la infraestructura escolar durante el primer año de gobierno, llegando al 100% en el tercer año, mediante mecanismos de participación comunitaria apoyada desde el municipio y el gobierno central entre otros.

En cuanto la Protección Social se ampliará y fortalecerán programas de becas, material de bioseguridad, matrícula gratis y merienda escolar que se focalizarán a fin de alcanzar a los sectores educativos de la población en extrema pobreza, sin corrupción ni manipulación.

Cuadro No. 01

### Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del 2024

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>1,949,928,104.0</b>
Inversión Productiva	749,302,012.0
Inversión Social	1,107,104,398.0
Formación Bruta de Capital	93,521,694.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>2,046,464,612.0</b>
Inversión Productiva	689,424,351.0
Inversión Social	1,043,667,645.0
Formación Bruta de Capital	313,372,616.0
<b>Ejecutado III Trimestre</b>	<b>261,644,461.6</b>
Inversión Productiva	137,798,765.3
Inversión Social	113,402,588.6
Formación Bruta de Capital	10,443,107.6
<b>% Ejecución (Devengado III Trim-2024/Vigente)</b>	<b>12.8%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>386,616,530.9</b>
Inversión Productiva	169,789,360.1
Inversión Social	188,857,409.8
Formación Bruta de Capital	27,969,761.0
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>18.9%</b>
<b>Comprometido (Devengado + Compromiso)</b>	<b>578,926,456.9</b>
Inversión Productiva	245,461,551.6
Inversión Social	227,397,404.3
Formación Bruta de Capital	106,067,501.1
<b>% Ejecución Comprometido (Comprometido/Vigente)</b>	<b>28.3%</b>

Nota: SIAFI, 30/09/2024


Al tercer trimestre del año 2024, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L2,046.5 millones**; de los cuales **L689.4 millones**

corresponden a Inversión productiva, L1,043.7 millones a inversión social y L 313.4 millones a formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al cierre del trimestre de L137.8 millones correspondientes a inversión productiva, L113.4 millones a Inversión Social y L10.4 millones a la formación bruta de capital lo que representa en su conjunto el 12.8% con relación al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de (3) tres proyectos enfocados en Infraestructura Escolar, Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras y la Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.


### b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, el 70.6% corresponde a fondos provenientes de fondos nacionales expresado en términos monetarios con un monto de L1,445.4 millones, el 20.9% es financiado con crédito externo que equivale L427.2 millones y donaciones el 8.5% que corresponde L173.9 millones. Dicha inversión es financiada por la Tesorería General de la Republica con recursos de fuente 11, el banco mundial con fuente 21 y 22 y KFW con fuente 22 como se detalla a continuación:

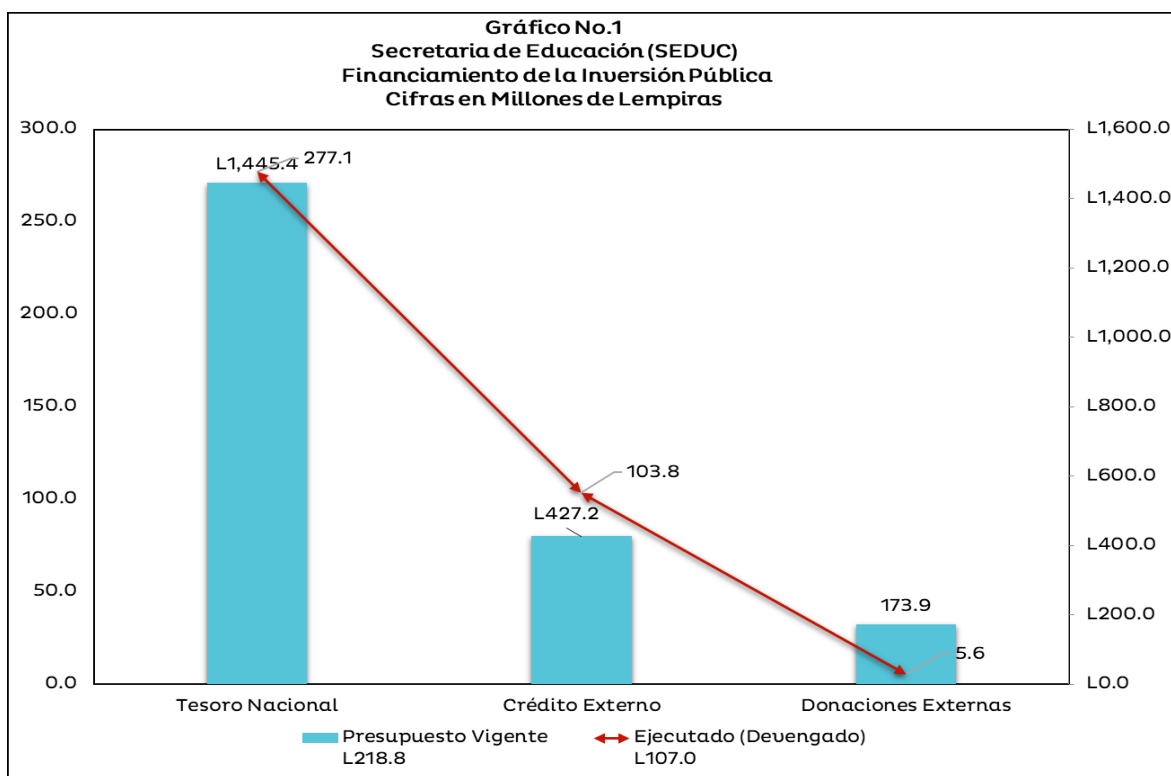

### c. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2020-2024):

En los años comprendidos del 2020 al 2024, los proyectos de Inversión Pública de SEDUC han considerado la ejecución de 3 Proyectos de Inversión, financiados por recursos provenientes de fondos nacionales y fondos externos provenientes de créditos y donaciones externas.

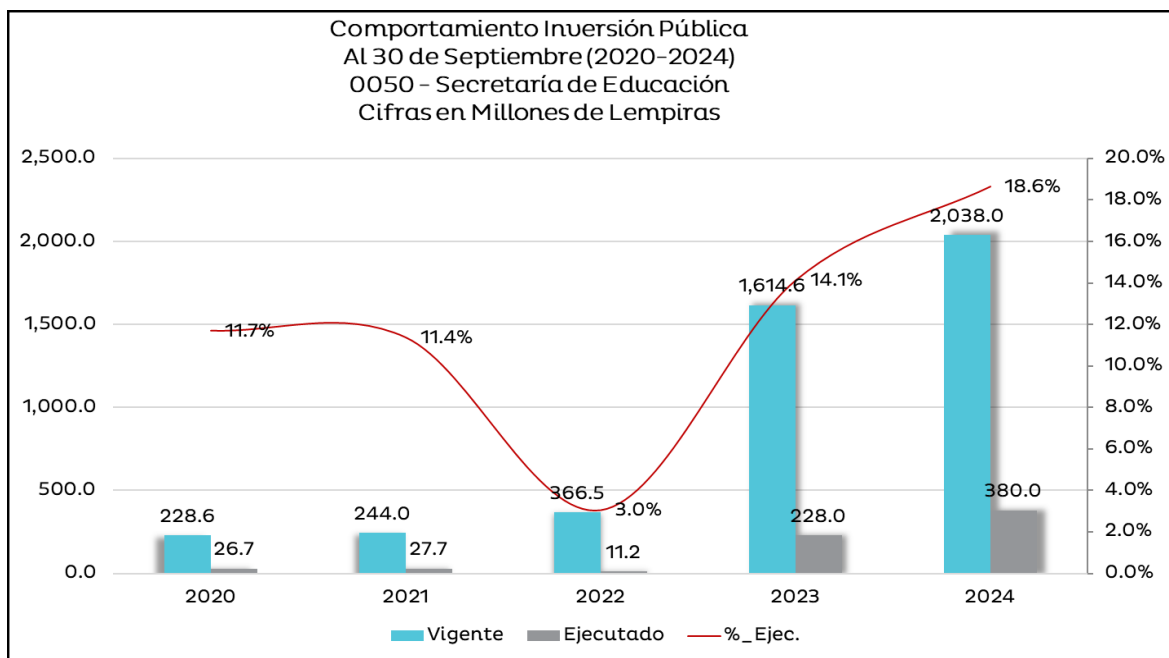

La Gráfica No.1 muestra la ejecución porcentual comparativa al 30 de septiembre del periodo comprendido entre el 2020 y el 2024, en ella se muestra una disminución en los niveles de ejecución, especialmente en el año 2022 donde se reporta menor ejecución (L11.2 millones, que representan el 3%). A consecuencia de cambio autoridades en las unidades ejecutoras, en el 2023 la ejecución se incrementó en parte debido a la incorporación presupuestaria total de los recursos con fondos provenientes del BCH; para el año 2024 se muestran un aumento de la ejecución debido que se logró completar el personal de la unidad ejecutora mejorando los procedimientos internos mejorando los tiempos de ejecución.

### d. Principales Proyectos

En el tercer trimestre del año 2024, la inversión se concentró en los siguientes proyectos:

1. Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE IV Y V) (Componente SEDUC).
2. Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras (IDA 6560-HN).

3. Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

**1. Programa Modernización de la Infraestructura Educativa (PROMINE)**

El Programa se enfoca en dotar de infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores. Además, de la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, III-Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III- Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Servicio de Contabilidad y Auditoría	Informe	1	0	0%	19	0	0%
Supervisor y diseñador estructural de proyectos de infraestructura educativa	Informe	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

La cooperación ha sido participe de la supervisión continua del manejo de los fondos, lo que ha generado confianza para aprobar más fases y beneficiar más centros educativos en la zona de influencia del programa; el proyecto tiene influencia en los Departamentos de Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, priorizando los centros educativos de la zona rural de estos departamentos.

El problema de la ejecución física y financiera se debe a dificultades entre los ejecutores del proyecto ya que el proyecto coejecutado por el FHIS, quien construye los centros escolares y la Secretaría de Educación quien los supervisa. La secretaria de educación no reporta ejecución física debido a

que el FHIS aún no ha reportado avances al tercer trimestre además del vencimiento de la fecha de cierre de ejecución de este y se tuvo que solicitar ampliación de plazo al proyecto.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto, al tercer trimestre del 2024:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar (PROMINE/KFW, FASE II)	2014 67 414 (KFW) / FHIS - SE	US\$	2,414,554.6	03/12/2015 31/7/2024
		Lempiras	59,554,506.0	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III -Trimestre 2024	9,619,065.0	9,619,065.0	3,080,224.3	32.0%
Acumulado 2024	9,619,065.0	9,619,065.0	4,791,851.5	49.8%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>59,554,506.0</b>	<b>59,554,506.0</b>	<b>40,096,810.3</b>	<b>67.3%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

## 2. Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” (IDA 6560-HN)”

El Proyecto Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica, consiste en la mejora de la capacidad institucional de Secretaría de Educación (SE) para la gestión de este nivel educativo; las prácticas de enseñanza de docentes y educadoras a nivel nacional; y los entornos de aprendizaje físico en centros de Prebásica que atienden educandos vulnerables de regiones seleccionadas.

Los principales avances físicos al 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Se concluyó la ejecución de las 52 obras de Infraestructura Escolar, diseminadas en los departamentos de Copán, Lempira, Olancho y El Paraíso”, las cuales corresponden a la FASE I, se experimentaron atrasos por las condiciones climatológicas de las zonas.

**Principales Metas Físicas, III- Trimestre-2024**

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III-Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Fasa-1 - Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de Aulas Integrales	Aula	52	52	100%	52	52	100%
Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB)	Lote	4	0	0%	4	0	0%
Fase 2- Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de Aulas Integrales	Aulas	42	0	0%	42	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024

La adquisición de materiales educativos para los espacios de aprendizaje de los Centros de Educación Prebásica (CEPB) se encuentra en proceso de adjudicación de los miembros de la comisión evaluadora, dicho proceso estaría adjudicado y entregado en el IV trimestre del presente año.

Se encuentra en marcha la estrategia de Supervisión de obras de infraestructura de la Fase II, dicha estrategia responde al objetivo de garantizar espacios físicos accesibles, confortables, funcionales y seguros, en los departamentos de Gracias a Dios y Yoro, adaptados a las diferentes zonas climáticas de dichas regiones postergadas del país y ajustar aspectos que por condiciones ambientales y culturales lo requieran, todo enmarcado en la normativa vigente de infraestructura educativa, paralelo a la contratación de contratistas para la ejecución de las obras, esta estrategia plantea resolver la factibilidad, en primera instancia administrativa y técnica para desarrollar la estructura organizativa requerida para el inicio de obras en las 42 aulas diseminadas en 28 Centros de Educación Prebásica (CEPB) en los departamentos antes mencionados.

Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	6560-HN/TFOB2218-HN	US\$	39,500,000.0	31/7/2020 31/7/2025
		Lempiras	970,262,200.0	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III -Trimestre 2023	635,547,008.0	575,669,347.0	80,110,216.2	13.9%
Acumulado 2023	635,547,008.0	575,669,347.0	105,574,713.9	18.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>970,262,200.0</b>	<b>970,262,200.0</b>	<b>237,102,386.9</b>	<b>24.4%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

### 3. Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.

El proyecto consiste en mejorar la infraestructura y dotar de mobiliario escolar, equipo de conectividad, así como la implementación de huertos escolares en los Centros Educativos de 197 municipios priorizados de Honduras incrementando los índices de escolaridad para el año 2024.

Al 30 de septiembre de 2024 los principales avances físicos son los siguientes:

Se ha avanzado en la ejecución de los 32 centros educativos para ser intervenidos durante el ejercicio fiscal 2024, en el III Trimestre del 2024 se han finalizados 9 centros educativos a nivel nacional y en el IV Trimestre se espera terminar los restantes.

#### Principales Metas Físicas, III -Trimestre-2024

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2024			III- Trimestre 2024		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Reconstrucción, Ampliación y/o Rehabilitación de Centros Educativos	Centro Escolar	32	32	100%	32	32	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/09/2024



Los aspectos financieros del proyecto se presentan a continuación:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Programa de Reconstrucción, Ampliación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa e Implementación de Huertos Escolares Productivos en Centros Educativos de Honduras, Fase I.	BCH - 24841 - 1			1/10/2022 31/12/2024
		Lempiras	441,600,000	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
III- Trimestre 2024	104,135,939.0	104,135,939.0	54,608,324.9	52.4%
Acumulado 2024	104,135,939.0	104,135,939.0	59,422,794.7	57.1%
Acumulado Vida del Proyecto **	<b>441,600,000.0</b>	<b>441,600,000.0</b>	<b>396,688,637.6</b>	<b>89.8%</b>

\*\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/09/2024 (BCH): L24.9115 por US\$1.00

#### d.1. Principales Adquisiciones al III Trimestre 2024

- Contrato para Reconstrucción, Ampliación y/o Rehabilitación de 32 Centros Educativos (Infraestructura Escolar)
- Contrato para Servicio de Contabilidad y Auditoría (PROMINE)
- Contrato para Supervisor y diseñador estructural de proyectos de infraestructura educativa (PROMINE).
- Fase-2, Contrato para Construcción, Rehabilitación y/o Ampliación de 42 Aulas Integrales (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras)
- Contrato para Adquisición de Materiales Educativos para los Espacios de Aprendizaje a los Centros de Educación Prebásica a (CEPB) (Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras).

#### d.2. Programas Sociales

Referente al presupuesto asignado para este concepto (L1,043,667,645.0), al 30 de septiembre, se alcanzó una ejecución de L188,857,409.8 que representan el 18.1% del presupuesto vigente al primer trimestre, los cuales se están invirtiendo en:

- Becas
- Material de Bioseguridad
- Matrícula gratis

A través del programa social de servicios educativos de prebásica, la Secretaría de Educación ejecuta mediante las 18 direcciones departamentales de educación el pago de capacitadores voluntarios de Centros Comunitarios de educación prebásica, y Centros de Educación Prebásica (universalización de la Educación Prebásica). La ejecución de estos fondos se realiza mediante convenio con BANADESA. En el tercer trimestre se presentan atrasos en la Ejecución de los recursos asignados para el 2024 en vista que se encuentra en proceso de firma el convenio de cooperación con la Institución Financiera que brinda el Servicio y la logística para el pago a las Educadoras.

Otra de las inversiones importantes, es el Programa Ciudad Mujer, se desarrolla en seis (6) módulos; de los cuales la SEDUC tiene participación directa en dos Módulos de autonomía Económica (atención de mujeres en rezago escolar, con modalidades educativas alternativas).

Módulo de atención a las Adolescentes (orientación educativa y vocacional para adolescentes): En el III trimestre se reporta un bajo porcentaje de ejecución presupuestaria, esto se debe a que los pagos de los procesos ejecutados del periodo 2023 no se realizaron en tiempo y forma.

El programa social de servicios de educación para pueblos indígenas y afro hondureños es un convenio de cooperación entre la secretaría de estado en el despacho de educación y la asociación de miskitos hondureños de buzos lisiados (amhbli), en cumplimiento a la sentencia emitida por la corte interamericana de derechos humanos a favor de los buzos lisiados de la moskitia. La ejecución se refleja en el III trimestre, debido que en el mes abril se hicieron entregas de becas por parte de la asociación de misquitos hondureños buzos.

Respecto al presupuesto vigente en la Formación Bruta de Capital Fijo (L 313,372,616), se alcanzó una ejecución de L10,443,107.6 que representan el 3.3% de cumplimiento. Al tercer trimestre la inversión fue realizada en:

- Pupitres
- Mobiliario
- Archivadores
- Equipo Transporte para asistir a los centros educativos
- Construcción y Readecuación de centros educativos

**e. Gestión de la Inversión**

- Actualización de proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones de seguimiento y ejecución física y financiera entre la DGIP-SEFIN-DGP y SEDUC.
- Revisión de Cartera Banco Mundial Proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras” 2024.
- Actualización de Informes de Avances de obras de intervención escolar.
- Dictámenes de Modificaciones Presupuestarias

**f. Problemática y acciones durante el III trimestre-2024**

- Se reportan problemas con las licitaciones de obra de la fase 2 del proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras”.
- En los programas sociales y formación bruta de capital fijo se reportan atrasos debido a los procesos de adquisiciones y documentación.
- Limitada cantidad de ofertas del mercado para la contratación de Servicios de consultoría especializados.

**V. Conclusiones**

- En el Tercer Trimestre se alcanzaron mejores resultados y monitoreo más cercano con las unidades ejecutoras de la SEDUC debido a que las reuniones de ejecución física y financiera en los principales actores SEFIN-DGIP-DGP-SEDUC.
- Se ha tenido buenos resultados con la recepción de 28 aulas integrales de la Fase I del proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras y en marcha la estrategia de obras de infraestructura de la Fase II de las aulas integrales que tendrá un impacto positivo en las regiones de Yoro y Gracias a Dios que beneficiará a los niños de Prebásica de estas regiones.

**VI. Recomendaciones**

- Realizar evaluaciones periódicas de los proyectos para ayudar a identificar áreas de mejora y tiempos entrega de las metas físicas para el 2024
- Agilizar los procesos de licitaciones de obras en la Fase II del proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Prebásica en Honduras.
- Seguimiento y Monitoreo por cada responsable de los procesos.
- Diálogo permanente y sistemático entre la UCP y la gerencia del préstamo del BM.
- Capacitación de las Comisiones Evaluadoras.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# ANEXOS





## ANEXO No 2

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2024**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2024		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Educación	007 - PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	03 - Dotación de herramientas pedagógicas (tales como manuales técnicos para BTP-PAA y nueva oferta académica, así como licencias de simuladores virtuales) a la población estudiantil de los niveles educativos (Pre-básica, Básica y Media) con enfoque en el fortalecimiento y mejora integral de la calidad educativa.	1016 - EDUCANDO	1	0	-	0	0	-
		04 - Capacitaciones de Formación Técnico Profesional en el sector agroforestal, industrial incluye Procesamiento Agroalimentario en Centros Educativos focalizados.	1016 - EDUCANDO	3,169	0	-	0	0	-
		05 - Implementación de Proyectos de Infraestructura Educativa en los niveles Pre-básica, Básica y, de manera limitada, en el nivel Medio, en los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Copán, Francisco Morazán, Valle, Choluteca, Comayagua y Gracias a Dios, con enfoque en equidad, género, inclusión y participación.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	87	0	-	0	0	-
		06 - Diseño y formulación de proyectos de infraestructura escolar con enfoque en la promoción y respeto de los derechos humanos y la mejora integral de la calidad educativa.	305 - PROYECTO	2	0	-	0	0	-
		14 - Diseño y formulación de proyectos de infraestructura escolar con enfoque en la promoción y respeto de los derechos humanos y la mejora integral de la calidad educativa, correspondiente a la Fase IV..	305 - PROYECTO	1	0	-	0	0	-
		010 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS	06 - Desarrollo e Implementación del Modelo de la Calidad de la Educación Pre-básica (MCEPB).	82 - SISTEMA	2	0	-	0	0
	07 - Promoción de la participación comunitaria en la educación Pre-básica.		300 - ORGANIZACION	110	0	-	0	0	-
	08 - Mejora de la organización de los sistemas de planificación y monitoreo de la SE.		101 - CENTRO EDUCATIVO	52	0	-	0	0	-
	09 - Mejora de la capacidad operativa, administrativa y técnica de los recursos humanos (RRHH) para el nivel de Educación Pre-básica.		74 - PERSONA	25	0	-	0	0	-
	11 - Actualización del diseño curricular del nivel de educación Pre-básica y materiales de aprendizaje asociados, y su provisión.		32 - DOCUMENTO	2	0	-	0	0	-
	12 - Apoyo a la implementación de prácticas pedagógicas mejoradas.		32 - DOCUMENTO	1	0	-	0	0	-
	13 - Implementación de herramientas de medición para el desarrollo infantil y la calidad de los entornos de aprendizaje.		547 - ESTUDIO	1	0	-	0	0	-
	15 - Mejoramiento de los entornos físicos de aprendizaje en los centros de educación Pre-básica existentes en áreas focalizadas.		333 - AULA	1	0	-	0	0	-
	16 - Gestión y Evaluación del proyecto.		149 - INFORME	4	0	-	1	0	-
	17 - Implementación del diplomado Capacidades Pedagógicas para Docentes y Educadoras en Educación Pre-básica.		31 - DOCENTE	2,000	0	-	0	0	-
	011 - PROGRAMA DE RECONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS ESCOLARES PRODUCTIVOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE HONDURAS, FASE I		08 - Equipamiento de mobiliario escolar en centros educativos de los niveles de educación Pre-básica, Básica y Media, como parte de la intervención integral en infraestructura, dotación de recursos y la implementación de huertos escolares productivos.	101 - CENTRO EDUCATIVO	88	0	-	0	0
		09 - Gestión eficiente de recursos para el programa de intervención en infraestructura educativa, dotación de mobiliario y equipo, e implementación de huertos escolares productivos, con el fin de mejorar las condiciones físicas y calidad de educación en los niveles educativos de Pre-básica, Básica y Media, promoviendo el desarrollo de competencias pedagógicas y sociales, así como el impulso hacia la Seguridad Alimentaria en la población estudiantil.	104 - RECURSO	2	0	-	0	0	-
		10 - Diseño y formulación de proyectos de infraestructura de centros educativos buscando aumentar significativamente las condiciones físicas y la calidad educativa en los niveles de educación Pre-básica, Básica y Media.	579 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA	151	0	-	0	0	-

Fuente: SIAFI, 30/09/2024
