



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL II TRIMESTRE 2025

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAAH)

Tegucigalpa, Honduras

Julio, 2025

www.sefin.gob.hn

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-financiera de la Inversión Pública

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAI) es una institución autónoma, científica y técnica dedicada a la protección, investigación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural del país para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural de la sociedad hondureña.

El gobierno de la República pretende fomentar la conservación, participación y el disfrute del Patrimonio Cultural en la ciudadanía. Se busca también impulsar la visión de un país con una riqueza cultural capaz de convertirse en factor de cohesión e inclusión social de los/as hondureños/as. Para ello, el IHAI pretende impulsar las alianzas con los actores locales (municipalidades, gestores de la cultura, investigadores, instituciones educativas) y concebir una política de Patrimonio Cultural en el que se incluya la diversidad de culturas que han poblado y el territorio hondureño.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II
Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	32,938,218
Inversión Productiva	18,094,639
Formación Bruta de Capital	14,843,579
Presupuesto Vigente	56,761,710
Inversión Productiva	18,094,639
Formación Bruta de Capital	38,667,071
Ejecutado II Trimestre	9,441,015
Inversión Productiva	2,522,561
Formación Bruta de Capital	6,918,454
% Ejecución (Devengado II Trim- 2025/Vigente)	16.6%
Ejecutado Anual	11,927,321
Inversión Productiva	2,693,140
Formación Bruta de Capital	9,234,181
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	21.0%

Nota: SIAFI, 30/06/2025

Al Segundo-Trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L56.8 millones**, concentrando **L18.1 millones** para Inversión productiva y **L38.7 millones** para la formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al segundo trimestre de **L2.5 millones** en inversión productiva y **L6.9 millones** en formación bruta de capital, lo que en su conjunto representa el 16.6% respecto al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.


Dicha ejecución se llevó a cabo a través del proyecto Apoyo para la Defensa, Rescate, Manejo, Protección, Promoción, Mantenimiento, Valoración Histórica y Transmisión a las Generaciones Futuras de los Bienes que Conforman el Patrimonio Cultural de Honduras, el cual está enfocado en el fortalecimiento integral del IHAH para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos en 9 departamentos del país y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

En referencia al financiamiento de Inversión Pública, la totalidad de los recursos proveniente de fondos nacionales con un monto de **L56.8 millones**, Dicha inversión es financiada en su totalidad por la Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al II -Trimestre (2023-2025):

En el período comprendido entre el 2023 y el 2025, únicamente se ha considerado, la ejecución del proyecto antes mencionado, financiado en su totalidad con recursos nacionales.

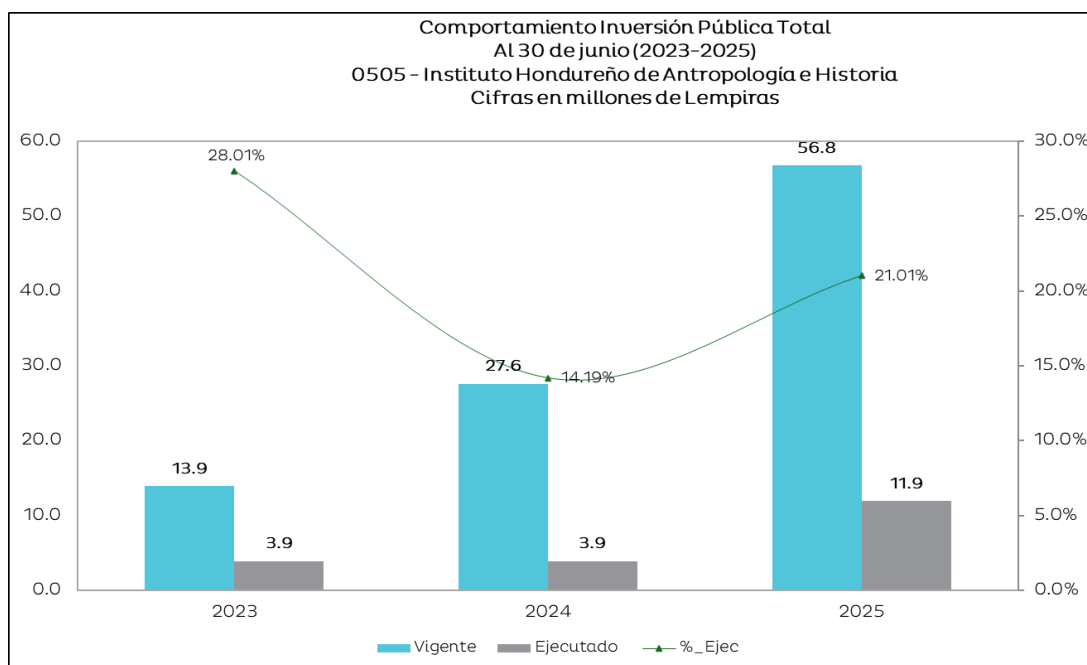

Se presenta una comparación porcentual de la ejecución presupuestaria acumulada al 30 de junio, correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025. En dicha gráfica se observa una tendencia creciente en los niveles de ejecución de los recursos asignados.

Particularmente, en el año 2025 se destaca un incremento significativo en la inversión, alcanzando un monto de L11.9 millones, lo que equivale al 21% del presupuesto asignado para el año. Este resultado evidencia una ejecución satisfactoria al cierre del segundo trimestre, reflejando un mejor desempeño institucional en la gestión de los recursos en comparación con los años anteriores.

Este avance sugiere una mayor eficiencia en la planificación y ejecución de los proyectos institucionales, así como un fortalecimiento en los mecanismos de seguimiento y control presupuestario.

d. Principales Proyectos

En el II -Trimestre del año 2025, la inversión se concentró en un proyecto para fortalecimiento integral del instituto hondureño de antropología e historia, para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos, museos, archivos históricos e inmuebles de patrimonio en 9 departamentos del país, para los cuales se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

- 1. Proyecto Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de Patrimonio 9 Departamentos del País:**

El Proyecto contempla la restauración y rehabilitación de 5 inmuebles de patrimonio cultural de Honduras, 12 investigaciones, distribuidas en zonas arqueológicas históricas y etnohistóricas, creando un sistema de gestión documental elaborado e implementado un Plan Estratégico Institucional; dichos entregables se desarrollarán en 9 departamentos del país que abarcan 16 municipios, en la zona de influencia del proyecto.

Los principales avances físicos al 30 de junio de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, II -Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			II - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	2	40%	3	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025

El mayor logro de esta actividad Restaurados y rehabilitados patrimonio del país como se muestra en el cuadro es que las empresas han finalizado la restauración del techo del Museo de Comayagua.

Restaurar la cubierta del inmueble de Casa Valle, Choluteca, Choluteca Se público en Honducompras y se les informó a las empresas que participaron. A principios del mes de julio se firmará el contrato y se dará la orden de inicio.

Restaurar y rehabilitar la Casa Fortín, en Yuscarán, El Paraíso, está en proceso de revisión técnica, la visita técnica al inmueble con el fin de realizar actualización de patologías, análisis de la situación actual y levantamiento arquitectónico. Se alojó el Proceso en Honducompras.

Restaurar la Antigua Comandancia de la Fortaleza Santa Bárbara de Trujillo, Colón, Se conformó la comisión para la apertura y evaluación de las ofertas y se reunió la Comisión para dar inicio al proceso de apertura y evaluación de las ofertas.

Acceso Inclusivo en la Fortaleza de San Fernando en Omoa, Actualmente se está trabajando en el diseño de la cedula inclusiva, elaborando réplicas de algunas piezas relevantes y añadiendo sistema braille a la cedula de objetos. Para mediados del II trimestre se realizará una visita con personal de la Subgerencia de Conservación para el diseño de una rampa de madera curada para garantizar el acceso a personas con dificultad motora a la terraza de la fortaleza.

Con el proyecto, se benefician 2,835,288 habitantes en 9 departamentos del País.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al I trimestre 2025 Proyecto para Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles de patrimonio 9 departamentos del país:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio – Fin
Fortalecimiento integral del instituto hondureño de antropología e historia, para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos, museos, archivos históricos e inmuebles de patrimonio 9 departamentos del país	FN-25617-1	Lempiras	L31,707,186.40	01/04/2024
				27/2/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Deuengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2025	18,094,639.00	18,094,639.00	2,522,560.95	13.9%
Acumulado 2025	18,094,639.00	18,094,639.00	2,693,140.45	14.9%
Acumulado Vida del Proyecto **	31,707,186.40	31,707,186.40	16,272,819.82	51.3%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

d.1 Principales Adquisiciones al II -Trimestre 2025

- Estabilización del Terreno y Restauración del Inmueble del Museo Villa Roy etapa II.
- Investigaciones históricas de los Centros Mineros inscritos en la Lista Indicativa de Honduras.
- Sistema de Gestión Documental en el Archivo Ethnohistórico del IHAH.
- Restaurados y rehabilitados patrimonio del país.

e. Gestión de la Inversión

- Proyecciones mensuales de ejecución financiera.
- Reuniones ejecución física y financiera.
- Modificaciones Presupuestarias.
- Enmienda a la nota prioridad.

f. Problemática y Acciones Durante el II - Trimestre-2025

- Las obras restauración y rehabilitación de patrimonio del país de algunas aún se encuentran en etapa de publicación o evaluación en el sistema Honducompras, lo que retrasa la firma de contratos y el inicio efectivo de obras, se Agilizado los procesos de contratación, pero cumpliendo con la normativa y la ley contratación de estado de Honduras.

V. Conclusiones

- La finalización de la restauración del techo del Museo de Comayagua representa un logro importante en la protección del patrimonio histórico del país, reflejando una mejora en la ejecución institucional de proyectos culturales.
- La puesta en marcha de diversos proyectos en diferentes regiones del país demuestra el compromiso por preservar y rehabilitar edificaciones emblemáticas, fortaleciendo la identidad cultural y promoviendo el turismo histórico.
- Se están desarrollando acciones concretas para garantizar el acceso inclusivo en espacios patrimoniales, como el uso de sistema braille, réplicas táctiles y diseño de rampas de acceso para personas con discapacidad, lo cual es un paso clave hacia una cultura más accesible.

VI. Recomendaciones

- Establecer cronogramas internos de seguimiento con fechas clave para cada etapa (publicación, recepción, evaluación, firma de contrato) y reforzar la coordinación con el sistema Honducompras para evitar retrasos innecesarios.
- Invertir en la capacitación continua del personal técnico y en la contratación de especialistas en restauración, arquitectura patrimonial e ingeniería estructural, para mejorar la calidad y rapidez de los diagnósticos y levantamientos.
- Crear un sistema de seguimiento mensual para cada proyecto, con indicadores de avance físico y financiero, alertas tempranas de desviaciones y acciones correctivas en tiempo real.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado II Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	2,522,561.0	2,522,561.0	13.9	2,693,140.4	2,693,140.4	14.9
1	FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS	FN-25617-1	18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	2,522,561.0	2,522,561.0	13.9	2,693,140.4	2,693,140.4	14.9
	Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN		18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	2,522,561.0	2,522,561.0	13.9	2,693,140.4	2,693,140.4	14.9
	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		14,843,579.0	14,843,579.0	38,667,071.0	38,667,071.0	6,918,453.9	6,918,453.9	17.9	9,234,180.9	9,234,180.9	23.9
	ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	6,725,252.0	6,725,252.0	2,458,262.3	2,458,262.3	36.6	3,292,322.8	3,292,322.8	49.0
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	6,725,252.0	6,725,252.0	2,458,262.3	2,458,262.3	36.6	3,292,322.8	3,292,322.8	49.0
	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.		1,211,032.0	1,211,032.0	29,211,216.0	29,211,216.0	4,134,322.5	4,134,322.5	14.2	5,563,589.7	5,563,589.7	19.0
	Total ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.		1,211,032.0	1,211,032.0	29,211,216.0	29,211,216.0	4,134,322.5	4,134,322.5	14.2	5,563,589.7	5,563,589.7	19.0
	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		-	-	2,730,603.0	2,730,603.0	325,869.1	325,869.1	11.9	378,268.4	378,268.4	13.9
	Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		-	-	2,730,603.0	2,730,603.0	325,869.1	325,869.1	11.9	378,268.4	378,268.4	13.9
	CONSERVACIÓN DEL MUSEO VILLA ROY		13,612,547.0	13,612,547.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - CONSERVACIÓN DEL MUSEO VILLA ROY		13,612,547.0	13,612,547.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.		20,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total - INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.		20,000.0	20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 30/06/2025



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No 2

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia								
Fortalecimiento Integral Del Instituto Hondureño De Antropología E Historia, Para La Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo E Investigación En Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos E Inmuebles De Patrimonio 9 Departamentos Del País	Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	2	40%	3	0	0%

