

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2025

*Instituto Hondureño para la Prevención y
Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción
y Farmacodependencia (IHADFA)*

Tegucigalpa, Honduras

Octubre, 2025

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

El Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia

(IHADFA), tiene a su cargo la investigación, prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades del alcoholismo, tabaquismo, drogadicción y farmacodependencia, promoviendo de esta manera una salud mental positiva en la población hondureña.

El “Plan de Gobierno Bicentenario para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022-2026)”, considera la promoción de la salud mental

positiva en la población hondureña, sin discriminación de género, raza o religión, a través de la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas lícitas e ilícitas que impacten en la disminución del consumo de sustancias psicoactivas.

Al Tercer Trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente para la inversión pública de **L67.1 millones**; de los cuales se alcanzó una ejecución de **L13.9 millones**, representativos del **20.8%** de cumplimiento; el presupuesto de inversión del IHADFA, se desglosa en **L62.9 millones** para inversión productiva de lo cual se ejecutó un **L10.9 millones**, **L0.6 millones** para inversión social, y la ejecución en formación bruta de capital es **2.9 millones**; tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

La ejecución de la inversión productiva de la institución fue ejecutada a través del Proyecto de Construcción y equipamiento del edificio del Primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras (CENATRAH) en el

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al III Trimestre del
2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	67,131,970.0
Inversión Productiva	62,925,100.0
Inversión Social	835,049.0
Formación Bruta de Capital	3,371,821.0
Presupuesto Vigente	67,154,754.0
Inversión Productiva	62,925,100.0
Inversión Social	857,833.0
Formación Bruta de Capital	3,371,821.0
Ejecutado III Trimestre	13,935,115.1
Inversión Productiva	10,967,048.6
Inversión Social	55,817.5
Formación Bruta de Capital	2,912,249.0
% Ejecución (Devengado III Trim-2025/Vigente)	20.8%
Ejecutado Anual	49,358,041.5
Inversión Productiva	45,432,016.2
Inversión Social	857,816.3
Formación Bruta de Capital	3,068,209.0
% Ejecución (Devengado Anual/Vigente)	73.5%

Nota: SIAFI, 30/09/2025


Municipio de Orica, Francisco Morazán.

b. Comportamiento de la Ejecución al III Trimestre (2023-2025)

En el periodo comprendido entre el 2023 y el 2025, la Inversión Pública del IHADFA se ha concentrado en la inversión social y la formación bruta de capital; en el 2024 se incluye la ejecución del mencionado proyecto de inversión.

Las actividades y obras de ese proyecto están orientadas a la construcción, supervisión, equipamiento y fortalecimiento tecnológico del CENATRAH.

Gráfico No.1

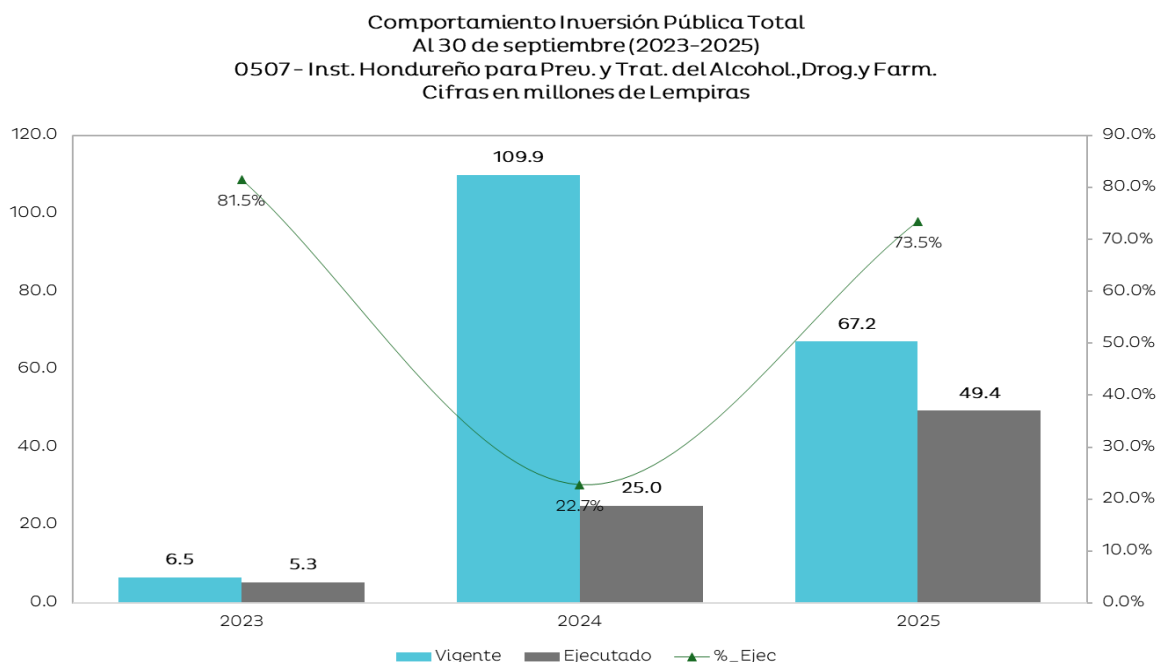

El Gráfico No. 1 presenta la ejecución porcentual comparativa de la inversión al 30 de septiembre de los últimos tres años. En 2025, se registra una ejecución del 73.5%, correspondiente a la inversión destinada a la sostenibilidad de los centros de rehabilitación en funcionamiento. Esto representa un incremento significativo en comparación con 2024, año en el que se alcanzó una ejecución del 22.7%, equivalente a L25.0 millones respecto al presupuesto vigente. En dicho período, se incluyen los tres tipos de inversión que conforman la inversión total de la institución.

c. Principales Proyectos

Como se ha mencionado, la inversión productiva del IHADFA contempla la ejecución del Proyecto de Construcción y equipamiento del edificio del Primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras (CENATRAH) en el Municipio de Orica, Francisco Morazán; a continuación, se detallan los principales avances físicos al 30 septiembre del 2025:

Principales Metas Físicas, III - Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			III -Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construcción y supervisión del CE NATRAH	Obra	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 30/06/2025

La construcción del Centro Nacional de Tratamiento de Adicciones de Honduras (CENATRAH) culminó exitosamente, dotando al edificio del equipamiento médico y tecnológico necesario para su adecuado funcionamiento. La entrega del inmueble se realizó en el mes de agosto, y su inauguración oficial tuvo lugar en septiembre. Este logro se enmarca en los procesos de licitación ejecutados conforme a la Ley de Contratación del Estado de Honduras, garantizando la transparencia y competitividad en la adjudicación de obras, bienes y servicios.

El proyecto se desarrolló según el cronograma establecido, cumpliendo las etapas de licitación que aseguraron la disponibilidad de estudios y diseños técnicos, así como estimaciones presupuestarias completas y precisas, lo que permitió evitar retrasos en la ejecución de los contratos y en su financiamiento, beneficiará a 5,000 personas por año.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Proyecto de la referencia al III -Trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio – Fin
Construcción y Equipamiento del Edificio del primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras	FN-25591-1	Lempiras	105,739,351.00	01/04/2024 -01/07/2025
		Lempiras	L105,739,351.00	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
III-Trimestre 2025	62,925,100.0	62,925,100.0	10,967,048.6	17.4%
Acumulado 2025	62,925,100.0	62,925,100.0	45,432,016.2	72.2%
Acumulado Vida del Proyecto **	105,739,351.0	105,739,351.0	95,158,350.0	90.0%

d.1. Principales Adquisiciones III- Trimestre 2025

La Unidad Ejecutora del proyecto de acuerdo con sus PAC´s y PEP´s ha efectuado los procesos siguientes:

- Equipamiento del edificio CENATRAH
- Fortalecimiento tecnológico del edificio CENATRAH

d.2. Programas Sociales

Al Tercer Trimestre del 2025, el presupuesto vigente asciende a L857,833 de lo cual se ejecutó L857,816 el 100% en la Atención Médica especializada a personas que sufren adicciones. Así mismo, se logró ejecutar L3,068,209 en formación bruta de capital, el cual se utilizó para la adquisición de equipamiento y demás para el funcionamiento de los centros de rehabilitación a nivel nacional.

d. Gestión de la Inversión

Para el Tercer Trimestre del 2025, se realizaron las siguientes gestiones:

- Aplicación de Procedimiento para Extensión de la Ampliación de Plazo.
- Dictamen Técnico de Modificación entre Categorías de Inversión del proyecto.

- Reuniones de Monitoreo y Seguimiento de avances físicos-financieros
- Modificaciones Presupuestarias
- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualiza la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Acompañamiento al proyecto durante su ejecución.

e. Problemática y Acciones Durante el III - Trimestre-2025

Problemática

- El proyecto presentó atrasos debido a que la duración correspondiente a 15 meses de ejecución resultó insuficiente ya que los componentes 1, 2 y 3 no se lograron ejecutar en su totalidad, debido a que la nota de prioridad fue emitida después de la fecha de inicio programada del proyecto y los desembolsos también se realizaron después de la fecha programada por lo que fue necesario ampliar la fecha de fin del proyecto al 10 de octubre del 2025

Acciones

- Revisión y ajuste de los plazos de ejecución, considerando los tiempos reales requeridos para los procesos administrativos previos, como la emisión de notas de prioridad y los desembolsos iniciales.
- Fortalecer la coordinación interinstitucional entre las unidades ejecutoras, financieras y administrativas, para garantizar la sincronización entre la aprobación del proyecto y el inicio de la ejecución.

V. CONCLUSIONES

- A pesar de que el plazo de 15 meses resultó insuficiente para cumplir con la totalidad de las actividades planificadas; el proyecto demostró avances significativos en la ejecución de sus componentes.
- Los retrasos en la emisión de la nota de prioridad y en los desembolsos financieros afectaron directamente el cumplimiento del cronograma, limitando la ejecución oportuna de los componentes 1, 2 y 3.

Durante 2024 y 2025, el aumento en la ejecución evidencia el compromiso institucional con la operatividad sostenible de los centros de rehabilitación.

VI. RECOMENDACIONES

- Incorporar en los cronogramas de ejecución los tiempos reales que requieren los procesos administrativos y financieros, especialmente la emisión de notas de prioridad, aprobaciones presupuestarias y desembolsos iniciales.
- Mejorar la comunicación y articulación entre las unidades ejecutoras, financieras y administrativas para garantizar la alineación de los procesos de licitación, financiamiento y ejecución física de los proyectos.
- Implementar mecanismos de planificación financiera que permitan disponer de los fondos en las fechas establecidas, evitando retrasos en el inicio o continuidad de las obras.
- Hacer todos los procedimientos conforme a Ley para el Cierre financiero, presupuestario, administrativo y técnico del proyecto.

ANEXOS

ANEXO 1

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución/ Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado III Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig)
1	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.		62,925,100	62,925,100	62,925,100	62,925,100	10,967,049	10,967,049	17.4%	45,432,016	45,432,016	72.2%
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES EN HONDURAS	FN-25591-1	62,925,100	62,925,100	62,925,100	62,925,100	10,967,049	10,967,049	17.4%	45,432,016	45,432,016	72.2%
	Total CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO DEL PRIMER CENTRO NACIONAL DE TRA		62,925,100	62,925,100	62,925,100	62,925,100	10,967,049	10,967,049	17.4%	45,432,016	45,432,016	72.2%
	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.		835,049	835,049	857,833	857,833	55,818	55,818	6.5%	857,816	857,816	100.0%
	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE SUFREN ADICCIONES		835,049	835,049	857,833	857,833	55,818	55,818	6.5%	857,816	857,816	100.0%
	Total ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA A PERSONAS QUE SUFREN ADICCIONES		835,049	835,049	857,833	857,833	55,818	55,818	6.5%	857,816	857,816	100.0%
	0507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.		3,371,821	3,371,821	3,371,821	3,371,821	2,912,249	2,912,249	86.4%	3,068,209	3,068,209	91.0%
	JÓVENES (MUJERES Y HOMBRES) CAPACITADOS EN TEMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS		3,371,821	3,371,821	3,371,821	3,371,821	2,912,249	2,912,249	86.4%	3,068,209	3,068,209	91.0%
	Total JÓVENES (MUJERES Y HOMBRES) CAPACITADOS EN TEMA DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO		3,371,821	3,371,821	3,371,821	3,371,821	2,912,249	2,912,249	86.4%	3,068,209	3,068,209	91.0%

ANEXO 2

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL III TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			III Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0507-Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia								
Construcción y Equipamiento del Edificio del Primer Centro Nacional de Tratamiento de las Adicciones en Honduras (CENATRAH)	Construcción y supervisión del CE NATRAH	Obra	1	1	100%	1	1	100%

Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos
