



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# Informe de Avance Físico y Financiero

## PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

*Secretaría de Desarrollo  
Comunitario, Agua y  
Saneamiento (SEDECOAS)*

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

[www.sefin.gob.hn](http://www.sefin.gob.hn)

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIONES PÚBLICAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

### a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento en Honduras, (SEDECOAS), se dedica a promover el desarrollo comunitario a través de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos. La institución trabaja en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable del país.

Cuadro No. 01  
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del  
Cifras en Lempiras


Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>2,041,559,773.0</b>
Inversión Productiva	351,030,506.0
Inversión Social	1,399,745,003.0
Formación Bruta de Capital	290,784,264.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>416,924,276.0</b>
Inversión Productiva	400,847,344.0
Inversión Social	0.0
Formación Bruta de Capital	16,076,932.0
<b>Ejecutado IV Trimestre</b>	<b>59,032,755.3</b>
Inversión Productiva	58,684,932.1
Inversión Social	0.0
Formación Bruta de Capital	347,823.3
<b>% Ejecución (Devengado IV Trim- 2024/Vigente)</b>	<b>14.2%</b>
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>328,823,646.5</b>
Inversión Productiva	312,747,600.3
Inversión Social	0.0
Formación Bruta de Capital	16,076,046.2
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>78.9%</b>

Nota: SIAFI, 31/12/2025

Al IV trimestre del 2025 la institución contó con un presupuesto vigente L 416.9 millones; para la ejecución productiva a través del proyecto Programa de Agua y Saneamiento en Honduras. La ejecución presupuestaria del cuarto trimestre ascendió a L59.0 millones (14.2%), tal como se detalla en el cuadro anterior. Es importante mencionar que las obras del proyecto se encuentran en su etapa inicial (pago de anticipos) por lo que aún no hay una ejecución física de obras como tal.

## b. Financiamiento de la Inversión Pública

La inversión ejecutada por la SEDECOAS proviene de fuentes de financiamiento externo y recursos del tesoro nacional.

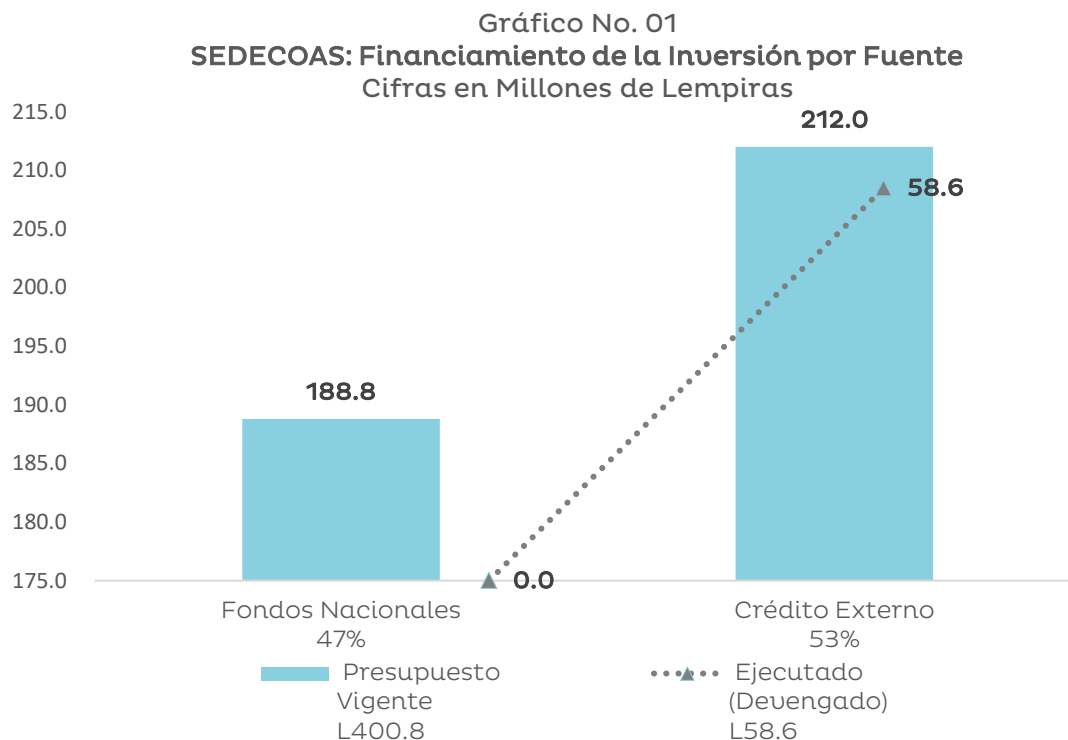


Fuente: SIAFI

Del total del financiamiento vigente para fondos provenientes de crédito externo expresado en términos monetarios con un monto de L212.0 que corresponde al 53% y del tesoro nacional un monto de L188.8 que representan el 47% del total del presupuesto vigente L 400.8

### c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2023-2025)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2023 y 2025, basado en los montos vigentes y ejecutados:

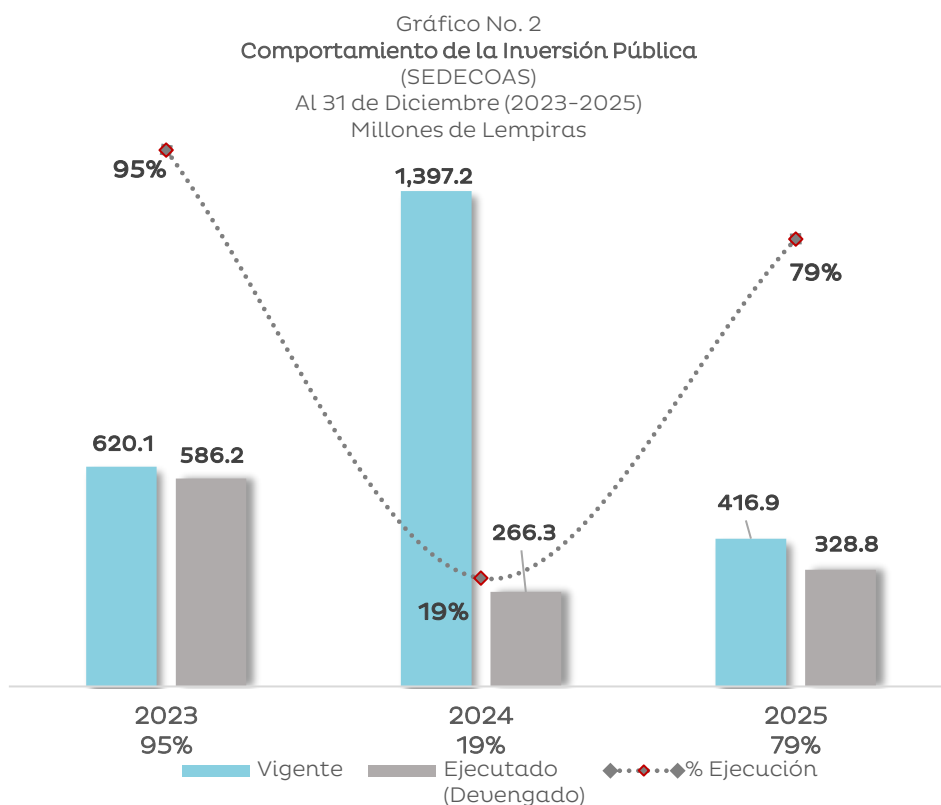

Fuente SIAFI

En la gráfica se detalla un incremento significativo del presupuesto vigente pasando de una asignación de L620.1 millones en 2023 a L1,397.2 millones en 2024, año para el que el Congreso Nacional de la República aprobó espacio presupuestario para ajustador de inversión pública de la institución para el financiamiento de nuevas iniciativas de proyectos. Sin embargo, para el 2025 disminuyó a L 416.9 a fin de que la institución iniciara los procesos de ejecución de las nuevas iniciativas de inversión.

En cuanto al porcentaje de ejecución, en el año 2023 a nivel institucional se reporta una ejecución de L586.2 millones, que representa el 95% con relación a su presupuesto vigente, en el año 2024 el monto ejecutado disminuyó a L266.3 millones que representó apenas el 19% en relación con su presupuesto vigente y para el 2025 se alcanzó una ejecución de L328.8 millones que representan el 79% de cumplimiento.



#### d. Principales Proyectos

En el cuarto trimestre de 2025, la inversión productiva se concentra en el Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros del proyecto de acuerdo con su presupuesto vigente:

#### 1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento. Para lograr el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rural.
- Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del cambio climático (CC) sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Los principales avances físicos al 31 de Diciembre de 2025 son los siguientes:

#### Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Programación	Ejecución	% EJEC.	Programación	Ejecución	% EJEC.
Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades	SISTEMA	0	0	0%	0	0	0%

*Fuente: SEDECOAS, al 31 de diciembre de 2025*

Al cuarto trimestre, el Programa se encuentra en etapa inicial de licitaciones de procesos, se espera que la ejecución inicie a partir del año 2026.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Agua Potable y Saneamiento En Honduras al IV trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Programa de Agua Potable y Saneamiento En Honduras	BID5284/BL-HO	US\$45,000,000	1,185,479,550.00	01/12/2023-23/11/2028
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
IV Trimestre 2025	351,030,506	206,030,506	58684932.1	28%
Acumulado 2025	351,030,506	206,030,506	123940600.6	60%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,185,479,550	1,185,479,550	127,781,681.56	11%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399por US\$1.00

Al cierre del trimestre, se resaltan los siguientes avances:

- El programa logró adjudicar los contratos de supervisión de las obras de micro captación pluviál (8 proyectos), igualmente para las obras de proyectos rurales de Paquete 1 (5proyectos), en total 9 proyectos.
- Se ha avanzado con el proceso de Licitación de obras para los proyectos del Paquete 1, Lote 3: Agua Potable en la aldea de Sanata Ana de Yusguare en Choluteca y la planta potabilizadora filtración en múltiples etapas (FIME) en San Jerónimo, Comayagua. Igualmente se avanzó con el proceso de Licitación de obras para los proyectos de cosecha de aguas lluvias o micro captación pluviál para aldeas en el departamento de Intibucá, en municipios de San Marcos de la Sierra y Concepción.
- Se elaboró el borrador final del Convenio Piloto de Fortalecimiento Comunitario y municipal para las localidades de Irióna Colón y San Marcos de la Sierra en Intibucá a ser firmado con el SANAA. Dicho proceso se encuentra en aprobación de la dirección legal del FHIS
- Se logró contratar y dar orden de inicio a la firma supervisora del proyecto de Línea de Impulsión SANAA-Barrios.



#### **d.1. Principales Adquisiciones IV Trimestre 2025**

El proyecto ejecutado por SEDECOAS, no reporta ninguna adquisición al cierre del IV Trimestre.

#### **e. Gestión de la Inversión**

- En atención al oficio DSM-0789-2025 de fecha 27 de octubre de 2025 el proyecto solicita modificación presupuestaria entre objetos de gasto de capital, ya que el programa requiere efectuar una readecuación del presupuesto asignado para el presenta año fiscal.
- Acompañamiento a la institución en las actividades previas a la ejecución del proyecto.

#### **f. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre-2025**

- La ausencia de convenios interinstitucionales formales ha impedido acciones legales y administrativas, La falta de firma de los convenios entre SEDECOAS, ERSAPS y SANAA ha frenado procesos clave como la contratación de consultorías, adquisición de equipos e implementación técnica, al no existir un marco legal que permita ejecutar los recursos comprometidos en el préstamo internacional.
- Limitaciones operativas por falta de personal, equipo y vehículos, inicio tardío de personal clave, como el Coordinador del Componente 1, junto con la ausencia de contrataciones para el Componente 2, afecta directamente la ejecución de actividades y el cumplimiento de metas.
- Los procesos de revisión legal en SERNA han superado los plazos estimados, retrasando la emisión de licencias ambientales necesarias para iniciar obras, Por otra parte, también se ha detectado la debilidad de no contar con un consultor legal que realice la función de revisión de contratos suscritos con las empresas contratistas y de supervisión, pólizas de seguros, etc.
- Condiciones meteorológicas adversas, como las lluvias intensas, han obligado a reprogramar actividades de socialización en comunidades, afectando el calendario establecido para el despliegue del personal supervisor y contratista en campo.

### **V. CONCLUSIONES**

- Se han dado pasos importantes, como la gestión de contrataciones, solicitudes de equipos y apoyo interinstitucional para el desarrollo de giras. No obstante, aún persisten retos que limitan la ejecución plena de las actividades. Estos desafíos estructurales y otros como el clima invitan para identificar soluciones sostenibles, con una mirada integral centrada en la eficiencia, la participación territorial y la mejora continua.



## **VI. RECOMENDACIONES**

- Promover la formalización oportuna de convenios y licencias a través de mesas técnicas con participación de todas las instituciones clave (ERSAPS, SANAA, SERNA) permitiría reducir cuellos de botella legales y administrativos. Estas acciones, además de anticipar soluciones, consolidan una cultura de trabajo conjunto y de responsabilidad compartida.
- Impulsar la provisión oportuna de equipos y vehículos, contribuirá directamente a la eficiencia de las actividades en territorio. Estos elementos, aunque operativos, son fundamentales para garantizar que el personal técnico desarrolle sus funciones en condiciones adecuadas y con un impacto real en las comunidades beneficiarias.



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

# ANEXOS



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025**  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	
108	I. Inversión Productiva																
3	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		-	351,030,506.0	351,030,506.0	188,807,000.0	212,040,344.0	400,847,344.0	-	58,684,932.1	58,684,932.1	14.6	188,806,999.7	123,940,600.6	312,747,600.3	78.0	
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS	BID5284/BL-HO	-	351,030,506.0	351,030,506.0	-	206,030,506.0	206,030,506.0	-	58,684,932.1	58,684,932.1	28.5	-	123,940,600.6	123,940,600.6	60.2	
	<b>Total PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS</b>		-	351,030,506.0	351,030,506.0	-	206,030,506.0	206,030,506.0	-	58,684,932.1	58,684,932.1	28.5	-	123,940,600.6	123,940,600.6	60.2	
3	PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		-	-	-	188,807,000.0	-	188,807,000.0	-	-	-	-	188,806,999.7	-	188,806,999.7	100.0	
	<b>Total PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS</b>		-	-	-	188,807,000.0	-	188,807,000.0	-	-	-	-	188,806,999.7	-	188,806,999.7	100.0	
	<b>II. Inversión Social</b>																
	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		1,399,745,003.0	-	1,399,745,003.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OTRAS INVERSIONES SOCIALES		1,399,745,003.0	-	1,399,745,003.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Total OTRAS INVERSIONES SOCIALES</b>		1,399,745,003.0	-	1,399,745,003.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>III. Formación Bruta de Capital</b>																
	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		290,784,264.0	-	290,784,264.0	16,076,932.0	-	16,076,932.0	347,823.3	-	347,823.3	2.2	16,076,046.2	-	16,076,046.2	100.0	
	PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS		290,784,264.0	-	290,784,264.0	16,076,932.0	-	16,076,932.0	347,823.3	-	347,823.3	2.2	16,076,046.2	-	16,076,046.2	100.0	
	<b>Total PROGRAMAS: EN ACCIÓN POR EL AGUA, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS VEHICULARES EN VARIOS DEPARTAMENTOS</b>		290,784,264.0	-	290,784,264.0	16,076,932.0	-	16,076,932.0	347,823.3	-	347,823.3	2.2	16,076,046.2	-	16,076,046.2	100.0	
	<b>Total general</b>		1,690,529,267.0	351,030,506.0	2,041,559,773.0	204,883,932.0	212,040,344.0	416,924,276.0	347,823.3	58,684,932.1	59,032,755.3	16.8	204,883,046.0	123,940,600.6	328,823,646.5	70.5	

Fuente: SIAFI, 31/12/2025



Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento	001 - Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	14 - Ejecución del Contrato de Obras de los sistemas de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		15 - Ejecución del Contrato de Supervisión de Obras de los sistemas de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		16 - Ejecución del Contrato de Obras de de las soluciones individuales de saneamiento PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		17 - Ejecución del Contrato de supervisión de las soluciones individuales de saneamiento PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		18 - Ejecución del Contrato con ONGs para la construcción los sistemas individuales de cosecha de agua. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		19 - Ejecución del Contrato de Inspectores (consultores individuales) de los sistemas individuales de cosecha de agua. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		20 - Contratación de las firmas consultoras que elaborarán los diseños. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		21 - Informe de los proyectos en ejecución con enfoque de género para evidenciar las oportunidades entre mujeres y hombres. PAPSH	149 - INFORME	1	0	0	0	0	0
		22 - Ejecución del Contrato construcción de obras de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		23 - Ejecución Contrato de Supervisión de obras de Agua Potable PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		24 - Ejecución del contrato de construcción de obras de Línea de Impulsión Barrios PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		25 - Ejecución Contrato de supervisión de	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0



Secretaría de  
**Finanzas**  
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		obras de Línea de Impulsión Barrios PAPSH							
		26 - Ejecución del Contrato de construcción obras de Alcantarillado PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		27 - Ejecución del Contrato de Supervisión de obras de Alcantarillado PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		30 - Contratación de firma para el diseño e implementación del plan. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		31 - Suscripción de Convenio de Cooperación SEDECOAS FHIS SANAA. PAPSH	26 - CONVENIO	1	0	0	0	0	0

Secretaría de Finanzas  
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública  
**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025**

Institución	Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
				Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
		32 - Contratación de firma para el diseño de obras de infraestructura. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0
		33 - Contratación de firma para el desarrollo de los cursos. PAPSH	155 - CONTRATO	1	0	0	0	0	0

**Fuente:** SIAFI, 31/12/2025
