



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAAH)

Tegucigalpa, Honduras

ENERO, 2026

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-financiera de la Inversión Pública

El Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) es una institución autónoma, científica y técnica dedicada a la protección, investigación, conservación y divulgación del Patrimonio Cultural del país para el fortalecimiento de la memoria histórica y la identidad cultural de la sociedad hondureña.

El Gobierno de la República pretende fomentar la conservación, participación y el disfrute del Patrimonio Cultural en la ciudadanía. Se busca también impulsar la visión de un país con una riqueza cultural capaz de convertirse en factor de cohesión e inclusión social de los/as hondureños/as. Para ello, el IHAH pretende impulsar las alianzas con los actores locales (municipalidades, gestores de la cultura, investigadores, instituciones educativas) y concebir una política de Patrimonio Cultural en el que se incluya la diversidad de culturas que han poblado y el territorio hondureño.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del
2025

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	32,938,218.0
Inversión Productiva	18,094,639.0
Formación Bruta de Capital	14,843,579.0
Presupuesto Vigente	58,285,345.0
Inversión Productiva	18,094,639.0
Formación Bruta de Capital	40,190,706.0
Ejecutado IV Trimestre	29,940,955.8
Inversión Productiva	7,791,467.6
Formación Bruta de Capital	22,149,488.2
% Ejecución (Devengado IV Trim-2024/Vigente)	51.4%
Ejecutado Anual	57,420,752.5
Inversión Productiva	17,960,464.3
Formación Bruta de Capital	39,460,288.2
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	98.5%

Nota: SIAFI, 31/12/2025

Al Cuarto Trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L58.3 millones**, concentrando **L18.1 millones** para Inversión productiva y **L40.2 millones** para la formación bruta capital; con una ejecución presupuestaria al último trimestre de **L7.8 millones** en inversión productiva y **L22.2 millones** en formación bruta de capital, lo que en su conjunto representa el 51.4% respecto al presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través del proyecto Apoyo para la Defensa, Rescate, Manejo, Protección, Promoción, Mantenimiento, Valoración Histórica y Transmisión a las Generaciones Futuras de los Bienes que Conforman el Patrimonio Cultural de Honduras, el cual está enfocado en el fortalecimiento integral del IHAH para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos en 9 departamentos del país y la formación bruta de capital. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

En cuanto al financiamiento de Inversión Pública, la totalidad de los recursos proveniente de fondos nacionales con un monto de **L58.3 millones**, Dicha inversión es financiada en su totalidad por la Tesorería General de la Republica.

c. Comportamiento de la Ejecución al IV -Trimestre (2023-2025):

En el período comprendido entre el 2023 y el 2025, únicamente se ha considerado, la ejecución del proyecto antes mencionado. A continuación, se presenta el comportamiento histórico del proyecto:

Gráfico No.1
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 31 de diciembre (2021-2025)
0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Cifras en millones de Lempiras

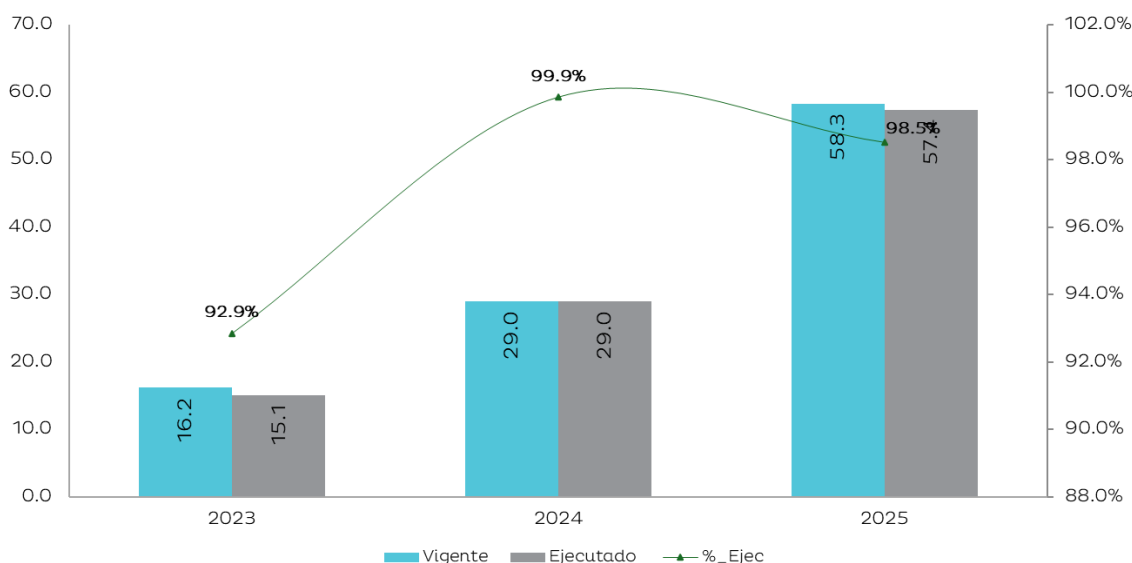

El Gráfico N.º1 muestra una comparación porcentual de la ejecución presupuestaria acumulada al 31 de diciembre correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025. Los resultados evidencian una tendencia creciente en los niveles de ejecución de los recursos asignados, destacándose el año 2025 como el período con mayor grado de ejecución.

De manera específica, durante 2025 se observa un incremento significativo en la inversión, alcanzando un monto de L 57.4 millones, equivalente al 98.5 % del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal. Este desempeño refleja una ejecución altamente satisfactoria al cierre del último trimestre y pone de manifiesto una mejora sustancial en la gestión institucional de los recursos en comparación con los años anteriores.

Este avance evidencia una mayor eficiencia en los procesos de planificación y ejecución de los proyectos institucionales, así como el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento, control y evaluación presupuestaria.

d. Principales Proyectos

En el Cuarto -Trimestre del año 2025, la inversión se concentró en el Proyecto Fortalecimiento Integral del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, para la Restauración, Rehabilitación, Acceso Inclusivo e Investigación en Sitios Arqueológicos, Museos, Archivos Históricos e Inmuebles

de Patrimonio 9 Departamentos del País, para los cuales se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

El Proyecto contempla la restauración y rehabilitación de 5 inmuebles de patrimonio cultural de Honduras, 12 investigaciones, distribuidas en zonas arqueológicas históricas y etnohistóricas, creando un sistema de gestión documental elaborado e implementado un Plan Estratégico Institucional; dichos entregables se desarrollarán en 9 departamentos del país que abarcan 16 municipios, en la zona de influencia del proyecto.

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV -Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	5	100%	2	2	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

Es importante resaltar que las labores de Estabilización del Terreno y Restauración del inmueble museo Villa Roy fueron finalizadas.

Restauración de la cubierta del inmueble de Casa Valle, Choluteca, Choluteca, está obra ya se encuentra finalizada, y como resultado, se logró la restauración total del ala oeste de la cubierta, la estructura de la cubierta de los corredores de a la interna.

Casa Fortín, en Yuscarán, El Paraíso, se adjudicó a finales del III trimestre, y se enfoca principalmente en la estructura física del edificio, haciendo énfasis en los sectores o áreas más críticas y que requieran intervención de manera urgente.

En el mes de agosto inició la Restauración de la Antigua Comandancia de la Fortaleza Santa Bárbara de Trujillo, Colón, se tenidos avances significativos (Desmontaje de estructuras de techo, Desmontaje del cielo falso, Suministro e instalación de Joists, Suministro e instalación de lámina, capa asfáltica y canales y Suministro e instalación de sistema eléctrico y luminarias)

Acceso Inclusivo en la Fortaleza de San Fernando en Omoa, inicio en el IV trimestre entre las actividades se destacan:

- Publicación en Honducompras.
- Visitas de inspección.
- Nombramiento de comisión para apertura y evaluación de ofertas.
- Emisión de resolución de adjudicación.
- Firma de contrato y orden de inicio.
-

Con el proyecto, se benefician 2,835,288 habitantes en 9 departamentos del País.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica al IV trimestre del 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio – Fin
Fortalecimiento integral del instituto hondureño de antropología e historia, para la restauración, rehabilitación, acceso inclusivo e investigación en sitios arqueológicos, museos.	FN-25617-1	Lempiras	L31,707,186.4	01/04/2024
				27/2/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV-Trimestre 2025	18,094,639.0	18,094,639.0	7,791,467.6	43.1%
Acumulado 2025	18,094,639.0	18,094,639.0	17,960,464.3	99.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	31,707,186.4	31,707,186.4	31,540,143.7	99.5%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

d.1 Principales Adquisiciones al IV Trimestre 2025

- Contratos para las Investigaciones históricas de los Centros Mineros inscritos en la Lista Indicativa de Honduras.
- Adquirido el Sistema de Gestión Documental en el Archivo Etnohistórico del IHAH.
- Contratos de Restaurados y rehabilitados patrimonios del país

e. Gestión de la Inversión

- En seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025, se actualizó la Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (septiembre - diciembre).
- Acompañamiento constante en Monitoreo y Seguimiento con la UCP/IHAH-DGIP-SEFIN.
- Atención a Modificaciones Presupuestarias.
- Cumplimiento de la Normativa Cierre Presupuestario

f. Problemática y Acciones Durante el IV - Trimestre-2025

- Se registraron atrasos en la etapa de precalificación debido al alto número de empresas participantes y al proceso de revisión y subsanación de documentación. Para mitigarlos, el comité realizó evaluaciones técnicas y administrativas, estableció plazos de corrección y concluyó el proceso con la preselección de 17 de las 19 empresas, garantizando la continuidad del proyecto.
- Se presentaron atrasos por la coordinación interinstitucional y con actores locales. Para superarlos, el IHAH fortaleció la planificación interna y la articulación con municipalidades y comunidades, alineando el proyecto con la Meta 4 del Plan Institucional 2022-2026.

V. Conclusiones

- A pesar de los atrasos presentados en los componentes de Restauración y Rehabilitación de Museos, Sitios e Inmuebles de Patrimonio y de Investigaciones Históricas y Etnohistóricas de Honduras, estos fueron atendidos mediante acciones oportunas y coordinadas por el IHAH.
- Los retrasos, derivados principalmente de procesos administrativos, técnicos y de coordinación interinstitucional, permitieron fortalecer los mecanismos de evaluación, planificación y articulación con actores clave.
- se garantizó la continuidad de los proyectos con empresas y actores que cumplen los requisitos establecidos, asegurando el cumplimiento de los objetivos institucionales y la adecuada protección, conservación y difusión del Patrimonio Cultural de la Nación.

VI. Recomendaciones

- Fortalecer la planificación anticipada de los procesos de contratación y precalificación, estableciendo cronogramas realistas que consideren la revisión y subsanación de documentación.
- Estandarizar y digitalizar los requisitos administrativos y técnicos para reducir tiempos de evaluación y corrección.
- Reforzar la coordinación interinstitucional y la comunicación temprana con municipalidades, comunidades y actores locales para evitar retrasos en la ejecución de actividades.
- Implementar mecanismos de seguimiento y control que permitan identificar oportunamente posibles retrasos y aplicar medidas correctivas.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS

ANEXO No 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente		Ejecutado IV Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		18,094,639.0	-	18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	7,791,467.6	7,791,467.6	43.1	17,960,464.3	17,960,464.3	99.3
1	FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN, ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLÓGICOS	FN-25617-1	18,094,639.0	-	18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	7,791,467.6	7,791,467.6	43.1	17,960,464.3	17,960,464.3	99.3
	Total FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN, REHAB		18,094,639.0	-	18,094,639.0	18,094,639.0	18,094,639.0	7,791,467.6	7,791,467.6	43.1	17,960,464.3	17,960,464.3	99.3
	0505 - Instituto Hondureño de Antropología e Historia		14,843,579.0	-	14,843,579.0	40,190,706.0	40,190,706.0	22,149,488.2	22,149,488.2	55.1	-	39,460,288.2	98.2
	ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	-	5,746,490.0	5,746,490.0	1,815,043.1	1,815,043.1	31.6	-	5,746,174.8	100.0
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		-	-	-	5,746,490.0	5,746,490.0	1,815,043.1	1,815,043.1	31.6	-	5,746,174.8	100.0
	ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGICOS, FORTALEZAS Y MUSEOS.		1,211,032.0	-	1,211,032.0	28,761,216.0	28,761,216.0	17,168,404.4	17,168,404.4	59.7	-	28,657,741.7	99.6
	Total ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES ARQUEOLÓGIC		1,211,032.0	-	1,211,032.0	28,761,216.0	28,761,216.0	17,168,404.4	17,168,404.4	59.7	-	28,657,741.7	99.6
	PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		-	-	-	5,683,000.0	5,683,000.0	3,166,040.7	3,166,040.7	55.7	-	5,056,371.7	89.0
	Total PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA.		-	-	-	5,683,000.0	5,683,000.0	3,166,040.7	3,166,040.7	55.7	-	5,056,371.7	89.0
	CONSERVACIÓN DEL MUSEO VILLA ROY		13,612,547.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL CONSERVACIÓN DEL MUSEO VILLA ROY		13,612,547.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL INVESTIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL		20,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI, 31/12/2025 (Preliminar)

ANEXO No 2

Principales Metas Físicas, IV- Trimestre-2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Restaurados y rehabilitados patrimonio del país	Inmuebles	5	5	100%	2	2	100%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/ 12/ 2025
