



Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSION PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

www.sefin.gob.hn

IV. PLAN DE INVERSION PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC), tiene la finalidad de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes

de la capital en el área rural y urbana, mediante programas y proyectos de desarrollo social o infraestructura, con el propósito de construir el desarrollo sostenible generando fuentes empleos del Distrito Central.

El Gobierno ha considerado dentro de sus prioridades, Promulgar en Ley el Presupuesto Municipal Participativo mediante el cual la ciudadanía en conjunto con sus autoridades locales, decidirán de forma vinculante la asignación de recursos públicos para diferentes proyectos municipales, priorizando una distribución equitativa para los grupos históricamente olvidados. Se realizarán asambleas comunales para la recolección de propuestas y se impulsará a la juventud de 13 a 25 años a ser parte del presupuesto participativo joven.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2025

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	485,633,136.0
Inversión Productiva	485,633,136.0
Presupuesto Vigente	231,432,136.0
Inversión Productiva	204,932,136.0
Formación Bruta de Capital	26,500,000.0
Ejecutado IV Trimestre	100,517,904.8
Inversión Productiva	97,871,076.5
Formación Bruta de Capital	2,646,828.3
% Ejecución (Devengado IV Trim-2025/Vigente)	43.4%
Ejecutado Anual	222,121,250.5
Inversión Productiva	199,438,000.9
Formación Bruta de Capital	22,683,249.6
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	96.0%

Nota: SIAFI, 31/12/2025

Al Tener más participación en el presupuesto, se garantiza transparencia dentro del gobierno y permite que las sociedades civiles tengan más impacto dentro de sus propias comunidades y se empoderen y propaguen la importancia del compromiso.

Al cierre del 2025, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L204.9 millones** para Inversión productiva; con una ejecución presupuestaria al IV del trimestre de **L97.9 millones** lo que representa el **(40.7%)** con relación al presupuesto vigente, con un presupuesto Formación Bruta de Capital de L26.5 millones y una ejecución de L2.7 al último trimestre que equivale al 2.6 del presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Dicha ejecución se llevó a cabo a través de la ejecución de un proyecto enfocado en el Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa.


b. Financiamiento de la Inversión Pública

Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la totalidad de los recursos corresponden a fondos provenientes de crédito externo proveniente del Banco Mundial, con un monto de **L231.4 millones**, Dicha inversión es financiada por el Banco Mundial con 100%

c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2023-2025):

En los años comprendidos entre el 2023 y el 2025, la Inversión Pública de la AMDC ha considerado la ejecución 1 Proyecto de Inversión, financiados en su totalidad con recursos de crédito externo, a continuación, se muestra gráficamente la inversión histórica del proyecto.

Grafica No.1

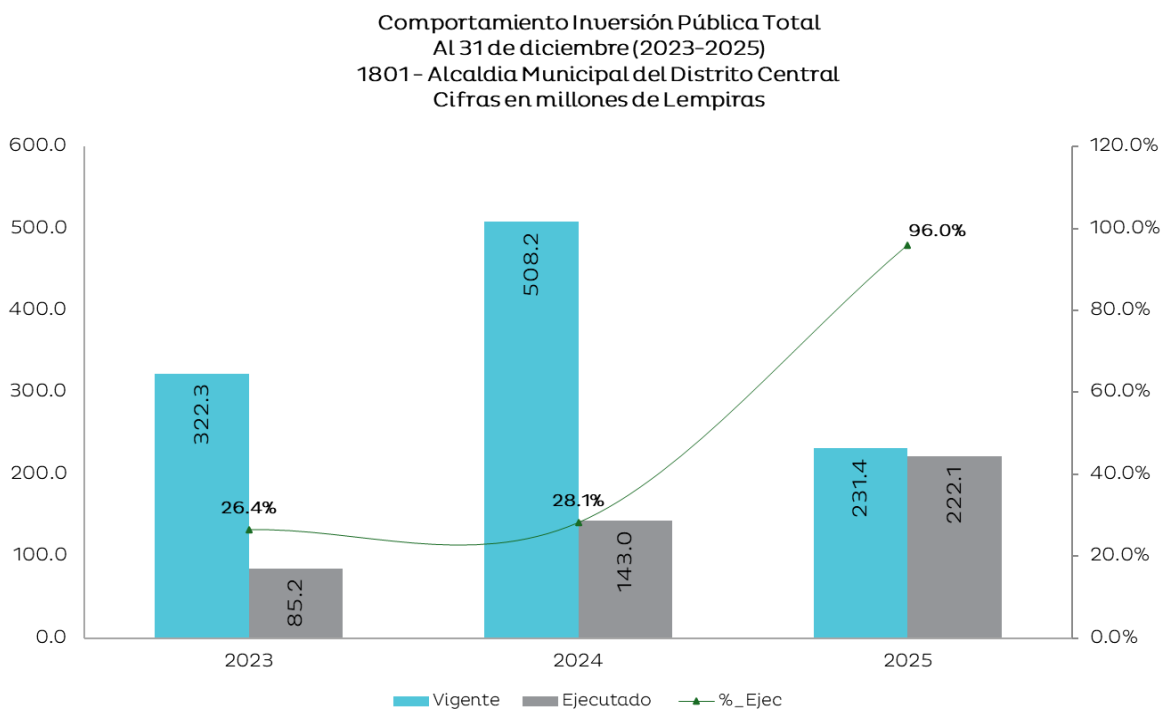

La Gráfica No. 1 presenta un análisis comparativo de la ejecución presupuestaria al cierre del 31 de diciembre correspondiente a los años 2023, 2024 y 2025. Los resultados reflejan un incremento notable en los niveles de ejecución durante los años 2024 y 2025, registrándose inversiones por **L 143.0 millones** y **L 222.1 millones**, que representan **el 28.1 %** y **el 96.0 %** del presupuesto vigente, respectivamente. Por el contrario, el bajo nivel de ejecución registrado en 2023 obedeció principalmente a demoras asociadas a los procesos de adecuación tanto de los entes financiadores como de la institución ejecutora.

d. Principales Proyectos

Al IV Trimestre del 2025, la inversión se concentró en el proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa el cual se detallan los avances físicos y financieros de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa:

Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas, IV- Trimestre-2025

Meta -Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV -Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución.	Programación	Ejecución	% Ejecución
Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho	obra	1	1	100%	1	1	100%
Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción	Obra	1	0	0%	1	0	0%
Mejoras Plantas de Tratamiento Los Laureles	Obra	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025

Al cuarto trimestre se contrataron y ejecutaron las obras finales de las mejoras de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) El Picacho; a la fecha se fue recepcionada e inaugurada la obra y en funcionamiento operativo. Adicionalmente se destacan los siguientes alcances:

PTAP Los Laureles:

- Contrato adjudicado.
- Recepción de documentos legales del Contratista.
- Contrato Firmado
- Realizada la reunión pre-construcción para la presente
- Enviado el PGAS al contratista

PTAP La Concepción: Es importante mencionar que este proceso de contratación se llevó a cabo conforme a la normativa de Banco Mundial, a continuación, se detalla los avances:

- Contrato adjudicado.
- Recepción de documentos legales del Contratista.
- Contrato Firmado
- Realizada la reunión pre-construcción para la presente
- Enviado el PGAS al contratista

Con el proyecto, se beneficiarán 525.890,00 habitantes de la ciudad de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán.

A continuación, se presentan los aspectos financieros y presupuestarios más relevantes al IV - Trimestre de 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
		US\$		Inicio - Fin
Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	US\$	US\$ 50,000,000.00	4/3/2020
		Lempiras	L1,233,240,000.00	15/4/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV-Trimestre 2025	237,932,136.0	204,932,136.0	97,871,076.5	47.8%
Acumulado 2025	237,932,136.0	204,932,136.0	199,438,000.9	97.3%
Acumulado Vida del Proyecto **	1,233,240,000.0	1,233,240,000.0	850,486,521.8	69.0%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

d.1 Principales Adquisiciones al IV - Trimestre 2025

- Suscripción de contrato de obras de mejora en Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) La Concepción
- Suscripción del contrato para las Mejoras en la Planta de Tratamiento de los Laureles.
- Supervisión de Obras de Sectores Hidráulicos y Programa de Reducción del Agua No Facturada (ANF).
- Suscripción de contrato de Auditoría Externa para 2024
- Contratación de la Supervisión en Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) los Laureles y la Concepción.

e. Gestión de la Inversión

- Reuniones de Seguimiento y Monitoreo.
- Dictamen y Aprobación de Modificaciones Presupuestarias.
- Actualización de proyecciones de ejecución (octubre – diciembre 2025).
- Elaboración de Nota Técnica para incorporación de espacio presupuestario para la ejecución del proyecto.

f. Problemática y Acciones Durante el IV - Trimestre-2025

- Riesgo de baja eficiencia operativa en la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Picacho, se implementó de manuales operativos, planes de mantenimiento y obtención de certificaciones técnicas.
- Riesgos en la calidad y control de ejecución de nuevas PTAP desde fases iniciales, Adjudicación y firma de contratos para las PTAP Los Laureles y La

Concepción, con órdenes de inicio programadas y supervisión técnica desde el inicio.

- Gestión desactualizada de las subcuencas Guacerique y San José de Río Grande, se actualizaron los Planes de Manejo de ambas subcuencas, aprobación de 14 productos contractuales y coordinación interinstitucional.

V. Conclusiones

- La ejecución de las intervenciones en infraestructura hídrica evidencia un alto nivel de eficiencia operativa y cumplimiento de objetivos, destacando la Planta de Tratamiento de Agua Potable El Picacho, que alcanza un 100% de eficiencia y cuenta con instrumentos técnicos que garantizan su sostenibilidad en el tiempo.
- Los avances en la adjudicación, inicio y supervisión temprana de las PTAP Los Laureles y La Concepción permiten asegurar estándares adecuados de calidad constructiva y reducen riesgos asociados a retrasos o deficiencias en la ejecución de las obras.
- La finalización de los estudios y diseños de sectores hidráulicos y del programa de reducción de agua no facturada constituye un insumo estratégico para mejorar la eficiencia del sistema de distribución y optimizar el uso de los recursos financieros y operativos.
- El fortalecimiento del control de calidad del agua, mediante la adquisición de equipamiento de laboratorio y la capacitación del personal técnico, garantiza un monitoreo más eficiente y confiable de los recursos hídricos, contribuyendo a la protección de la salud pública.
- El inicio de la evaluación integral de riesgos en las represas Los Laureles y La Concepción representa un avance significativo en la gestión preventiva de infraestructuras críticas, incrementando la resiliencia del sistema ante eventos naturales y escenarios de riesgo.

VI. Recomendaciones

- Fortalecer la supervisión técnica, administrativa y ambiental de las PTAP Los Laureles y La Concepción durante todas las fases de ejecución, a fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas, especificaciones técnicas y estándares de calidad establecidos.
- Iniciar la implementación gradual de las acciones definidas en los estudios de sectores hidráulicos y del programa de reducción de agua no facturada, priorizando las zonas con mayores pérdidas y estableciendo indicadores claros de desempeño y seguimiento.
- Asegurar la sostenibilidad del laboratorio de control de calidad del agua mediante la actualización periódica del equipamiento, la capacitación continua del personal y la asignación de recursos para su operación y mantenimiento.
- Continuar y concluir la evaluación integral de riesgos de las represas Los Laureles y La Concepción, incorporando las recomendaciones técnicas en los planes de operación y emergencia para fortalecer la gestión preventiva y la resiliencia ante eventos naturales.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS



ANEXO No 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	485,633,136.0	485,633,136.0	-	204,932,136.0	204,932,136.0	-	97,871,076.5	97,871,076.5	47.8	-	199,438,000.9	199,438,000.9	97.3
Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	-	237,932,136.0	237,932,136.0	-	204,932,136.0	204,932,136.0	-	97,871,076.5	97,871,076.5	47.8	-	199,438,000.9	199,438,000.9	97.3
Total Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		-	237,932,136.0	237,932,136.0	-	204,932,136.0	204,932,136.0	-	97,871,076.5	97,871,076.5	47.8	-	199,438,000.9	199,438,000.9	97.3
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		-	-	-	-	26,500,000.0	26,500,000.0	-	2,646,828.3	2,646,828.3	10.0	-	22,683,249.6	22,683,249.6	85.6
OBRAS PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES		-	-	-	-	26,500,000.0	26,500,000.0	-	2,646,828.3	2,646,828.3	10.0	-	22,683,249.6	22,683,249.6	85.6
Total OBRAS PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS POR DESASTRES NATURALES		-	-	-	-	26,500,000.0	26,500,000.0	-	2,646,828.3	2,646,828.3	10.0	-	22,683,249.6	22,683,249.6	85.6

Fuente: SIAFI, 31/12/2025 (Preliminar)



ANEXO 2

Principales Metas Físicas, IV- Trimestre-2025

Meta - Física	Unidad de Medida	Anual 2025			IV - Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Mejoras Planta de Tratamiento de El Picacho	obra	1	1	100%	1	1	100%
Mejoras Plantas de Tratamiento La Concepción	Obra	1	0	0%	1	0	0%
Mejoras Plantas de Tratamiento Los Laureles	Obra	1	0	0%	1	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora al 31/12/2025
