

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Secretaría de Salud (SESAL)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026



IV. PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la institución responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector Salud; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

El “Plan de Gobierno para la Refundación de la Patria y Construcción del Estado Socialista y Democrático (2022 – 2026)”, prioriza en su punto No. 4 “Hacia una Honduras Solidaria, Incluyente y Libre de Violencia”, ofrendar servicios de salud, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros. Mediante hitos específicos como: “Salud, lo primero es vivir con calidad”, y la “Salud Mental y Emocional”.

Respecto a la Inversión Pública del año 2025, la Secretaría de Salud contó con

un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional de L10,823.8 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Proyectos de Inversión Pública (Inversión Productiva), Programas sociales orientados al desarrollo de las capacidades humanas y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable (Inversión Social) y Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.

Al cuarto trimestre, el presupuesto vigente total asignado ascendió a L9,206.0 millones, de los cuales la *Inversión Social* se destinó principalmente a la

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del 2025
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	10,823,792,284.0
Inversión Productiva	3,276,101,856.0
Inversión Social	7,376,614,268.0
Formación Bruta de Capital	171,076,160.0
Presupuesto Vigente	9,024,672,621.0
Inversión Productiva	2,114,119,659.0
Inversión Social	6,121,667,824.0
Formación Bruta de Capital	788,885,138.0
Ejecutado IV Trimestre	3,119,408,925.2
Inversión Productiva	651,831,559.1
Inversión Social	2,285,539,833.4
Formación Bruta de Capital	182,037,532.7
% Ejecución (Devengado IV Trim-2025/Vigente)	34.6%
Ejecutado Anual	7,974,813,754.1
Inversión Productiva	1,310,868,297.2
Inversión Social	6,096,844,990.2
Formación Bruta de Capital	567,100,466.8
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	88.4%

Nota: SIAFI, 31/12/2025



atención de enfermedades transmisibles, atención a grupos priorizados, atención a grupos y enfermedades no priorizadas, riesgo poblacional, intervención de prevención y promoción de la salud, prevención, atención y control de emergencias epidemiológicas, entre otras intervenciones sociales. Dicha inversión ascendió a L6,121.7 millones de lo cual se ejecutó un 99.6%, equivalente a L6,096.8 millones a nivel de devengado al término del año 2025.

En consecuencia, la *Inversión Productiva* contó con una asignación vigente de L2,114.1 millones, para la ejecución de 7 proyectos de inversión pública. Asimismo, al cierre del año 2025 la SESAL contó con espacio presupuestario adicional de L245.2 millones de fuentes externas (crédito y donaciones) previsto para proyectos de inversión productiva; con prioridad en la infraestructura hospitalaria. Al cuarto trimestre se reportó una ejecución de L1,310.9 millones (62%) a nivel de devengado con relación al presupuesto vigente asignado.

Por su parte, las asignaciones correspondientes a la *Formación Bruta de Capital* (L788.9 millones), se orientan principalmente a la adquisición de ambulancias para el sistema de salud pública, atención a enfermedades transmisibles priorizadas, atención de grupos priorizados, desarrollo del recurso humano, dirección y coordinación de riesgo poblacional, intervenciones de prevención de salud, entre otros. Al cierre del año reflejó una ejecución del 71.9% (L567.1 millones) a nivel de devengado con relación al presupuesto vigente asignado.


En su conjunto la inversión pública para la SESAL al cierre del año 2025 registró una ejecución presupuestaria de L7,974.8 millones (88.4%) a nivel de devengado en relación con el Presupuesto Vigente asignado, principalmente con orientación al Sector Salud e intervenciones para la corresponsabilidad en el Sector Protección Social. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.

b. Financiamiento de la Inversión Pública

El 52% de la Inversión Pública de la SESAL, se financia con recursos provenientes del Tesoro Nacional (Fondos nacionales y propios), el 24% con Crédito Externo (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)) y los restantes 23% con donaciones externas, alivio de la deuda y apoyos presupuestarios (BID, BM, BCIE, CAF, China, Japón y Alemania) mismos que se representan en el Gráfico No. 01.



Gráfico No. 01
Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente
Cifras en Millones de Lempiras

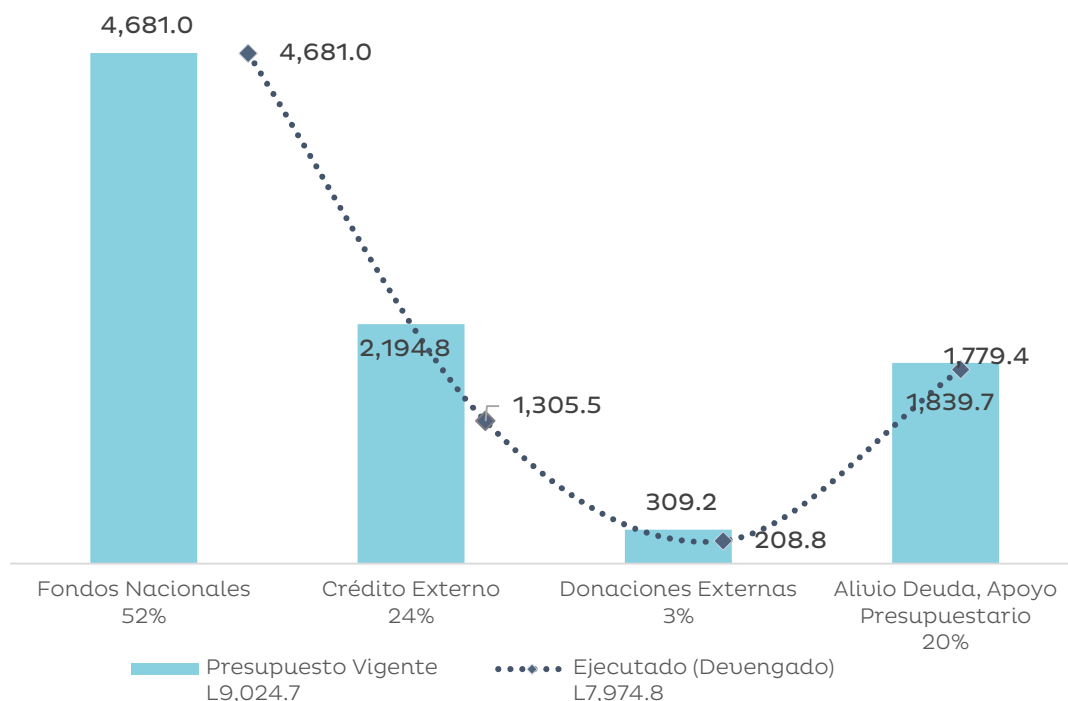


c. Comportamiento de la Ejecución al IV trimestre (2023-2025):

En el período comprendido del 2023 al 2025, la Inversión Pública de la SESAL ha considerado la ejecución de al menos 12 Proyectos de Inversión y diferentes intervenciones para inversión social y formación bruta de capital; las cuales se han financiado en 50% con recursos nacionales, 40% con recursos de crédito externo y el restante 10% de donaciones externas, alivio de deuda y apoyos presupuestarios.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un total de L28,478.2 millones; reflejando un promedio de ejecución en 88.4% (L25,180.7 millones) al cierre de cada año.



Grafico No. 2
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 31 de diciembre (2023-2025)
0060 - Secretaría de Salud
Cifras en millones de Lempiras

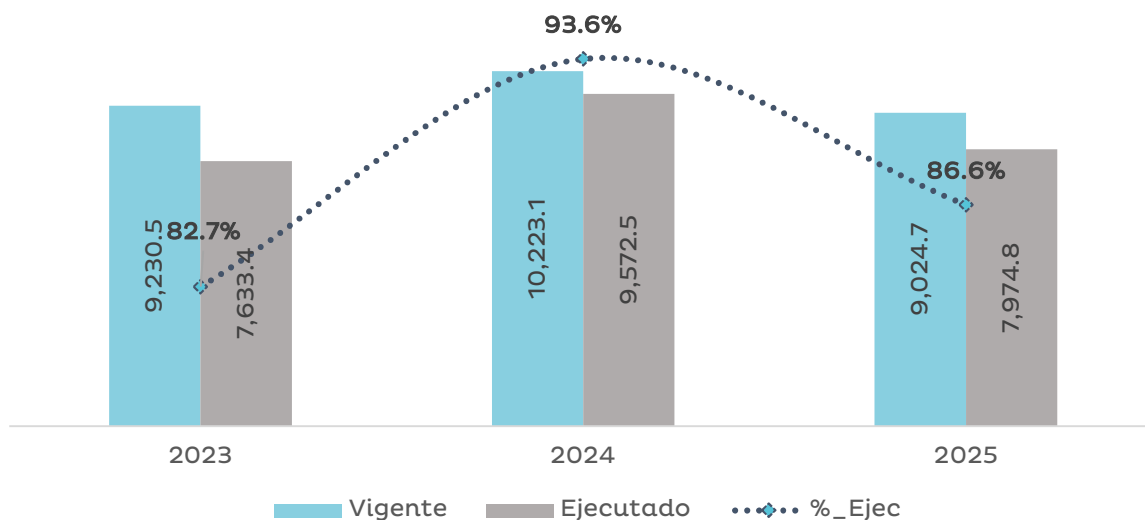

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa con corte al 31 de diciembre de los últimos tres años; donde el año 2024 destaca su mayor asignación y mejor ejecución considerando principalmente la incorporación de programas sociales orientados primordialmente en la atención a enfermedades transmisibles, atención a grupos priorizados, atención a grupos y enfermedades no priorizadas, riesgo poblacional, intervención de prevención y promoción de la salud, prevención, atención y control de emergencias epidemiológicas, entre otras intervenciones sociales.

d. Principales Proyectos

La inversión productiva para el año 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1	Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	BCIE-2329
2	Programa de Construcción y equipamiento de 3 hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras	BID 5790/BL-HO
3	Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO
4	Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE)	IDA 7142-HN TFOB8564-HN TFOC1861
5	Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.	Acuerdo Donación No 1660400



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

6 Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (Componente 3)

BID 5008/BL-HO

7 Proyecto Honduras - Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM en Mesoamérica y República Dominicana)

GRT/MM-17339-40-HO

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH):

Tiene como propósito incrementar la cobertura en la atención de los servicios de salud a nivel hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca y Tocoa, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).

Los principales avances físicos programados al cuarto trimestre son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca.	Informe de obra	21	12	57.1%	6	4	66.7%
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa	Informe de obra	19	11	57.9%	6	5	83.3%
Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales,	Informe	17	0	-	0	0	-
Realizada la gestión de gastos administración del proyecto	Informe	75	91	100%	18	27	100.0%

Fuente: SESAL-UEP-PARH al 31/12/2025



Para el cuarto trimestre la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:

- En seguimiento al Contrato de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo **Hospital Regional del Sur en Choluteca** (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-001-2024-SS), contrato suscrito el 07 de octubre de 2024:
 - Etapa 1 (Preinversión): Se dio orden de inicio a partir del 22 de octubre del 2024 con fecha (ampliada) para su fin al mes de octubre de 2025. Se reporta un avance físico de 91.39% y financiero del 47% (US\$1,128,614.07).
 - De los 3 productos que componen la Fase 1, se aprobaron los dos primeros; el tercer producto es el más extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se reprogramó su fecha de entrega para el mes de enero 2026.
 - Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes:
 - Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA.
 - Entrega de la Carpeta completa de infraestructura.
 - Entrega de carpeta a SESAL.
 - Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 20 de octubre de 2024; con fecha de fin (ampliada) al 12 de agosto de 2026. Se reporta un avance físico del 35.25% y financiero del 46.36% (US\$14,446,195.64).
 - Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 31 de diciembre de 2025 se listan a continuación:
 - Instalación de fibra de vidrio en paredes de tabla yeso Bloque C, primer nivel
 - Pulido de paredes en Bloque C, primer nivel
 - Armado de caseta para desechos sólidos comunes e infecciosos del HRSCH
 - Armado de soleras intermedias en paredes de bloque E1, primer nivel
 - Construcción de paredes en Bloque E, segundo nivel.

- En seguimiento al Contrato de Diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha del nuevo **Hospital San Isidro de Tocoa** (proceso No. LPI-UAFCE-BCIE-002-2024-SS), contrato suscrito el 11 de octubre de 2024:
 - Etapa 1 (Preinversión): Se indicó orden de inicio a partir del 21 de octubre del 2024 con fecha (prevista) de finalización el 26 de agosto de 2025. Se reporta un avance físico de 91.53% y financiero del 51% (US\$1,881,187.84).
 - De los 3 productos que componen la Fase 1 se tiene aprobado el primer y segundo productos; mientras que el tercer producto es el más



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

- extenso (incluye el diseño de todos los sistemas hospitalarios especiales), se estima estará listo durante el mes de enero 2026.
- Dentro del producto 3 se incluyen estos puntos importantes:
 - Observaciones a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) por SESAL y SERNA.
 - Entrega de la Carpeta completa de infraestructura.
 - Entrega de carpeta a SESAL
 - Etapa 2 (Construcción), se dio orden de inicio el 21 de octubre de 2024; fecha de fin (prevista) al 20 de julio de 2026. Se reporta un avance físico de 14.42% y financiero del 32.41% (US\$13,434,768.75).
 - Las actividades más relevantes realizadas en esta etapa al 31 de diciembre de 2025 se listan a continuación:
 - Ensayo de ruptura de cilindros en laboratorio del Contratista
 - Inician trabajos de excavación para instalación de tuberías sanitarias en edificio Bloque 6.
 - Inician trabajos de excavación para instalación de tuberías sanitarias en edificio Bloque 6.
 - Supervisando área liberación de losa de piso en la marquesina
 - Preparación de contrapiso para fundición en área de Marquesina.
 - Montaje de estructura metálica en B4.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica: del Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH) al cuarto trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	BCIE-2329	135,000,000		30/07/2024
			3,556,438,650	01/08/2028
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	1,485,722,612	1,196,400,341	381,318,047	32%
Acumulado 2025	1,485,722,612	1,196,400,341	748,719,556	63%
Acumulado Vida del Proyecto *	3,556,438,650	3,556,438,650	1,111,924,695	31%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00



2. Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras

Mediante la construcción y equipamiento de dos (2) Hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un (1) Hospital General en Roatán se mejorará la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).

Los principales avances físicos programados para el año 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
		Progra- mación	Ejecución	% Ejecu- ción	Progra- mación	Ejecución	% Ejecu- ción
Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán	Informe técnico	15	28	100%	4	12	100%
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa	Informe técnico	1	0	-	0	0	-
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula	Informe técnico	1	0	-	0	0	-
Formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales	Informe	55	0	-	15	0	-
Reorganizar y fortalecer la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales	Informe	7	0	-	1	0	-
Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025	Informe	158	188	100%	50	50	100%

Fuente: SESAL-GESALUD al 31/12/2025

Al cuarto trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 3% y financiero de 7%, con relación a las



actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR).

Así mismo, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), al cuarto trimestre se reporta para la **Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán**, avance físico (obra) del 28.99% y financiero del 91.6% (US\$7,568,951.19) indicando las siguientes actividades en ejecución:

- Colocación de chapa colorante en entrepiso actuaciones 1, 2 y 3.
- Retiro de aplanado fino de muros existentes.
- Fundición de contrapiso y verificación topográfica para contrapisos.
- Aplicación de pintura en estructuras, retoque de pintura en nodos y soldaduras.
- Izaje de pilares.
- Instalación de lámina para losa maciza.
- Armado de castillos en actuación 3.
- Estructura metálica de actuación 3.

En cuanto al **Diseño Hospitales de Traumatología de Tegucigalpa (160 camas), y San Pedro Sula (150 camas)**, se reporta un avance del 100% en ambos; cabe señalar que ambos diseños se realizan bajo contrato con el Consorcio PLANHO/TASH, con fecha de finalización contractual (ampliada) al 15 de noviembre del 2025.

Al cierre del año 2025, se tiene pendiente las gestiones de aprobación de entidades gubernamentales: UMAPS, ENEE y Alcaldías según corresponde. Así mismo, de acuerdo con notificación del BID mediante oficio O-CID/CHO-1390/2025 el proceso para la solicitud de propuestas para la supervisión de la construcción y equipamiento de los hospitales de traumatología Honduras, Lote A: Tegucigalpa y Lote B: San Pedro Sula (HO-L1239-P00016) queda pausado y la nueva fecha de presentación de ofertas será comunicada posteriormente.

Dicha decisión, considerando el desfase marcado entre la contratación de los ejecutores de obra y la supervisión, considerando el cronograma modificado de licitación de los hospitales con respecto al proceso de supervisión.

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Construcción y equipamiento de tres hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras al cuarto trimestre 2025:



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	230,163,200	15/04/2024 15/05/2030
Lempiras	6,063,417,039			
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	1,020,492,553	331,233,052	87,386,989	26%
Acumulado 2025	1,020,492,553	331,233,052	179,696,847	54%
Acumulado Vida del Proyecto *	6,063,417,039	6,063,417,039	412,832,507	7%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

3. Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO):

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autorizó a que la SEFIN, realizar las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el BID aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Préstamo No. 4713/BL-HO de fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

Los principales avances físicos para el año 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
		Progra-mación	Ejecución	% Ejecución	Progra-mación	Ejecución	% Ejecución
Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL	Equipo	1	0.5	50%	1	0.5	50%



Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
		Progra-mación	Ejecución	% Ejecución	Progra-mación	Ejecución	% Ejecución
Adquiridos generadores eléctricos para 5 hospitales	Equipo	1	0	0	0	0	0
Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas neonatales de 5 hospitales	Equipo	601	596	99%	1	0.5	50%
Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2025	Informe	80	71	88.8%	20	42	100%

Fuente: SESAL-GESALUD al 31/12/2025

Al cuarto trimestre del 2025, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 92% y financiero de 91.5%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR):

- Proceso Adecuación Centro de Datos de la SESAL: Se cuenta con No objeción a las especificaciones técnicas del proceso y el Documento de Licitación y Aviso versión final cargado en el portal del cliente a la espera de recepción de ofertas, con un avance del 50%.
- Se adquirió 19 Discos Externos y 4 Impresoras para la operatividad de diferentes áreas.
- Pago de estimación de obra No. 3, 5 y 6 para la Subestación eléctrica del Hospital Escuela (octubre, noviembre y diciembre).
- Pago de honorarios a personal de apoyo (consultores) para UTINH y GESALUD (julio a septiembre).
- Se procesó pago por la presentación del 5to Informe de Diseños del Hospitales de Traumas de Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente.
- El Proceso de Adquisición de Equipo No Médico para Salas Neonatales, documento de Licitación cuenta con No Objeción del BID y fue cargado en el portal del cliente, a la espera de recepción de ofertas. Avance del 50%.

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) al cuarto trimestre 2025:



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 31/08/2026
		Lempiras	1,417,833,542	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	184,054,191	248,561,957	55,864,734	22%
Acumulado 2025	184,054,191	248,561,957	146,847,171	59%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,417,833,542	1,417,833,542	1,171,407,804	83%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00

4. Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Con el propósito de proveer de infraestructura física adecuada para un funcionamiento óptimo del área técnico-administrativa del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.

Los principales avances físicos programados para el año 2025 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Construido el Edificio del Laboratorio Nacional de Vigilancia de La Salud (JICA)	Informe de ejecución	1	1	100%	1	1	100%
Adquirido mobiliario, equipo tecnológico, y terrestre para el año 2025	Equipo	576	576	100%	576	576	100%
Adquirido, instalado el equipo para el Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de Salud	Equipo	71	71	100%	71	71	100%

Fuente: SESAL-UAFCE al 31/12/2025

Para el cuarto trimestre la Unidad Administradora de Fondos de Cooperación Externa (UAFCE) reporta las siguientes acciones:



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

- Se realizó estudio de suelo del lugar donde será construido el edificio administrativo del LNV Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo.
- Al cierre del año 2025, se encontraba en ejecución el proceso para la licitación No. LPN-UAFCE-FN-002-2025-SESAL, correspondiente a la contratación de una empresa para la construcción del edificio administrativo del LNV; hubo recepción de tres ofertas recibidas el 10 de diciembre de 2025, mismas que fueron evaluadas por la terna evaluadora asignada y se encuentra actualmente el expediente en la secretaria general de la SESAL para dictamen de adjudicación.
- Equipamiento Clínico del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV): Se adquirió equipos varios 2 baño maría, 1 rotador de láminas, 2 cabina de bioseguridad A2, 2 balanza analítica, 3 baño seco, 1 centrifuga, 2 horno, 2 incinerador de asas bacteriológicos, 2 lector de Elisa con lavador, 10 medidor de PH, 3 microcentrífuga para microviales, 1 microcentrífuga para microhematocrito, 4 micropipeta multicanal de doce canales 50-300 ul, 16 microscopio binocular, 10 pipeta repetidora electrónica, 7 timer digital de 4 tiempos, 3 vortex.
- Adquisición y entrega de Aplicaciones Informáticas, Equipo de Comunicación, Muebles Varios de Oficina, Equipo de Elevación y Tracción, Equipos para Computación.
- El 11 de diciembre de 2025, la empresa Tokura Corporation Japón, **realizo la entrega** del edificio del Laboratorio Nacional de Vigilancia de La Salud a la SESAL (pendiente la regularización del gasto hasta el año 2026).

A continuación, véase la ejecución financiera histórica de la Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) al cuarto trimestre 2025:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.	Acuerdo Donación No 1660400 (JICA)	Lempiras	251,326,119	01/09/2023 31/03/2026
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	112,668,942	115,471,311	8,509,829	7%
Acumulado 2025	112,668,942	115,471,311	34,407,473	30%
Acumulado Vida del Proyecto *	251,326,119	251,326,119	148,556,822	59%

* / Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.34399 por US\$1.00



d.1. Principales Adquisiciones IV Trimestre 2025

Durante el cuarto trimestre, la UEP-PARH mantiene en ejecución los siguientes contratos:

- Coordinación General, Contrato UEP-PARH-001-2025-SS.
- Especialista financiero, Contrato UEP-PARH-002-2025-SS.
- Especialista en adquisiciones, Contrato UEP-PARH-003-2025-SS.
- Especialista ambiental Social, Contrato UEP-PARH-004-2025-SS.
- Especialista biomédico, Contrato UEP-PARH-005-2025-SS.
- Asistente administrativo, Contrato UEP-PARH-006-2025-SS.
- Miembro Único del DAAB, Dispute Adjudication And Avoidance Board, para el Contrato de Diseño, Construcción y Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital Regional del Sur en Choluteca. Contrato UEP-PARH-007-2025-SS.
- Miembro Único del DAAB, Dispute Adjudication And Avoidance Board, para el Contrato de Diseño, Construcción y Equipamiento y Puesta en Marcha del Nuevo Hospital San Isidro de Tocoa. Contrato UEP-PARH-008-2025-SS.
- Apoyo a la Gestión y Supervisión para el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras. Contrato UEP-PARH-009-2025-SS.
- Servicios de Auditoría Externa para el Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH). Contrato UEP-PARH-010-2025-SS

Por su parte **GESALUD**, reporta la ejecución el Contrato para la Construcción y Equipamiento del Hospital General de Roatán; y Contrato para la "Supervisión de la Construcción y Equipamiento del Hospital General del Municipio de Roatán".

Asimismo, se encuentran en ejecución los contratos de consultoría en apoyo a la Unidad Técnica de Infraestructura para Nuevos Hospitales (UTINH), GESALUD y UGI (alrededor de 31 contratos por trimestre).

Continúan en ejecución con Convenios de Gestión con la Asociación de desarrollo en el área de Santa Barbara (ADASBA) (San Agustín, Copán y Lucerna, Ocotepeque) y la Mancomunidad de Municipios Lencas de La Sierra de La Paz (MAMLESIP) (Cabañas, Tutule y Matazano, La Paz).

Continúa en ejecución el Convenio de Gestión con la organización "Community Health Assessment Initiative (CHAI)" en el marco del Proyecto Honduras - Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria, hasta el cierre en el año 2025.



Por su parte la **UAFCE**, mantiene dos contratos vigentes, firmados por la **SESAL**, con financiamiento de donación externa:

- Construcción del Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud, (contratista Tokura Corporation Japón) por un monto de contrato de JPY1,141,000.00, del cual se ha realizado un 62% del pago del contrato; la obra fue finalizada y se ha dado recepción en diciembre de 2025, quedando pendiente la regularización de pagos a inicios de 2026.
- Supervisión de obra del Edificio del Laboratorio Nacional de la Vigilancia de la Salud, (Contratista Azusa Sekkei) LTD, por un monto de contrato de JPY 156,000.00 con un nivel de pagos realizados al 30 de septiembre de 2025, de JPY96,220,000.00; debido a la entrega hasta el mes de diciembre de la obra, la programación de pagos al supervisor se modifica para el primer trimestre del año 2026.

En cuanto a la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Humana (**PROSALH**), contó con los contratos al cierre del año 2025:

- 3 consultores para asistencia técnica (Asesor Técnico de Inmunizaciones, Especialista Técnico en Infraestructura y Especialista en Vacunación). Monto Contratado US\$90,126.87, ejecutado en 100%.
- Contratación de Recurso Humano en apoyo al Programa Ampliado de Inmunización (PAI) (4 oficiales administrativos y logísticos, 11 supervisores). Monto contratado US\$175,695.32, ejecutado 100%.
- Contrato HN-SESAL-427033-NC-RFB, Empresa de transporte de personal para las jornadas de vacunación a nivel nacional. Monto contratado US\$763,300.0, ejecutado 89%.
- Adquisición de indumentaria PAI para la estrategia de vacunación. Monto contratado US\$261,444.37, ejecutado 100%.
- HN-SESAL-407026-CS-IND, Especialista para el Restablecimiento de los servicios de salud materna neonatal. Monto contratado US\$40,733.67, ejecutado 100%.
- HN-SESAL-48733-NC-DIR, Actualización e integración de nuevos módulos y funcionalidades del Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV). Monto contratado US\$2,396,772.0, ejecutado 60%.
- Contratación de Recurso Humano en apoyo a la Unidad de Gestión de Información (UGI) (16 facilitadores UGI y 2 administradores de base de datos). Monto contratado US\$106,270.0, ejecutado 100%.
- Consultorías de Apoyo a la gestión del proyecto (UAP-PROSALH/GAVI). Monto contratado US\$1,650,000.0, ejecutado 70%.
- HN-SESAL-460976-NC-RFQ, Contratación de servicios de transporte para apoyo de actividades RESHAPE. Monto contratado US\$30,000.0, ejecutado 74%.



- Asistencia técnica de apoyo a la planificación y fortalecimiento de la red de Laboratorio y Vigilancia Epidemiológica de la SESAL. Monto contratado US\$22,000.0, ejecutado 10%.
- Contrato HN-SESAL-487514-CS-CQS Estudio y diseño de 19 laboratorios regionales, 3 laboratorios de biología molecular y el Laboratorio Nacional de Virología. Monto contratado US\$80,000.0, ejecutado 19%.
- Contrato HN-SESAL-496889-CS-CQS Diseño de la Región Sanitaria Departamental de Intibucá. Monto contratado US\$62,500.0, ejecutado 20%.
- Contrato HN-SESAL-426990-GO-RFQ Adquisición de equipo (376 equipos de perifoneo) en las localidades previo y durante los operativos de vacunación. Monto contratado US\$25,031.86, ejecutado 100%.
- Insumos para el manejo de desechos de vacunación. Monto contratado US\$13,376.28, ejecutado 100%.
- Impresión de material de comunicación SESAL-UVS. Monto contratado US\$7,661.12, ejecutado 100%.
- Impresión de formularios de vacunación [Síndrome de Parsonage-Turner (SPT)] para 2 años. Monto contratado US\$22,782.17, ejecutado 100%.
- Rehabilitación de la Oficina de la Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud (DGRISS). Monto contratado US\$54,447.88, ejecutado 100%.
- Adquisición de sillas y mesas para la Unidad de Gestión Informática (UGI). Monto contratado US\$3,633.23, ejecutado 100%.

d.2. Programas Sociales

Al cuarto trimestre, la SESAL cuenta con L6,910.5 millones asignados para Inversiones Sociales conformados por Programas Sociales (L6,121.7 millones) y Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) por un monto de L788.9 millones.

En su conjunto, se registró una ejecución financiera de L6,663.9 millones equivalentes al 96%; destinados principalmente a atención a enfermedades transmisibles, atención a grupos priorizados, atención a grupos y enfermedades no priorizadas, riesgo poblacional, intervención de prevención y promoción de la salud, prevención, atención y control de emergencias epidemiológicas, entre otras intervenciones sociales. Así mismo, se consideran adquisición de al menos 32 ambulancias para el sistema de salud pública, atención a enfermedades transmisibles priorizadas, atención de grupos priorizados, desarrollo del recurso humano, dirección y coordinación de riesgo poblacional, intervenciones de prevención de salud.



e. Gestión de la Inversión

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Actualización a Proyección de ejecución Mensual para el Año 2025 (octubre - diciembre) en seguimiento a Circular DGIP No. 01-2025.
- Gestión para aprobación de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo y su gestión ante TGR en función de las proyecciones de ejecución reportadas por las Unidades ejecutoras de Proyectos.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.
- Durante el cuarto trimestre se atendieron 06 solicitudes de Modificaciones Presupuestarias con proyecto.
- Se emitieron 06 Opiniones complementarias a solicitud de la Dirección de Exoneraciones Fiscales y Franquicias Aduaneras (DGEFFA) para la Exoneración de Franquicias aduaneras relacionadas a proyectos de inversión pública.

f. Problemática y Acciones durante el IV Trimestre-2025

Al cuarto trimestre, se reportó por desfase de 0.87 puntos porcentuales con relación al avance físico para el Hospital de Roatán, representando una desviación igual a 4 días; de acuerdo con lo reportado, se encuentra en campo alrededor de 127 trabajadores (mano de obra) para agilizar el avance de obras.

Adicionalmente, en cuanto a la consultoría para los diseños de hospitales de traumatología en Tegucigalpa y San Pedro Sula; tras varias extensiones al plazo de entrega del producto final, se cuenta con el 100% de los diseños de hospitales; causando desfase en el lanzamiento de los procesos relacionados a la contratación de la construcción de obra y equipamiento; as vez el proceso de contratación para la supervisión quedó suspendida su presentación de ofertas, por notificación del organismo financiero.

En cuanto a las obras de infraestructura relacionadas al Edificio administrativo del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV), se indicó por parte de la UAFCE, que la SESAL ha realizado en casa los estudios de suelo durante el presente año por parte de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos (UTGP) realizando modificaciones al diseño previamente establecido para este edificio; identificando un nuevo costo por L41.9 millones el cual deberá ser gestionados sus recursos posterior a la Enmienda a Nota de Prioridad por incremento en el costo del proyecto.



Actualmente se está trabajando en la segunda enmienda de los contratos del Hospital Regional del Sur en Choluteca y del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa, específicamente lo relacionado al esquema de pagos de la tercera fase de Equipamiento Médico y el Listado de Equipamiento que será suministrado por el contratista de acuerdo con lo negociado en las mesas de trabajo contemplando las opiniones técnicas del equipo biomédico de la agencia de apoyo, UTGP y miembro de la UE-PARH. Se espera que, durante el I Trimestre del 2026, se lleve a cabo esta enmienda que permita realizar la ejecución del esquema de pagos de la Fase 3 Equipamiento del Hospital Regional del Sur en Choluteca y del Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa.

V. Conclusiones

- Al cierre del año 2025, la ejecución reportada por la SESAL se registra a nivel de devengado en 88.4% (L7,974.8 millones) de los cuales la Inversión Productiva reporta L1,310.9 millones (15%) y un 74% (L6,663.9 millones) para la Inversión Social (Formación Bruta de Capital + Programas Sociales) ambas en relación con el Presupuesto Vigente asignado; ello denota la tendencia en ejecución menor al cuarto trimestre del año anterior considerando las asignaciones en su conjunto para la Inversión Pública de la SESAL.
- Durante el cuarto trimestre del año 2025, se mantuvo el ritmo de ejecución de procesos de contratación para el Proyecto “Servicios esenciales de salud y preparación ante emergencias”, el cual en dicho trimestre indicó 18 procesos en ejecución en su plan de adquisiciones y contrataciones; con prioridad en la ejecución bajo el convenio de financiamiento de la Alianza para la Vacunación (GAVI).
- Al término del cuarto trimestre la SESAL recibe importantes productos como ser los diseños de hospitales de traumatología (Tegucigalpa y San Pedro Sula). Así mismo, de la Cooperación Japonesa se destaca la entrega del Edificio del Laboratorio Nacional de Vigilancia, quedando el compromiso del Gobierno en honrar la contraparte, Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo como complemento.



VI. Recomendaciones

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones conjuntas que permitan la eficiencia de los procesos y la gestión oportuna para la agilización de los trámites, y apegarse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda a las Unidades Ejecutoras en SESAL, contar con mecanismos de control y aplicación de penalizaciones por desfase en entrega de productos (principalmente los generados por los diseños de hospitales de traumatología) mediante los cuales las empresas contratistas asuman la responsabilidad y la entrega de los productos en tiempo y forma.
- Se recomienda registrar y mantener actualizada la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXOS



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No. 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
8	I. Inversión Productiva		6,351,810.0	3,269,750,046.0	3,276,101,856.0	9,154,179.0	2,104,965,480.0	2,114,119,659.0	8,509,829.0	643,321,730.2	651,831,559.1	30.8	9,154,177.0	1,301,714,120.2	1,310,868,297.2	62.0
8	0060 - Secretaría de Salud		6,351,810.0	3,269,750,046.0	3,276,101,856.0	9,154,179.0	2,104,965,480.0	2,114,119,659.0	8,509,829.0	643,321,730.2	651,831,559.1	30.8	9,154,177.0	1,301,714,120.2	1,310,868,297.2	62.0
1	APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO	5008/BL-HO	-	45,357,049.0	45,357,049.0	-	40,457,049.0	40,457,049.0	-	10,514,857.5	10,514,857.5	26.0	-	32,702,756.4	32,702,756.4	80.8
	Total APOYO AL SISTEMA INTEGRAL DE PROTECCIÓN SOCIAL 5008/BL-HO		-	45,357,049.0	45,357,049.0	-	40,457,049.0	40,457,049.0	-	10,514,857.5	10,514,857.5	26.0	-	32,702,756.4	32,702,756.4	80.8
2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN	Acuerdo Donación No 1660400	6,351,810.0	106,317,132.0	112,668,942.0	9,154,179.0	106,317,132.0	115,471,311.0	8,509,829.0	-	8,509,829.0	7.4	9,154,177.0	25,253,296.1	34,407,473.1	29.8
	Total CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABI		6,351,810.0	106,317,132.0	112,668,942.0	9,154,179.0	106,317,132.0	115,471,311.0	8,509,829.0	-	8,509,829.0	7.4	9,154,177.0	25,253,296.1	34,407,473.1	29.8
3	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS	BID 5790/BL-HO	-	1,020,492,553.0	1,020,492,553.0	-	331,233,052.0	331,233,052.0	-	87,386,989.0	87,386,989.0	26.4	-	179,696,846.9	179,696,846.9	54.3
	Total PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGU		-	1,020,492,553.0	1,020,492,553.0	-	331,233,052.0	331,233,052.0	-	87,386,989.0	87,386,989.0	26.4	-	179,696,846.9	179,696,846.9	54.3
4	PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOSA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	BCIE-2329	-	1,485,722,612.0	1,485,722,612.0	-	1,196,400,341.0	1,196,400,341.0	-	381,318,047.3	381,318,047.3	31.9	-	748,719,556.1	748,719,556.1	62.6
	Total PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSP		-	1,485,722,612.0	1,485,722,612.0	-	1,196,400,341.0	1,196,400,341.0	-	381,318,047.3	381,318,047.3	31.9	-	748,719,556.1	748,719,556.1	62.6
5	PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS	IDA 7142-HN	-	26,380,875.0	26,380,875.0	-	3,000.0	3,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
		TF088564-HN	-	14,381,332.0	14,381,332.0	-	9,109,250.0	9,109,250.0	-	9,056,250.0	9,056,250.0	99.4	-	9,056,250.0	9,056,250.0	99.4
		TF0C1861	-	74,931,699.0	74,931,699.0	-	160,303,699.0	160,303,699.0	-	98,519,508.0	98,519,508.0	61.5	-	155,437,189.9	155,437,189.9	97.0
	Total PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERG		-	115,693,906.0	115,693,906.0	-	169,415,949.0	169,415,949.0	-	107,575,758.0	107,575,758.0	63.5	-	164,493,439.9	164,493,439.9	97.1
6	PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALARIA (IREM EN MESOAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA)	GRT/MM-17339-40-HO	-	22,000,000.0	22,000,000.0	-	12,580,000.0	12,580,000.0	-	661,344.3	661,344.3	5.3	-	4,001,054.0	4,001,054.0	31.8
	Total PROYECTO HONDURAS - INICIATIVA REGIONAL DE ELIMINACIÓN DE LA MALA		-	22,000,000.0	22,000,000.0	-	12,580,000.0	12,580,000.0	-	661,344.3	661,344.3	5.3	-	4,001,054.0	4,001,054.0	31.8
7	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	-	184,054,191.0	184,054,191.0	-	248,561,957.0	248,561,957.0	-	55,864,734.1	55,864,734.1	22.5	-	146,847,170.7	146,847,170.7	59.1
	Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR E		-	184,054,191.0	184,054,191.0	-	248,561,957.0	248,561,957.0	-	55,864,734.1	55,864,734.1	22.5	-	146,847,170.7	146,847,170.7	59.1
8	FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRASPLANTES RENALES Y SERVICIOS CONEXOS HOSPITALARIOS		-	290,112,603.0	290,112,603.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total ORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRASPLANTES RENALES Y SERVICIOS CC		-	290,112,603.0	290,112,603.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy	Institución / Programa o Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)					
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	
	II. Inversión Social	7,376,614,268.0	-	7,376,614,268.0	4,130,838,546.0	1,990,829,278.0	6,121,667,824.0	1,666,925,237.7	618,614,595.7	2,285,539,833.4	37.3	4,130,838,452.7	1,966,006,537.5	6,096,844,990.2	99.6	
	0060 - Secretaría de Salud	7,376,614,268.0	-	7,376,614,268.0	4,130,838,546.0	1,990,829,278.0	6,121,667,824.0	1,666,925,237.7	618,614,595.7	2,285,539,833.4	37.3	4,130,838,452.7	1,966,006,537.5	6,096,844,990.2	99.6	
	ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS	-	-	-	11,247,707.0	-	11,247,707.0	11,247,706.1	-	11,247,706.1	100.0	11,247,706.1	-	11,247,706.1	100.0	
	Total ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS	-	-	-	11,247,707.0	-	11,247,707.0	11,247,706.1	-	11,247,706.1	100.0	11,247,706.1	-	11,247,706.1	100.0	
	ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADA	93,452,861.0	-	93,452,861.0	86,725,187.0	304,441.0	87,029,628.0	34,924,744.2	-	46,683.5	34,878,067.0	40.1	86,725,183.1	304,439.0	87,029,622.1	100.0
	Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS	93,452,861.0	-	93,452,861.0	86,725,187.0	304,441.0	87,029,628.0	34,924,744.2	-	46,683.5	34,878,067.0	40.1	86,725,183.1	304,439.0	87,029,622.1	100.0
	ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS	366,515,423.0	-	366,515,423.0	101,294,243.0	717,561.0	102,011,804.0	44,213,537.4	-	160,000.0	44,373,537.4	43.5	101,294,238.9	717,560.1	102,011,799.0	100.0
	Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS	366,515,423.0	-	366,515,423.0	101,294,243.0	717,561.0	102,011,804.0	44,213,537.4	-	160,000.0	44,373,537.4	43.5	101,294,238.9	717,560.1	102,011,799.0	100.0
	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS	193,721,873.0	-	193,721,873.0	183,234,593.0	492,652.0	183,727,245.0	40,561,679.9	-	173,882.0	40,735,561.9	22.2	183,234,588.7	492,652.0	183,727,240.7	100.0
	Total ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS	193,721,873.0	-	193,721,873.0	183,234,593.0	492,652.0	183,727,245.0	40,561,679.9	-	173,882.0	40,735,561.9	22.2	183,234,588.7	492,652.0	183,727,240.7	100.0
	ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS	121,367,852.0	-	121,367,852.0	83,571,110.0	15,695,437.0	99,266,547.0	34,666,907.8	-	383,057.6	35,049,965.3	35.3	83,571,096.7	15,695,432.8	99,266,529.6	100.0
	Total ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS	121,367,852.0	-	121,367,852.0	83,571,110.0	15,695,437.0	99,266,547.0	34,666,907.8	-	383,057.6	35,049,965.3	35.3	83,571,096.7	15,695,432.8	99,266,529.6	100.0
	ATENCIÓN INTEGRAL PRIORIZADA POR COVID-19	29,930,982.0	-	29,930,982.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19	29,930,982.0	-	29,930,982.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,339,428,593.0	-	1,339,428,593.0	1,382,135,997.0	223,427,064.0	1,605,563,061.0	509,397,139.1	-	104,496,990.0	613,894,129.1	38.2	1,382,135,989.8	223,427,061.0	1,605,563,050.9	100.0
	Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1,339,428,593.0	-	1,339,428,593.0	1,382,135,997.0	223,427,064.0	1,605,563,061.0	509,397,139.1	-	104,496,990.0	613,894,129.1	38.2	1,382,135,989.8	223,427,061.0	1,605,563,050.9	100.0
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RIESGO POBLACIONAL	112,948,321.0	-	112,948,321.0	9,644,078.0	127,480,609.0	137,124,687.0	55,000.2	-	80,396,041.0	80,451,041.2	58.7	9,644,077.1	127,480,606.5	137,124,683.6	100.0
	Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE RIESGO POBLACIONAL	112,948,321.0	-	112,948,321.0	9,644,078.0	127,480,609.0	137,124,687.0	55,000.2	-	80,396,041.0	80,451,041.2	58.7	9,644,077.1	127,480,606.5	137,124,683.6	100.0
	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	-	-	-	60,818.0	-	60,818.0	-	-	-	-	-	60,817.4	-	60,817.4	
	Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR	-	-	-	60,818.0	-	60,818.0	-	-	-	-	-	60,817.4	-	60,817.4	
	INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD	362,881,225.0	-	362,881,225.0	197,591,644.0	8,341,102.0	205,932,746.0	25,091,106.2	-	5,607,997.7	30,699,103.9	14.9	197,591,636.9	8,341,099.1	205,932,736.0	100.0
	Total INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD	362,881,225.0	-	362,881,225.0	197,591,644.0	8,341,102.0	205,932,746.0	25,091,106.2	-	5,607,997.7	30,699,103.9	14.9	197,591,636.9	8,341,099.1	205,932,736.0	100.0
	INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	223,868,129.0	-	223,868,129.0	252,637,068.0	5,787,285.0	258,424,353.0	54,503,693.3	-	5,332,713.6	59,836,406.9	23.2	252,637,061.5	5,787,283.6	258,424,345.1	100.0
	Total INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	223,868,129.0	-	223,868,129.0	252,637,068.0	5,787,285.0	258,424,353.0	54,503,693.3	-	5,332,713.6	59,836,406.9	23.2	252,637,061.5	5,787,283.6	258,424,345.1	100.0
	PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS	530,476,975.0	-	530,476,975.0	3,000,000.0	-	3,000,000.0	-	-	-	-	-	3,000,000.0	-	3,000,000.0	
	Total PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS	530,476,975.0	-	530,476,975.0	3,000,000.0	-	3,000,000.0	-	-	-	-	-	3,000,000.0	-	3,000,000.0	
	RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS	3,000,000.0	-	3,000,000.0	55,484.0	84,392.0	139,876.0	28,061.8	-	-	28,061.8	20.1	55,483.2	84,392.0	139,875.2	100.0
	Total RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS	3,000,000.0	-	3,000,000.0	55,484.0	84,392.0	139,876.0	28,061.8	-	-	28,061.8	20.1	55,483.2	84,392.0	139,875.2	100.0
	REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSA	1,472,352.0	-	1,472,352.0	-	2,087,133.0	2,087,133.0	-	-	-	-	-	-	27,135.6	27,135.6	
	Total REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSA	1,472,352.0	-	1,472,352.0	-	2,087,133.0	2,087,133.0	-	-	-	-	-	-	27,135.6	27,135.6	
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	85,149,652.0	-	85,149,652.0	38,977,350.0	193,865,019.0	232,842,369.0	15,910,670.0	-	193,865,019.0	209,775,689.0	90.1	38,977,350.0	193,865,019.0	232,842,369.0	100.0
	Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	85,149,652.0	-	85,149,652.0	38,977,350.0	193,865,019.0	232,842,369.0	15,910,670.0	-	193,865,019.0	209,775,689.0	90.1	38,977,350.0	193,865,019.0	232,842,369.0	100.0
	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA	352,039,451.0	-	352,039,451.0	1,102,389,981.0	1,135,021,775.0	2,237,411,756.0	717,329,353.5	-	166,000,878.0	883,330,231.5	39.5	1,102,389,976.7	1,124,959,003.4	2,227,348,980.1	99.6
	Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA	352,039,451.0	-	352,039,451.0	1,102,389,981.0	1,135,021,775.0	2,237,411,756.0	717,329,353.5	-	166,000,878.0	883,330,231.5	39.5	1,102,389,976.7	1,124,959,003.4	2,227,348,980.1	99.6
	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA	166,152,823.0	-	166,152,823.0	185,873,353.0	23,425,062.0	209,298,415.0	31,360,702.7	-	4,566,247.2	35,926,949.9	17.2	185,873,348.3	21,545,081.7	207,418,429.9	99.1
	Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA	166,152,823.0	-	166,152,823.0	185,873,353.0	23,425,062.0	209,298,415.0	31,360,702.7	-	4,566,247.2	35,926,949.9	17.2	185,873,348.3	21,545,081.7	207,418,429.9	99.1
	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA	187,034,949.0	-	187,034,949.0	88,346,386.0	15,061,105.0	103,407,491.0	27,449,715.1	-	2,817,290.2	24,632,425.0	23.8	88,346,377.6	9,948,490.2	98,294,867.9	95.1
	Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA	187,034,949.0	-	187,034,949.0	88,346,386.0	15,061,105.0	103,407,491.0	27,449,715.1	-	2,817,290.2	24,632,425.0	23.8	88,346,377.6	9,948,490.2	98,294,867.9	95.1
	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA	833,369,786.0	-	833,369,786.0	355,165,353.0	222,063,527.0	577,228,880.0	108,579,490.0	-	57,572,547.4	166,152,037.5	28.8	355,165,334.6	217,691,175.9	572,856,510.5	99.2
	Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA	833,369,786.0	-	833,369,786.0	355,165,353.0	222,063,527.0	577,228,880.0	108,579,490.0	-	57,572,547.4	166,152,037.5	28.8	355,165,334.6	217,691,175.9	572,856,510.5	99.2
	SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA	151,981,389.0	-	151,981,389.0	36,640,180.0	16,705,114.0	53,345,294.0	9,217,942.6	-	2,921,211.8	12,139,154.5	22.8	36,640,173.1	15,583,178.1	52,223,351.2	97.9
	Total SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA	151,981,389.0	-	151,981,389.0	36,640,180.0	16,705,114.0	53,345,294.0	9,217,942.6	-	2,921,211.8	12,139,154.5	22.8	36,640,173.1	15,583,178.1	52,223,351.2	97.9
	SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19	64,792,421.0	-	64,792,421.0	8,606,888.0	270,000.0	8,876,888.0	2,387,788.0	-	1,984.0	2,389,772.0	26.9	8,606,887.8	56,927.5	8,663,815.3	97.6
	Total SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19	64,792,421.0	-	64,792,421.0	8,606,888.0	270,000.0	8,876,888.0	2,387,788.0	-	1,984.0	2,389,772.0	26.9	8,6			



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
	III. Formación Bruta de Capital	164,845,293.0	6,230,867.0	171,076,160.0	541,018,632.0	247,866,506.0	788,885,138.0	162,643,420.8	19,394,111.9	182,037,532.7	23.1	541,018,534.9	26,081,931.9	567,100,466.8	71.9
	0060 - Secretaría de Salud	164,845,293.0	6,230,867.0	171,076,160.0	541,018,632.0	247,866,506.0	788,885,138.0	162,643,420.8	19,394,111.9	182,037,532.7	23.1	541,018,534.9	26,081,931.9	567,100,466.8	71.9
	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL SISTEMA DE SALUD I	-	-	-	-	3,724,000.0	3,724,000.0	-	-	-	-	-	3,707,439.4	3,707,439.4	99.6
	Total ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS PARA EL SISTEMA DE	-	-	-	-	3,724,000.0	3,724,000.0	-	-	-	-	-	3,707,439.4	3,707,439.4	99.6
	ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS	340,000.0	-	340,000.0	37,958,433.0	-	37,958,433.0	37,958,430.0	-	37,958,430.0	100.0	37,958,430.0	-	37,958,430.0	100.0
	Total ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SER	340,000.0	-	340,000.0	37,958,433.0	-	37,958,433.0	37,958,430.0	-	37,958,430.0	100.0	37,958,430.0	-	37,958,430.0	100.0
	ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZAD	455,391.0	-	455,391.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIK	455,391.0	-	455,391.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS	-	-	-	191,109.0	-	191,109.0	-	-	-	-	191,109.0	-	191,109.0	100.0
	Total ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZ	-	-	-	191,109.0	-	191,109.0	-	-	-	-	191,109.0	-	191,109.0	100.0
	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS	3,027,557.0	-	3,027,557.0	1,211,262.0	1,456,993.0	2,668,255.0	540,811.6	-	540,811.6	20.3	1,211,260.1	1,456,993.0	2,668,253.1	100.0
	Total ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS	3,027,557.0	-	3,027,557.0	1,211,262.0	1,456,993.0	2,668,255.0	540,811.6	-	540,811.6	20.3	1,211,260.1	1,456,993.0	2,668,253.1	100.0
	ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS	554,958.0	-	554,958.0	100,000.0	-	100,000.0	-	-	-	-	100,000.0	-	100,000.0	100.0
	Total ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZAC	554,958.0	-	554,958.0	100,000.0	-	100,000.0	-	-	-	-	100,000.0	-	100,000.0	100.0
	COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES	165,000.0	-	165,000.0	29,946.0	-	29,946.0	29,946.0	-	29,946.0	100.0	29,946.0	-	29,946.0	100.0
	Total COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSION	165,000.0	-	165,000.0	29,946.0	-	29,946.0	29,946.0	-	29,946.0	100.0	29,946.0	-	29,946.0	100.0
	COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICI	30,000.0	-	30,000.0	178,881.0	-	178,881.0	-	-	-	-	178,880.2	-	178,880.2	100.0
	Total COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE S	30,000.0	-	30,000.0	178,881.0	-	178,881.0	-	-	-	-	178,880.2	-	178,880.2	100.0
	COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACION	-	-	-	1,334,854.0	-	1,334,854.0	1,234,997.7	-	1,234,997.7	92.5	1,334,853.3	-	1,334,853.3	100.0
	Total COORDINACIÓN SUPERIOR DE REGULACION	-	-	-	1,334,854.0	-	1,334,854.0	1,234,997.7	-	1,234,997.7	92.5	1,334,853.3	-	1,334,853.3	100.0
	DESARROLLO DE RECURSO HUMANO	11,384,262.0	-	11,384,262.0	3,039,007.0	-	3,039,007.0	3,039,004.7	-	3,039,004.7	100.0	3,039,004.7	-	3,039,004.7	100.0
	Total DESARROLLO DE RECURSO HUMANO	11,384,262.0	-	11,384,262.0	3,039,007.0	-	3,039,007.0	3,039,004.7	-	3,039,004.7	100.0	3,039,004.7	-	3,039,004.7	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION	58,576,640.0	-	58,576,640.0	86,491,700.0	-	86,491,700.0	47,108,278.0	-	47,108,278.0	54.5	86,491,655.9	-	86,491,655.9	100.0
	Total DIRECCION Y COORDINACION	58,576,640.0	-	58,576,640.0	86,491,700.0	-	86,491,700.0	47,108,278.0	-	47,108,278.0	54.5	86,491,655.9	-	86,491,655.9	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE	278,101.0	-	278,101.0	445,236.0	-	445,236.0	59,685.0	-	59,685.0	13.4	445,234.7	-	445,234.7	100.0
	Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE	278,101.0	-	278,101.0	445,236.0	-	445,236.0	59,685.0	-	59,685.0	13.4	445,234.7	-	445,234.7	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE	17,233,692.0	-	17,233,692.0	5,258,865.0	-	5,258,865.0	3,330,962.0	-	3,330,962.0	63.3	5,258,863.7	-	5,258,863.7	100.0
	Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE	17,233,692.0	-	17,233,692.0	5,258,865.0	-	5,258,865.0	3,330,962.0	-	3,330,962.0	63.3	5,258,863.7	-	5,258,863.7	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP	530,000.0	-	530,000.0	255,597.0	-	255,597.0	77,628.5	-	77,628.5	30.4	255,595.6	-	255,595.6	100.0
	Total DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP	530,000.0	-	530,000.0	255,597.0	-	255,597.0	77,628.5	-	77,628.5	30.4	255,595.6	-	255,595.6	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONAL	20,721,724.0	-	20,721,724.0	9,068,814.0	-	9,068,814.0	3,734,895.4	-	3,734,895.4	41.2	9,068,811.8	-	9,068,811.8	100.0
	Total DIRECCION Y COORDINACION DE RIESGO POBLACIONA	20,721,724.0	-	20,721,724.0	9,068,814.0	-	9,068,814.0	3,734,895.4	-	3,734,895.4	41.2	9,068,811.8	-	9,068,811.8	100.0
	DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	-	-	-	642,954.0	-	642,954.0	420,020.3	-	420,020.3	65.3	642,953.5	-	642,953.5	100.0
	Total DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR	-	-	-	642,954.0	-	642,954.0	420,020.3	-	420,020.3	65.3	642,953.5	-	642,953.5	100.0
	FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE	-	-	-	-	4,855,000.0	4,855,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTE	-	-	-	-	4,855,000.0	4,855,000.0	-	-	-	-	-	-	-	-



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado IV Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)			
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
	III. Formación Bruta de Capital	164,845,293.0	6,230,867.0	171,076,160.0	541,018,632.0	247,866,506.0	788,885,138.0	162,643,420.8	19,394,111.9	182,037,532.7	23.1	541,018,534.9	26,081,931.9	567,100,466.8	71.9
	0060 - Secretaría de Salud	164,845,293.0	6,230,867.0	171,076,160.0	541,018,632.0	247,866,506.0	788,885,138.0	162,643,420.8	19,394,111.9	182,037,532.7	23.1	541,018,534.9	26,081,931.9	567,100,466.8	71.9
	GESTION DE LA INFORMACION	580,000.0	-	580,000.0	519,657.0	-	519,657.0	365,044.5	-	365,044.5	70.2	519,656.3	-	519,656.3	100.0
	Total GESTION DE LA INFORMACION	580,000.0	-	580,000.0	519,657.0	-	519,657.0	365,044.5	-	365,044.5	70.2	519,656.3	-	519,656.3	100.0
	GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS NO NA	-	-	-	-	15,080,273.0	15,080,273.0	-	-	15,080,272.2	100.0	-	15,080,272.2	15,080,272.2	100.0
	Total GESTION PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS VARIAS	-	-	-	-	15,080,273.0	15,080,273.0	-	-	15,080,272.2	100.0	-	15,080,272.2	15,080,272.2	100.0
	INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD	10,456,431.0	-	10,456,431.0	5,878,786.0	-	5,878,786.0	1,988,502.3	-	1,988,502.3	33.8	5,878,782.5	-	5,878,782.5	100.0
	Total INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD	10,456,431.0	-	10,456,431.0	5,878,786.0	-	5,878,786.0	1,988,502.3	-	1,988,502.3	33.8	5,878,782.5	-	5,878,782.5	100.0
	INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	5,808,567.0	-	5,808,567.0	4,596,502.0	-	4,596,502.0	2,275,523.8	-	2,275,523.8	49.5	4,596,499.5	-	4,596,499.5	100.0
	Total INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	5,808,567.0	-	5,808,567.0	4,596,502.0	-	4,596,502.0	2,275,523.8	-	2,275,523.8	49.5	4,596,499.5	-	4,596,499.5	100.0
	PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL	447,689.0	-	447,689.0	704,962.0	-	704,962.0	300,550.2	-	300,550.2	42.6	704,959.7	-	704,959.7	100.0
	Total PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL	447,689.0	-	447,689.0	704,962.0	-	704,962.0	300,550.2	-	300,550.2	42.6	704,959.7	-	704,959.7	100.0
	PREMIO TERCERA OPERACION DESEMPEÑO	-	-	-	-	26,500.0	26,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total PREMIO TERCERA OPERACION DESEMPEÑO	-	-	-	-	26,500.0	26,500.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS	1,000,000.0	-	1,000,000.0	299,978.0	-	299,978.0	299,977.5	-	299,977.5	100.0	299,977.5	-	299,977.5	100.0
	Total PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS	1,000,000.0	-	1,000,000.0	299,978.0	-	299,978.0	299,977.5	-	299,977.5	100.0	299,977.5	-	299,977.5	100.0
	RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS	700,000.0	-	700,000.0	298,873.0	-	298,873.0	-	-	-	-	298,872.4	-	298,872.4	100.0
	Total RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS	700,000.0	-	700,000.0	298,873.0	-	298,873.0	-	-	-	-	298,872.4	-	298,872.4	100.0
	REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSA	-	-	-	-	41,305,001.0	41,305,001.0	-	4,313,839.7	4,313,839.7	10.4	-	5,837,227.3	5,837,227.3	14.1
	Total REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DE LA MALNUTRICIÓN/EUROSA	-	-	-	-	41,305,001.0	41,305,001.0	-	4,313,839.7	4,313,839.7	10.4	-	5,837,227.3	5,837,227.3	14.1
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	6,733,787.0	6,230,867.0	12,964,654.0	294,512,129.0	181,418,739.0	475,930,868.0	31,168,633.5	-	31,168,633.5	6.5	294,512,124.0	-	294,512,124.0	61.9
	Total SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES	6,733,787.0	6,230,867.0	12,964,654.0	294,512,129.0	181,418,739.0	475,930,868.0	31,168,633.5	-	31,168,633.5	6.5	294,512,124.0	-	294,512,124.0	61.9
	SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	850,000.0	-	850,000.0	1,573,500.0	-	1,573,500.0	1,317,912.0	-	1,317,912.0	83.8	1,573,498.3	-	1,573,498.3	100.0
	Total SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO	850,000.0	-	850,000.0	1,573,500.0	-	1,573,500.0	1,317,912.0	-	1,317,912.0	83.8	1,573,498.3	-	1,573,498.3	100.0
	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA	4,273,204.0	-	4,273,204.0	2,013,795.0	-	2,013,795.0	200,000.0	-	200,000.0	9.9	2,013,793.6	-	2,013,793.6	100.0
	Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA	4,273,204.0	-	4,273,204.0	2,013,795.0	-	2,013,795.0	200,000.0	-	200,000.0	9.9	2,013,793.6	-	2,013,793.6	100.0
	SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA	13,995,092.0	-	13,995,092.0	6,056,706.0	-	6,056,706.0	100,473.5	-	100,473.5	1.7	6,056,704.5	-	6,056,704.5	100.0
	Total SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA	13,995,092.0	-	13,995,092.0	6,056,706.0	-	6,056,706.0	100,473.5	-	100,473.5	1.7	6,056,704.5	-	6,056,704.5	100.0
	SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	1,400,000.0	-	1,400,000.0	294,918.0	-	294,918.0	-	-	-	-	294,917.5	-	294,917.5	100.0
	Total SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA	1,400,000.0	-	1,400,000.0	294,918.0	-	294,918.0	-	-	-	-	294,917.5	-	294,917.5	100.0
	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA	1,063,051.0	-	1,063,051.0	9,003,354.0	-	9,003,354.0	5,943,602.6	-	5,943,602.6	66.0	9,003,351.6	-	9,003,351.6	100.0
	Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA	1,063,051.0	-	1,063,051.0	9,003,354.0	-	9,003,354.0	5,943,602.6	-	5,943,602.6	66.0	9,003,351.6	-	9,003,351.6	100.0
	SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA	-	-	-	54,687,538.0	-	54,687,538.0	12,673,621.0	-	12,673,621.0	23.2	54,687,531.1	-	54,687,531.1	100.0
	Total SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA	-	-	-	54,687,538.0	-	54,687,538.0	12,673,621.0	-	12,673,621.0	23.2	54,687,531.1	-	54,687,531.1	100.0
	SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN	1,959,106.0	-	1,959,106.0	2,088,573.0	-	2,088,573.0	2,088,571.7	-	2,088,571.7	100.0	2,088,571.7	-	2,088,571.7	100.0
	Total SERVICIOS DE NORMALIZACIÓN	1,959,106.0	-	1,959,106.0	2,088,573.0	-	2,088,573.0	2,088,571.7	-	2,088,571.7	100.0	2,088,571.7	-	2,088,571.7	100.0
	SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA	-	-	-	6,381,516.0	-	6,381,516.0	2,137,801.2	-	2,137,801.2	33.5	6,381,513.2	-	6,381,513.2	100.0
	Total SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA	-	-	-	6,381,516.0	-	6,381,516.0	2,137,801.2	-	2,137,801.2	33.5	6,381,513.2	-	6,381,513.2	100.0
	SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	615,000.0	-	615,000.0	2,545,803.0	-	2,545,803.0	2,374,789.3	-	2,374,789.3	93.3	2,545,801.2	-	2,545,801.2	100.0
	Total SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL	615,000.0	-	615,000.0	2,545,803.0	-	2,545,803.0	2,374,789.3	-	2,374,789.3	93.3	2,545,801.2	-	2,545,801.2	100.0
	VIGILANCIA DE LA SALUD	620,000.0	-	620,000.0	2,346,135.0	-	2,346,135.0	2,346,134.0	-	2,346,134.0	100.0	2,346,134.0	-	2,346,134.0	100.0
	Total VIGILANCIA DE LA SALUD	620,000.0	-	620,000.0	2,346,135.0	-	2,346,135.0	2,346,134.0	-	2,346,134.0	100.0	2,346,134.0	-	2,346,134.0	100.0
	VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO	1,046,041.0	-	1,046,041.0	1,009,249.0	-	1,009,249.0	1,009,248.2	-	1,009,248.2	100.0	1,009,248.2	-	1,009,248.2	100.0
	Total VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO	1,046,041.0	-	1,046,041.0	1,009,249.0	-	1,009,249.0	1,009,248.2	-	1,009,248.2	100.0	1,009,248.2	-	1,009,248.2	100.0
	Total general	7,547,811,371.0	3,275,980,913.0	10,823,792,284.0	4,681,011,357.0	4,343,661,264.0	9,024,672,621.0	1,838,078,487.5	1,281,330,437.8	3,119,408,925.2	34.6	4,681,011,164.5	3,293,802,589.6	7,974,813,754.1	88.4

Fuente: SIAFI, 31/12/2025



ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0060 - Secretaría de Salud								
Apoyo al Sistema Integral de Protección Social (BID 5008/BL-HO)	Fortalecimiento de Servicios de Salud Materno Infantil	Informe	129	188	100%	42	42	100%
Construcción y equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán (Acuerdo Donación No 1660400)	Construido el Edificio del Laboratorio Nacional de Vigilancia de La Salud (JICA)	Informe de ejecución	1	1	100%	1	1	100%
	Adquirido mobiliario, equipo tecnológico, y terrestre para el año 2025	Equipo	576	576	100%	576	576	100%
	Adquirido, instalado el equipo para el Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de Salud	Equipo	71	71	100%	71	71	100%
Programa de construcción y equipamiento de 3 hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán)	Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán	Informe técnico	15	28	100%	4	12	100%



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras (BID 5790/BL-HO)	Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa	Informe técnico	1	0	0%	0	0	0%
	Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales	Informe	55	0	0%	15	0	0%



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Reorganizar y fortalecer la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales	Informe	7	0	0%	1	0	0%
	Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2025	Informe	158	188	100%	50	50	100%
Programa de diseño, construcción y equipamiento del nuevo Hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (BCIE-2329)	Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca.	Informe de obra	21	12	57%	6	4	67%
	Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa	Informe de obra	19	11	58%	6	5	83%
	Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales	Informe	17	0	0%	8	0	0%



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Realizada la gestión de gastos administración del proyecto	Informe	75	91	100%	18	27	100%
Proyecto Servicios Esenciales de salud y preparación ante emergencias (RESHAPE) (TF01861)	Fortalecido el sistema de cadena de frío y realizada las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional.	Informe	9	0	0%	1	0	0%
	Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y laboratorio de virología nacional	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto	Informe	6	0	0%	1	0	0%
	Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI)	Informe	1	0	0%	1	0	0%



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes.	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional.	Informe	1	0	0%	1	0	0%
	Fortalecido el Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV).	Informe	1	0	0%	0	0	0%
	Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto	Informe	1	0	0%	1	0	0%
Proyecto Honduras Iniciativa Regional de Eliminación de la Malaria (IREM en Mesoamérica y República Dominicana) (GRT/MM-17339-40-HO)	Fortalecer la calidad de los servicios de diagnóstico, tratamiento, investigación y respuesta de los casos de malaria.	Informe	4	3	75%	2	2	100%



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Fortalecer la vigilancia epidemiológica entomológica y parasitológica de malaria	Informe	3	3	100%	1	1	100%
	Fortalecida la conducción técnica y financiera del proyecto.	Informe	3	2	67%	1	1	100%
Respuesta inmediata de salud pública para contener y controlar el coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO)	Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL	Equipo	1	0.5	50%	1	0.5	50%
	Adquiridos generadores eléctricos para 5 hospitales	Equipo	1	0	0%	1	0	0%
	Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas	Equipo	601	596	99%	1	0.5	50%



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

ANEXO No.2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	neonatales de 5 hospitales							
	Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2025	Informe	80	71	89%	20	42	100%

Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos
