



Secretaría de
Finanzas
Gobierno de la República

Informe de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA AL IV TRIMESTRE 2025

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

Tegucigalpa, Honduras

Enero, 2026

www.sefin.gob.hn





IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

a. Ejecución Física-Financiera de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) de Honduras, fundada en 1995 para regular y promover el desarrollo del sector de telecomunicaciones en el país. Como ente técnico estatal, administra el espectro radioeléctrico y establece políticas que fomentan la competencia justa, protegen los derechos de los usuarios y aseguran servicios de calidad. Su misión es impulsar la conectividad y reducir la brecha digital, garantizando el acceso de la población a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y colaborando en la transformación digital de Honduras. Al cierre del IV trimestre del 2025, la institución contó con un presupuesto vigente para la ejecución de programas y proyectos de L250.2 millones. La ejecución del trimestre ascendió a casi L204.9 millones lo que representó 81.9%, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al IV Trimestre del
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	236,460,722
Inversión Productiva	36,215,722
Inversión Social	200,000,000
Formación Bruta de Capital	245,000
Presupuesto Vigente	250,212,634
Inversión Productiva	250,049,774
Inversión Social	0
Formación Bruta de Capital	162,860
Ejecutado IV Trimestre	204,994,725
Inversión Productiva	204,953,723
Inversión Social	0
Formación Bruta de Capital	41,002
% Ejecución (Devengado IV Trim-2024/Vigente)	81.9%
Ejecutado Anual	240,068,087
Inversión Productiva	239,905,228
Inversión Social	0
Formación Bruta de Capital	162,859
% Ejecución (Devengado anual/Vigente)	95.9%

Nota: SIAFI, 31/12/2025

b. Financiamiento de la Inversión Pública

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) financia la ejecución de sus programas y proyectos principalmente con recursos de origen interno, siendo el Tesoro Nacional la principal fuente de financiamiento. Todas las actividades y proyectos se desarrollan exclusivamente con fondos provenientes de fuentes nacionales.




c. Comportamiento de la Ejecución al IV Trimestre (2021-2025)

Al cuarto trimestre de cada año en el período 2021-2025, la ejecución presupuestaria de los recursos asignados ha mostrado variaciones considerables.

- En 2021 y 2022, el presupuesto fue mínimo en términos monetarios, con montos de 0.2 y 1.5, y se ejecutó en su totalidad.
- A partir de 2023, el presupuesto aumentó de forma clara, alcanzando L601.1 en 2023 y L679.6 en 2024. En ambos años se ejecutó todo el presupuesto asignado, lo que mostró que la institución pudo ejecutar proyectos de inversión pública con orden y control del gasto.
- En 2025, el presupuesto asignado ascendió a L250.2 y se ejecutaron L240.1, lo que representó un 95.9%. quedando una pequeña parte sin ejecutar, sin embargo; se mantuvo dentro de rangos aceptables y no afectó de manera relevante el desempeño general del período revisado. Durante este año se cerraron los proyectos de inversión que fueron ejecutados por la institución.

Gráfico No. 01
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 31 de diciembre (2021-2025)
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones
Cifras en millones de Lempiras

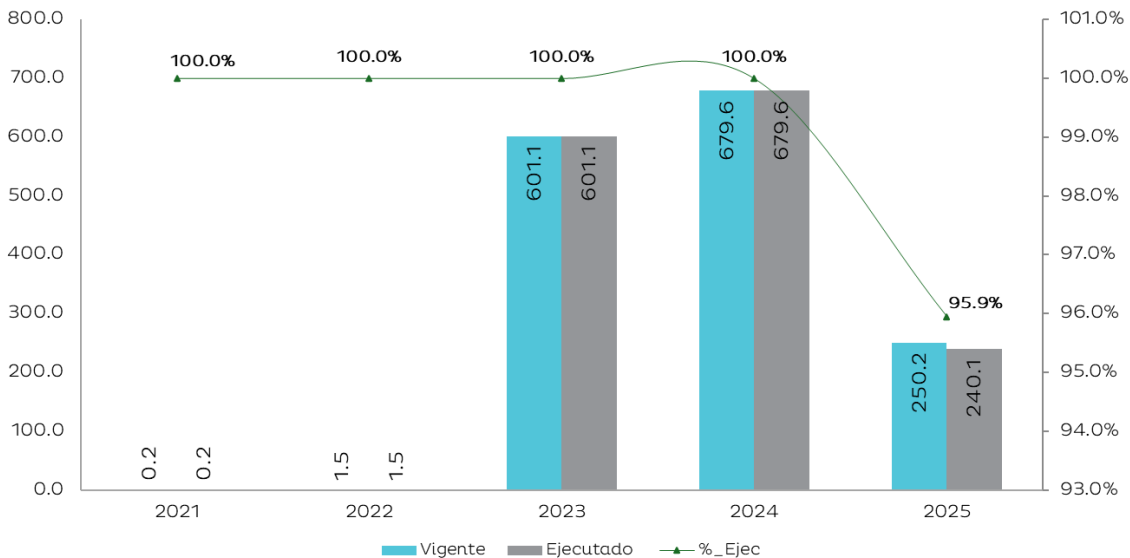



d. Principales Proyectos

La inversión productiva en el cuarto trimestre de 2025 se concentra en el siguiente proyecto:

1. Programa de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.

El objetivo general del Programa Ampliar la capacidad de CONATEL para regular los servicios de telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico e impulsar el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, garantizando la calidad de los servicios, protegiendo los derechos de los usuarios y promoviendo la conectividad de la población. Los principales avances físicos al 31 de diciembre de 2025 son los siguientes:

Cuadro No. 2
Principales Metas Físicas al IV trimestre 2025

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre de 2025		
		Program.	Ejecución	% Ejec.	Program.	Ejecución	% Ejec.
Construcción de Nuevas plantas del Edificio de CONATEL	PISO	2	2	100%	1	1	100%
Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad	SISTEMA	4	4	100%	1	1	100%
Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios	SISTEMA	1	1	100%	1	1	100%
Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	EQUIPO	210	210	100%	210	210	100%

Fuente: CONATEL, al 31 de diciembre de 2025



Al cuarto trimestre se finalizó con los siguientes procesos:

Componente I: Fortalecimiento Técnico

- Se finalizó al 100% la remodelación de la oficina de la estación remota atendida en la ciudad de Tocoa, ubicada en las instalaciones de COPECO, proceso ejecutado por la empresa ELCOS, quedando completamente operativa para el control y monitoreo del espectro radioeléctrico.
- Se concluyó en su totalidad (100%) la instalación de las estaciones desatendidas para el control y monitoreo del espectro radioeléctrico, correspondiente al proceso adjudicado mediante Licitación Pública Internacional LPI-001-2023-CONATEL, fortaleciendo la capacidad institucional de supervisión a nivel nacional.
- Se completó al 100% la segunda revisión técnica del proyecto de Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, realizada por expertos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), constituyéndose en un insumo técnico final para el fortalecimiento del marco legal del sector.

Componente III: Ampliación y Modernización de Infraestructura

- Se concluyó al 100% la construcción del cuarto y quinto nivel del edificio principal de CONATEL, obra ejecutada mediante la Licitación Pública Nacional LPN-CNT-03-2024, quedando las nuevas áreas totalmente habilitadas para uso institucional.
- Se finalizó al 100% la instalación del sistema de climatización del edificio principal de CONATEL, tanto en el nivel 1 como en el nivel 4, ejecutado a través de la Licitación Pública Nacional LPN-CNT-02-2024, mejorando de manera integral las condiciones técnicas, operativas y de confort del personal.



A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Programa a Nivel Nacional al cuarto trimestre de 2025:

Cuadro No. 3
Ejecución Histórica del Proyecto

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) a Nivel Nacional.	25261-1	US\$9,423,736.7	L248,257,977.00	01/08/2023-31/12/2025
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Deuengado)	% Ejecución
IV Trimestre 2025	36,215,722	36,215,722	4,953,723	13.7%
Acumulado 2025	36,215,722	39,905,236	39,905,228	100.0%
Acumulado Vida del Proyecto*	248,257,977	248,257,977	219,381,460	88.4%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 31/12/2025 (BCH): L26.3439 por US\$1.00

d.1. Principales Adquisiciones IV Trimestre 2025

Durante el cuarto trimestre de 2025, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) finiquitó las obligaciones pendientes de las adquisiciones y obras programadas, entre las que se incluyeron la remodelación de la oficina de la estación remota atendida en la ciudad de Tocoa, ejecutada por la empresa ELCOS, la finalización de los pagos y estimaciones correspondientes a la construcción de la cuarta y quinta planta del edificio principal, a cargo de la empresa CONCO, así como la conclusión total de la instalación del sistema de climatización del edificio principal de CONATEL, desarrollada por la empresa ELCON, quedando completamente operativos los distintos niveles intervenidos.

d.2. Programas Sociales

El presupuesto asignado a los programas sociales de la institución para el año 2025 ascendió a L200 millones, los cuales se destinaron a transferencias que debieron realizarse a la Empresa Hondureña de



Telecomunicaciones (HONDUTEL). Estos fondos tenían como objetivo respaldar iniciativas de proyectos indispensables para la recuperación de dicha entidad estatal. En consecuencia, los alcances físicos derivados de estas inversiones serán reportados directamente por HONDUTEL.

a. Gestión de la Inversión

Durante el cuarto trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Mediante Oficio CONATEL-CP-326-2025, Formulario FP-05 y Memorándum DPMF-M-507-2025, gestionó una modificación presupuestaria ante la Secretaría de Finanzas para trasladar fondos del grupo de gasto 40000 (bienes capitalizables) al grupo 20000 (servicios no personales), por un monto de L13,851,127.00 que se atendió en el último trimestre con el objetivo de finiquitar obligaciones derivadas de la oficina regional de Tocoa y la remodelación del cuarto y quinto piso del edificio principal.

b. Problemática y Acciones Durante el IV Trimestre-2025

Durante el IV trimestre de 2025, la ejecución del proyecto enfrentó limitaciones relacionadas con atrasos en la disponibilidad presupuestaria, demoras en procesos de licitación para la adquisición de equipamiento especializado y retrasos en algunas obras de infraestructura, así como mayores tiempos de entrega y verificación técnica de equipos importados.

Ante esta situación, se implementaron acciones correctivas como la reprogramación de actividades, priorización de procesos críticos, ajustes en los cronogramas de contratación y una coordinación técnica y financiera más eficiente para asegurar el uso oportuno de los recursos disponibles.



Como resultado de estas medidas, se logró mitigar los impactos operativos, completar las actividades sustantivas previstas y finalizar con éxito el proyecto, cumpliendo los objetivos institucionales y fortaleciendo las capacidades técnicas, logísticas y operativas de CONATEL.

V. CONCLUSIONES

- Al cierre del cuarto trimestre de 2025, CONATEL contó con un presupuesto vigente de L250.2 millones, alcanzando una ejecución de L204.9 millones, equivalente al 81.9%, reflejando un nivel satisfactorio de gestión financiera y cumplimiento de los programas y proyectos de inversión pública.
- El Programa de Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas alcanzó el 100% de sus metas físicas programadas, incluyendo la ampliación de infraestructura institucional, la implementación de sistemas de monitoreo del espectro radioeléctrico, la adquisición de equipamiento especializado y la mejora de las condiciones operativas del personal.
- Durante el trimestre se presentaron retrasos asociados a la disponibilidad presupuestaria, procesos de contratación y tiempos de importación y verificación técnica de equipos; no obstante, mediante reprogramaciones y priorización de actividades críticas se mitigaron los impactos y se logró finalizar satisfactoriamente el proyecto.
- La operatividad, mantenimiento y sostenibilidad de las inversiones realizadas quedaron contempladas en el presupuesto del siguiente ejercicio fiscal, garantizando la continuidad de los servicios, el funcionamiento de la infraestructura y el aprovechamiento de los equipos adquiridos.



VI. RECOMENDACIONES

- Fortalecer la planificación y programación presupuestaria anual, asegurando la disponibilidad oportuna de recursos para mantener y mejorar los niveles de ejecución financiera alcanzados.
- Dar continuidad a las inversiones estratégicas orientadas al fortalecimiento institucional, priorizando la modernización tecnológica, el monitoreo del espectro radioeléctrico y la mejora de la calidad de los servicios a los usuarios.
- Anticipar y optimizar los procesos de contratación y adquisición de bienes y servicios especializados, considerando tiempos de importación, instalación y validación técnica, a fin de prevenir retrasos en la ejecución de futuros proyectos.
- Garantizar en los presupuestos de los próximos ejercicios fiscales los recursos necesarios para la operación, mantenimiento y sostenibilidad de la infraestructura y equipos implementados, asegurando la continuidad y el máximo aprovechamiento de las inversiones realizadas.

Anexo No.1

Secretaría de Finanzas

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE, 2025

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado IV Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Total	% Ejecución (Dev./Vig.)
2	I. Inversión Productiva		36,215,722.0	36,215,722.0	250,049,774.0	250,049,774.0	204,953,723.3	204,953,723.3	82.0%	239,905,228.1	239,905,228.1	95.9%
2	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		36,215,722.0	36,215,722.0	250,049,774.0	250,049,774.0	204,953,723.3	204,953,723.3	82.0%	239,905,228.1	239,905,228.1	95.9%
1	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL.	BCH-25261-1	36,215,722.0	36,215,722.0	50,049,774.0	50,049,774.0	4,953,723.3	4,953,723.3	9.9%	39,905,228.1	39,905,228.1	79.7%
	Total FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL.		36,215,722.0	36,215,722.0	50,049,774.0	50,049,774.0	4,953,723.3	4,953,723.3	9.9%	39,905,228.1	39,905,228.1	79.7%
2	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		-	-	200,000,000.0	200,000,000.0	200,000,000.0	200,000,000.0	100.0%	200,000,000.0	200,000,000.0	100.0%
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		-	-	200,000,000.0	200,000,000.0	200,000,000.0	200,000,000.0	100.0%	200,000,000.0	200,000,000.0	100.0%
	II. Inversión Social		200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	OTRAS INVERSIONES SOCIALES		200,000,000.0	200,000,000.0	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	Total OTRAS INVERSIONES SOCIALES		20,000,000.0	20,000,000.0	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
	III. Formación Bruta de Capital		245,000.0	245,000.0	162,860.0	162,860.0	41,001.7	41,001.7	25.2%	162,859.4	162,859.4	100.0%
	0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones		245,000.0	245,000.0	162,860.0	162,860.0	41,001.7	41,001.7	25.2%	162,859.4	162,859.4	100.0%
	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		245,000.0	245,000.0	162,860.0	162,860.0	41,001.7	41,001.7	25.2%	162,859.4	162,859.4	100.0%
	Total PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y ACCESO UNIVERSAL A LAS TELECOMUNICACIONES		245,000.0	245,000.0	162,860.0	162,860.0	41,001.7	41,001.7	25.2%	162,859.4	162,859.4	100.0%
	Total general		236,460,722.0	236,460,722.0	250,212,634.0	250,212,634.0	204,994,725.1	204,994,725.1	81.9%	240,068,087.5	240,068,087.5	95.9%

Fuente: SIAFI, 31/12/2025

Anexo No.2
SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL IV TRIMESTRE, 2025

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			IV Trimestre 2025		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
0101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones								
001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y LOGÍSTICAS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL) A NIVEL NACIONAL	Construcción de Nuevas plantas del Edificio de CONATEL	PISO	2	2	100%	1	1	100%
	Sistemas de Monitoreo y Control del espectro y la conectividad	SISTEMA	4	4	100%	1	1	100%
	Sistemas para la medición de la calidad de servicios y protección a los usuarios	SISTEMA	1	1	100%	1	1	100%
	Equipos adquiridos y procesos realizados para el fortalecimiento técnico y logístico de CONATEL.	EQUIPO	210	210	100%	210	210	100%

Fuente: Unidades Ejecutoras de Proyectos
