



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS)

Informe No. 0416-001-2026
Tegucigalpa, abril 2026



Contenido

| | |
|--|--------------------------------------|
| Contenido | 2 |
| IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN | 3 |
| A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA..... | 3 |
| B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA..... | 4 |
| C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) 4 | |
| D. PRINCIPALES PROYECTOS | 5 |
| D.1 La mayor parte de la inversión acumulada al I trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:..... | 5 |
| 1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras | 5 |
| 2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras | 5 |
| A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:..... | 5 |
| D.1.1. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 | 6 |
| 2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras | 7 |
| E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN | 7 |
| F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026 | 7 |
| G. CONCLUSIONES | 8 |
| H. RECOMENDACIONES | 8 |
| ANEXO 1 | 10 |
| ANEXO 2 | ¡Error! Marcador no definido. |



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento en Honduras, (SEDECOAS), se dedica a promover el desarrollo comunitario a través de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos. La institución trabaja en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable del país.

Al I trimestre del 2026 la institución contó con un presupuesto vigente L 183.8 millones; para la ejecución productiva a través del proyecto Programa de Agua y Saneamiento en Honduras y Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras, La ejecución presupuestaria I trimestre ascendió a L 0.93 millones (0.1%), tal como se

detalla en el cuadro No.01. Es de suma importancia lograr la reactivación de los proyectos, como la formalización de los contratos de la unidad ejecutora del programa, a fin de reactivar y normalizar los procesos de pago para transformar los recursos disponibles en avances concretos, evitando que el crédito externo permanezca inmovilizado.

Las cifras reportadas al cierre del I trimestre de 2026 corresponden al **presupuesto prorrogado del ejercicio fiscal 2025** aplicable para 2026, conforme a la normativa presupuestaria vigente.

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 2 se instruye suprimir la Secretaría de Desarrollo comunitario Agua y Saneamiento SEDECOAS y pasa a formar parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras


| Descripción | Monto |
|---|------------------------|
| Presupuesto Aprobado | 190,594,624.0 |
| Inversión Productiva | 183,805,602.0 |
| Formación Bruta de Capital | 6,789,022.0 |
| Presupuesto Vigente | 1,752,285,608.0 |
| Inversión Productiva | 183,805,602.0 |
| Formación Bruta de Capital | 1,568,480,006.0 |
| Ejecutado Anual | 1,326,167.8 |
| Inversión Productiva | 937,145.8 |
| Formación Bruta de Capital | 389,022.0 |
| % Ejecución (Devengado anual/Vigente) | 0.1% |
| Compromiso Aprobado | 1,566,168.0 |
| Inversión Productiva | 1,177,146.0 |
| Formación Bruta de Capital | 389,022.0 |
| % Compromiso (Compromiso I Cuatrim-2026/Vigente) | 0.1% |

Nota: SIAFI, 31/03/2026



B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión ejecutada por la SEDECOAS proviene de fuentes de financiamiento externo y recursos del tesoro nacional.

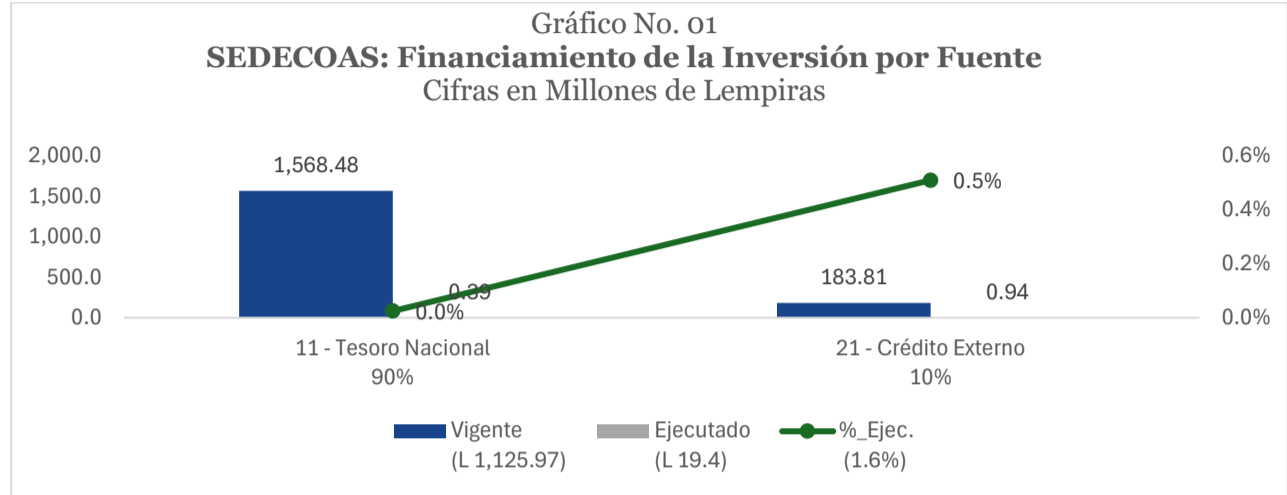


Fuente: SIAFI

Del total del financiamiento del presupuesto vigente (L1,752.2.0 millones), el 90% corresponde a fondos provenientes de fondos nacionales con un monto de L 1,568.48 millones y fondos Externos para los proyectos con un monto vigente de L 183.81 millones equivalente a 10.%. tal como se muestra en el gráfico No 1.

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2023 y 2026, basado en los montos vigentes y ejecutados:

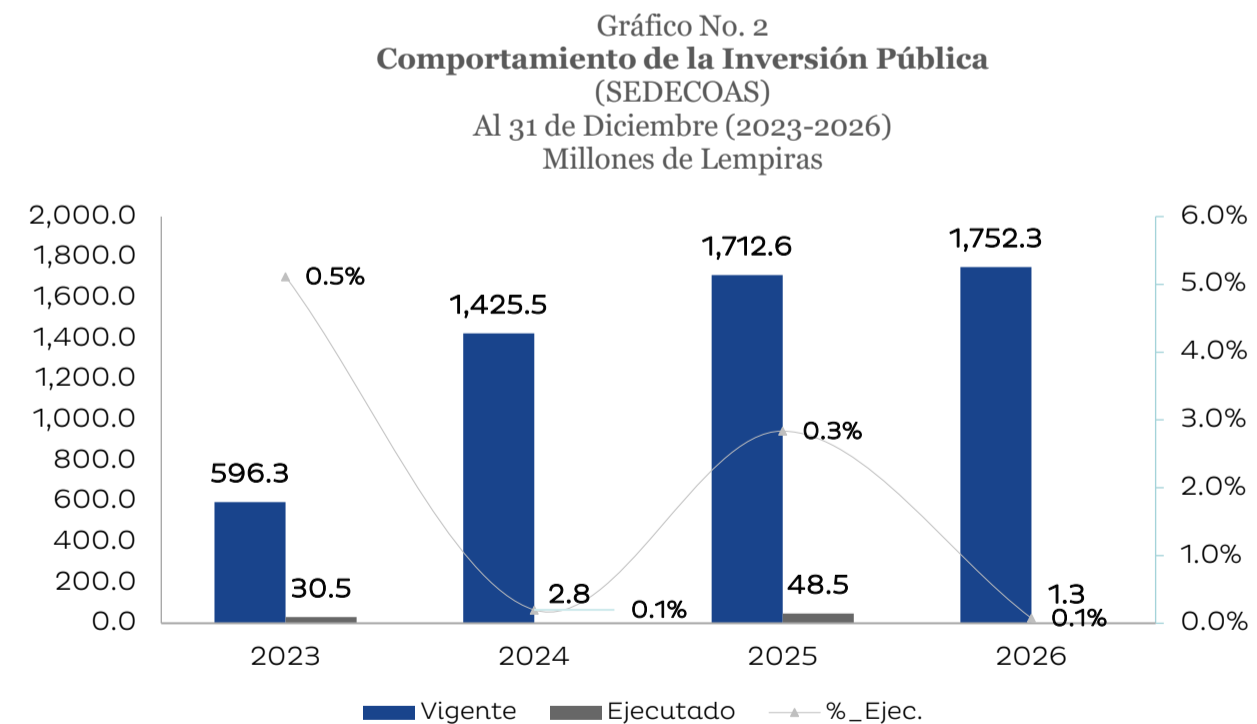

Fuente: SIAFI



SECRETARÍA DE FINANZAS



En la gráfica se detalla un incremento significativo del presupuesto vigente pasando de una asignación de L 596.3 millones en 2023 a L 1,425.5 millones en 2024, para el 2025 incrementó a L 1,712.6 millones a fin de que la institución iniciara los procesos de ejecución de las nuevas iniciativas de inversión y actualmente para el 2026 tiene asignado un presupuesto vigente de L 1,752.3 millones,

En cuanto al porcentaje de ejecución, en el año 2023 a nivel institucional se reporta una ejecución de L 30.5 millones, que representa el 5% con relación a su presupuesto vigente, en el año 2024 el monto ejecutado disminuyó a L 2.8 millones que representó apenas el 0.1% en relación con su presupuesto vigente y para el 2025 se alcanzó una ejecución de L 48.5 millones que representan el 3% de cumplimiento. Finalmente, para 2026 se reporta una ejecución de L 1.3 millones apenas 0.1% con relación al presupuesto vigente.

Se precisa que las cifras que se muestran en esta sección están orientadas, en su mayoría, a la Formación Bruta de Capital, al corresponder principalmente a inversiones en infraestructura y activos físicos asociados a los proyectos de agua y saneamiento.

D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 La mayor parte de la inversión acumulada al I trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras
2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento. Para lograr el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rural.
- Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del cambio climático (CC) sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Los principales avances físicos al 31 de marzo de 2026 son los siguientes: **Principales Metas Físicas al I trimestre 2026**

| Metas Física | Unidad de Medida | Anual | | | I Trimestre 2026 | | |
|---|------------------|--------------|-----------|--------|------------------|-----------|--------|
| | | Programación | Ejecución | % Ejec | Programación | Ejecución | % Ejec |
| Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades | SISTEMA | 8 | 8 | 100% | 0 | 0 | 0% |
| Obras de Mitigación | OBRA | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0% |

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Durante el primer trimestre de 2026, la ejecución física del Programa se ha visto interrumpida debido a la suspensión de varios contratos de obra. Las empresas constructoras han detenido actividades principalmente por la falta de pago y la necesidad de ajustes contractuales, lo que ha generado un impacto directo en el avance físico y financiero de los proyectos.

Entre los proyectos afectados se encuentran:

- Sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades de La Paz y Santa Bárbara, suspendidos el 12 de marzo de 2026.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Obras de reparación y construcción de sistemas de abastecimiento en municipios de Intibucá, también suspendidas en la misma fecha.
- Intervenciones en Choluteca y Comayagua, que fueron detenidas el 19 de marzo de 2026.
- Proyectos de reposición de sistemas en Colón, suspendidos el 16 de marzo de 2026.

D.1.1. Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

Evaluación Financiera I trimestre 2026

| Proyecto | Convenio | Costo Total | | Fecha de Inicio - Fin |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras) | 5284/BL-HO | US\$ 45,000,000 | 1,201,050,000 | 15/05/2023-23/11/2028 |
| | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado (Devengado) | % Ejecución |
| I Trimestre 2026 | 172,328,764.00 | 172,328,764.00 | 937,145.82 | 0.7% |
| Acumulado 2026 | 172,328,764.00 | 172,328,764.00 | 937,145.82 | 0.7% |
| Acumulado Vida del Proyecto * | 1,201,050,000 | 1,201,050,000 | 127,781,681.56 | 11% |

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
 Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

Información Específica de Proyectos

Avance físico del trimestre, Proyectos en pausa a la espera de ratificación del Congreso Nacional.

| No | Nombre del Proyecto | Avance | | |
|--------------------------|---|------------|--------|---------------------------|
| | | Financiero | Físico | Tiempo |
| Subcomponente 1.1 | | | | |
| 1 | Proyecto Obras De Mitigación En Col. Nueva Jerusalen No.2 | 20.00% | 1.90% | 55.42% |
| 2 | Obras De Mitigación Col. Montes De Los Olivos | 20.00% | 1.18% | 55.42% |
| 3 | Obras De Mitigación En Col. Brisas Del Mogote | 20.00% | 9.58% | 110% |
| Subcomponente 1.2 | | | | |
| 4 | Sistema De Agua Potable y Saneamiento De Las Comunidades Del Guayabal, Pedernal, Guascotoro Y Delicias, Municipio De San José, Departamento De La Paz | 26.61% | 18.79% | 65.67% |
| 5 | Ampliación Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Casco Urbano San Marcos, San Marcos, Santa Bárbara | 29.79% | 12.24% | 82.08% |
| 6 | Reparación Del Sistema De Agua Potable, Casco Urbano Del Municipio De San Marcos De La Sierra, Departamento De Intibucá | 60.92% | 51.15% | 82.08% |
| 7 | Construcción De Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Campanario 2, Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguira, Masaguara, Intibucá | 27.25% | 27.29% | 82.08% |
| 8 | Reposición Sistema De Agua Potable, Comunidades De Sangrelaya, Cocalito, Irióna Puerto Y Los Mangos, Municipio De Irióna, Departamento De Colón | 35.10% | 18.87% | 72.96% |
| 9 | Proyecto Línea De Impulsión Sanaa-Barrios, Comayagua, Distrito Central | 20.00% | 0.00% | Pendiente Orden de Inicio |
| 10 | Ampliación Sistema De Abastecimiento De Agua Potable Y Saneamiento En Las Comunidades Tablones Arriba, Municipio Santa Ana De Yusguare, Choluteca | 20.00% | 0.00% | 29.17% |
| 11 | Constucción De Planta De Tratamiento Fime, Municipio De San Jerónimo, Departamento De Comayagua | 20.00% | 0.00% | 29.17% |

Fuente FHIS



Durante el primer trimestre de 2026 no se registraron avances en los procesos de adquisiciones del Programa. La principal limitante ha sido la ausencia de firma delegada, lo que ha impedido realizar los envíos oficiales y las gestiones administrativas necesarias para la formalización de contratos y la tramitación de procesos de compra.

Esta situación ha generado un retraso en la adjudicación de bienes y servicios esenciales para la ejecución de las obras y actividades de apoyo, manteniendo pendientes los procesos que ya cuentan con documentación técnica y financiera preparada.

2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras

Al I trimestre de 2026, el **Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras** no registra **avances físicos** ni **ejecución financiera**. En consecuencia, no se reportan metas físicas alcanzadas, estimaciones de obra, devengados ni desembolsos asociados al Programa durante el período evaluado.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante oficio DGIP-PRE-033-2026 se otorgó enmienda a la nota de prioridad por cambio de ejecutor a la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026

- **Transición institucional:** La supresión de SEDECOAS y el traslado de sus funciones a la SIT generó una parálisis administrativa que afectó directamente la operatividad del Programa. Este cambio institucional retrasó la toma de decisiones y la gestión de procesos clave, creando incertidumbre en la continuidad de las intervenciones.
- **Falta de firma delegada:** La ausencia de una autoridad con firma delegada impidió realizar envíos oficiales y procesar pagos, lo que paralizó los desembolsos hacia contratistas y supervisores. Esta limitante bloqueó la ejecución financiera y presupuestaria, afectando tanto la continuidad de obras como los procesos de adquisiciones y fortalecimiento institucional.
- **Suspensión de proyectos por falta de pago:** La mayoría de los contratos de obra fueron suspendidos por las empresas constructoras debido a la falta de desembolsos. Esto generó atrasos significativos en la ejecución física y financiera, además de obligar a iniciar procesos de ampliación de plazo, estimaciones y órdenes de cambio para poder reactivar las obras en el futuro.
- **Desfase entre ejecución física y financiera:** Algunos proyectos alcanzaron porcentajes físicos superiores al 70%, pero con ejecución financiera inferior al 20%. Esta disparidad refleja el impacto de la paralización administrativa y la falta de desembolsos oportunos, lo que compromete la credibilidad del Programa frente al BID y los contratistas.
- **Riesgo de incumplimientos contractuales:** La suspensión de obras y la falta de pagos incrementaron el riesgo de incumplimientos contractuales. En casos específicos, como el proyecto que debía finalizar el 2 de abril de 2026, se incumplió la garantía de cumplimiento, generando un impacto crítico en la gestión contractual y en la confianza de los actores involucrados.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Impacto en la sostenibilidad y fortalecimiento institucional: Las actividades de fortalecimiento comunitario y sectorial no pudieron avanzar debido a la falta de habilitación administrativa. Esto retrasa la implementación de planes de capacitación y acompañamiento, afectando la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento a largo plazo.
- Riesgo social y comunitario: Aunque se logró mantener la relación con las comunidades para evitar conflictos, la falta de avances en obra aumenta el riesgo de descontento social. La paralización prolongada podría derivar en presiones comunitarias más fuertes si no se normalizan los procesos en el corto plazo.
- Se encuentran pendientes de Ratificación por el Congreso Nacional 11 Contratos, por los que a la fecha las obras se encuentran suspendidas.

G. CONCLUSIONES

- Al I trimestre de 2026, la ejecución presupuestaria institucional es mínima (0.1% del presupuesto vigente) durante el período evaluado.
- La transición institucional (supresión de SEDECOAS y traslado de funciones a la SIT) generó una interrupción administrativa que afectó la gobernanza del Programa, retrasó la toma de decisiones y limitó la continuidad operativa.
- La ausencia de firma delegada se constituye como el principal cuello de botella para la gestión financiera y contractual, al impedir trámites oficiales, pagos a contratistas y supervisores, y la formalización de adquisiciones.
- La suspensión de contratos por falta de pago detuvo la ejecución física en varios proyectos, incrementando la necesidad de ampliaciones de plazo, ajustes contractuales y órdenes de cambio para una futura reactivación.
- Se observa un desfase relevante entre la ejecución física y la financiera en determinados proyectos, lo cual incrementa el riesgo de incumplimientos contractuales, deteriora la credibilidad del Programa frente a financiadores y proveedores, y puede derivar en mayores costos por reclamos y reprogramaciones.
- La paralización administrativa también afectó los procesos de adquisiciones y las actividades de fortalecimiento institucional y comunitario, comprometiendo la sostenibilidad de los sistemas de agua y saneamiento y retrasando la implementación de medidas de resiliencia climática.
- La falta de avances sostenidos incrementa el riesgo social y comunitario, debido a posibles presiones por parte de beneficiarios y autoridades locales, especialmente si no se normalizan los procesos de ejecución en el corto plazo.

H. RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos del I Trimestre de 2026, se recomienda priorizar acciones inmediatas para restablecer la gobernanza administrativa y financiera del Programa, reactivar la ejecución física de los contratos suspendidos y reducir los riesgos contractuales, sociales y de sostenibilidad. Las recomendaciones se presentan a continuación en orden de prioridad.

- **Regularizar la autoridad con firma delegada (prioridad inmediata):** gestionar, formalizar y comunicar la delegación de firma para habilitar pagos, envíos oficiales, aprobaciones y actos administrativos indispensables para la continuidad del Programa (incluyendo comunicaciones al BID y a terceros).
1. **Implementar un plan de reactivación de obras con cronograma y responsables:** elaborar un plan 30–60–90 días que incluya (i) listado de contratos suspendidos, (ii) condiciones de reanudación, (iii) estimaciones pendientes, (iv) ajustes/órdenes de cambio requeridos y (v) ruta crítica y fecha estimada de reinicio por proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



2. **Establecer un plan de desembolsos y flujo de caja del Programa**
3. **Fortalecer la coordinación SIT–Unidad Ejecutora–BID:** implementar un mecanismo de seguimiento quincenal con actas, acuerdos, responsables y fechas; utilizar un tablero de control para dar trazabilidad a decisiones, pagos, reactivaciones y adquisiciones.
4. **Reactivar y destrabar procesos de adquisiciones:** actualizar el Plan Anual de Compras/Adquisiciones (PACC), priorizar procesos críticos, revisar expedientes listos para envío y calendarizar hitos de adjudicación; establecer controles de tiempo por etapa para reducir rezagos.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Institución / Programa o Proyecto | Convenio | Presupuesto Aprobado | | | Presupuesto Vigente | | | Ejecutado Anual (Devengado) | | | | Compromiso Aprobado | | | | | |
|-----------|---|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | 12 - Recursos | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | % Ejec | Total Fondos Nacionales | Total Fondos Externos | Total general | % Comp./Vig | |
| 79 | 1. Inversión Productiva | | | 183,805,602 | 183,805,602 | - | | 183,805,602 | 183,805,602 | | | | 12.2% | | | | | |
| 2 | 0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento | | | 183,805,602 | 183,805,602 | | | 183,805,602 | 183,805,602 | | | 937,146 | 937,146 | 0.5% | | 1,177,146 | 1,177,146 | 0.6% |
| 1 | PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS | BID5284/BL-HO | | 172,328,764 | 172,328,764 | | | 172,328,764 | 172,328,764 | | | 0.94 | 937,146 | 0.5% | | 1,177,146 | 1,177,146 | 0.7% |
| | Total PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS | | | 172,328,764 | 172,328,764 | | | 172,328,764 | 172,328,764 | | | 937,146 | 937,146 | 0.5% | | 1,177,146 | 1,177,146 | 0.7% |
| 2 | Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras | 5875/BL-HO | | 11,476,838 | 11,476,838 | | | 11,476,838 | 11,476,838 | | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| | Total Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras | | | 11,476,838 | 11,476,838 | | | 11,476,838 | 11,476,838 | | | - | - | 0.0% | | - | - | 0.0% |
| | 2. Formación Bruta de Capital Fijo | | 6,789,022 | | 6,789,022 | - | 1,568,480,006 | | 1,568,480,006 | 389,022 | | - | 389,022 | 9.8% | 389,022 | - | 389,022 | 0.02% |
| | 0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento | | 6,789,022 | | 6,789,022 | | 1,568,480,006 | | 1,568,480,006 | 389,022 | | | 389,022 | 0.0% | 389,022 | | 389,022 | 0.02% |
| | ACTIVIDADES CENTRALES | | 789,022 | | 789,022 | | 11,400,000 | | 11,400,000 | 389,022 | | | 389,022 | 3.4% | 389,022 | | 389,022 | 3.4% |
| | Total ACTIVIDADES CENTRALES | | 789,022 | | 789,022 | | 11,400,000 | | 11,400,000 | 389,022 | | | 389,022 | 3.4% | 389,022 | | 389,022 | 3.4% |
| | GESTION DE PROYECTOS NACIONALES | | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 1,557,080,006 | | 1,557,080,006 | - | | | - | 0.0% | - | | - | 0.0% |
| | Total GESTION DE PROYECTOS NACIONALES | | 6,000,000 | | 6,000,000 | | 1,557,080,006 | | 1,557,080,006 | - | | | - | 0.0% | - | | - | 0.0% |
| | Total general | | 6,789,022 | 183,805,602 | 190,594,624 | - | 1,568,480,006 | 183,805,602 | 1,752,285,608 | 389,022 | 937,146 | 1,326,168 | 0 | 389,022 | 1,177,146 | 1,566,168 | 0.1% | |

Nota: SIAFI, 30/04/2026
