



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe Trimestral de Avance Físico y Financiero  
**PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA**

# Secretaría de Salud (SESAL)

**Informe No. 0060-001-2026**  
Tegucigalpa, Abril 2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Contenido

Contenido .....	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN .....	4
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	4
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA .....	6
C.COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026) .....	7
D. PRINCIPALES PROYECTOS .....	8
D.1 Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH): .....	8
D.1.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026 .....	9
D.1.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026 .....	10
D.1.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026.....	10
D.2 Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras .....	11
D.2.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	11
D.2.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	12
D.2.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	13
D.3 Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO): .....	14
D.3.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	14
D.3.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	15
D.3.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	16
D.4 Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE): .....	16
D.4.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026.....	16
D.4.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026.....	17
D.4.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026 .....	18
E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL .....	19
F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN .....	19



# SECRETARÍA DE FINANZAS



G.	PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026 .....	19
H.	CONCLUSIONES .....	21
I.	RECOMENDACIONES .....	21
ANEXO 1	.....	22
ANEXO 2	.....	23



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

### A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Salud (SESAL), tiene como misión ser la institución responsable de formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las políticas, normas, planes y programas nacionales de salud, ejercer la rectoría del Sector Salud; orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud, así como promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, entre otros.

El Plan de Gobierno “*Juntos vamos a estar bien (2026-2030)*”, con la perspectiva que, creando sinergias entre la política pública y la política social, bien conducidas y ejecutadas pueden generar trabajo y cohesión social, prevenir y resolver conflictividad social, facilitar la gestión democrática y respeto a la Ley, bajo el principio de legalidad en un Estado de Derecho. Se prioriza

particularmente dentro de este la “*Política de Salud*” principalmente orientada a la Reducción de la mora quirúrgica, Garantizar disponibilidad de medicamentos, Mejorar atención de accidentes viales, Regionalización de enfermedades crónicas y la Ampliación de infraestructura sanitaria.

Respecto a la **Inversión Pública** para el año 2026, la Secretaría de Salud cuenta con un Presupuesto Aprobado por el Congreso Nacional por L2,868.4 millones que incluye las asignaciones correspondientes a Proyectos de Inversión Pública (Inversión Productiva y Formación Bruta de Capital (gasto de capital) detalladas en el cuadro No. 01.

Al término del primer trimestre, el presupuesto vigente total asignado se registró en L1,469.8 millones, de los cuales las asignaciones para la **Formación Bruta de Capital** (Bienes Capitalizables) se identifican en los Programas para la provisión de servicios de salud del Primer Nivel de atención (centros de salud, Unidades de Atención Primaria en Salud- UAPS y los Centros Integrales de Salud- CIS); Provisión de servicios de salud del Segundo Nivel de atención (servicios

Cuadro No. 01

#### Programa de Inversión Pública, al I Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>2,868,391,243.0</b>
Inversión Productiva	1,484,419,912.0
Formación Bruta de Capital	1,383,971,331.0
<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>1,469,785,036.0</b>
Inversión Productiva	1,057,483,225.0
Formación Bruta de Capital	412,301,811.0
<b>Ejecutado Anual</b>	<b>30,279,031.3</b>
Inversión Productiva	20,488,708.9
Formación Bruta de Capital	9,790,322.4
<b>% Ejecución (Devengado anual/Vigente)</b>	<b>2.1%</b>
<b>Compromiso Aprobado</b>	<b>89,807,825.3</b>
Inversión Productiva	80,017,502.9
Formación Bruta de Capital	9,790,322.4
<b>% Compromiso (Compromiso I Trim-2026/Vigente)</b>	<b>6.1%</b>

Nota: SIAFI, 31/03/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



hospitalarios) y la rectoría de salud. Dicha inversión se registra en L412.3 millones y de lo cual se ejecutó 2.4% equivalente a L9,.8 millones a nivel de devengado y comprometido al término del trimestre.

En consecuencia, la **Inversión Productiva** contó con una asignación vigente de L1,057.5 millones, para la ejecución de 5 proyectos de inversión pública, de los cuales se destaca la prioridad en la infraestructura hospitalaria. Al primer trimestre del año 2026 se reportó una ejecución de L20.5 millones (2%) a nivel de devengado y L80.0 millones (8%) a nivel de compromisos, con relación al presupuesto vigente asignado.

En su conjunto la inversión pública para la SESAL registró una ejecución presupuestaria de L30.3 millones (2.1%) a nivel de devengado y 6.1% (L89.8 millones) a nivel compromisos en relación con el Presupuesto Vigente asignado, principalmente con orientación al **Sector Salud**. Ver Detalle de Ejecución Financiera en Anexo No. 1.




# SECRETARÍA DE FINANZAS



## B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

El **73%** de la Inversión Pública de la SESAL, se financia con recursos provenientes de **Crédito Externo** (Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial)); la participación de **Fondos Nacionales** (Tesoro Nacional) representa el **21%** y corresponde a la contraparte nacional del aporte de JICA; el restante **6%** corresponde a **Donaciones Externas** de financiamientos administrados por la Asociación Internacional del Fomento (Banco Mundial) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), mismos que se representan en el Gráfico No. 01.

Gráfico No. 01  
Secretaría de Salud: Financiamiento de la Inversión por Fuente  
Cifras en Millones de Lempiras

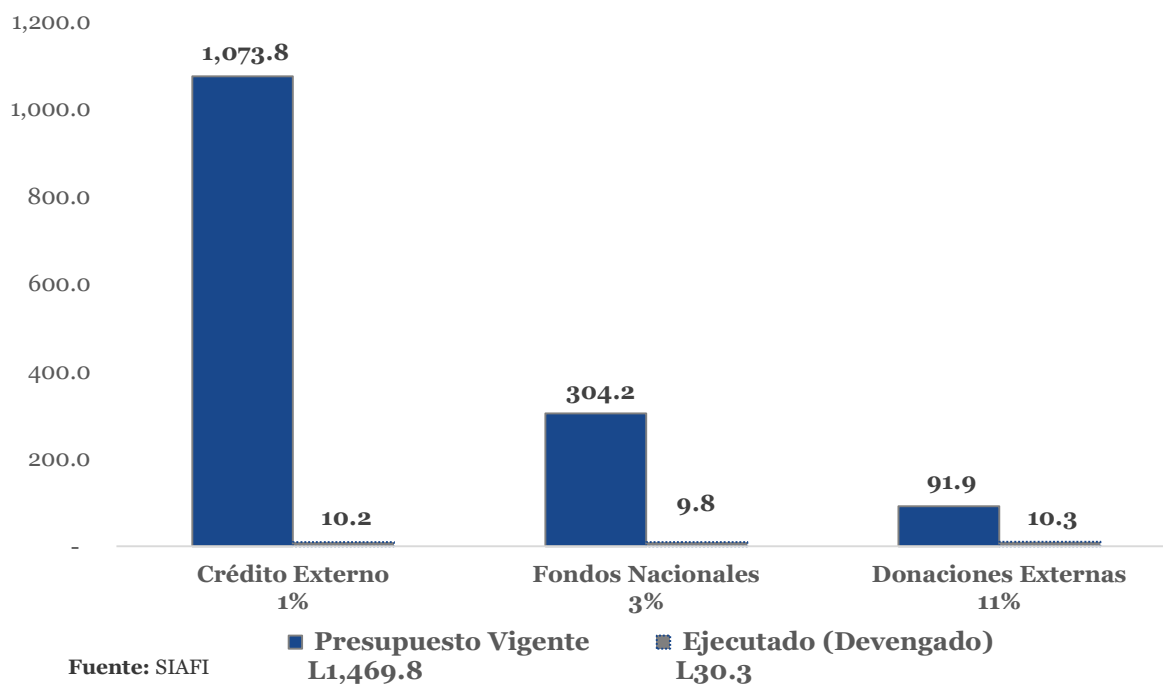




# SECRETARÍA DE FINANZAS



## C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL I TRIMESTRE (2022-2026)

En el período comprendido del 2022 al 2026, la Inversión Pública de la SESAL ha considerado la ejecución de 12 Proyectos de Inversión y diferentes asignaciones en formación bruta de capital (gasto de capital); las cuales se han financiado en 13% con recursos nacionales, 83% con recursos de crédito externo y el restante 5% de donaciones externas, alivio de deuda y apoyos presupuestarios.

En dicho período, la SESAL ha contado con asignaciones presupuestarias por un total de L8,677.4 millones; reflejando un promedio de ejecución en **2.7%** (L233.9 millones) al Primer trimestre de cada año.

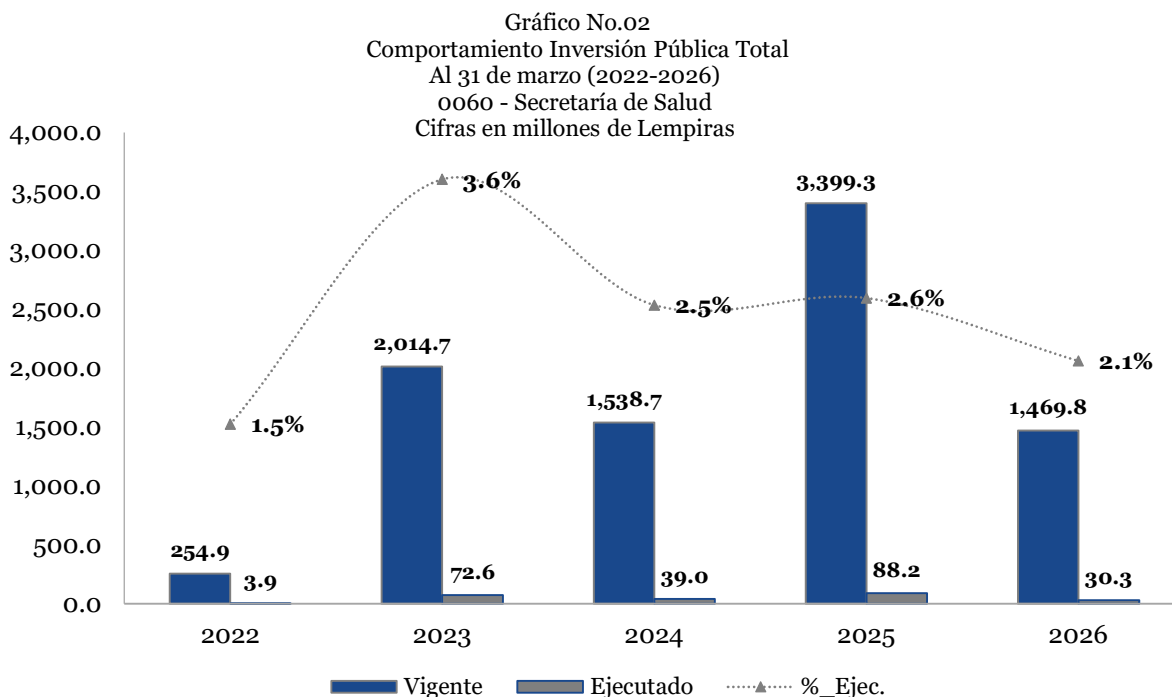

Fuente: SIAFI

La Gráfica No.2 muestra la ejecución porcentual comparativa con corte al 31 de marzo de los últimos cinco años; donde el año 2025 destaca su mayor asignación y mejor ejecución considerando el cuarto año de un período de gobierno con orientación principalmente a la categorización de programas sociales dentro de la Inversión Pública.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D. PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión productiva para el año 2025 se concentra en los siguientes proyectos:

1	Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	BCIE-2329
2	Programa de Construcción y equipamiento de 3 hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras	BID 5790/BL-HO
3	Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación de Servicios en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO
4	Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE)	IDA 7142-HN TFoB8564-HN TFoC1861
5	Construcción y Equipamiento del Edificio Administrativo y del Laboratorio Nacional de Vigilancia (LNV) de la salud en Tegucigalpa, Francisco Morazán.	Acuerdo Donación No 1660400

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:

### D.1 Programa de Diseño, Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital en las Ciudades de Choluteca y Tocoa Como Apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH):

Tiene como propósito incrementar la cobertura en la atención de los servicios de salud a nivel hospitalario, a través del diseño, construcción, equipamiento y puesta en marcha de dos centros hospitalarios en las ciudades de Choluteca y Tocoa, en coherencia con las prioridades de la Secretaría de Salud de Honduras (SESAL).



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D.1.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

### Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca.	Informe de obra	14	0	0%	0	0	0%
Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa	Informe de obra	16	0	0%	0	0	0%
Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales,	Taller de socialización	7	0	0%	0	0	0%
Realizada la gestión de gastos administración del proyecto	Informe	100	5	0.05%	5	5	100%

**Fuente:** SESAL-PARH al 31/03/2026

Para el primer trimestre 2026, la Unidad Administradora del Programa de Apoyo a la Red Hospitalaria de Honduras (PARH) reporta el siguiente avance:

- Hospital Regional del Sur en Choluteca:
  - Etapa (1) Preinversión: avance físico 96.16%, avance financiero 47.0% (US\$1,128,614.07); fecha de fin prevista 29 junio de 2025.
  - Etapa (2) Construcción: avance físico 45.61%, avance financiero 43.36% (US\$14,446,195.64); fecha de fin prevista 12 agosto de 2026.
  - Etapa (3) Equipamiento: avance físico 13.96%, avance financiero 9.45% (US\$2,162,245.49); fecha de fin prevista 12 agosto 2026.
- Hospital San Isidro en Tocoa:
  - Etapa (1) Preinversión: avance físico 100%, avance financiero 95% (US\$3,504,173.42); fecha de fin prevista 26 agosto de 2025.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



- Etapa (2) Construcción: avance físico 21.12%, avance financiero 32.41% (US\$13,434,768.75); fecha de fin prevista 21 julio de 2026.
- Etapa (3) Equipamiento: avance físico 0%, avance financiero 20% (US\$2,743,285.34); fecha de fin prevista 21 julio de 2026.

## D.1.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica: del Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras (PARH) registrada al primer trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Diseño, construcción y equipamiento del nuevo hospital en las ciudades de Choluteca y Tocoa como apoyo a la Red Hospitalaria de la República de Honduras	BCIE-2329	US\$	135,000,000	30/07/2024 01/08/2028
		Lempiras	3,603,946,500	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	603,286,840	443,901,429	511,650	0.1%
Acumulado 2026	603,286,840	443,901,429	511,650	0.1%
Acumulado Vida del Proyecto *	3,603,946,500	3,603,946,500	1,112,436,345	30.9%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

## D.1.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Los contratos suscritos del 01 de enero al 31 de marzo de 2026 son los siguientes:

- Coordinación General, Contrato UEP-PARH-001-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista financiero, Contrato UEP-PARH-002-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista en adquisiciones, Contrato UEP-PARH-003-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista ambiental Social, Contrato UEP-PARH-004-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Especialista biomédico, Contrato UEP-PARH-005-2026-SS (adjudicado 01/01/2026).
- Asistente administrativo, Contrato UEP-PARH-006-2026-SS (adjudicado 02/03/2026).



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D.2 Programa de Construcción y Equipamiento de Tres Hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras

Mediante la construcción y equipamiento de dos (2) Hospitales de trauma en Tegucigalpa y San Pedro Sula y un (1) Hospital General en Roatán se mejorará la efectividad y el acceso a los servicios especializados hospitalarios materno-infantiles, de atención a Lesiones de Causa Externa (LCE) y a complicaciones de Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ENT).

### D.2.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

#### Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
		Progra- mación	Ejecución	% Ejecu- ción	Progra- mación	Ejecución	% Ejecu- ción
Construcción y supervisión de la obra del Hospital general de Roatán	Informe técnico	24	4	16.7%	6	4	66.7%
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa	Informe técnico	0	0	0%	0	0	0%
Construcción y supervisión de la obra del Hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de San Pedro Sula	Informe técnico	4	0	0%	0	0	0%
Desarrollo de competencias clínicas y gestión hospitalaria	Informe	7	0	0%	0	0	0%
Fortalecimiento de la integración y gestión de redes de servicios prioritizadas	Informe	2	0	0%	0	0	0%
Procesos administrativos y auditados los fondos para el 2026	Informe	336	80	23.8%	84	80	95.2%

**Fuente:** SESAL-GESALUD al 31/03/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Al primer trimestre, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 2.2% y financiero de 7.2%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR).

Así mismo, por parte de la Unidad Técnica de Infraestructura para los Nuevos Hospitales (UTINH), al término de marzo reporta para la **Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán**, avance físico (obra) del 32.69% y supervisión en 99.22%, indicando las siguientes actividades en ejecución:

- Trabajos de excavación de terreno en área de puente de intercomunicación entre Actuación 1 y Edificio Existente,
- Construcción de contrapisos en nivel 2 del Edificio Existente,
- Habilitado y colocación de ductos de lámina galvanizada para instalación de HVAC nivel 1 en el Edificio Existente,
- Colocación de tubería y canastilla para Instalación de telecomunicaciones en niveles 2 y 3 de la Actuación 2 y 3
- Colocación de tubería de cobre de diferentes diámetros para instalación agua fría/caliente en el edificio existente entre otras.

En cuanto a la **Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma)**, a solicitud del BID se realiza en conjunto con UTINH revisión y cambios a los pliegos del proceso, para remitir a no objeción del Banco.

La Dirección General de Redes Integradas de Servicios de Salud (DGRISS) priorizó 7 productos para el año 2026; así mismo, ha conformado las comisiones de trabajo organizar el inicio de las actividades relacionadas; al término de marzo se encuentra en revisión el borrador de convenio de becas de formación de especialidades a nivel nacional (se presentó 54 candidatos a la UNAH, de los cuales aprobó 46).

## ***D.2.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026***

A continuación, se observa la ejecución financiera histórica del Programa de Construcción y equipamiento de tres hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras registrada al primer trimestre 2026:



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$	Lempiras	
Programa de Construcción y equipamiento de tres hospitales (Tegucigalpa, San Pedro Sula y Roatán) para el Fortalecimiento de la Red Hospitalaria en Honduras	BID 5790/BL-HO	230,163,200		15/04/2024
			6,144,413,771	15/05/2030
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	575,566,138	416,180,727	9,110,616	2.2%
Acumulado 2026	575,566,138	416,180,727	9,110,616	2.2%
Acumulado Vida del Proyecto *	6,144,413,771	6,144,413,771	421,943,122	6.9%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

### D.2.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

En cuanto a los contratos reportados por GESALUD, bajo el Contrato BID 5790/BL-HO (*trascendieron período de Gobierno*) se encuentra en ejecución:

- Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán (EDUCTRADE).
- Supervisión para la Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán (TASH)
- Auditoría de Estados financieros de Propósito Especial (BID/JICA).
- Servicios profesionales GESALUD (21 contratos).
- Consultorías de apoyo a la UTINH (7 contratos: Especialista Biomédico, Arquitecto, Especialista ambiental y social, Especialista en Ingeniería Mecánica, Ingeniero Hidrosanitario, Ingeniero Eléctrico) y fortalecimiento (adquisición de equipo informático).
- Consultoría Individual Miembro del "Dispute Board" para el Contrato de Construcción y Equipamiento del Hospital de Roatán.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D.3 Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar El Coronavirus (COVID-19) y Mitigar su Efecto en la Prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) (BID 4713/BL-HO):

Mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-092-2021, publicado en La Gaceta No. 35,701 de fecha 28 de agosto del 2021 se autorizó a que la SEFIN, realizar las acciones necesarias con el propósito de formalizar ante el BID, la redistribución de los recursos disponibles de los saldos no desembolsados del Contrato de Préstamo No.4713/BL-HO; así mismo, mediante Resolución DE-74/21 el BID aprobó la suscripción del Contrato Modificatorio No. 2 al Préstamo No. 4713/BL-HO, de fecha 30 de septiembre de 2021 para financiar el Programa Respuesta Inmediata de Salud Pública para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID-19) y mitigar su efecto en la prestación de servicios en Honduras (RISP-HO-2), con el objetivo de contribuir a reducir la morbilidad y la morbilidad por COVID-19 y mitigar los demás efectos indirectos de la pandemia sobre la salud.

### D.3.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

#### Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL	Informe	2	0	0%	1	0	0%
Adquiridos generadores eléctricos para para los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Aníbal Murillo	Equipo	2	0	0%	0	0	0%
Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela y adquirido el equipo no médico para salas neonatales	Equipo	34	12	35%	12	12	100%
Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2025	Informe	18	2	11%	4	2	50%

**Fuente:** SESAL-GESALUD al 31/03/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Al primer trimestre del 2026, la Unidad Ejecutora de Proyectos BID (GESALUD) reporta un avance global físico de 89% y financiero de 86.2%, con relación a las actividades realizadas en el marco del reporte de monitoreo del proyecto (PMR):

- Proceso Adecuación Centro de Datos de la SESAL: continua el proceso de evaluación de ofertas por personal de la Unidad de Gestión de la Informática (UGI), mismo que al finalizar se enviara a no objeción al Banco.
- Adquiridos Generadores Eléctricos para 5 hospitales: en proceso de evaluación de oferta por la SESAL (UTGP) esperando se concluya con la oportunidad requerida para proseguir con los pasos subsiguientes.
- Reemplazo de la Sub-Estación Eléctrica del Bloque Médico Quirúrgico del Hospital Escuela: se completó la adquisición del equipo requerido para proceder con la instalación y transferencias de carga a las salas del Hospital Escuela, y que por las diferentes eventualidades de demora que hubo en la entrega del último equipo por la empresa proveedora se hace necesario la adenda No. 3, misma que ya está en no objeción en el BID, existe un cronograma de trabajo para esta instalación coordinado con el Hospital Escuela.

### D.3.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026

A continuación, se presenta la ejecución financiera histórica del Programa Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2) registrada al primer trimestre 2026:

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Respuesta Inmediata de Salud para Contener y Controlar el Coronavirus (COVID - 19) y Mitigar su efecto en la prestación del Servicio, en Honduras (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO	US\$	53,820,000	01/10/2021 31/08/2026
		Lempiras	1,436,773,338	
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	85,720,918	85,720,918	610,427	0.7%
Acumulado 2026	85,720,918	85,720,918	610,427	0.7%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,436,773,338	1,436,773,338	1,172,018,231	81.6%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## D.3.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

En cuanto a los contratos reportados por GESALUD, bajo el Contrato BID 4713/BL-HO (*trascendieron período de Gobierno*) se encuentra en ejecución:

- Adquisición para el Reemplazo, Suministro, Instalación y Puesta en Marcha de la Sub-Estación Eléctrica Unitaria en Bloque Quirúrgico del Hospital Escuela (ICCE).
- Consultorías de apoyo a GESALUD (3 contratos: Ingeniero Eléctrico Industrial, Consultor Senior en Salud Digital y Desarrollador tecnológico).

## D.4 Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE):

Con el propósito de mejorar la utilización de los servicios de salud reproductiva e infantil en las regiones prioritarias, fortalecer las capacidades del sistema de salud pública para la preparación ante emergencias y en caso de una Crisis o Emergencia Elegible, responder de manera rápida y efectiva a la misma.

### D.4.1 Principales Metas Físicas al I Trimestre 2026

#### Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
		Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecu- ción
Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional:	Informe	255	0	0%	66	0	0%
Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional	Informe	46	0	0%	9	0	0%
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto	Informe	20	0	0%	4	0	0%
Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI)	Informe	10	0	0%	0	0	0%
Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes.	Taller	4	0	0%	0	0	0%



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## Principales Metas Físicas al I trimestre 2026

Meta Física	Unidad de Medida	Anual			I Trimestre 2026		
		Progra- mación	Ejecu- ción	% Ejecución	Progra- mación	Ejecución	% Ejecu- ción
Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional (GAVI)	Informe	49	0	0%	1	0	0%
Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional (GAVI)	Informe	10	0	0%	0	0	0%
Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto (GAVI)	Informe	7	0	0%	0	0	0%
Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional	Informe	255	0	0%	66	0	0%

**Fuente:** SESAL-PROSALH al 31/03/2026

Para el primer trimestre la Unidad Administradora de Proyectos Protección de la Salud Honduras (UAP-PROSALH) reporta las siguientes acciones en base a la Matriz de Resultados:

- Fortalecimiento de los servicios de salud para adolescentes, madres y niños:
  - 414,505 personas han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población.
  - 204,414 mujeres han recibido servicios esenciales de salud, nutrición y población.
  - 414,505 niños fueron inmunizados (aplicación de vacunas).
  - 31.4% de las mujeres embarazadas acudieron a primer control prenatal, con 12 semanas o menos de gestación.
  - 45,044 niños menos de 1 año pendientes de su primera dosis de vacuna pentavalente.
- Capacidad de preparación y respuesta de la salud pública:
  - 854 establecimientos de salud reportan datos al Sistema Integrado de conformidad con los protocolos de la SESAL.

### ***D.4.2 Evaluación Financiera al I Trimestre 2026***

A continuación, véase la ejecución financiera histórica del Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE) registrados al primer trimestre 2026:



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
		US\$		
Proyecto de Servicios Esenciales de Salud y Preparación ante Emergencias (RESHAPE)	IDA 7142-HN TFOC1861	US\$	82,000,000	15/03/2024
	TFOB8564-HN	Lempiras	2,189,063,800	15/03/2029
	<b>Presupuesto Aprobado</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Ejecutado (Devengado)</b>	<b>% Ejecución</b>
I Trimestre 2026	192,144,171	83,978,306	10,256,016	12.2%
Acumulado 2026	192,144,171	83,978,306	10,256,016	12.2%
Acumulado Vida del Proyecto *	2,189,063,800	2,189,063,800	179,140,593	8.2%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto  
Tipo de Cambio al 31/03/2026 (BCH): L26.6959 por US\$1.00

### D.4.3 Principales Adquisiciones al I Trimestre 2026

Por su parte PROSALH, reporta 13 contratos en ejecución, los que se detallan a continuación:

- Diagnóstico y diseño de la infraestructura de 36 Servicio Materno Infantil (SMI), avance 0%.
- Asistencia Técnica apoyo planificación fortalecimiento red de Laboratorio y Vigilancia epidemiológica de la SESAL, 10% avance.
- Compra de Autoclaves a vapor para la Red de servicios de la SESAL, 14% avance.
- Estudio y Diseño de 19 Laboratorios Regionales, 3 Laboratorios de Biología Molecular y el Laboratorio Nacional de Virología, 19% avance.
- Diseño de la Región Sanitaria Departamental de Intibucá, 20% avance.
- Adquisición de 30 Incubadoras Neonatales para el Hospital Mario Catarino Rivas, 20% avance.
- Asistencias Técnicas consultorías (1 Asesor técnico de inmunizaciones, 1 Especialista, Técnico en Infraestructura y 1 Especialista en vacunación), 60% avance.
- Actualización e integración de nuevos módulos y funcionalidades del Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV), 60% avance.
- Enmienda Sistema Digital de Registro Nominal de Vacunas (SDV), avance 0%.
- Contratación de Empresa para Transporte de Personal para las Jornadas de Vacunación a nivel Nacional, 68% avance.
- Compra e instalación de UPS para rayos X estacionarios, 89% avance.
- Contratación de Recurso Humano UGI (16 Facilitadores UGI y 2 administradores de base de datos)



# SECRETARÍA DE FINANZAS



- Contratación de Recurso Humano PAI (4 Oficial Administrativo y logístico, 11 Supervisoras PAI)

## **E. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL**

Al primer trimestre, la SESAL cuenta con L412.3 millones asignados en Formación Bruta de Capital (Bienes Capitalizables) de los cuales al término del trimestre registró ejecución de L9.8 millones a nivel de devengado y comprometido, representando un 2.4% con relación al presupuesto vigente asignado.

Bajo este esquema, se destacan las intervenciones para la provisión de servicios de salud del Primer Nivel de atención (centros de salud, Unidades de Atención Primaria en Salud- UAPS y los Centros Integrales de Salud- CIS); Provisión de servicios de salud del Segundo Nivel de atención (servicios hospitalarios) y la rectoría de salud.

## **F. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN**

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Gestión para aprobación de cuotas de compromiso mensuales de Crédito Externo y su gestión ante TGR en función de la programación considerada por las Unidades ejecutoras de Proyectos para el 2026.
- Participación en reuniones de seguimiento y monitoreo con las diferentes Unidades Ejecutoras de la SESAL.

## **G. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL I TRIMESTRE 2026**

Debido a la no aprobación del Presupuesto en el Congreso Nacional en el primer trimestre, el inicio de ejecución para las unidades ejecutoras fue limitada bajo la prórroga del presupuesto 2025. En ese sentido, se priorizó el pago de honorarios profesionales en algunas de las Unidades Ejecutoras de Proyectos (principalmente las que gestionaron la suscripción de los contratos bajo las nuevas autoridades de Gobierno y aquellas que tuvieron mayor apoyo de los organismos financieros para la gestión ante la SEFIN).



# SECRETARÍA DE FINANZAS



Otro factor de incidencia, que ha ocasionado desfase en la ejecución se deriva de la falta ratificación de los contratos que trascendieron período de Gobierno por parte del Congreso Nacional; implicando en muchos de los casos, que la información presentada a finales del año 2025 como parte del procedimiento establecido, generó pérdida de expedientes en las diferentes instancias internas y externas provocando que las unidades ejecutoras tuvieran que iniciar las gestiones de nuevo. Para el caso, al término del primer trimestre, las diferentes unidades ejecutoras de proyectos de la SESAL no cuentan con la ratificación de contratos por el Congreso Nacional.

En adición a estas acciones, se presentó el problema de registro de contratos por servicios profesionales en SIREP, hasta contar con la ratificación de los contratos bajo los cuales se han generados dichos servicios.

Al primer trimestre, se reportó por desfase de 1.44 puntos porcentuales con relación al avance físico para el Hospital de Roatán, representando una desviación igual a 11 días; de acuerdo con lo reportado, se encuentra en campo alrededor de 185 trabajadores (mano de obra) para agilizar el avance de obras.

Adicionalmente, en cuanto a los procesos relacionados con la construcción y equipamiento de hospitales de traumatología en Tegucigalpa y San Pedro Sula, así como la supervisión de obras; a sugerencia del BID se encuentran en proceso de ajuste a los pliegos del proceso, con el propósito de evitar subsanaciones y aclaraciones que ocasionen retrasos al mismo.

Con respecto al Hospital Regional del Sur en Choluteca se indicó por parte de la UEP-PARH, específicamente para etapa de Equipamiento, Se revisaron las subsanaciones que el contratista había realizado a los planos y listados de lavandería y cocina, así como se realizaron también reuniones de conciliación con las cuales se logró llegar a un listado final de equipos de lavandería y cocina el cual dio pie a la confirmación del listado final consolidado del equipamiento. Así mismo, para el Nuevo Hospital San Isidro en Tocoa, se presentó Garantía por el 100% del Anticipo de la Fase 3 Equipamiento Médico.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## H. CONCLUSIONES

- Al término del primer trimestre del 2026, la ejecución reportada por la SESAL se registra a nivel de devengado en 2.1% (L30.3 millones) de los cuales la Inversión Productiva reporta L20.5 millones (1.4%) y el 0.7% (L9.8 millones) para la Formación Bruta de Capital; ambas en relación con el Presupuesto Vigente asignado; ello denota la tendencia en ejecución menor al primer trimestre del año anterior considerando las asignaciones en su conjunto para la Inversión Pública de la SESAL.
- Durante el primer trimestre del 2026, se mantuvo el ritmo de ejecución de procesos de contratación para el Proyecto “Servicios esenciales de salud y preparación ante emergencias”, el cual en dicho trimestre indicó 13 procesos en ejecución en su plan de adquisiciones y contrataciones; incorporando todos sus financiamientos.
- Con respecto a los procesos relacionados con la construcción y equipamiento, así como supervisión de hospitales de traumatología se continua en espera del inicio de la ejecución de obras, una vez adjudicados los procesos.

## I. RECOMENDACIONES

- Las Unidades Ejecutoras de la SESAL deberán coordinar acciones conjuntas que permitan la eficiencia de los procesos y la gestión oportuna para la agilización de los trámites, y apearse a los nuevos lineamientos producto de las directrices de las Autoridades de Gobierno; así mismo, considerar la actualización de la planificación física y financiera.
- La SESAL deberá realizar una programación financiera realista que les permita contar con todos los recursos necesarios según las actividades y procesos que estas realicen.
- Se recomienda registrar y mantener actualizada la programación y ejecución física en SIAFI.
- Realizar todas las actividades en tiempo y forma, evitando ampliaciones de cierre de los proyectos.



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO 1

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE, 2026  
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado I Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)			Compromiso Aprobado					
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Ejecución (Dev./Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total general	% Compromiso (Comp./Vig.)
<b>5</b>	<b>1. Inversión Productiva</b>		<b>27,552,928</b>	<b>1,456,866,984</b>	<b>1,484,419,912</b>	<b>27,552,928</b>	<b>1,029,930,297</b>	<b>1,057,483,225</b>	-	<b>20,488,709</b>	<b>20,488,709</b>	<b>1.9%</b>	-	<b>20,488,709</b>	<b>20,488,709</b>	<b>1.9%</b>	-	<b>80,017,503</b>	<b>80,017,503</b>	<b>7.6%</b>
<b>5</b>	<b>0060 - Secretaría de Salud</b>		<b>27,552,928</b>	<b>1,456,866,984</b>	<b>1,484,419,912</b>	<b>27,552,928</b>	<b>1,029,930,297</b>	<b>1,057,483,225</b>	-	<b>20,488,709</b>	<b>20,488,709</b>	<b>1.9%</b>	-	<b>20,488,709</b>	<b>20,488,709</b>	<b>1.9%</b>	-	<b>80,017,503</b>	<b>80,017,503</b>	<b>7.6%</b>
1	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN	Acuerdo Donación No 1660400	27,552,928	148,917	27,701,845	27,552,928	148,917	27,701,845	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN</b>		<b>27,552,928</b>	<b>148,917</b>	<b>27,701,845</b>	<b>27,552,928</b>	<b>148,917</b>	<b>27,701,845</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>
2	PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS	BID 5790/BL-HO		575,566,138	575,566,138		416,180,727	416,180,727		9,110,616	9,110,616	2.2%		9,110,616	9,110,616	2.2%		66,213,228	66,213,228	15.9%
	<b>Total PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS</b>			<b>575,566,138</b>	<b>575,566,138</b>		<b>416,180,727</b>	<b>416,180,727</b>		<b>9,110,616</b>	<b>9,110,616</b>	<b>2.2%</b>		<b>9,110,616</b>	<b>9,110,616</b>	<b>2.2%</b>		<b>66,213,228</b>	<b>66,213,228</b>	<b>15.9%</b>
3	PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	BCIE-2329		603,286,840	603,286,840		443,901,429	443,901,429		511,650	511,650	0.1%		511,650	511,650	0.1%		673,650	673,650	0.2%
	<b>Total PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS</b>			<b>603,286,840</b>	<b>603,286,840</b>		<b>443,901,429</b>	<b>443,901,429</b>		<b>511,650</b>	<b>511,650</b>	<b>0.1%</b>		<b>511,650</b>	<b>511,650</b>	<b>0.1%</b>		<b>673,650</b>	<b>673,650</b>	<b>0.2%</b>
4	PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS	IDA 7142-HN		124,306	124,306		124,306	124,306		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
		TFoB8564-HN		190,059,865	190,059,865		81,894,000	81,894,000		9,782,816	9,782,816	11.9%		9,782,816	9,782,816	11.9%		9,893,987	9,893,987	12.1%
		TFoC1861		1,960,000	1,960,000		1,960,000	1,960,000		473,200	473,200	24.1%		473,200	473,200	24.1%		473,200	473,200	24.1%
	<b>Total PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS</b>			<b>192,144,171</b>	<b>192,144,171</b>		<b>83,978,306</b>	<b>83,978,306</b>		<b>10,256,016</b>	<b>10,256,016</b>	<b>12.2%</b>		<b>10,256,016</b>	<b>10,256,016</b>	<b>12.2%</b>		<b>10,367,187</b>	<b>10,367,187</b>	<b>12.3%</b>
5	RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	BID 4713/BL-HO		85,720,918	85,720,918		85,720,918	85,720,918		610,427	610,427	0.7%		610,427	610,427	0.7%		2,763,438	2,763,438	3.2%
	<b>Total RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)</b>			<b>85,720,918</b>	<b>85,720,918</b>		<b>85,720,918</b>	<b>85,720,918</b>		<b>610,427</b>	<b>610,427</b>	<b>0.7%</b>		<b>610,427</b>	<b>610,427</b>	<b>0.7%</b>		<b>2,763,438</b>	<b>2,763,438</b>	<b>3.2%</b>
	<b>2. Formación Bruta de Capital Fijo</b>		<b>276,615,120</b>	<b>1,107,356,211</b>	<b>1,383,971,331</b>	<b>276,615,120</b>	<b>135,686,691</b>	<b>412,301,811</b>	<b>9,790,322</b>	-	<b>9,790,322</b>	<b>2.4%</b>	<b>9,790,322</b>	-	<b>9,790,322</b>	<b>2.4%</b>	<b>9,790,322</b>	-	<b>9,790,322</b>	<b>2.4%</b>
	<b>0060 - Secretaría de Salud</b>		<b>276,615,120</b>	<b>1,107,356,211</b>	<b>1,383,971,331</b>	<b>276,615,120</b>	<b>135,686,691</b>	<b>412,301,811</b>	<b>9,790,322</b>	-	<b>9,790,322</b>	<b>2.4%</b>	<b>9,790,322</b>	-	<b>9,790,322</b>	<b>2.4%</b>	<b>9,790,322</b>	-	<b>9,790,322</b>	<b>2.4%</b>
	ACTIVIDADES CENTRALES		20,440,580	1,107,356,211	1,127,796,791	20,440,580	135,686,691	156,127,271	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total ACTIVIDADES CENTRALES</b>		<b>20,440,580</b>	<b>1,107,356,211</b>	<b>1,127,796,791</b>	<b>20,440,580</b>	<b>135,686,691</b>	<b>156,127,271</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>
	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION		55,077,288		55,077,288	55,077,288		55,077,288	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION</b>		<b>55,077,288</b>		<b>55,077,288</b>	<b>55,077,288</b>		<b>55,077,288</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>
	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)		154,652,563		154,652,563	154,652,563		154,652,563	9,790,322		9,790,322	6.3%	9,790,322		9,790,322	6.3%	9,790,322		9,790,322	6.3%
	<b>Total PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)</b>		<b>154,652,563</b>		<b>154,652,563</b>	<b>154,652,563</b>		<b>154,652,563</b>	<b>9,790,322</b>		<b>9,790,322</b>	<b>6.3%</b>	<b>9,790,322</b>		<b>9,790,322</b>	<b>6.3%</b>	<b>9,790,322</b>		<b>9,790,322</b>	<b>6.3%</b>
	RECTORIA DE SALUD		46,444,689		46,444,689	46,444,689		46,444,689	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	<b>Total RECTORIA DE SALUD</b>		<b>46,444,689</b>		<b>46,444,689</b>	<b>46,444,689</b>		<b>46,444,689</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>	-	-	-	<b>0.0%</b>
	<b>Total general</b>		<b>304,168,048</b>	<b>2,564,223,195</b>	<b>2,868,391,243</b>	<b>304,168,048</b>	<b>1,165,616,988</b>	<b>1,469,785,036</b>	<b>9,790,322</b>	<b>20,488,709</b>	<b>30,279,031</b>	<b>2.1%</b>	<b>9,790,322</b>	<b>20,488,709</b>	<b>30,279,031</b>	<b>4.3%</b>	<b>9,790,322</b>	<b>80,017,503</b>	<b>89,807,825</b>	<b>6.1%</b>

Nota: SIAFI, 30/04/2026



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## ANEXO 2

### PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Programación	Anual		I Trimestre 2026		% Ejecución
				Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	
<b>0060 - Secretaría de Salud</b>								
032 - RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PÚBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS (COVID-19) Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN HONDURAS (RISP-HO-2)	Realizada la adecuación y equipamiento del centro de datos de la SESAL	Informe	2	0	0%	1	0	0%
	Adquiridos generadores eléctricos para los Hospitales Juan Manuel Gálvez y Aníbal Murillo	Equipo	2	0	0%	0	0	0%
	Reemplazo de la subestación eléctrica del bloque médico quirúrgico del Hospital Escuela el equipo no médico para salas neonatales.	Equipo	34	12	35%	12	12	100%
	Realizadas las gestiones administrativas y auditados los fondos para el 2026	Informe	18	2	11%	4	2	50%
	Técnicos en monitoreo contratados para Unidad de Gestión Descentralizada	Informe	1	0	0%	1	0	0%
033 - CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DEL LABORATORIO NACIONAL DE	Adquirido mobiliario, equipo tecnológico, y terrestre para el año 2026	Lote de Equipo	1	0	0%	0	0	0%



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Programación	Anual		I Trimestre 2026		
				Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
VIGILANCIA (LNV) DE LA SALUD EN TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN *	Construcción y Equipamiento del edificio administrativo para el nuevo Laboratorio Nacional de Vigilancia.	Informe Técnico	6	0	0%	0	0	0%
033 - PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES HOSPITALES (TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA Y ROATÁN) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA EN HONDURAS	Construcción, Equipamiento y supervisión de la obra del Hospital General de Roatán	Informe	24	4	17%	6	4	67%
	Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de Tegucigalpa	Informe	0	0	0%	0	0	0%
	Construcción y supervisión de la obra del hospital de especialidades (trauma) en la ciudad de san pedro sula	Informe	4	0	0%	0	0	0%
	Realizada la formación y educación continua en especialidades médicas del personal hospitalario para la puesta en marcha de los tres hospitales	Informe	7	0	0%	0	0	0%
	Reorganizada y fortalecida la red de servicio del área de influencia y servicio prehospitalario de emergencia de los tres hospitales	Informe	2	0	0%	0	0	0%



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Programación	Anual		I Trimestre 2026		
				Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Realizadas los procesos administrativos y auditados los fondos para el 2026	Informe	336	80	24%	84	80	95%
034 - PROGRAMA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL EN LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y TOCOA COMO APOYO A LA RED HOSPITALARIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital General de Choluteca	Informe	14	0	0%	0	0	0%
	Diseñado, Construido y Supervisado el Nuevo Hospital Básico de Tocoa	Informe	16	0	0%	0	0	0%
	Fortalecidas las capacidades de la SESAL para la administración de los hospitales	Taller de Socialización	7	0	0%	0	0	0%
	Realizados los procesos de administración del proyecto para el año 2026	Informe	100	0	0%	5	5	100%
035 - PROYECTO DE SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS	Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional	Informe	255	0	0%	66	0	0%
	Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional	Informe	46	0	0%	9	0	0%
	Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto	Informe	20	0	0%	4	0	0%
	Fortalecido el sistema del Servicios de Materno Infantil (SMI)	Informe	10	0	0%	0	0	0%



# SECRETARÍA DE FINANZAS



## PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL I TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Programación	Anual		I Trimestre 2026		
				Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
	Fortalecido el Servicio de Salud Sexual y Reproductiva (SSR) para los adolescentes.	Taller	4	0	0%	0	0	0%
	Fortalecidas las jornadas de vacunación masivas a nivel nacional (GAVI)	Informe	49	0	0%	1	0	0%
	Fortalecido el Sistema de Vigilancia de la Salud y Laboratorio de Virología Nacional (GAVI)	Informe	10	0	0%	0	0	0%
	Realizado el Monitoreo, evaluación y auditoría del proyecto (GAVI)	Informe	7	0	0%	0	0	0%

**Nota:** Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 31 de marzo de 2026

\*/Datos SIAFI, UAFCE no remitió información de ejecución al I trimestre 2026.
