



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA
Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento
(SEDECOAS)

Informe No. 0416-002-2026
Tegucigalpa, Julio 2026



Contenido

Contenido2

IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN3

 A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....3

 B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....3

 C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) 4

 D. PRINCIPALES PROYECTOS4

 D.1 La mayor parte de la inversión acumulada al II trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:.....4

 1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras4

 2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras4

 A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:.....4

 D.1.1. Evaluación Financiera al II trimestre 20267

 2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras7

 E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN7

 F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....7

 G. CONCLUSIONES8

 H. RECOMENDACIONES8

ANEXO 19

ANEXO 210



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA


La Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento en Honduras, (SEDECOAS), se dedica a promover el desarrollo comunitario a través de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos. La institución trabaja en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable del país.

Al II trimestre del 2026 la institución contó con un presupuesto vigente L190.5 millones de los cuales L183.8 millones; para la ejecución productiva a través del proyecto Programa de Agua y Saneamiento en Honduras y Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras, La ejecución presupuestaria al II trimestre ascendió a L6.0 millones (3.2%), tal como se detalla en el cuadro No.01. Es de suma importancia lograr la reactivación de los proyectos, como la formalización de los contratos de la unidad ejecutora del programa, a fin de reactivar y normalizar los procesos de pago para transformar los recursos disponibles en avances concretos, evitando que el crédito externo permanezca inmovilizado.

Mediante Decreto Ejecutivo PCM-004-2026 de fecha 25 de febrero 2026 artículo 2 se instruye suprimir la Secretaría de Desarrollo comunitario Agua y Saneamiento SEDECOAS y que los proyectos que estén en ejecución serán en adelante ejecutados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).

B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión ejecutada por la SEDECOAS proviene de fuentes de financiamiento externo y recursos del tesoro nacional.

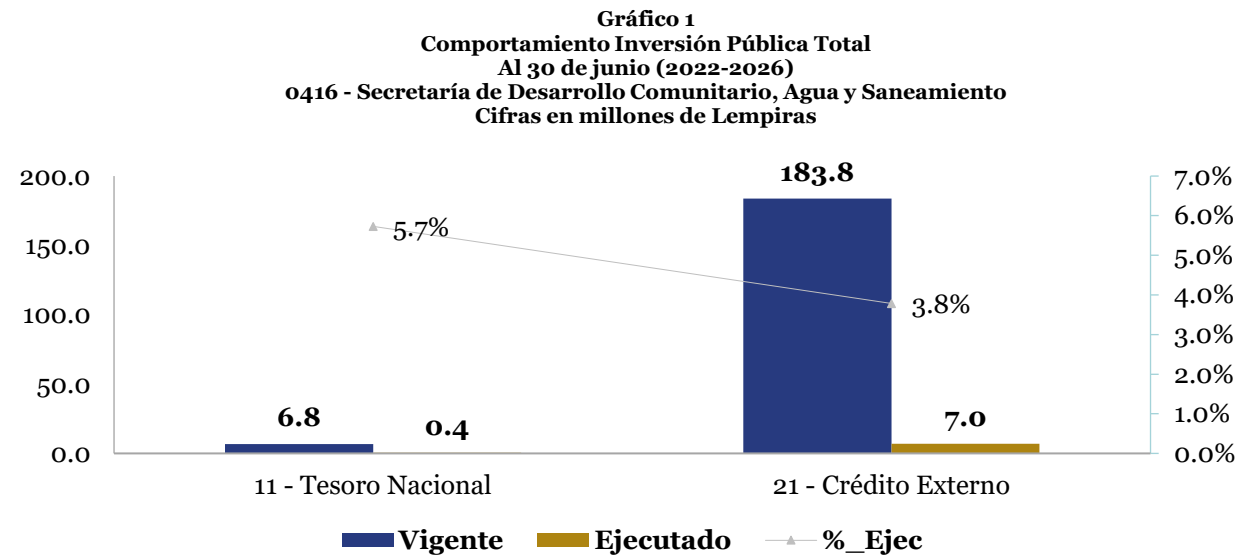

Fuente: SIAFI


Del total del financiamiento del presupuesto vigente L190.5 millones, para los proyectos corresponden a fondos provenientes de Crédito Externo con un monto de L 183.8 millones de los cuales se ha ejecutado el 3.8% y fondos nacionales con un monto vigente de L 6.7 millones ejecutados el 5.7%. tal como se muestra en el gráfico 1.



C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2023-2026)

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento histórico de la inversión entre 2023 y 2026, basado en los montos vigentes y ejecutados:

Gráfico 2
Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
0022 - Fondo Hondureño de

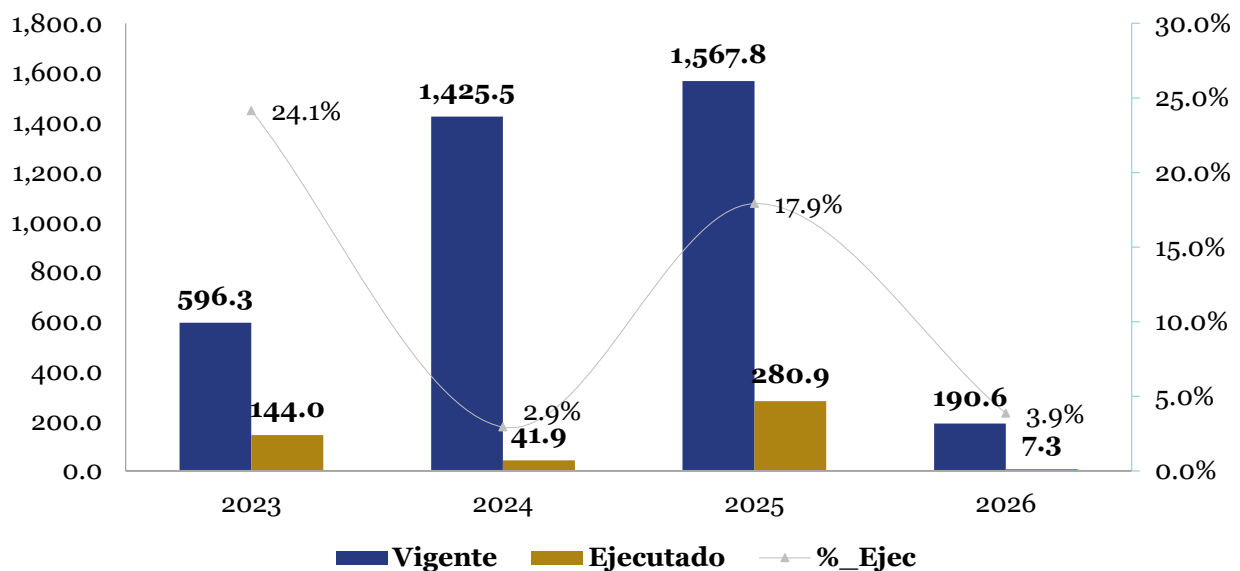

Fuente: SIAFI

En la gráfica se detalla un incremento significativo del presupuesto vigente pasando de una asignación de L 596.3 millones en 2023 a L 1,425.5 millones en 2024, para el 2025 incrementó a L 1,567.8 millones a fin de que la institución iniciara los procesos de ejecución de las nuevas iniciativas de inversión y actualmente para el 2026 tiene asignado un presupuesto vigente de L 190.6 millones,

En cuanto al porcentaje de ejecución, en el año 2023 a nivel institucional se reporta una ejecución de L 144.0 millones, que representa el 24.1% con relación a su presupuesto vigente, en el año 2024 el monto ejecutado disminuyó a L 41.9 millones que representó apenas el 2.9% en relación con su presupuesto vigente y para el 2025 se alcanzó una ejecución de L 280.9 millones que representan el 17.9% de cumplimiento. Finalmente, para 2026 se reporta una ejecución de L 7.3 millones apenas 3.9% con relación al presupuesto vigente, esto obedece a la falta de aprobación de los contratos que trascienden periodo de gobierno por parte del Congreso Nacional.

D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 La mayor parte de la inversión acumulada al II trimestre de 2026 se concentra en los siguientes proyectos:

1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras
2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras

A continuación, se detallan los avances físicos y financieros de los principales proyectos de acuerdo con su presupuesto vigente:



1. Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras

El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en Honduras sin acceso de calidad a agua potable y saneamiento. Para lograr el objetivo general se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Incrementar el acceso y mejorar la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento con un enfoque de seguridad hídrica en zonas urbanas y rural.
- Fortalecer las entidades sectoriales para mejorar la gestión y la sostenibilidad de la prestación del servicio teniendo en cuenta los impactos del cambio climático (CC) sobre las fuentes y la infraestructura que garantiza el suministro de agua.

Los principales avances físicos al II trimestre de 2026 son los siguientes: **Principales Metas Físicas al II trimestre 2026**

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejec	Programación	Ejecución	% Ejec
Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades	SISTEMA	8	0	0%	0	0	0%
Obras de Mitigación	OBRA	3	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto

Durante el segundo trimestre de 2026, el Programa realizó las actividades para reactivar los contratos de obras suspendidos. Para el mes de junio de 2026, los contratistas ya se encontraban nuevamente trabajando en campo con su respectiva orden de reinicio de obras, sin menoscabo de lo anterior, se mantiene el impacto directo en el avance físico y financiero de los proyectos debido al proceso de supresión de SEDECOAS y su traslado a la SIT. Los contratos de obras que se han reactivado son 11 de los cuales se encuentran en proceso de cancelación 6 contratos. Esto refleja la necesidad de ajustes administrativos para garantizar la continuidad de las obras.

Listado de proyectos de obras del 2026

No.	Nombre	Tipo de Obra	Comunidad	Departo	Beneficiario	Observaciones
1	Reposición Sistema de Agua Potable	Reposición de un sistema de agua potable.	1.Sangrelaya 2. Colalito 3.Iriona Puerto 4.Los Mangos	Colon	2526	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras en ejecución 3. Proyecto reactivado en 10jun26
2	Construcción de Sistema Integral de Micro Captación Pluvial y Saneamiento Básico	Instalación de sistemas de micro captación, Construcción de Letrinas, Techos, Pisos, Lavamanos.	1. Las Pilas 2. El Aceituno	Intibucá.	552	1. Contrato de Supervisión Adjudicado/ Falta entrega de documentos complementarios y firma de contrato. 2. Contrato de obras se encuentra em proceso de cancelación.
3	Construcción de Sistema Integral de Microcaptación Pluvial y Saneamiento Básico	Instalación de sistemas de micro captación, Construcción de Letrinas, Techos, Pisos, Lavamanos.	1. El Espino, 2. Guachipilín, 3. El Ocote, 4. San Juan de la Vega, 5. Hoja Blanca, 6. El Amatillo	Intibucá.	905	1. Contrato de Supervisión Adjudicado/ Falta entrega de documentos complementarios y firma de contrato. 2. Contrato de obras se encuentra em proceso de cancelación
4	Proyectos Obras de Mitigación en	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Línea de conducción	Colonia Montes de los Olivos	Francisco Morazán	7,926	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras en ejecución



SECRETARÍA DE FINANZAS



No.	Nombre	Tipo de Obra	Comunidad	Departo	Beneficiario	Observaciones
	Col. Montes de los Olivos	de agua potable y Obras de Mitigación.				3. Se encuentra en proceso de terminación de contrato.
5	Proyecto Obras de Mitigación en Col. Nueva Jerusalén N° 2	Construcción de Alcantarillado Sanitario, Construcción de colector principal de alcantarillado sanitario, Línea de conducción de agua potable desde tanque de almacenamiento, Construcción de sistema de agua potable, Obras de Mitigación.	Col. Nueva Jerusalén N° 2	Francisco Morazán	8,064	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras en ejecución. 3. Se encuentra en proceso de terminación de contrato
6	Obras Mitigación en Col. Brisas del Mogote	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario, Construcción de sistema de agua potable, Obras de Mitigación.	Col. Brisas del Mogote	Francisco Morazán	1,248	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras finalizado el tiempo de ejecución. Afectada la garantía de cumplimiento. 3. Se encuentra en proceso de terminación de contrato
7	Línea de Impulsión SANAA-Barrios	Construcción de línea de conducción desde planta de tratamiento a cisterna de 70,000.00 galones. Instalación de tres Bombas de 350 HP, Línea de impulsión hasta tanque de almacenamiento con un volumen de 347,436.00 galones.	Colonia Nueva España	Francisco Morazán	19,260	1. Contrato de supervisión en ejecución. 2. Contrato de obras en espera de orden de inicio, debido a revisión de condiciones técnicas actuales solicitadas por el BID.
8	Ampliación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento	Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable existente y saneamiento básico	Comunidades del Guayabal, Pedernal, Guascotoro y Delicias	La Paz	2,885	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras en ejecución 3. Proyecto reactivado en 15-jun-26
9	Ampliación Sistema de Abastecimiento de Agua Potable	Ampliación de dotación de agua del sistema de agua existente mediante la construcción de una nueva línea de conducción.	Casco Urbano San Marcos.	Santa Bárbara	6,584	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras en ejecución 3. Proyecto reactivado en 15-jun-26
10	Reparación del Sistema de Agua Potable	Reparación del Sistema de Agua Potable	Casco Urbano del Municipio de San Marcos de La Sierra	Intibucá	3,012	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras en ejecución. 3. Proyecto reactivado en 15-jun-26
11	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Campanario 2	Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico.	Comunidad Campanario 2, Aldea Quiraguira	Intibucá	315	1. Contrato de supervisión en ejecución 2. Contrato de obras en ejecución. 3. Proyecto reactivado en 15-jun-26

Fuente Unidad Ejecutora

El desempeño de los proyectos bajo los subcomponentes 1.1 y 1.2 donde se intervendrán colonias periurbanas del Distrito Central y pequeñas localidades y zonas rurales, se financiará la construcción de nuevos sistemas de agua potable y ampliación y mejoramiento de sistemas existentes; y la construcción y mejoramiento de sistemas de saneamiento con gestión sanitaria de excretas y aguas residuales. refleja un avance lento, derivado de la suspensión temporal que se levantó desde el mes de marzo y se reactivó hasta el mes de junio de 2026. Es importante mencionar que, por la baja ejecución, los proyectos Periurbanos (Nueva Jerusalén No 2; Montes



SECRETARÍA DE FINANZAS



de los Olivos y Brisas del Mogote) se encuentran en un proceso de terminación anticipada de contrato.

Los proyectos rurales cuentan con un reinicio desde el mes de junio para los cuales se ha comenzado el proceso de estimaciones y órdenes de cambio. Aunque algunos alcanzaron porcentajes físicos superiores al 70%, la mayoría apenas supera el 20%, confirmando que la detención ha afectó transversalmente la capacidad del Programa para cumplir con las metas de cobertura y calidad de los servicios de agua potable y saneamiento.

D.1.1. Evaluación Financiera al II trimestre 2026

Evaluación Financiera II trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Programa de Agua Potable y Saneamiento en Honduras	5284/BL-HO	US\$ 45,000,000	1,201,050,000	15/05/2023-23/11/2028
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II trimestre 2026	172,328,764.00	172,328,764.00	6,018,922	3%
Acumulado 2026	172,328,764.00	172,328,764.00	6,956,0628	4%
Acumulado Vida del Proyecto *	1,201,050,000	1,201,050,000	134,737,749.67	11.2%

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto
Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US\$1.00

Durante el segundo trimestre de 2026 no se registraron avances en los procesos de adquisiciones del Programa. La principal limitante fue la ausencia de firma delegada misma que fue subsanada a través del Oficio DGCP-FEN-330/2026 del 29 de mayo de 2026. Este punto marcó el inicio de los envíos oficiales y gestiones administrativas ante el Banco. De igual manera el programa se encuentra en transición hacia la SIT, por lo que, se entiende que los nuevos procesos deberán ser realizados bajo la sombrilla de esta institución y no a través de la suprimida SEDECOAS. Esta situación ha generado un retraso en la adjudicación de bienes y servicios esenciales para la ejecución de las obras y actividades de apoyo, manteniendo pendientes los procesos que ya cuentan con documentación técnica y financiera preparada.

2. Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras

Al II trimestre de 2026, el **Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras** no registra **avances físicos** ni **ejecución financiera**. En consecuencia, no se reportan metas físicas alcanzadas, estimaciones de obra, devengados ni desembolsos asociados al Programa durante el período evaluado.

Cabe destacar que este proyecto será reportado a través de la Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Mediante oficio DGIP-PRE-033-2026 se otorgó enmienda a la nota de prioridad por cambio de ejecutor a la Secretaria de Infraestructura y Transporte.

Mediante PCM-013-2026 se instruye a la Secretaria de Finanzas realizar cambio de organismo ejecutor al programa pasando a ser ejecutado entre SIT y la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

- Transición institucional: La supresión de SEDECOAS y el traslado de sus funciones a la SIT generó una parálisis administrativa que afectó directamente la operatividad del Programa. Este cambio institucional retrasó la toma de decisiones y la gestión de procesos clave, creando incertidumbre en la continuidad de las intervenciones.



- Necesidad de reactivación: Si bien, la reactivación de los proyectos es el hito más importante para lograr mejorar la ejecución financiera, es de suma importancia mencionar que estos se comenzaron a reactivar en el mes de junio (al final del trimestre) por lo que se observará una mejora en el tercer trimestre de 2026.
- Riesgo social y comunitario: Aunque se logró mantener la relación con las comunidades para evitar conflictos, la falta de avances en obra aumenta el riesgo de descontento social. La paralización prolongada podría derivar en presiones comunitarias más fuertes si no se normalizan los procesos en el corto plazo.
- Se encuentran pendientes de Ratificación por el Congreso Nacional 17 Contratos, por los que a la fecha las obras se encuentran suspendidas.

G. CONCLUSIONES

- Al II trimestre de 2026, la ejecución presupuestaria institucional es mínima (3.9% del presupuesto vigente) durante el período evaluado.
- La transición institucional (supresión de SEDECOAS y traslado de funciones a la SIT) generó una interrupción administrativa que afectó la gobernanza del Programa, retrasó la toma de decisiones y limitó la continuidad operativa.
- La suspensión de contratos por falta de pago detuvo la ejecución física en varios proyectos, incrementando la necesidad de ampliaciones de plazo, ajustes contractuales y órdenes de cambio para una futura reactivación.
- La falta de avances sostenidos incrementa el riesgo social y comunitario, debido a posibles presiones por parte de beneficiarios y autoridades locales, especialmente si no se normalizan los procesos de ejecución en el corto plazo.

H. RECOMENDACIONES

Con base en los hallazgos del II trimestre de 2026, se recomienda priorizar acciones inmediatas para restablecer la gobernanza administrativa y financiera del Programa, reactivar la ejecución física de los contratos suspendidos y reducir los riesgos contractuales, sociales y de sostenibilidad. Las recomendaciones se presentan a continuación en orden de prioridad.

1. **Implementar un plan de reactivación de obras con cronograma y responsables:** que incluya (i) listado de contratos suspendidos, (ii) condiciones de reanudación, (iii) estimaciones pendientes, (iv) ajustes/órdenes de cambio requeridos y (v) ruta crítica y fecha estimada de reinicio por proyecto.
2. **Establecer un plan de desembolsos y flujo de caja del Programa**
3. **Fortalecer la coordinación SIT–Alcaldía-Unidad Ejecutora–BID:** implementar un mecanismo de seguimiento quincenal con actas, acuerdos, responsables y fechas; utilizar un tablero de control para dar trazabilidad a decisiones, pagos, reactivaciones y adquisiciones.
4. **Reactivar y destrabar procesos de adquisiciones:** actualizar el Plan Anual de Compras/Adquisiciones (PACC), priorizar procesos críticos, revisar expedientes listos para envío y calendarizar hitos de adjudicación; establecer controles de tiempo por etapa para reducir rezagos.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
81	1. Inversión Productiva		-	183,805,602	183,805,602	-	183,805,602	183,805,602	-	6,018,922	6,018,922	13.1%	-	6,956,068	6,956,068	24.8%	-	7,897,798	7,897,798	27.8%
2	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento			183,805,602	183,805,602		183,805,602	183,805,602		6,018,922	6,018,922	3.3%		6,956,068	6,956,068	3.8%		7,897,798	7,897,798	4.3%
1	PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS	BID5284/BL-HO		172,328,764	172,328,764		172,328,764	172,328,764		6,018,922	6,018,922	3.5%		6,956,068	6,956,068	4.0%		7,897,798	7,897,798	4.6%
	Total PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN HONDURAS			172,328,764	172,328,764		172,328,764	172,328,764		6,018,922	6,018,922	3.5%		6,956,068	6,956,068	4.0%		7,897,798	7,897,798	4.6%
2	Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en Honduras	5875/BL-HO		11,476,838	11,476,838		11,476,838	11,476,838		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	Total Programa para incrementar la resiliencia ante inundaciones del Valle de Sula en			11,476,838	11,476,838		11,476,838	11,476,838		-	-	0.0%		-	-	0.0%		-	-	0.0%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		6,789,022	-	6,789,022	6,789,022	-	6,789,022	-	-	-	27.7%	389,022	-	389,022	37.6%	389,022	-	389,022	37.8%
	0416 - Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento		6,789,022		6,789,022	6,789,022		6,789,022	-	-	-	0.0%	389,022		389,022	5.7%	389,022		389,022	5.7%
	ACTIVIDADES CENTRALES		6,789,022		6,789,022	6,789,022		6,789,022	-	-	-	0.0%	389,022		389,022	5.7%	389,022		389,022	5.7%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		6,789,022		6,789,022	6,789,022		6,789,022	-	-	-	0.0%	389,022		389,022	5.7%	389,022		389,022	5.7%
	GESTION DE PROYECTOS NACIONALES		-		-	-		-	-	-	-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total GESTION DE PROYECTOS NACIONALES		-		-	-		-	-	-	-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total general		6,789,022	183,805,602	190,594,624	6,789,022	183,805,602	190,594,624	-	6,018,922	6,018,922	0	389,022	6,956,068	7,345,090	1	389,022	7,897,798	8,286,820	34.6%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS

Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II trimestre 2026		
		Programación	Ejecución	% Ejec	Programación	Ejecución	% Ejec
Sistemas de agua potable construidos nuevos en pequeñas comunidades	SISTEMA	8	0	0%	0	0	0%
Obras de Mitigación	OBRA	3	0	0%	0	0	0%

Fuente: Unidades ejecutoras de proyectos al 30 de junio de 2026
