



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero

PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

Universidad Nacional de Agricultura (UNAG)

Informe No. 0703-001-2026

Tegucigalpa, julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026) 4	
D. PRINCIPALES PROYECTOS	5
D.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026	5
D.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	6
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	6
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....	6
G. CONCLUSIONES	7
H. RECOMENDACIONES	7
ANEXO 1	8



SECRETARÍA DE FINANZAS



A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) tiene como fin primordial la gestión del conocimiento para contribuir a desarrollar el sector agrícola nacional y afines en su multidimensionalidad: tierra, agua, mar, aire; mediante la formación humanista, científica y tecnológica, la generación y difusión de conocimientos, así como la realización de actividades de vinculación con la sociedad, con una clara conciencia de la naturaleza multicultural y compleja de la nación hondureña.

Para el 2026 la UNAG cuenta con un presupuesto vigente de L547,180,037, para inversión productiva y Formación bruta de Capital.

Al trimestre se realizó una ejecución del 18.3% respecto al presupuesto vigente en donde la inversión mayormente realizada es bajo la Inversión Productiva con L98,616,898.

Para el año 2026 la UNAG tiene planificado realizar inversiones en dos proyectos 1) Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres y 2) Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social, Formativo e Investigativo en Varias Sedes de la Universidad Nacional de Agricultura (PRODESOFI-UNAG).

Los cuales generaran beneficios en incrementar la oportunidad de estudio a muchas jóvenes provenientes de todo el territorio nacional y mejorar las condiciones académicas, investigativas y sociales de las diferentes áreas de la Universidad Nacional de Agricultura.

Cuadro No. 01
Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	954,630,037
Inversión Productiva	516,676,250
Formación Bruta de Capital	437,953,787
Presupuesto Vigente	547,180,037
Inversión Productiva	109,226,250
Formación Bruta de Capital	437,953,787
Ejecutado II Trimestre	99,827,589
Inversión Productiva	98,616,898
Formación Bruta de Capital	1,210,691
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	18.2%
Ejecutado Anual	100,292,586
Inversión Productiva	98,616,898
Formación Bruta de Capital	1,675,688
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	18.3%
Compromiso Aprobado	100,292,586
Inversión Productiva	98,616,898
Formación Bruta de Capital	1,675,688
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	18.3%

Nota: SIAFI, 30/06/2026




SECRETARÍA DE FINANZAS



B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Gráfico No. 1
0703 - Universidad Nacional de Agricultura
Financiamiento de la Inversión por Fuente Cifras en
Millones de Lempiras

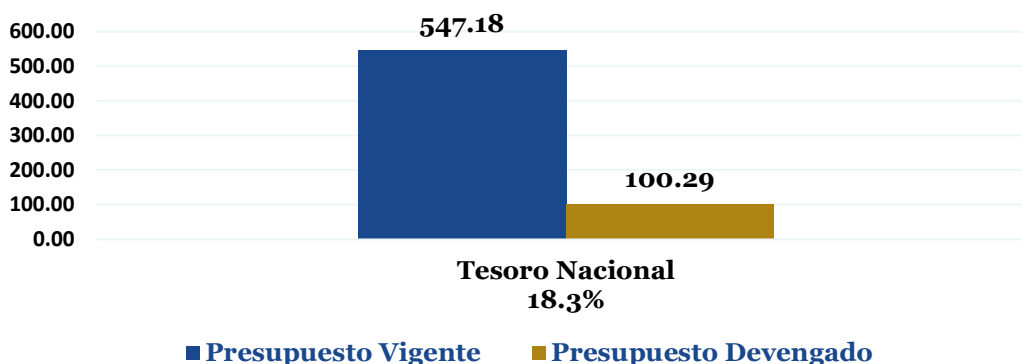

Fuente: SIAFI al 30/06/2026

En referencia al Gráfico No. 1, al cierre del II Trimestre 2026, el Presupuesto Vigente de la UNAG posee una ejecución del 18.3% de Tesoro Nacional.

El presupuesto vigente de la UNAG para inversión es financiado en su totalidad por la fuente de tesoro nacional, distribuida en un **99.3%** (L543,361,042.00) por Tesoro Nacional y un 0.7% Recursos Propios (L3,818,995.00).

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2022-2026)

En el periodo 2022-2025, la Inversión Productiva de la UNAG para el segundo trimestre de cada año ha mantenido su ritmo de ejecución de acuerdo con el análisis comparativo detallado al




SECRETARÍA DE FINANZAS



segundo trimestre del periodo indicado. Hasta el año 2026 se observa un incremento sustancial en la ejecución del 18.3% respecto a los años anteriores; esto debido a la ejecución que se ha tenido en la inversión productiva del Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres.

Comportamiento Inversión Pública Total Al 30 de junio (2022-2026) 0703 - Universidad Nacional de Agricultura Cifras en millones de Lempiras

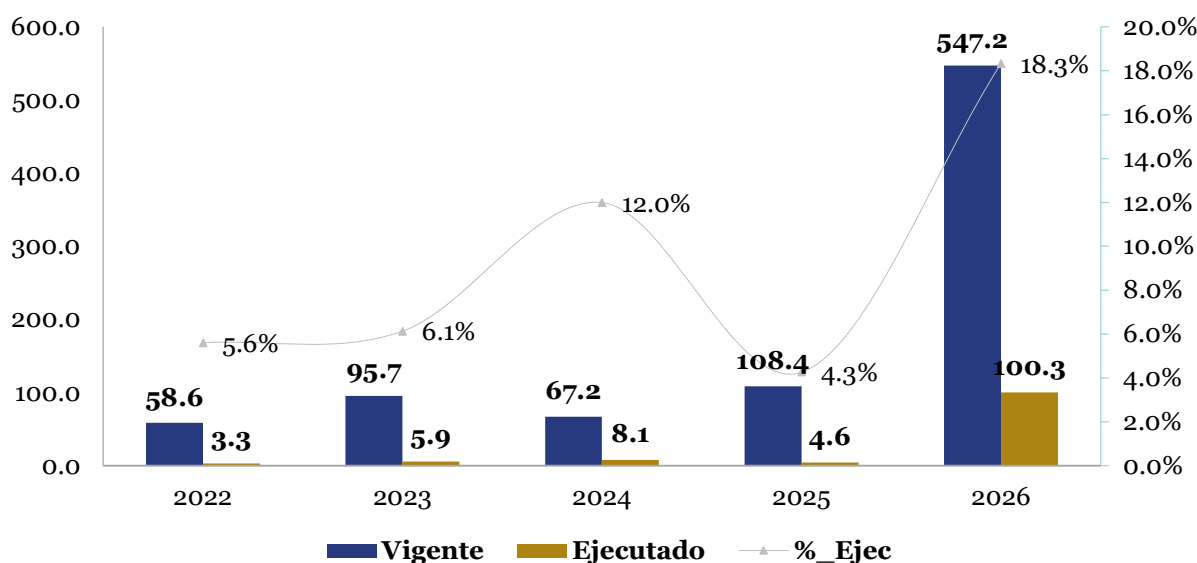

Fuente: SIAFI al 30/06/2026

D. PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación, se detallan los avance físico y financiero del Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial Para Estudiantes Mujeres en la Universidad Nacional de Agricultura:

El Proyecto pretende incrementar la oportunidad de estudio a muchas jóvenes provenientes de todo el territorio nacional, principalmente aquellas que por situaciones económicas no tienen oportunidad de ingresar a las diferentes ofertas de estudio presentadas por las otras instituciones del nivel de educación superior del país, mediante la construcción de un edificio de tres niveles que albergará 756 estudiantes, los cuales se distribuirán en 126 habitaciones con capacidad para seis personas cada una.

D.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

En cuanto al avance físico, al cierre del segundo trimestre del 2026 la UNAG indica que a la fecha no se presentan obras debido a que se formalizó el contrato para la ejecución de la obra física,



SECRETARÍA DE FINANZAS



asegurando los recursos necesarios para el inicio y desarrollo de las actividades constructivas. Por otra parte, se avanzó en la planificación y programación financiera para la adquisición de los bienes requeridos, los cuales serán incorporados conforme avance la construcción de la infraestructura.

Respecto a la supervisión en segundo trimestre se establecieron los mecanismos de seguimiento y control para verificar el avance físico y financiero del proyecto.

D.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de Inicio - Fin
Proyecto Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres	25920-1	Lempiras	159,226,249.81	05/06/2026 05/06/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II Trimestre 2026	109,226,250	109,226,250	98,616,898	90.3
Acumulado 2026	109,226,250	109,226,250	98,616,898	90.3
Acumulado Vida del Proyecto */	159,226,250	159,226,250	98,616,898	61.9

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Respecto al proyecto, Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social, Formativo e Investigativo en Varias Sedes de la Universidad Nacional de Agricultura (PRODESOFI-UNAG), informó a SEFIN en reuniones de seguimiento que el proyecto contempla quince (15) procesos de contratación, priorizando durante el año 2026 aquellos proyectos con mayor asignación presupuestaria y mayor tiempo de ejecución por lo que el objetivo institucional es adjudicar los procesos prioritarios durante los meses de julio a octubre de 2026, con la expectativa de concretar adjudicaciones en noviembre de 2026.

E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- Debido a la aplicación del procedimiento conceptual para la determinación de las fechas de inicio y finalización de los proyectos financiados con fuentes internas dentro del Programa de Inversión Pública, se actualizó la fecha de inicio y fin en el Sistema Nacional de Inversión Pública de Honduras.
- Reuniones de monitoreo y seguimiento del proyecto.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

De acuerdo con lo expresado por la UNAG se ha tenido problemas derivadas de variaciones en los precios de materiales de construcción, condiciones climáticas adversa, disponibilidad oportuna de recursos financieros lo cual les afecta en el cumplimiento de los cronogramas contractuales.



SECRETARÍA DE FINANZAS



G. CONCLUSIONES

- La UNAG se ha comprometido recursos por L98,616,898.00, equivalentes al 90.29% del presupuesto disponible, lo que demuestra un avance significativo en la gestión financiera del proyecto.
- Para el periodo de análisis, de acuerdo con la información proporcionada por la unidad ejecutora, no se cuenta con avances físicos ya que los avances corresponden mayormente a la etapa inicial de contratación de obra y supervisión.

H. RECOMENDACIONES

- Las UNAG debe incrementar su grado de responsabilidad e involucramiento ante las gestiones técnico-operativo a lo interno de la institución, a fin de mejorar el nivel de cumplimiento institucional y sus niveles de ejecución debido a que el proyecto cuenta con fecha de finalización al 05 de junio del 2027.



SECRETARÍA
DE FINANZAS

★ ★ ★ ★ ★

ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado II Trimestre				Ejecutado Anual (Devengado)				Compromiso Aprobado			
			Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Nacionales	Total Fondos Externos	Total General	% Compromiso (Comp./Vig.)
2	1. Inversión Productiva		516,676,250	-	516,676,250	109,226,250	-	109,226,250	98,616,898	-	98,616,898	90.3%	98,616,898	-	98,616,898	90.3%	98,616,898	-	98,616,898	90.3%
2	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		516,676,250		516,676,250	109,226,250		109,226,250	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%
1	Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres 'Xiomara Castro' en la Universidad Nacional de Agricultura, ubicado en la ciudad de Catacamas, departamento de	FN-25920-1	109,226,250		109,226,250	109,226,250		109,226,250	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%
	Total Proyecto de Construcción y Equipamiento de Edificio Residencial para Estudiantes Mujeres		109,226,250		109,226,250	109,226,250		109,226,250	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%	98,616,898		98,616,898	90.3%
2	Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social, Formativo e Investigativo en Varias Sedes de la Universidad Nacional de Agricultura (PRODESOFI-UNAG)	FN-25920-1	407,450,000		407,450,000	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	Total Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura y Equipamiento para el Desarrollo Social		407,450,000		407,450,000	-		-	-		-	0.0%	-		-	0.0%	-		-	0.0%
	2. Formación Bruta de Capital Fijo		437,953,787	-	437,953,787	437,953,787	-	437,953,787	1,210,691	-	1,210,691	0.3%	1,675,688	-	1,675,688	0.4%	1,675,688	-	1,675,688	0.4%
	0703 - Universidad Nacional de Agricultura		437,953,787		437,953,787	437,953,787		437,953,787	1,210,691		1,210,691	0.3%	1,675,688		1,675,688	0.4%	1,675,688		1,675,688	0.4%
	ACTIVIDADES CENTRALES		3,582,199		3,582,199	3,582,199		3,582,199	283,408		283,408	7.9%	283,408		283,408	7.9%	283,408		283,408	7.9%
	Total ACTIVIDADES CENTRALES		3,582,199		3,582,199	3,582,199		3,582,199	283,408		283,408	7.9%	283,408		283,408	7.9%	283,408		283,408	7.9%
	FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA		432,371,588		432,371,588	432,371,588		432,371,588	732,299		732,299	0.2%	1,171,046		1,171,046	0.3%	1,171,046		1,171,046	0.3%
	Total FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA		432,371,588		432,371,588	432,371,588		432,371,588	732,299		732,299	0.2%	1,171,046		1,171,046	0.3%	1,171,046		1,171,046	0.3%
	PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA		2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	194,985		194,985	9.7%	221,235		221,235	11.1%	221,235		221,235	11.1%
	Total PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA		2,000,000		2,000,000	2,000,000		2,000,000	194,985		194,985	9.7%	221,235		221,235	11.1%	221,235		221,235	11.1%
	Total general		954,630,037	-	954,630,037	547,180,037	-	547,180,037	99,827,589	-	99,827,589	18.2%	100,292,586	-	100,292,586	18.3%	100,292,586	-	100,292,586	18.3%
