



SECRETARÍA DE FINANZAS



Informe al II Trimestre de Avance Físico y Financiero
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (AMDC)

Informe No. 1801-002-2026
Tegucigalpa, Julio 2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



Contenido

Contenido	2
IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN	3
A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA.....	3
B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	4
C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2024-2026) 4	
D. PRINCIPALES PROYECTOS	6
D.1 Proyecto: Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa/ IDA 6460”	6
D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026	6
D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026	8
D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026.....	8
E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN	9
F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026.....	9
G. CONCLUSIONES	9
H. RECOMENDACIONES	10
ANEXO 1	11
ANEXO 2	12



SECRETARÍA DE FINANZAS



IV. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN

A. EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

La Alcaldía Municipal de Distrito Central (AMDC), tiene la finalidad de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la capital en el área rural y urbana, mediante programas y proyectos de desarrollo social o infraestructura, con el propósito de construir el desarrollo sostenible generando fuentes empleos del Distrito Central.

En el marco del Plan de Gobierno ¡Juntos Vamos a Estar Bien! 2026–2030, se promoverá la descentralización de la ejecución de los programas sociales mediante la transferencia de recursos financieros a las Alcaldías Municipales, fortaleciendo su capacidad institucional para identificar, planificar e implementar intervenciones orientadas a atender las necesidades prioritarias de la población de manera oportuna, eficiente y con mayor cercanía a los territorios.

Al cierre del II Trimestre de 2026, la institución contó con un presupuesto de inversión pública vigente de **L160.3 millones**, destinado en su totalidad a Inversión Productiva. Al 30 de junio de 2026, la ejecución presupuestaria ascendió a **L15.5 millones**, equivalente al **9.7%** del presupuesto vigente. Asimismo, el monto de compromisos aprobados alcanzó **L38.4 millones**, lo que representa un **23.9%** del presupuesto vigente, tal como se detalla en el Cuadro No. 1.

La ejecución registrada durante el período se realizó mediante el proyecto "Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa", el cual tiene como propósito mejorar la continuidad, calidad y eficiencia del servicio de agua potable en el Distrito Central, mediante la rehabilitación y ampliación de infraestructura.

Cuadro No. 01

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2026

Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	160,313,478
Inversión Productiva	160,313,478
Presupuesto Vigente	160,313,478
Inversión Productiva	160,313,478
Ejecutado II Trimestre	15,485,920
Inversión Productiva	15,485,920
% Ejecución (Ejecutado II Trim-2026/Vigente)	9.7%
Ejecutado Anual	15,485,920
Inversión Productiva	15,485,920
% Ejecución (Ejecutado Anual/Vigente)	9.7%
Compromiso Aprobado	38,352,930
Inversión Productiva	38,352,930
% Compromiso (Compromiso II Trim-2026/Vigente)	23.9%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



SECRETARÍA DE FINANZAS



B. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Respecto al financiamiento de la Inversión Pública, la totalidad de los recursos corresponden a fondos provenientes de crédito externo proveniente del Banco Mundial, con un monto de **L160.3 millones**, Dicha inversión es financiada por el Banco Mundial con 100%

C. COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LA EJECUCIÓN AL II TRIMESTRE (2024-2026)

En el periodo comprendido del 2022 al 2026, los proyectos de Inversión Pública de la AMDC han considerado la ejecución de un Proyectos de Inversión, financiados por recursos provenientes de fondos externos proveniente de crédito. En el siguiente cuadro se muestra gráficamente el comportamiento histórico de la inversión productiva de la institución desde el año 2022-2026:

- En el 2022, la institución contó con un presupuesto vigente de L236.4 millones, de los cuales ejecutó L5.1 millones, alcanzando una ejecución presupuestaria de 2.2%. Este bajo nivel de ejecución refleja que el proyecto se encontraba en una etapa inicial de implementación, con actividades orientadas principalmente a la planificación, preparación técnica y desarrollo de los procesos administrativos y de contratación.
- Para el año 2023, el presupuesto vigente aumentó a L309.9 millones, mientras que la ejecución ascendió a L27.8 millones, equivalente al 9.0% del presupuesto vigente. Aunque la ejecución continuó siendo moderada, se observa un incremento significativo respecto al año anterior, evidenciando avances en la implementación del proyecto y en el desarrollo de las actividades programadas.
- En 2024, el proyecto alcanzó su mayor presupuesto vigente con L508.2 millones. La ejecución fue de L44.2 millones, representando un 8.7% del presupuesto vigente. A pesar del incremento en los recursos asignados, el porcentaje de ejecución fue ligeramente inferior al registrado en 2023, lo que sugiere que la ampliación del presupuesto estuvo acompañada de desafíos en la ejecución de las inversiones, principalmente asociados al ritmo de contratación y desarrollo de las obras y actividades previstas.
- Durante 2025, el presupuesto vigente disminuyó a L137.9 millones, mientras que la ejecución alcanzó L52.5 millones, equivalente al 38.1% del presupuesto vigente. Este constituye el mayor porcentaje de ejecución del periodo analizado, reflejando una mejora significativa en la gestión del proyecto, producto de la consolidación de los procesos de contratación y de la ejecución de las actividades de inversión programadas.




SECRETARÍA DE FINANZAS



- Al cierre del II Trimestre de 2026, el proyecto registra un presupuesto vigente de L160.3 millones y una ejecución de L15.5 millones, equivalente al 9.7% del presupuesto vigente. Si bien el porcentaje de ejecución es inferior al alcanzado al cierre de 2025, este comportamiento es consistente con un corte semestral, por lo que se espera que la ejecución se incremente durante el tercer trimestre conforme avancen las contrataciones, los compromisos adquiridos y la ejecución física y financiera del proyecto "Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa".

La serie histórica evidencia que el proyecto experimentó un incremento importante en la disponibilidad de recursos entre 2022 y 2024, alcanzando su mayor presupuesto en este último año. No obstante, la mayor eficiencia en la ejecución se registró en 2025, con una ejecución del 38.1%. Al II trimestre de 2026, la ejecución alcanza el 9.7%, manteniendo además compromisos equivalentes al 23.9% del presupuesto vigente, lo que indica que existe una cartera de recursos ya comprometidos que permitirá incrementar la ejecución financiera en el transcurso del segundo semestre del ejercicio fiscal.

Comportamiento Inversión Pública Total
Al 30 de junio (2022-2026)
1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central
Cifras en millones de Lempiras

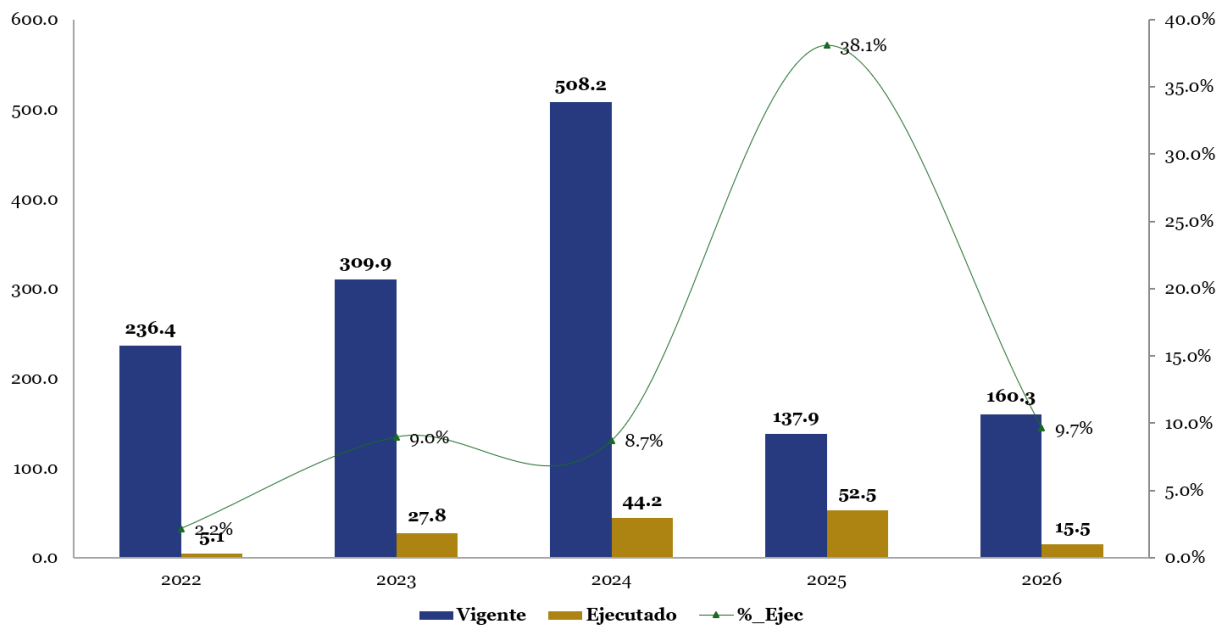

Fuente: SIAFI



D. PRINCIPALES PROYECTOS

D.1 Proyecto: Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa/ IDA 6460”

D.1.1. Principales Metas Físicas al II Trimestre 2026

El Proyecto consiste en aumentar la eficiencia, confiabilidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable en áreas seleccionadas del Distrito Central, particularmente en la ciudad de Tegucigalpa, mediante la modernización y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica, la rehabilitación de redes de distribución y la implementación de mejoras operativas que permitan reducir pérdidas de agua, optimizar la continuidad del servicio y garantizar un abastecimiento más seguro y de mayor calidad para la población beneficiaria.

Los principales avances físicos al segundo trimestre del 2026 son los siguientes:

Principales Metas Físicas al II trimestre 2026

Institución/ Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec	Programa- ción	Ejecu- ción	% Ejec
1801– Alcaldía Municipal del Distrito Central								
Proyecto “Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa”	Obras de Sectores Hidráulicos	Obras	3	0	0%	3	0	0%
	Laboratorio de Limnología	Laboratorio	1	0	0%	1	0	0%
	Evaluación integral de riesgos para las represas La Concepción y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia.	Planes	2	1.3	67%	2	1.3	67%

Fuente: Unidad Ejecutora del proyecto



SECRETARÍA DE FINANZAS



Durante el segundo trimestre 2026 se reactivó el proceso de contratación de las obras de sectores hidráulicos mediante un segundo proceso licitatorio. En este período se completaron las etapas de consultas, aclaraciones, evaluación técnica y financiera, se obtuvo la No Objeción del Banco Mundial y se formalizó la contratación del Lote 1. Asimismo, se emitió la Carta de Aceptación, se suscribió el contrato, se recibieron las garantías correspondientes y se realizaron reuniones de coordinación, visitas de campo en los sectores de Miraflores, Juana Laínez y Estiquirín, así como capacitaciones sobre los Estándares Ambientales y Sociales (EAS). Estas acciones permitieron establecer las condiciones necesarias para el inicio de las obras, cuya ejecución se desarrollará en los primeros días de julio 2026.

Durante el trimestre continuó el proceso de contratación para la construcción y equipamiento del Laboratorio de Limnología, avanzando conforme a los procedimientos establecidos en el plan de adquisiciones del proyecto y a las normas aplicables del Banco Mundial. En este período se llevó a cabo la evaluación técnica y financiera de seis ofertas recibidas, se elaboró el correspondiente informe de evaluación y se emitieron las notificaciones de intención de adjudicación, constituyendo un avance significativo para la formalización del contrato y el inicio de la ejecución de esta infraestructura, la cual fortalecerá las capacidades de investigación, monitoreo y análisis de la calidad de los recursos hídricos.

Durante el segundo trimestre se registraron avances en la consultoría para la evaluación integral de riesgos y fortalecimiento de la seguridad de las presas La Concepción y Los Laureles. Se realizaron reuniones de seguimiento y una misión técnica en junio de 2026, donde se revisaron los avances de los estudios hidrológicos, geotécnicos, hidromecánicos y de seguridad de presas. Asimismo, se recibieron y analizaron documentos técnicos clave, incluyendo planes de emergencia, vigilancia y monitoreo, análisis de rotura de presas y propuestas de re-instrumentación, los cuales se encuentran en revisión, ajustes técnicos y gestión de pago.

Los contratos cuya vigencia trasciende el período de la actual administración gubernamental fueron remitidos al Congreso Nacional para su correspondiente análisis y aprobación, de conformidad con el marco legal aplicable. A la fecha del presente informe, dichos instrumentos contractuales se encuentran pendientes de aprobación por parte del Poder Legislativo, condición necesaria para continuar con su ejecución. No obstante, la Unidad Ejecutora ha brindado seguimiento permanente al proceso, realizando las gestiones de coordinación, monitoreo y comunicación con las instancias competentes, con el propósito de agilizar su trámite y garantizar que, una vez obtenida la aprobación legislativa, las actividades programadas puedan desarrollarse oportunamente y sin afectar el cumplimiento de los objetivos y cronograma del proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



D.1.2. Evaluación Financiera al II Trimestre 2026

Evaluación Financiera II trimestre 2026

Proyecto	Convenio	Costo Total		Fecha de
				Inicio - Fin
Proyecto para Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	US\$	US\$ 38,000,000.00	4/3/2020
		Lempiras	L1,015,295,400.00	15/4/2027
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Ejecutado (Devengado)	% Ejecución
II-Trimestre 2026	160,313,478.0	160,313,478.0	15,485,920.3	9.7%
Acumulado 2026	160,313,478.0	160,313,478.0	15,485,920.3	9.7%
Acumulado Vida del Proyecto **	1,015,295,400.0	1,015,295,400.0	865,972,442.2	85.3%

**/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Tipo de Cambio al 30/06/2026 (BCH): L26.7183 por US\$1.00

D.1.3. Principales Adquisiciones al II Trimestre 2026

- ✓ Contratación de las Obras De Sectores Hidráulicos
- ✓ Construcción y equipamiento del Laboratorio de Limnología
- ✓ Evaluación integral de riesgos para las represas La Concepción y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia.



SECRETARÍA DE FINANZAS



E. GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ Gestión de cuota de compromiso ante la Tesorería General de la República.
- ✓ Reuniones Monitoreo y Seguimiento.
- ✓ Modificación Presupuestaria de Incorporación de Recursos.
- ✓ Proyecciones ejecución.

F. PROBLEMÁTICA Y ACCIONES DURANTE EL II TRIMESTRE 2026

- La reducción del alcance derivada de la segunda reestructuración y la cancelación parcial del financiamiento hizo necesario ajustar la planificación, el Marco de Resultados, metas e indicadores, proceso que fue atendido mediante la coordinación entre la UMAPS, SEFIN y el Banco Mundial, culminando con la aprobación de los ajustes correspondientes y la formalización de la Enmienda a la Nota de Prioridad.
- La rescisión de los contratos de construcción de las PTAP La Concepción y Los Laureles limitó la ejecución de las inversiones previstas, por lo que se gestionó el cierre administrativo y contractual, priorizando las inversiones en ejecución y las consultorías estratégicas para futuras intervenciones
- Durante el período se identificaron retos asociados a los procesos de contratación, revisión técnica y coordinación de actividades del Proyecto. Para atenderlos, se fortaleció la coordinación institucional, se completaron los procesos de evaluación y aprobación requeridos, se gestionó la No Objeción del Banco Mundial y se implementaron mecanismos de seguimiento técnico con contratistas, consultores y equipos supervisores, permitiendo avanzar en la ejecución de las obras de sectores hidráulicos, la contratación del Laboratorio de Limnología y los estudios de seguridad de las presas La Concepción y Los Laureles.

G. CONCLUSIONES

- Durante el segundo trimestre de 2026, el Proyecto presentó avances importantes en sus componentes prioritarios, destacándose la reactivación del proceso de contratación de las obras de sectores hidráulicos, la formalización del contrato del Lote 1 y la ejecución de actividades preparatorias que permitieron establecer las condiciones necesarias para el inicio de las intervenciones.
- La reestructuración del Proyecto y la reducción parcial del financiamiento requirieron ajustes en la planificación, metas e indicadores del Marco de Resultados; sin embargo, mediante la coordinación entre la UMAPS, SEFIN y el Banco Mundial se logró formalizar la Enmienda a la Nota de Prioridad, asegurando la alineación del Proyecto con su alcance vigente.
- Asimismo, aunque la rescisión de los contratos de construcción de las PTAP La Concepción y Los Laureles afectó la programación inicial de inversiones, se implementaron acciones de cierre administrativo y priorización de actividades estratégicas, permitiendo mantener la continuidad de los estudios técnicos y preparatorios para futuras intervenciones.



SECRETARÍA DE FINANZAS



- Se evidenció un avance significativo en los procesos de contratación del Laboratorio de Limnología y en la consultoría para la evaluación de riesgos y seguridad de las presas La Concepción y Los Laureles, mediante la evaluación de ofertas, revisión de productos técnicos especializados y seguimiento permanente con consultores, supervisores y el Panel de Expertos.

H. RECOMENDACIONES

- Continuar fortaleciendo la coordinación entre la UCP-AMDC, UMAPS, SEFIN, contratistas, consultores y el Banco Mundial, a fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos y la ejecución oportuna de las actividades pendientes del Proyecto.
- Dar seguimiento permanente al inicio y ejecución de las obras de sectores hidráulicos, asegurando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, ambientales y sociales requeridas, así como la adecuada supervisión de los trabajos.
- Agilizar las gestiones administrativas y contractuales necesarias para la formalización e inicio de la construcción y equipamiento del Laboratorio de Limnología, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos en el plan de adquisiciones.
- Mantener el fortalecimiento institucional de la UMAPS mediante asistencia técnica y desarrollo de capacidades, especialmente en la gestión de reducción de Agua No Facturada (ANF), operación de sectores hidráulicos y sostenibilidad de las inversiones realizadas.
- Implementar mecanismos de seguimiento físico y financiero que permitan identificar oportunamente posibles riesgos de ejecución y adoptar medidas correctivas para asegurar el cumplimiento de las metas e indicadores ajustados del Proyecto.



SECRETARÍA DE FINANZAS



ANEXO 1

Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversiones Públicas
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE, 2026
Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Programa o Proyecto	Convenio	Presupuesto Aprobado		Presupuesto Vigente		Ejecutado II Trimestre			Ejecutado Anual (Devengado)		
			Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)	Total Fondos Externos	Total General	% Ejecución (Dev./Vig.)
1	1801 - Alcaldía Municipal del Distrito Central		160,313,478	160,313,478	160,313,478	160,313,478	15,485,920	15,485,920	9.7%	15,485,920	15,485,920	9.7%
1	Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa	IDA 6460	160,313,478	160,313,478	160,313,478	160,313,478	15,485,920	15,485,920	9.7%	15,485,920	15,485,920	9.7%
	Total Proyecto para Fortalecer la Prestación de Agua Potable de Tegucigalpa		160,313,478	160,313,478	160,313,478	160,313,478	15,485,920	15,485,920	9.7%	15,485,920	15,485,920	9.7%

Nota: SIAFI, 30/06/2026



ANEXO 2

SECRETARÍA DE FINANZAS
Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública - Dirección General de Inversión Pública
PLAN DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FÍSICA AL II TRIMESTRE, 2026

Institución/Proyecto	Metas Física	Unidad de Medida	Anual			II Trimestre 2026		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
1801-ALCADIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL								
Proyecto “Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	Obras de Sectores Hidráulicos	Obras	3	0	0%	3	0	0%
Proyecto “Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	Evaluación integral de riesgos para las represas La Concepción y Los Laureles que incluye planes de seguridad y planes de acción de emergencia.	Planes	2	1.3	67%	2	1.3	67%
Proyecto “Fortalecer los Servicios de Agua Potable de Tegucigalpa	Laboratorio de Limnología	Laboratorio	1	0	0%	1	0	0%

Nota : Unidades Ejecutoras de Proyectos, al 30 de junio de 2026
