



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## **Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)**

Al II Trimestre, 2016

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2016

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representa el 21.4% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año es de L. 163,267,155 y su ejecución financiera L.7208,735 (4%) se detalla en el Cuadro.

**Cuadro No. XX**  
**Programa de Inversión Pública al II trimestre, 2016**  
cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	163,267,155
Presupuesto Vigente	163,267,155
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	163,267,155
Presupuesto Ejecutado (Devengado Anual)	7,208,735
<b>% Ejecución (Devengado/ Vigente Ajustado)</b>	<b>4%</b>
Presupuesto Ejecutado (Comprometido)	7,208,735
<b>% Ejecución (Compromiso/ Vigente Ajustado)</b>	<b>4%</b>

Fuente: SIAFI, 30 de junio de 2016

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: el 49% (L.79,412,025) está financiado con fondos Corea, 38% (62,188,398) y el 13% (L.21,666,732) con fondos nacionales, tal y como se muestra en el gráfico No. 1

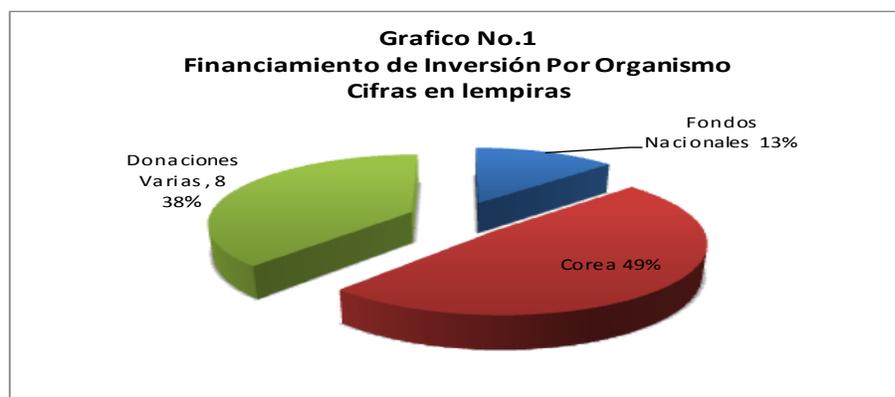

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

La inversión de la institución se concentra en tres proyectos de los cuales el más relevante es el de **PROENERGIA** cuya meta es la instalación de 21,036 sistemas fotovoltaicos; los beneficiarios serán: 21,036 viviendas, 34 centros, 416 escuelas. Y representa el 49% del presupuesto de la institución.

Estatus: se concluyó el proceso de revisión de los pliegos de licitación y se remitió las observaciones al EXIMBANK para su No Objeción, pendiente la adjudicación y se tiene programado para el mes de octubre el proceso de contratación a través de una Empresa Coreana. Se inició la socialización del proyecto para conformar 584 Juntas de Energía para los años 2016 (273) y para el año 2017 (311) quienes serán responsables en cada comunidad de la auto sostenibilidad.

SECRETARIA DE FINANZAS

La regularización del segundo desembolso se ingresó el 28 de junio por L.6,254.3 equivalente a US\$270.3 correspondiente a la ejecución del 30/06/16.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
Proyecto de Energía Renovable para el Desarrollo Rural Sostenible PROENERGIA RURAL	EDCF No. HND-5	1,113,604,915	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2016	89,571,547	89,571,547	3,190,432	4%
Acumulado 2016	89,571,547	89,571,547	3,190,432	4%
Acumulado Vida del Proyecto	1,113,604,915	1,113,604,915	28,616,229	3%
<b>Observaciones:</b>				

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto  
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Ver Detalle de Proyectos en Anexo No.

### 3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre los 2 proyectos han realizado modificaciones presupuestarias para realizar traslados entre objetos de gasto.

El Programa de Seguridad Alimentaria ( PESA), cerro al 30 de junio, 2016, la unidad Ejecutora envió solicitud para retirar el presupuesto asignado para 2016, se emito respuesta para proceder a su congelamiento por la cantidad de L. 50,573,600., quedando pendiente el destino de la contraparte nacional.

#### Conclusiones

- Gestiones de procesos de licitación para adjudicar la Empresa Consultora Coreana que es la que procederá a instalar los sistemas (panel solar, controlador de energía, una batería), Pendiente regularización de los fondos externos (fondos donación y préstamo).

#### Recomendaciones

- Dar el seguimiento oportuno a la no objeción de cada proceso de licitación.
- Darle continuidad a la regularización de fondos de acuerdo a los desembolsos recibidos.

Actualizar  
 Fechas de Inicio -  
 Término por  
 Proyecto

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública  
 ANEXO No. XXX  
 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre del 2016  
 Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Término	Aprobado			Vigente			Congelamiento			Vigente Ajustado			Devengado II Trim- 16			Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)				
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev. / Vig. Ajust.)	
3	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			21,666,732	141,600,423	163,267,155	21,666,732	141,600,423	163,267,155	-	-	-	21,666,732	141,600,423	163,267,155	3,130,193	2,716,215	5,846,407	4,492,520	2,716,215	7,208,735	4	4,492,520	2,716,215	7,208,735	4	
1	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2015-2018	10,159,522	79,412,025	89,571,547	10,159,522	79,412,025	89,571,547	-	-	-	10,159,522	79,412,025	89,571,547	1,928,199	-	1,928,199	3,190,432	-	3,190,432	4	3,190,432	-	3,190,432	4	
2	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	2009-2018	6,449,850	11,614,798	18,064,648	6,449,850	11,614,798	18,064,648	-	-	-	6,449,850	11,614,798	18,064,648	1,201,994	2,716,215	3,918,208	1,302,088	2,716,215	4,018,303	22	1,302,088	2,716,215	4,018,303	22	
3	Seguridad Alimentaria PESA.	GCP/HON/022/S PA-3.1	2009-2016	5,057,360	50,573,600	55,630,960	5,057,360	50,573,600	55,630,960	-	-	-	5,057,360	50,573,600	55,630,960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: SIAFI

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. XXX

## Programa de Inversión Pública: Ejecución Física al II Trimestre del 2016

INSTITUCION	PROYECTO	RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	ANUAL						2do Trimestre					
				Programación		Ejecución				Programación		Ejecución			
				Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	Cantidad	Porcentaje	% Ejec. Cantidad	% Ejec. Porcentaje
144-Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	Impartidos talleres de capacitación en el uso de sistemas de energía renovable	TALLERE DE CAPACITACION	342	0	60	0	18	0	90	0	55	0	61	0
		METODOLOGIAS PARA CAPACITACIÓN DE JUNTAS DE ENERGIA	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	Impartidos talleres de capacitación a productores en temas de Gestión Ambiental	TALLER	475	0	0	0	0	0	118	0			0	0
	Seguridad Alimentaria PESA.	Documentos Institucionales Publicados	DOCUMENTO	50	0	0	0	0	0	2	0			0	0
		Impartidos Talleres de Capacitación a productores en temas de Seguridad Alimentaria	TALLERE DE CAPACITACION	140	0	0	0	0	0	10	0			0	0
	Insumos entregados a productores para promover la seguridad alimentaria	EVENTO	140	0	0	0	0	0	10	0			0	0	

Fuente: SIAFI
