



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Programa Nacional de Desarrollo Rural (PRONADERS)

Al II Trimestre, 2017

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2017

3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA


El Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (PRONADERS) representa el 9% de la inversión del Gabinete de Desarrollo e Inclusión Social; su presupuesto de inversión para el presente año es de L.272,030,024 y su ejecución financiera al II trimestre es L.88,387,800 se detalla en el Cuadro.

Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2017
Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	272,030,024
Presupuesto Vigente	272,030,024
Congelamiento	-
Presupuesto Vigente Ajustado	272,030,024
Devengado II Trimestre -17	88,387,800
% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente Ajustado)	32%
Devengado Anual	91,577,273
% Ejecución (Devengado Anual / Vigente Ajustado)	34%
Comprometido (Devengado + Compromiso)	91,577,273
% Ejecución Comprometido (Comprometido / Vigente Ajustado)	34%

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Dicho presupuesto es financiado de la siguiente forma: COREA 88%, Donaciones 4% y Fondos Nacionales 8% lo que representa un gran total de vigente ajustado L.272,030,024 tal y como se muestra en el gráfico.

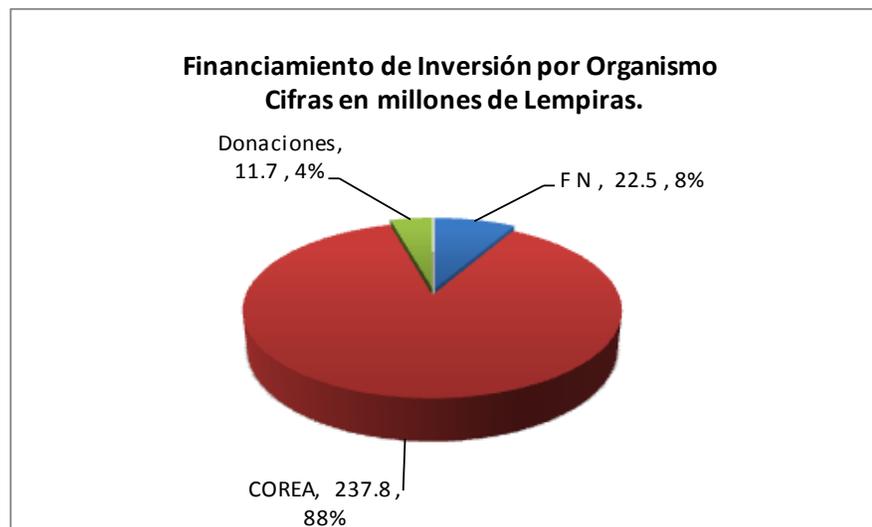

3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PROENERGIA-RURAL EDCF No. HND-5)

Sistemas fotovoltaicos aislados: Ingeniería, adquisición e instalación de micro sistemas fotovoltaicos aislados, y suministro de repuestos y herramientas para la operación y mantenimiento sostenible.

Estatus: a la espera del primer embarque de 25 furgones que se tiene programado efectuar las primeras instalaciones en septiembre del presente año. La Paz, Santa Bárbara y Ocotepeque. Se reprogramó la Instalación de sistemas fotovoltaicos ya que previo a iniciar con la instalación de sistemas la Unidad Ejecutora con Otras Instituciones involucradas realizaron una revisión de control de calidad, la cual se llevó a cabo en las instalaciones de la empresa en Corea.

Según SIAFI: Se programó 113 juntas de Energía y se crearon 91; se programó instalar 1515 sistemas fotovoltaicos.

Proyecto	Convenio	Costo Estimado Total	Inicio-Fin	
PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGIA RURAL	EDCF No. HND-5	1,160,770,355.00	2015-2018	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2017	259,195,264	259,195,264	86,455,271	33%
Acumulado 2017	259,195,264	259,195,264	88,485,271	34%
Acumulado Vida del P	1,160,770,355	1,160,770,355	336,450,104	29%
Observaciones: Instalación de 21, 036 paneles solares; se tiene programado iniciar la construcción en septiembre del presente año.				

*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto
 Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Anexo No.4 y 5

3.3 GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

- ✓ En gestión incorporación presupuestaria mediante Nota Técnica de L. 282.3 Millones para realizar pagos a las Empresas Coreanas: Constructora Joint Venture of Top and Joeun and KORBI y Consultora y Supervisora DOHWA.

Conclusiones

- ✓ PRONADERS presenta una ejecución a nivel institucional de 32% con la ejecución de dos proyectos
- ✓ El proyecto PROCATFES manifiesta apatía con la ejecución del mismo, lo justifican de que no tienen fondos nacionales para cubrir costos operativos, además tienen pendiente regularización de fondos del presente año y de años anteriores.
- ✓ A la espera del primer embargo.

Recomendaciones

- ✓ Agilizar los procesos de embarque para el logro de instalaciones de los primeros paneles solares.
- ✓ El proyecto PROCATFES cierra en el año 2018, deberá regularizar su presupuesto asignado en el presente ejercicio fiscal.

POR FAVOR
COMPLETE Y REENVIÉ SU PARTE
PARA CONSOLIDAR EL ANEXO DEL
PIP

Dirección General de Inversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEJO No. 4

Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2017

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Aprobado			Vigente			Congelamiento	Vigente Ajustado			Devengado II Trimestre				Devengado Anual				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total		Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución/ Vigente Ajustado	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total
2	0144 - Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible			22,595,502	249,434,522	272,030,024	22,595,502	249,434,522	272,030,024	-	22,595,502	249,434,522	272,030,024	2,599,772	85,788,028	88,387,800	32	5,789,244	85,788,028	91,577,273	34	5,789,244	85,788,028	91,577,273	34
1	PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	EDCF No. HND-5	2015-2018	21,428,502	237,766,762	259,195,264	21,428,502	237,766,762	259,195,264	-	21,428,502	237,766,762	259,195,264	2,599,772	83,855,499	86,455,271	33	4,629,694	83,855,499	88,485,194	34	4,629,694	83,855,499	88,485,194	34
2	PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	FN-0000046-09	2009-2018	1,167,000	11,667,760	12,834,760	1,167,000	11,667,760	12,834,760	-	1,167,000	11,667,760	12,834,760	-	1,932,529	1,932,529	15	1,159,550	1,932,529	3,092,079	24	1,159,550	1,932,529	3,092,079	24

Fuente: SIAFI, 30/06/2017

Dirección General de Ineversiones Públicas - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 5

Programa de Inversión Pública, Ejecución Física al II Trimestre, 2017

Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	ANUAL			II Trimestre		
			Programación	Ejecución	% Ejecución	Programación	Ejecución	% Ejecución
Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible								
005 - PROGRAMA TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES)	05 - Capacitaciones Ambientales para la sostenibilidad en los cultivos del café	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	200	0	0%	50	0	0%
	06 - Asistencia Técnica en mejores practicas de cultivos café	992 - ASISTENCIA TÉCNICA	1,835	0	0%	458	0	0%
010 - PROYECTO DE ENERGÍA RENOVABLE PARA EL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PRO-ENERGÍA RURAL	03 - Capacitaciones a Juntas de Energia	1039 - TALLERE DE CAPACITACION	351	139	40%	113	91	81%
	04 - Instalación de sistemas fotovoltaicos	82 - SISTEMA	7,422	0	0%	1,515	0	0%

Fuente: SIAFI
