



Secretaría de Finanzas  
Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Gabinete de la Prevención*

Al Cuarto Trimestre 2018

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Enero, 2019

## I. GABINETE SECTORIAL DE LA PREVENCIÓN

Este Gabinete tiene entre sus objetivos contribuir a generar las condiciones para la gestión eficiente y eficaz del riesgo de desastres naturales, implementar estrategias que favorezcan el uso apropiado de las capacidades productivas agropecuarias, comerciales (agro negocios) para elevar los niveles de ingreso y mejorar la calidad de la estadística básica requerida por el país para facilitar la toma de decisiones públicas mejor informadas.

El Programa de Inversión Pública del Gabinete de la Prevención para el año 2018 estuvo integrado por el Comité Permanente de Contingencias (COPECO) y el Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (IHCIETI), con un presupuesto vigente de L94,143,672, cantidad que representa el 0.68% del total del Programa de Inversión Pública vigente (L13,884,226,128), la ejecución financiera de Gabinete al Cuarto Trimestre es de L68,429,709, equivalente al 73% del presupuesto vigente.

Los recursos asignados están destinados a la ejecución de tres (3) proyectos:

1. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD).
2. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR).
3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.

Gabinete de Prevención - Ejecución Financiera al IV Trimestre de 2018

Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto  | Convenio        | Fecha de Inicio - Fin    | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente | Ejecutado IV Trimestre-18 (Devengado) | Ejecutado Anual (Devengado) |                 |            |  |
|-----------|--|-----------------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|------------|--|
|           |  |                 |                          |                      |                     |                                       | Fondos Nacionales           | Fondos Externos | Total      | % Ejecución (Ejecutado/Vigente Ajustado) |
| 3         | Gabinete de la Prevención  |                 |                          | 81,509,917           | 94,143,672          | 25,184,532                            | -                           | 68,429,709      | 68,429,709 | 73                                       |
| 2         | 0041 - Comisión Permanente de Contingencias  |                 |                          | 81,509,917           | 90,689,917          | 24,045,899                            | -                           | 67,291,076      | 67,291,076 | 74                                       |
| 1         | PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES   | IDA 5190-HN     | 18/12/2012<br>30/04/2019 | 74,475,363           | 71,206,738          | 24,045,899                            | -                           | 48,529,927      | 48,529,927 | 68                                       |
| 2         | PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NATURALES (2152/BL-HO)                | 2152/BL-HO      | 16/07/2010<br>31/07/2018 | 7,034,554            | 19,483,179          |                                       | -                           | 18,761,149      | 18,761,149 | 96                                       |
| 1         | 0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación                                 |                 |                          | -                    | 3,453,755           | 1,138,633                             | -                           | 1,138,633       | 1,138,633  | 33                                       |
| 1         | Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras. | ATN/OC-16177-HO | 08/12/17<br>31/12/19     | -                    | 3,453,755           | 1,138,633                             | -                           | 1,138,633       | 1,138,633  | 33                                       |

Fuente: SIAFI, 31/12/2018

## II. PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL IV TRIMESTRE 2018

### A. COMITÉ PERMANENTE DE CONTINGENCIAS (COPECO)

#### 1. Proyecto Prevención y Mitigación del Riesgo de Desastres Naturales (MITIGAR) (2152/BLHO), avances del trimestre:

Dicho proyecto tiene como objetivo la reducción de pérdidas de desastres naturales a través de inversiones de prevención y mitigación, así como el fortalecimiento de instituciones y capacidades para la gestión del riesgo de desastre naturales.

El Proyecto ha finalizado su cierre financiero y administrativo en el mes de agosto de 2018, realizando los últimos pagos de la construcción del puente sobre el río blanco en San Luis, Santa Bárbara y pago de la auditoría financiera.

## 2. Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):

El avance físico obtenido al cuarto trimestre del 2018 ha sido muy importante, lográndose comprometer muchas de las actividades reflejadas en el POA del proyecto, al cuarto trimestre ha realizado las siguientes acciones:

- a) **Obras:** Se finalizaron 5 obras de 6 programadas, la restante será finalizada en febrero 2019.

Las medidas estructurales son:

- Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Helado y Puente Colgante para Reducir el Riesgo en la Aldea Buenos Aires - La Jutosa en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, Cortés.
- Canalización de aguas pluviales provenientes del Cerro Callejas en el barrio San Pablo y construcción de alcantarilla tipo caja en los barrios Reparto Pedregal, Poder Ciudadano 1, y Callejas Maradiaga, para Reducción del Riesgo en el municipio de Potrerillos, Cortés.
- Construcción de Caja Puente sobre río Naco para Reducción del Riesgo en el municipio de Quimistán, Santa Bárbara.
- Construcción de Bordo de Protección sobre la margen izquierda del Río Chiquito y Canalización de Aguas Pluviales en Colonia La Paz en el municipio de San Francisco de Yojoa, Cortés.
- Construcción de caja puente triple sobre la quebrada Chasnigua en sector El Sauce para Reducción del Riesgo en el municipio de Villanueva, Cortés.

El Proyecto tiene pendiente de pago L.12.2 millones que corresponden a estimaciones de cierre, devolución de retenciones y supervisión de las medidas de reducción de la vulnerabilidad construidas en 6 diferentes municipios, aunque 5 de estas quedaron ejecutadas físicamente al 100% su ejecución financiera quedó retrasada. Estos pagos pasaran para la gestión 2019. Dado a las últimas instrucciones de cierre emitidas por la Secretaría de Finanzas.

- b) **Bienes:** entregado el Equipo de cómputo para la UCP, Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT), entregadas 3 estaciones meteorológicas, Repuestos para radar banda X, tarjetas para radar banda S, se adjudicaron la compra 3 drones con cámara HD serán entregados en el 2019 Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (CENAOS) de COPECO. entregadas a la Dirección Nacional de Recursos Hídricos (Miambiente), 6 fluviógrafos y heliógrafos equipo especial para la recolección de datos de precipitación por hora y recolección de datos de sol por hora.

- c) **Consultorías:** 19 Planes de adecuación, 20 Auditorías Sociales y 1 Auditoría externa en un 100%; 2 planes de intervención con población autóctona con avance en un 30%.

- d) **Servicios de No Consultoría:** Sitio Web creación y mantenimiento y testimonios de satisfacción de obras en un 100%; y

- e) **Capacitaciones:** Taller de Reasentamiento, Taller de Manual del Constructor, Taller Regional de Alcaldes, Taller SIG en un 100% y Talleres de sistematización en un 80%.


### 3. Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras (ATN/OC-16177-HO)

Durante el segundo trimestre se hicieron las gestiones necesarias para la incorporación de espacio fiscal de fondos de la Donación ATN/OC-116177-HO, por un monto de L3,453,755.00 proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el primer desembolso se realizó el tercer trimestre por valor de US\$80,020; y durante el Cuarto Trimestre se elaboraron 2 informes de análisis de las actuales capacidades institucionales del IHCIETI y de su interrelación con los principales actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI).

### III. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos del presupuesto vigente del Gabinete de la Prevención están constituidos en un 96% (L90,689,917) por fondos externos de préstamo, de los cuales L71,206,738 provienen del Banco Mundial y L19,483,179 del BID; la diferencia de 4% (L3,453,755) son fondos de donación del BID, ver el siguiente gráfico:

Financiamiento de la Inversión por Fuente de Financiamiento  
Cifras en Lempiras

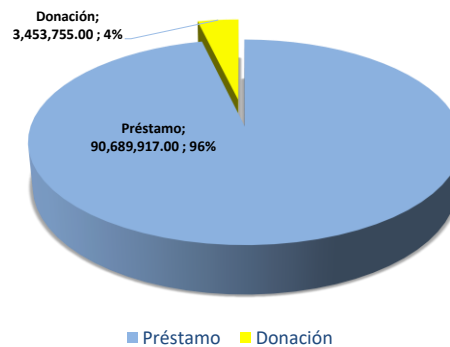

### IV. PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

| Área       | Problemas   | Acciones  |
|------------|---|---|
| Financiero | Desfases en el cierre financiero de los proyectos.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hacer el monitoreo adecuado por parte de la Unidad Ejecutora previendo hacer el cierre en el tiempo estipulado.</li> <li>Reprogramación de actividades de cierre.</li> </ul> |
| Técnico    | Falta de experiencia en la preparación de bases de licitación en procesos de infraestructura. | Posibles alianzas con otras instituciones del Estado que tienen mayor experiencia en la preparación de documentos de licitación.  |
