



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARÍA DE FINANZAS

Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

Informe de Avance Físico y Financiero

Gabinete Económico

Al Primer Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Abril, 2019


PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Económico, está orientado al logro de un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante la promoción de inversiones, competitividad, dinamización del comercio exterior y el apoyo al desarrollo empresarial de las pequeñas empresas a nivel urbano y rural.

Este Gabinete lo conforman veintinueve (29) instituciones: Secretaría de Finanzas (SEFIN) Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF), Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICETI), Instituto Hondureño de Geología y Minas, (INGEOMIN) Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria, (DICTA), Secretaría de Recursos Naturales (SERNA), Secretaría de Desarrollo Económico, el propio Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, Instituto Hondureño de Turismo (IHT), Instituto Nacional de Formación Profesional, (INFOP), Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), Universidad de Ciencias Forestales, Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y la Suplidora Nacional de Productos Básicos, (BANASUPRO) entre otras.

De las cuales cinco (5) Instituciones que conforman este gabinete están ejecutando proyectos de Inversión Pública de acuerdo al siguiente porcentaje de participación, en primer lugar tenemos a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) con **68%** de participación, Secretaría de Finanzas (SEFIN) **16%**, Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF) con **11%** y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) con **5%** y Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICETI), con un **0%**; con relación al presupuesto vigente.

Al Primer Trimestre 2019 el Gabinete de Económico cuenta con un presupuesto Vigente de **L.1,184,000.00** y un presupuesto devengado que asciende a **L.147,595,711.00 (12%)**. A nivel Institucional la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) con **24%**, es la institución que presenta mayor ejecución a la fecha, seguido por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) con **19%** y en último lugar Secretaría de Finanzas con **1%** de ejecución.

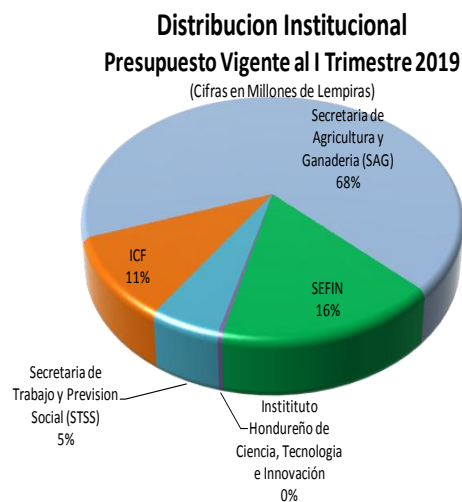

SECRETARÍA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy	Gabinete / Institución	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre-19			% Ejecución (Dev./)
		Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	
14	Gabinete Económico	29,934,503	1,194,065,678	1,224,000,181	29,934,503	1,154,065,678	1,184,000,181	3,137,109	144,458,602	147,595,711	12
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal	9,485,136	153,559,730	163,044,866	9,485,136	113,559,730	123,044,866	2,235,594	21,207,937	23,443,531	19
5	0100 - Secretaría de Finanzas		187,564,596	187,564,596		187,564,596	187,564,596		2,139,321	2,139,321	1
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social	5,449,367	54,493,667	59,943,034	5,449,367	54,493,667	59,943,034	682,140	13,569,866	14,252,007	24
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería	15,000,000	794,754,740	809,754,740	15,000,000	794,754,740	809,754,740	219,375	107,042,240	107,261,615	13
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación		3,692,945	3,692,945		3,692,945	3,692,945		499,238	499,238	14

Fuente: SIAFI, 31/03/2019

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas y culturales.

Las instituciones que conforman el Gabinete de Desarrollo Económico y sus proyectos de Inversión Pública están alineadas con el Plan Estratégico de Gobierno 2014-2018 “El plan de todos para una Vida Mejor”, teniendo por objetivo lograr un crecimiento económico acelerado, incluyente y sostenible, para incrementar el empleo y reducir la pobreza, mediante el apoyo a sectores económicos claves que respondan a la promoción de inversiones y el mejoramiento de las condiciones de competitividad.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA:

El presupuesto vigente del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico L.1,184,000.00 y un presupuesto devengado que asciende a L.147,595,711.00 (12%) orientados a la ejecución de 14 proyectos, mismos que son financiados con Fondos Externos por un monto de L.1,154,065,678 **(97%)** y Fondos Nacionales que ascienden a L.29,934,503 **(3%)**.

El financiamiento externo proviene de los siguientes organismos: Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Unión Europea, Export Import Bank – India, Kredital Fur Wiederaufbau (Gobierno Alemán), International Fund For Agricultural Development (FIDA), Export Import Bank-India y Fund for International Development **(OPEC)**. Los fondos presupuestarios de los proyectos de este Gabinete Sectorial, en su mayoría son recursos destinados a la Inversión Real o infraestructura.

PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE 2019:

Al Primer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

El Proyecto CLIFOR: Dentro de las actividades principales realizadas durante el primer trimestre se encuentran las siguientes:

- Se elaboró con propuesta para reforma de Marco Legal del Sistema Social Forestal, la cual será analizada con todos los coordinadores regionales del Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario (DFC), además de actores claves como la mesa de desarrollo forestal de COCONAFOR.
- Avances en el establecimiento de mesas agroclimáticas, resultado de la implementación del Sistema Participativo de Alerta Agroclimática Temprana, en las Regiones Forestales de El Paraíso y Olancho, siendo ECOSAGA quienes lideran el proceso por medio de una consultoría.
- Intercambio de Experiencias en Colombia, relacionado con temática de Negocios Verdes Comunitario, el cual es uno de los pilares donde se basa el Plan Estratégico del Sistema Social Forestal;
- Seguimiento a las parcelas establecidas bajo Sistemas Agroforestales y Silvopastoriles en las 6 regiones de intervención del proyecto.
- Se realizaron actividades de protección y control de incendios vinculados a la implementación de planes de acción en cuencas de las 6 regiones de intervención del proyecto.

Al Primer Trimestre ha ejecutado financieramente L.19,101,261 con respecto a su presupuesto vigente de L.99,276,511 equivalente a un **(19%)**.

El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego en los Departamentos de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto

El Proyecto de Construcción de Sistemas de Riego de San Sebastián (Comayagua): contrato de obras firmado, presenta baja ejecución debido a inconvenientes presentados en el paso de servidumbre, las líneas de conducción de las tuberías no beneficia la localidad por lo que los habitantes no permiten el paso de las mismas. Actualmente ya se firmó convenio para derecho de servidumbre.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Sulaco (Yoro): contrato firmado este incluye diseño y construcción de obras, obras en ejecución de instalación de líneas de tubería Instaladas (Conducción, Distribución y Terciarias).

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Oloman (Yoro): contrato firmado incluye diseño y construcción de obras, dado que no reunía las especificaciones técnicas se acordó con la empresa contratada que se rediseñará nuevamente.

El Proyecto de Construcción Sistema de Riego de Selguapa (Comayagua), el contrato está pendiente de firma, se encuentran en revisión por parte del Organismo Financiador,

actualmente se está realizando en el área de influencia la certificación de los respectivos convenios de servidumbre para que no hayan atrasos al momento de iniciar la ejecución.

Construcción de sistemas de pequeño riego, en evaluación y precalificación de la oferta técnica, la supervisión pendiente de notificar la adjudicación.

El Proyecto presenta al I trimestre una ejecución financiera del L.66,437,868 que representa el 15% del presupuesto asignado de L. 448,679,873.00.

Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR)

El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el año 2019 tiene el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, año clave debido a su finalización 2019, lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente.

Entre las actividades físicas ejecutadas del Proyecto tenemos:

- 13 Km de Caminos rurales terciarios rehabilitados
- 22 hectáreas Incorporación de hectáreas agrícolas al riego.
- 20 asistencia técnica brindada a grupos organizados con planes de inversión y financieros, Planes de Negocios y de Desarrollo Organizacional.
- Rehabilitación de camino rural terciario en Guajiquiro cuya longitud total es de 32 km. 3- Culminada la construcción de tres las Lagunas que estarán beneficiando a la Organización ESPROTAP que se dedican al cultivo de la OKRA una hortaliza de alto valor que se exporta al mercado de Estados Unidos. El costo de la construcción incluyendo las geomembranas, tres pozos y es de L.3,602,371, para una capacidad de 28000 m3 de agua. Ver foto en anexo IV.
- Se logró adquirir el equipamiento de la empresa Familias Unidas para clasificación de semillas certificadas, por un valor de L.230,000.00 municipio de San Isidro, departamento de Choluteca.
- Los Amigos Productores y Productoras de Alubaren (ESMAPAL) culminaron la construcción de centro de acopio de granos básicos, para una inversión total de L. 380,000.00 de un tamaño de 100 m2.
- Se culminó el Centro de Acopio Curaren de 150 m2 por un valor de L. 520,000.00.
- La Cooperativa de Producción Agropecuaria Milpa Grande culminó la instalación de tres macro túneles para la siembra de hortalizas. Cada macro túnel tiene una extensión de 180 m2 y la inversión total por estos fue de L. 426,000.00.
- La CRAC Unidos para Crecer del Ocotal, Francisco Morazán; adquirió nueve mega-túnel (18 m X 100 M= con un área de 1800 m2 cada uno) por un costo total de L.868,586.00. Con esta mejora la CRAC está comercializando hortalizas con Wal-Mart.
- Se ha dado asistencia Técnica a 1600 productores de micro riegos Choluteca, El Paraíso, La Paz. Los mismos recibieron micro riegos desglosados de la siguiente manera: 1300 beneficiarios de sistemas de 100 m2, 200 beneficiarios de 200 m2, 100 beneficiarios de 500 m2.

- Promoviendo el Desarrollo Social (PRODESOL) lograron adquirir un sistema de riego para 12 manzanas por un valor L.464,327.46, con este sistema la organización está en proceso de siembra de granos básicos.
- Ampliación del taller de carpintería de la Cooperativa Mixta de Apicultores de Choluteca (COAPICH) con un área total de construcción de 78 m², además de una bodega de 84 m². Con una inversión total L.746,714.72. Con esto la cooperativa amplía su área de elaboración de materiales y equipo apícolas. Esta organización está ubicada en el municipio de Choluteca, departamento de Choluteca.
- La organización Asociación de Productores de Café de Guajiquiro, La Paz (APRECAFE) lograron una capitalización por un valor L. 918,246.54, las compras corresponden por un maquina despulpadora con motor estacionario Lps 128,052.00, además de insumos como fertilizantes por el resto del monto.
- La organización CRAC de Segundo grado Unidos para el Desarrollo se fortaleció con la compra de Lps 822,148.00 en insumos agrícolas, lo cual se ha brindado a los productores como crédito y serán pagados al finalizar el periodo de cosecha.
- La organización CRAC El Eben-ezer adquirió insumos por un valor de L.661,791 para fortalecer la tienda de insumos en la comunidad de Oropolí, El Paraíso.
- La Asociación de Productores de Sal de Honduras (ASOPROSAL), en San Lorenzo Valle adquirieron una malla NYLON negro especial para secar la Sal por un valor de L.1,508,000.00. Esta adquisición ayuda a mejorar la calidad de sal al momento del secado.
- A la fecha de marzo del 2019 EmrendeSur cuenta con 120 organizaciones con Planes de Desarrollo Organizacional (PDO) y Plan de Negocio Sostenible.

Durante el trimestre de enero a marzo se generaron 1978 auto empleos-temporales-permanentes.

El Proyecto presenta al I trimestre una ejecución financiera del 30%.

El Proyecto EUROLABOR: Este Programa al primer Trimestre ha apoyado el proceso de instalación de la Mesa Sectorial de Empleo Decente (MSED), como parte de la estructura institucional para el Fortalecimiento del Consejo Económico (CES). La Mesa ha sido un hito importante en el fortalecimiento de esta instancia tripartita, por ser el espacio técnico de referencia donde se formuló la Planificación Nacional del Empleo en Honduras ((PNEH) y el Marco de Acción Conjunta (MAC).

Elaboración y validación de Propuesta técnica para la modernización de la estructura organizativa y funcional de la STSS, especialmente de la DGE (Dirección General de Empleo) y del SENAHEH (Servicio Nacional de Empleos de Honduras) y su vinculación con otras instancias del estado. Ejecución de programa específico de capacitación enfocado en la mejora de las competencias técnicas y de gestión por resultados de un

estimado de 550 miembros de los equipos técnicos de las instancias del Estado especialmente la STSS y de la DGE, el SENAEH, municipalidades, cámaras de comercio y otras entidades que asumen responsabilidades en la promoción del empleo decente.

Asesoría a la STSS para la reforma curricular del INFOP en los sectores priorizados por el Estado y la Empresa Privada y su estrategia de implementación relacionada con la promoción del trabajo decente: turismo, textiles, manufactura intermedia, servicios de apoyo a negocios, agroindustria y vivienda social, entre otros.

Implementación de plan de sensibilización dirigido a un estimado de 2.000 autoridades y funcionarios municipales de la AMHON, Cámaras Empresariales y de Consejos de Desarrollo Regional. Ejecución de Plan de capacitación con una participación estimada de 600 funcionarios de los Consejos Regionales de Desarrollo, las Cámaras Empresariales, los Municipios entre otros para que mejoren sus competencias para la puesta en marcha de programas de apoyo al desarrollo productivo territorial y de promoción de empleo decente a nivel local. Apertura, equipamiento, capacitación y asistencia técnica a las Unidades de Promoción de Empleo de la STSS, en el marco del SENAEH.

Fortalecimiento de capacidades empresariales y competitivas de Mipymes con acompañamiento del SENAEH, para la promoción del empleo decente y productivo y de acuerdo a las necesidades y características específicas de cada territorio que permitan promover la inversión local, el desarrollo de mercados, asociación de unidades e iniciativas productivas, el desarrollo empresarial y la mejora de la competitividad. Fortalecimiento de las instituciones locales para la promoción de empleo decente y productivo en concordancia con el marco de acción conjunta. Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de las Unidades de Promoción de Empleo ya existentes.

Los Contratos de Subvenciones comenzaron su ejecución desde el 1 de agosto del año 2018, con la finalidad de adaptar la estrategia de promoción de empleo e ingresos. En total son 8 contratos de aproximadamente € 400,000 cada uno. Los 8 municipios priorizados son Catacamas, Juticalpa, San Lorenzo, Roatán, Choloma, San Rosa de Copán, La Esperanza y Gracias. En este I Trimestre se ejecutaron contratos de subvenciones por un monto de **3,148,161 Euros**.

El Proyecto presenta al I trimestre una ejecución financiera del L.14,252,007 que representa el 24% del presupuesto asignado de L.59,943,034.00.

PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR:
Problemas que afectan la Ejecución de los Proyectos Primer Trimestre 2019

Área	Problemas	Acciones
Técnica - Administrativa	<p>Problemas técnicos en construcción y diseños en ciertos proyectos de riego (PDBR), así como ciertos atrasos en los procesos que atrasan la ejecución normal.</p> <p>Ciertos proyectos como El Valle de Jamastran no cuenta con una Unidad Ejecutora o personal técnico especializado en el área de riego, que permita supervisar la ejecución del Proyecto en el área de influencia, asimismo, la repetición de ciertos procesos de revisión de información-documentación de este Proyecto ha causado una Auditoría por parte del TSC.</p> <p>Con respecto al proyecto de Euro+Labor existe lentitud en la aprobación de los procesos de exoneraciones de las ordenes de compra.</p> <p>Algunas dificultades en algunos proyectos para gestionar la agilización en desembarques de los equipos de riego, cotizaciones, créditos y/o documentación de respaldo para efectuar los pagos (constancia-solvencia fiscal, pagos a cuenta).</p> <p>Lentitud en las Unidades Ejecutoras para el proceso de modificaciones en el sistema para gestión de cuotas, y pagos presupuestarios, así como para alcanzar las metas planificadas.</p> <p>Falta de agilidad en la ejecución física y financiera de los proyectos por parte de algunos Proyectos (, para cumplir así con la programación establecida, a través de pronta respuesta a aprobación de procesos toma de decisiones</p>	<p>Las Unidades Ejecutoras de Proyectos deben de actuar con más eficiencia y eficacia de los recursos asignados a la institución, al igual para la ejecución de sus metas y actividades planificadas y así evitar retrasos en la ejecución.</p> <p>Agilizar la ejecución física y financiera de los proyectos, para cumplir con la programación establecida, a través de pronta respuesta en la aprobación de procesos por parte de los organismos financiadores, pronta toma de decisiones a todo nivel para dar solución a problemas.</p>

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE 2019
 Cifras en Lempiras

No. Proy	Gabinete / Institución / Proyecto	Convenio	Aprobado			Vigente			Devengado I Trimestre-19			
			Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución
14	Gabinete Económico		29,934,503	1,194,065,678	1,224,000,181	29,934,503	1,154,065,678	1,184,000,181	3,137,109	144,458,602	147,595,711	12
2	0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal		9,485,136	153,559,730	163,044,866	9,485,136	113,559,730	123,044,866	2,235,594	21,207,937	23,443,531	19
1	001 - MEDIDA COMPLEMENTARIA AL PROYECTO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL COMUNAL Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN RÍO PLÁTANO (MC-PROTEP)	PN 2016 70 124	2,713,069	31,055,286	33,768,355	2,713,069	21,055,286	23,768,355	97,075	4,245,195	4,342,270	18
2	006 - ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR FORESTAL (CLIFOR)	DCI-AL-4/2012/023-510	6,772,067	122,504,444	129,276,511	6,772,067	92,504,444	99,276,511	2,138,519	16,962,742	19,101,261	19
5	0100 - Secretaría de Finanzas			187,564,596	187,564,596		187,564,596	187,564,596		2,139,321	2,139,321	1
1	027 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD RURAL EN HONDURAS, (COMRURAL)	BM-4465		720,000	720,000		720,000	720,000		-	-	-
2	051 - PROYECTO MEJORA DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS	ATN/OC-15875-HO		3,589,600	3,589,600		3,589,600	3,589,600		142,357	142,357	4
3	052 - MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	BID3878/BL-HO		173,678,573	173,678,573		173,678,573	173,678,573		1,996,964	1,996,964	1
4	053 - APOYO A LA ESTRATEGIA DE INVERSION PUBLICA DE MEDIANO PLAZO	BID ATN/OC-15878-HO		1,232,000	1,232,000		1,232,000	1,232,000		-	-	-
5	054 - APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE LA ALIANZA PARA LA PROSPERIDAD DEL TRIÁNGULO NORTE (PAPTN)	ATN/OC-15961-HO		8,344,423	8,344,423		8,344,423	8,344,423		-	-	-
1	0130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social		5,449,367	54,493,667	59,943,034	5,449,367	54,493,667	59,943,034	682,140	13,569,866	14,252,007	24
1	001 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO-LABOR)	DCI-ALA/2014/026-851	5,449,367	54,493,667	59,943,034	5,449,367	54,493,667	59,943,034	682,140	13,569,866	14,252,007	24
5	0140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería		15,000,000	794,754,740	809,754,740	15,000,000	794,754,740	809,754,740	219,375	107,042,240	107,261,615	13
1	003 - PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA LA REGION SUR (EMPREDESUR)	FIDA 816-HN		111,588,401	111,588,401		115,788,401	115,788,401		35,274,390	35,274,390	30
2	005 - PROYECTO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CORREDOR FRONTERIZO SUR OCCIDENTAL PRO-LENCA	FIDA-I-899-HN FIDA-II-200000125200 GEF-FSS-05-HN		85,000,000 33,000,000 35,097,000	85,000,000 33,000,000 35,097,000		80,800,000 33,000,000 35,097,000	80,800,000 33,000,000 35,097,000		4,795,100 -	4,795,100 -	6 -
3	007 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA BAJO RIEGO (PDABR)	BCIE-2101	15,000,000	433,679,873	448,679,873	15,000,000	433,679,873	448,679,873	219,375	66,437,868	66,657,242	15
4	010 - PROYECTO DE DESARROLLO AGRÍCOLA BAJO RIEGO DEL VALLE DE JAMAISTRAN FASE 1	IN-DL98134500295569L		93,337,527	93,337,527		93,337,527	93,337,527		-	-	-
5	011 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS (UAP), DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y GANADERIA (SAG) EN HONDURAS.	DN-No.2000001838-FIDA-SAG		3,051,939	3,051,939		3,051,939	3,051,939		-	-	-
1	0515 - Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología e Innovación			3,692,945	3,692,945		3,692,945	3,692,945		499,238	499,238	14
1	001 - Apoyo al Fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Honduras.	ATN/OC-16177-HO		3,692,945	3,692,945		3,692,945	3,692,945		499,238	499,238	14

Fuente: SIAFI, 31/03/2019
