



Secretaría de Finanzas

Dirección General de Inversiones Públicas

# Informe de Avance Físico y Financiero

## *Gabinete Social*

Al Segundo Trimestre, 2019

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A

Julio, 2019

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL:

El objetivo estratégico del Gabinete Social, es fungir como la entidad del Poder Ejecutivo con facultades en materia social y reducción de la pobreza, como formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia social y reducción de la pobreza y planificación, administración y ejecución de los planes, programas, proyectos y estrategias en materia social, orientadas a la reducción de la pobreza y pobreza extrema; incluyendo programas de los subsectores de educación, vivienda, agua y saneamiento.

Este Gabinete lo conforman ocho (8) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Nacional de Agricultura (UNA), Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET), Dirección Nacional de Ciudad Mujer (DNCM) y el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), las cuales ejecutan 18 programas y proyectos de inversión pública.


El Gabinete Sectorial Social tiene un presupuesto vigente asignado de L1,356,730,729, en el segundo trimestre logró una ejecución de L277,273,283 equivalente el 20% respecto al presupuesto vigente, y una ejecución acumulada de L394,384,094 equivalente al 20% respecto al presupuesto vigente, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Secretaría de Finanzas  
Sub Secretaría de Crédito e Inversión Pública-Dirección General de Inversiones Públicas  
**Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al II Trimestre, 2019**  
Cifras en Lempiras

| No. Proy. | Gabinete / Institución                                   | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente  | Devengado II Trimestre | Devengado Anual    | % Ejecución (Dev./ Vig.) |
|-----------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 3         | 0050 - Secretaría de Educación                           | 274,647,572          | 206,647,357          | 34,333,173             | 38,267,936         | 18.52                    |
| 1         | 0051 - Centro Nacional de Educación para el Trabajo      | -                    | 5,390,904            | -                      | -                  | -                        |
| 4         | 0060 - Secretaría de Salud                               | 430,032,377          | 452,715,666          | 55,651,275             | 85,445,237         | 18.87                    |
| 7         | 0240 - Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social       | 631,411,812          | 631,411,812          | 174,004,173            | 249,765,257        | 39.56                    |
| 1         | 0244 - Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer      | 19,249,634           | 19,249,634           | 2,579,479              | 4,441,983          | 23.08                    |
| 1         | 0702 - Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán | 12,045,398           | 12,045,398           | -                      | -                  | -                        |
| 1         | 0703 - Universidad Nacional de Agricultura               | 29,269,958           | 29,269,958           | 10,705,184             | 16,463,681         | 56.25                    |
| 18        | <b>Total</b>   | <b>1,396,656,751</b> | <b>1,356,730,729</b> | <b>277,273,283</b>     | <b>394,384,094</b> | <b>29.07</b>             |

Fuente: SIAFI

La Distribución de la Inversión del Gabinete, está concentrada mayormente en la Secretaría de Desarrollo e Inversión Social (SEDIS) con un 46.5% seguida de la Secretaría de Salud (33.4), Secretaría de Educación (15.2%), Universidad Nacional de Agricultura (2%), Dirección Nacional de Ciudad Mujer (1.4%) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (1%), tal como se muestra en el siguiente gráfico.

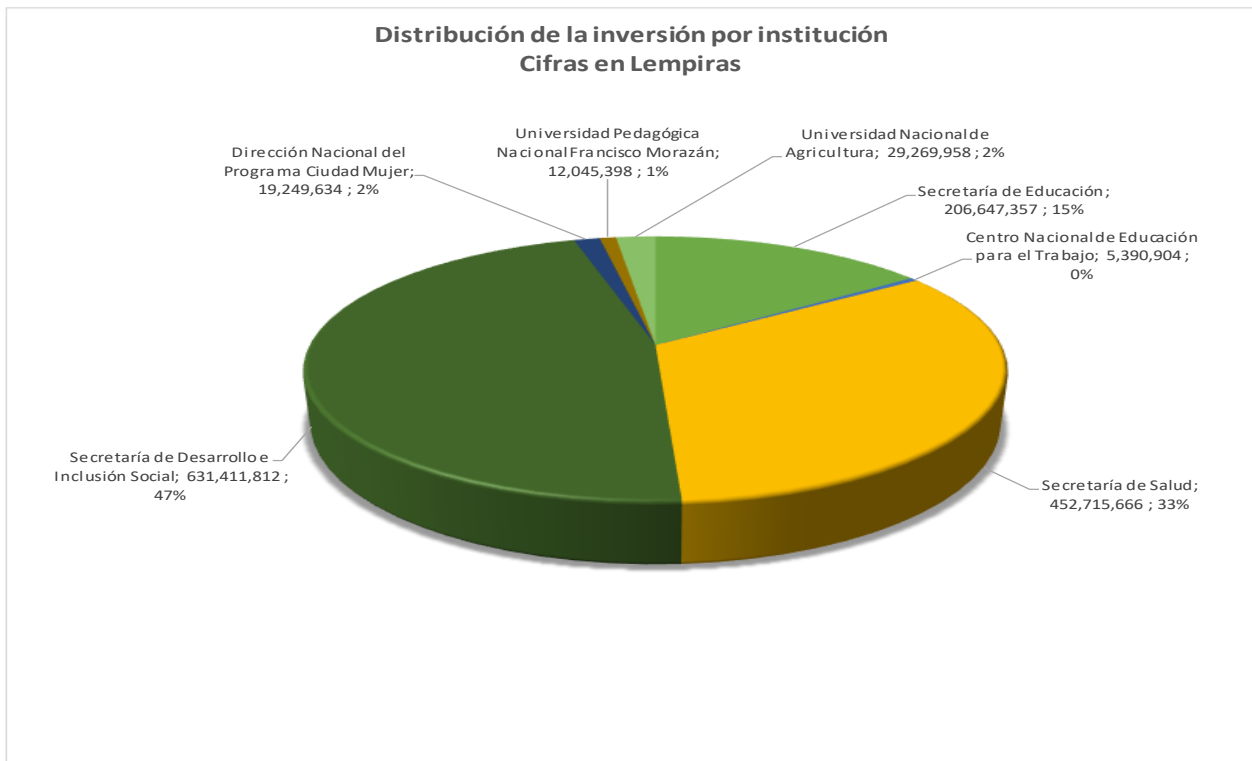

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación, salud.

Los proyectos que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, incorporando las familias en condiciones de extrema pobreza al programa plataforma de vida mejor, que incluye transferencias monetarias condicionadas y el mejoramiento de condiciones básicas de las viviendas y ampliar con visión progresiva de universalidad, la cobertura y la calidad de los servicios de educación y salud a fin de potenciar las capacidades para la superación gradual y progresiva de la pobreza.

### FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Los recursos presupuestados en el Gabinete Social están orientados a la ejecución de 18 proyectos, los cuales son financiados con Fondos Externos (préstamos y donaciones) en un 88% (L1,198,205,487) y en un 12% por Fondos Nacionales (L158,525,242).

## SECRETARÍA DE FINANZAS

### Gabinete Social, Programa de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento II Trimestre 2019

Cifras en Lempiras

| Fuente de Financiamiento | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Vigente  | % de Inversión por Fuente de Financiamiento |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Fondos Nacionales        | 158,525,242          | 158,525,242          | 12  |
| Fondos Externos          | 1,238,131,509        | 1,198,205,487        | 88  |
| <b>Total</b>             | <b>1,396,656,751</b> | <b>1,356,730,729</b> | <b>100</b>                                  |

Fuente: SIAFI

### PRINCIPALES METAS EJECUTADAS AL II TRIMESTRE, 2019

Al segundo trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos según la Unidad Ejecutora:

#### ➤ Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (3371/BL-HO)

Durante el segundo trimestre en el **Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas**, se efectuó el pago correspondiente al complemento a la comisión bancaria de la segunda entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) del año 2018 por un monto de L.1,703,854.36, en el **Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica**, con énfasis en zonas rurales focalizadas se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del **Componente V**, en este período se concluyó con el proceso de evaluación de la Licitación Pública Nacional: LPN 001 SSIS SE BID 3371 2019 obras de ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3) distribuidos en 16 Lotes. Remitiendo el informe a solicitud de No Objeción del BID, el cual se está en espera de respuesta por parte del ente financiero.

- Como parte del seguimiento y la supervisión de las obras se realizó el pago del primer y segundo entregable de la firma Supervisora de los proyectos de infraestructura en 19 CEB LPN 004-SSIS-SE-BID-3371-2018.

- Se realizó la evaluación de la expresión de interés de la SP No. EI-001-SSIS-SBCC-BID-3371-2019/ SEPA: PASAPS-536-SBCC-CF-2.2.2.3 selección de consultores para la Supervisión de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 34 Centros de Educación Básica (CEB) de los 6 Departamentos donde tiene influencia el Programa distribuidos en dieciséis (16) lotes, la cual se encuentra en la etapa de evaluación del informe No. 2: evaluación de propuesta económica.

- Se cuenta con la No objeción del BID la lista corta de las Firma supervisora para la contratación de la EI-002-SSIS-SBCC-BID-3371-2019 contratación de firma a cargo de la supervisión de las obras de ampliación para el tercer Ciclo en 32 centros de educación básica (CEB) distribuidos en 14 lotes en los 6 departamentos donde se ejecuta el Programa.

Ejecución al II Trimestre 2019, Gabinete Social

- Por otra parte, se continuó con el avance de la ejecución de la construcción de los módulos en 19 CEB, los cuales se concentran en los municipios de los departamentos de Copán (2 CEBs), La Paz (6 CEBs), Lempira (3 CEB), Ocotepeque (2 CEBs) y Santa Bárbara (6 CEBs), efectuándose el pago en concepto de estimación No. 1 de los contratos No.570 OB SSIS BID 3371 2018, 572 OB SSIS BID 3371 2018, 575 OB SSIS BID 3371 2018 y 576 OB SSIS BID 3371 2018.

- Además, se efectuó el pago de la última estimación del contrato 326/OB/SSIS/BID/3371/2017, concluyendo así el cierre administrativo del contrato.

➤ **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO)**

En el segundo trimestre en el Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas se realizó el traslado de fondos a BANADESA para el pago de Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC), correspondiente a tres meses en el primer ejercicio de entregas del año 2019 para beneficiar a 43,831 hogares participantes del Programa, por un monto de L. 61,547,671.48, en los Departamentos: Choluteca (1,991 hogares), Copán (6,726 hogares), El Paraíso (11,391 hogares), Intibucá (10,545 hogares), La Paz (1,893 hogares), Lempira (9,859 hogares), Ocotepeque (876 hogares), Olancho (650 hogares).

Se realizó el traslado de fondos a BANADESA en concepto de pago de la comisión bancaria correspondiente a la entrega de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a los participantes del PBVM, de acuerdo a liquidación de fecha 11 de marzo del 2019, por un monto de L2,440,449.48.

Bajo el componente Piloto de Superación de Pobreza para el año 2019 se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos (as) saldrán del PBVM, es por ello que se realizaron las visitas a los hogares participantes para realizar los talleres grupales para la formulación de perfiles de negocios.

Asimismo, se efectuó el pago que corresponde al capital semilla más comisión bancaria a 795 hogares de los 840 establecidos como meta y que han presentado el perfil de negocio aprobado, lo que viabilizó la transferencia de capital semilla No Reembolsable, distribuidos en los Departamentos de: Copán (133 hogares), El Paraíso (398 hogares) y Lempira (264 hogares).

A la fecha se ha realizado el levantamiento de 691,128 Fichas Socioeconómicas Únicas distribuidos en los Departamentos: Atlántida (33,730), Choluteca (51,778), Colón (33,056), Comayagua (41,931), Copán,(39,206), Cortés (62,404), El Paraíso (61,800), Francisco Morazán (106,971), Intibucá (31,377), La Paz(33,130), Lempira(37,327), Ocotepeque (15,677), Olancho (43,693), Santa Bárbara (29,668), Valle (17,762) y Yoro (51,618).

➤ **Proyecto “Centros de Atención Integral para mejorar las Condiciones de Vida de las Mujeres Hondureñas (Ciudad Mujer)”**

Orientado a mejorar las condiciones de vida de las mujeres de 15 años o más de edad en términos de su participación laboral, salud sexual y reproductiva, prevención y atención a la violencia contra las mujeres y prevención del embarazo en adolescentes.

❖ **Centro Ciudad Mujer Kennedy**

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 133,642 mujeres, de las cuales 36,017 fueron nuevos ingresos (27%) del total y 97,625 (73%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 308 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 259,232 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 17,944 mujeres de las cuales 2,635 fueron nuevos ingresos (15.0%) del total y 15,309 (85%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 29,022.

❖ **Centro Ciudad Mujer Choloma**

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año, se han atendido 54,809 mujeres, de las cuales 17,484 fueron nuevos ingresos (32%) del total y 37,325 (68%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 137 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 142,277, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 7,927 mujeres de las cuales 1,666 fueron nuevos ingresos (21%) del total y 6,261 (79%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 20,314.

❖ **Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula**

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de junio del presente año se han atendido 25,644 mujeres, de las cuales 8,437 fueron nuevos ingresos (33%) del total y 17,207 (67%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 246 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 62,952 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 14,175 mujeres de las cuales 3,994 fueron nuevos ingresos (28%) del total y 10,181 (72%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 32,418.

❖ **Ciudad Mujer Móvil**

Consiste en extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de junio del presente año se han atendido 5,490 mujeres, de las cuales 4,882 fueron nuevos ingresos (89%) del total y 608 (11%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios Ejecución al II Trimestre 2019, Gabinete Social

brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 10,503 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Actividades Realizadas:

- Se han realizado visitas a las comunidades más postergadas, como ser los campos bananeros de La Lima y El Progreso, Yoro ofreciendo solo los servicios completos de MSSR y MAI; el trabajo territorial siempre se sigue realizando en su totalidad, cabe mencionar que la asesora legal desde mediados del mes de abril está en calidad de préstamo tres días a la semana en Centro Ciudad Mujer, dejándonos corto con los servicios en dicha área, por otra parte, desde la última semana del mes de mayo, el INFOP proporcionó la funcionaria que cubriría el MAE, siendo la orientadora-vocacional que faltaba.
  - Las usuarias que recibieron los cursos impartidos se empoderaron de sus derechos, de la autonomía económica de sus hogares contribuyendo al desarrollo del hogar, su comunidad y del país.
  - En el mes de junio debido a la situación de manifestaciones y obstrucción de salidas de San Pedro Sula, no se pudo salir a campo. Por seguridad de camiones y resto de materiales que complementan a Ciudad Mujer Móvil, así como por protección de su personal.
- **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM.**

El costo total del proyecto es L56,984,848.48, su tiempo de finalización es el 31 de diciembre 2020.

La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha reiterado en que la UPNFM debe de acelerar los procesos de la LPN para cumplir así con el nuevo cronograma de tiempos.

Actualmente cuenta con un disponible 2019 de L12,045,398.

El día 28 de mayo se realizó la publicación de la Licitación Pública 001-2019 relativa al proyecto, la apertura de estas ofertas selladas por parte de las 9 empresas calificadas no se pudo realizar el 20 de Junio 2019 debido a la situación socio-política de país, trasladándose para el **19 de julio** nuevamente su apertura. La Licitación se efectuará de acuerdo a los procedimientos de la LPN establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento.

- **Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Jóven:**

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

Ejecución al II Trimestre 2019, Gabinete Social



El proyecto es financiado por el BID por un monto de \$ 60.0 millones, sin contraparte nacional y con una duración de 5 años. Este proyecto inició el 03 de Julio 2018 y finalizará el 03 de Julio 2023.

La Unidad Ejecutora del Proyecto Joven obtuvo por parte del Banco Interamericano de Desarrollo la Elegibilidad total del proyecto el día 04 de enero de 2019, lo cual, permite a la unidad Ejecutora continuar con la gestión del segundo desembolso y demás actividades del proyecto.

Durante el segundo semestre el Proyecto Joven gestionó ante el organismo financiero el segundo desembolso de recursos por un monto de USD \$ 3.7 millones, el cual tuvo gran impacto ya que se pudo iniciar la ejecución financiera del Convenio Interinstitucional entre la SEDUC y el IHER. En el mes de mayo se efectuó el primer desembolso del convenio por un monto de L. 18,202,960.81 y en el mes de junio se programó un segundo desembolso de L. 2,735,000.00.

Uno de los logros significativos del proyecto es la conformación de las mesas técnicas de trabajo que permitirán contar con un equipo de técnicos de la SEDUC y que logran una mejor planificación de las actividades que desarrollará el proyecto por medio de la identificación de las necesidades de fortalecimiento de la institución y de la Unidad Ejecutora del Proyecto, sin embargo presenta dificultades para llevar a cabo las siguientes actividades:

- La priorización de los 50 Centros Escolares para la construcción de los módulos del tercer ciclo por parte de SEDUC e IDECOAS.
- La definición de estrategia de ejecución del Componente 3 “Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC”
- Exoneración de impuestos (bloqueo RTN SEDUC) - Pendiente por parte de la SAR.

El avance financiero Del segundo trimestre de 2019 es de **18%** y un compromiso del **63%**.

### ➤ **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II)**

El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores.

Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es "Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una gerencia comunitaria. Para esto, los fondos son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Durante el segundo trimestre, el Proyecto PROMINE-SE realizó las siguientes actividades:



## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

- En el marco de actividades del proyecto PROMINE se realizó la Supervisión de Infraestructura y Seguridad Alimentaria.
- Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para evaluación de la situación Actual y la respectiva “pre-Alcances de Proyectos” Priorizados para Fase IV en los departamentos de Copan, Intibucá, Lempira, Choluteca y Ocotepeque.
- Proyectos en Formulación por los supervisores departamentales y la elaboración de Expediente que contiene los planos, presupuestos y especificaciones Técnicas para tres centros educativos en el departamento de Gracias a Dios.
- Adquisición y dotación de equipo informático (Impresoras) a seis Direcciones Municipales de Educación del departamento de Gracias a Dios, que incluyen los seis Municipios del departamento que serán intervenidos por el Programa PROMINE.
- Taller de capacitación sobre Gestión Integral Comunitaria, Conservación y Mantenimiento de los Centros Educativos en el Municipio de Gracias Departamento d Lempira.
- Taller de Capacitación interna para empleados de la Dirección General de Construcciones Escolares en el Marco del Programa PROMINE.
- Adquisición útiles y materiales eléctricos y se realizó instalación de conectividad de internet al equipo del personal técnico del Programa PROMINE.
- Adquisición y dotación de equipo informático de quince (15) computadoras de escritorio para personal del Programa PROMINE, oficina central en Tegucigalpa y para seis Direcciones Municipales del departamento de Gracias a Dios.
- Adquisición y dotación de equipo informático de cuatro (4) computadoras Laptop avanzada para personal que trabaja en el área de diseño de proyectos de infraestructura educativa.
- Proceso de contratación de un especialista para la actualización del sistema contable, con el propósito de brindar información al Organismo donante con informes contables confiales.
- Proceso de contratación de un técnico para la digitalización de información en el sistema contable de toda la vida del Programa (Fase I, II, III y IV).
- Proceso de pago a trece (13) consultores contratados bajo la estructura del Programa PROMINE, quienes realizan actividades de dueños, estudios de pre inversión, presupuestos, seguridad alimentaria, adquisición de bienes y servicios y área administrativa financiera.

Durante el segundo trimestre de 2019, el proyecto PROMINE tuvo una ejecución de 40% referente al presupuesto vigente.

➤ **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente**

El objetivo del Proyecto es apoyar al desarrollo de capital humano a través de una intervención integral de alivio a la pobreza y mejoramiento del acceso a servicios de salud, priorizando a los municipios más pobres del Occidente de Honduras. El programa ejecuta dos componentes Alivio a la Pobreza e Inversión en Capital Humano, ejecutado a través de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social y el componente Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud el cual se ejecuta mediante la Secretaría de Salud (SESAL).

Durante el segundo trimestre, presenta una ejecución de L55.3 millones, que representa el 32% con relación al presupuesto vigente de L172,839,848, dicha ejecución se debe en su mayoría a pagos efectuados a gestores descentralizados de primer y segundo nivel de atención en servicios de salud y pagos para consultorías.

Las transferencias del período para gestores de primer nivel fueron por un monto total de L31,937,464.00

Las transferencias del período para gestores de segundo nivel fueron por un monto de L10,281,315.00

➤ **Hospital María de Especialidades Pediátricas**

En el mes de mayo se realizó adjudicación provisional a la empresa TBS la cual, según la comisión de evaluación del proceso de LPI de los lotes 3 y 9, satisface todas las condiciones fijados en el documento base de condiciones

En el mismo mes se remitieron los documentos del proceso de LPI a Cancillería, posteriormente el 14 de junio dicho documentos fueron recibidos por la Embajada de Honduras en Italia y el 17 de mismo mes fueron recibidos por la AICS.

Por tanto se está a la espera de la No Objeción por parte de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) para proceder a la adjudicación definitiva y posterior firma del contrato.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al segundo trimestre 2019.

➤ **Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca:**

Se ha realizado reuniones con personal de Salud para ver la problemática del mismo y no hay acuerdos entre las autoridades de SALUD, sobre el alcance del proyecto, por lo tanto a la fecha no se cuenta con los diseños finales para la construcción del Hospital de Choluteca.

Cabe mencionar que se emitió dictamen Técnico de Ampliación de Plazo en cumplimiento al Decreto Legislativo No.162-2018 mediante el cual el Congreso Nacional instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 26 de enero del 2022.

El proyecto no presenta ejecución física y financiera al segundo trimestre 2019.

➤ **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)”**

Orientado a facilitar la inclusión social de sectores de la población menos favorecidos a la educación superior, para contribuir de manera directa y efectiva al desarrollo socioeconómico de las comunidades pobres de Honduras e impulsar la producción sustentable en la UNA.

Avances presentados:

- **Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:**

La planta está construida a un 100%, con garantía de calidad vigente hasta el 02 de agosto de 2019, construida por la Empresa IDECO

Los equipos de la planta fueron instalados al 100% por el Consorcio HONDUTEC (hondureña – Nuevos Recursos (Colombia), quedando pendiente hacer las pruebas del equipo y la realización de los servicios conexos.

Se solicitó una ampliación de plazo para la incorporación de los nuevos requerimientos de equipos aprobada mediante orden de cambio No.3 y para **equipamientos** siendo cotizados por el consorcio Nuevos Recursos/Hondutec contando con un Contrato firmado el 22 de mayo de 2018 por un valor de US\$443,206.66 a la fecha con una ejecución de US\$396,669.96 (90%) en avance financiero y 90% en avance físico.

- **Remodelación de la Planta Procesadora de Productos Cárnicos:** El proyecto de la Remodelación de la Planta de Cárnicos se culminó físicamente el 16 de enero de 2017, el cierre de la ejecución financiera se realizó en marzo de 2017.

El **equipamiento** de planta para procesamiento de carnes/Suministro, de instalación de equipo de climatización para planta de cárnicos, la empresa IDECO S. de R.L. firmo el contrato por un monto de US\$116,384.35, ejecutándose US\$79,911.30 (69% en avance financiero y un 90% en avance físico y para equipamiento de planta se firmó el contrato con la Empresa DISATYR para equipo de procesamiento de carnes por un monto de US\$194,538.70, ejecutándose US\$38,630.02 llevando un avance financiero de un 20% y 0% avance físico.

- **Remodelación de Planta de Maquilado y Procesamiento de Frutas y Vegetales:** El contrato de remodelación de obras de la planta de vegetales con la Empresa Lempira S de RL se ejecutó en un 100%.

Se solicitó una ampliación de plazo para la incorporación de los nuevos requerimientos de equipos, están siendo cotizados por el consorcio.

El consorcio Nuevos Recursos/Hondutec firmó un contrato por US\$331,255.50, ejecutándose US\$296,473.67 (90%) y un avance físico de un 85%.

- **Sistema de Riego:** Contratista “Ferretería San Francisco” con una ejecución financiera de un 100% y con acta de recepción final y adjudicada para el equipamiento a la empresa MEXICHEM HONDURAS firmando un contrato por US\$17,431.52, ejecutándose US\$17,431.52 (100%) y un avance físico de un 100%.

- **Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:** Empresa: INGECON. Firmo un contrato por un valor de US\$291,374.83 ejecutándose US\$106,295.81 (36%) en avance financiero y Las Ejecución al II Trimestre 2019, Gabinete Social

## SECRETARÍA DE FINANZAS

---

actividades físicas de esta obra tiene un avance de 29.89%, no ha habido avance en este trimestre debido a que aún no se ha aprobado los cambios, están en negociación.

### PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SECTOR

| Área           | Problema  | Acción/Tiempo   | Responsable         |
|----------------|---|---|---------------------|
| Administrativa | Tardanza en los tiempos de gestiones de documentos en el sector | Tomar las Acciones Necesarias para mejorar los Procesos de cada Unidad Involucrada                    | Unidades Ejecutoras |
| Técnica        | Comunicación entre los Involucrados de los Proyectos            | Realizar reuniones periódicas para encontrar soluciones a la problemática de cada proyecto del Sector | Unidades Ejecutoras |
