



**Secretaría de Finanzas**

**Dirección General de inversiones Públicas**

# Informe de Avance Físico y Financiero

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (SEDUC)**

**Al II Trimestre, 2019**

**Tegucigalpa M.D.C**

**Honduras C.A.**

**Julio, 2019**

### 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA

La Secretaría de Educación (**SEDUC**) encargada de la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, para el año 2019 ejecuta dos proyectos y cuenta con un 15% del presupuesto vigente del Gabinete Social. En el cuadro No. 1 se presenta el presupuesto de inversión y ejecución financiera de la Secretaria de Educación para el segundo trimestre.

El presupuesto de la Secretaria de Educación es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y KFW (Donación Alemana) para fondos de préstamo, donación y fondos nacionales como contra parte nacional para la ejecución de dos proyectos. Para el segundo Trimestre de 2019 la Secretaría de Educación cuenta con un presupuesto vigente de **L 206,647,357** y su ejecución para este segundo Trimestre representó el **17%** con un monto devengado de **L. 34,333,173**, acumulando una ejecución anual de **L. 38,267,936** representando el **19%** respecto al presupuesto vigente.

**Cuadro No. 1**  
**Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2019**


Cifras en Lempiras

Descripción	Monto
Presupuesto Aprobado	274,647,572
Presupuesto Vigente	206,647,357
Devengado II Trimestre 2019	34,333,173
<b>% Ejecución (Devengado II Trim. / Vigente)</b>	<b>17%</b>
Devengado Anual	38,267,936
<b>% Ejecución (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>19%</b>
Comprometido (Devengado + Compromiso)	129,127,058
<b>% Ejecución Comprometido (Devengado Anual / Vigente)</b>	<b>62%</b>

Fuente: SIAFI, 30/06/2019

El financiamiento de la inversión para la Secretaria de Educación se refleja en el gráfico No. 1

**Gráfico No. 1**

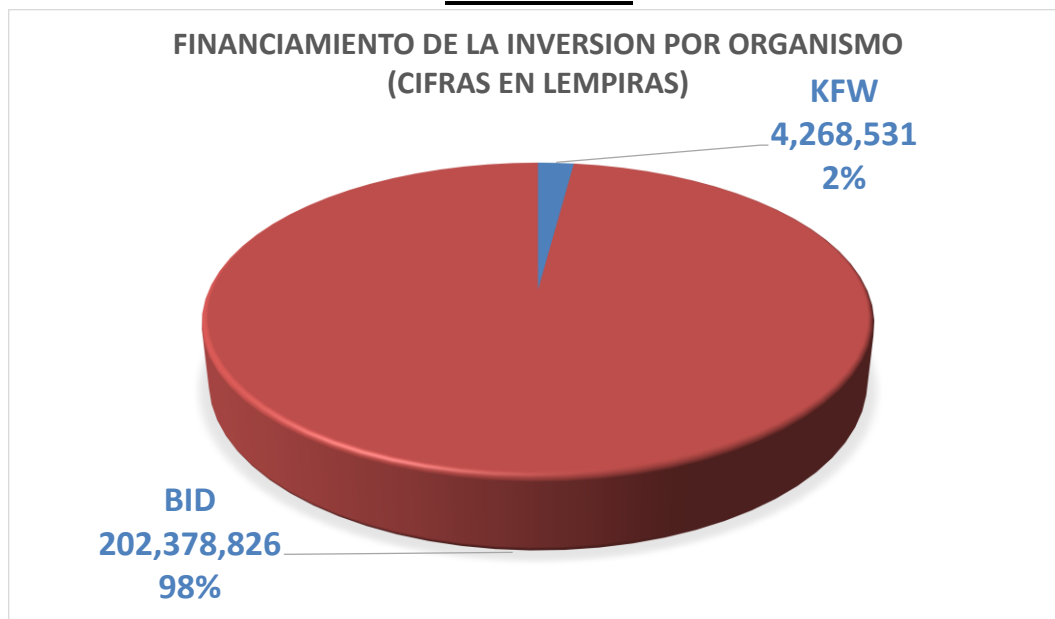

Ver Detalle de Proyectos, Ejecución Financiera en **Anexo No 4**  
Ejecución al II Trimestre 2019; Secretaría de Educación

### 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS

A continuación se detalla la ejecución financiera trimestral y acumulada de la vida de los proyectos adscritos a la Secretaría de Educación:

**Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven:**

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
"Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo", Proyecto Joven	BID-4449/BL-HO	1,491,558,000	2018-2023	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	202,378,826	202,378,826	33,167,813	16.4%
Acumulado 2019	202,378,826	202,378,826	36,542,458	18.1%
Acumulado vida del Proyecto */	1,414,560,000	1,414,560,000	39,446,827	2.8%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

El proyecto es financiado por el BID por un monto de \$ 60.0 millones y con una duración de 5 años. Este proyecto inició el 03 de Julio 2018 y finalizará el 03 de Julio 2023.

Durante el segundo semestre el Proyecto Joven gestiona ante el organismo financiero el segundo desembolso de recursos por un monto de USD \$ 3.7 millones, el cual tuvo gran impacto ya que se pudo iniciar la ejecución financiera del Convenio Interinstitucional entre la SEDUC y el IHER. En el mes de mayo se efectuó el primer desembolso del convenio por un monto de L. 18,202,960.81 y en el mes de junio se programó un segundo desembolso de L. 2,735,000.00.

Uno de los logros significativos del proyecto es la conformación de las mesas técnicas de trabajo que permitirán contar con un equipo de técnicos de la SEDUC y que logran una mejor planificación de las actividades que desarrollara el proyecto por medio de la identificación de las necesidades de fortalecimiento de la institución y de la Unidad Ejecutora del Proyecto, sin embargo presenta dificultades para llevar a cabo las siguientes actividades:

- La priorización de los 50 Centros Escolares para la construcción de los módulos del tercer ciclo por parte de SEDUC e IDECOAS.
- La definición de estrategia de ejecución del Componente 3 “Modernización de la gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC”
- Exoneración de impuestos (bloqueo RTN SEDUC) - Pendiente por parte de la SAR.

El avance financiero del segundo trimestre de 2019 es de **18%** y un compromiso del **63%**.

**Proyecto: "Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras"**

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
"Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras"	522-0501 y 522-0502	99,437,200	2018-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	68,000,215	-	-	0.0%
Acumulado 2019	68,000,215	-	-	0.0%
Acumulado vida del Proyecto */	99,437,200	99,437,200	188,256	0.2%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

Según notificación por parte de USAID del día 27 de marzo por medio de las Cartas de Ejecución No. 14 y No. 24 de los Convenios USAID No. 522-0501 y USAID No. 522-0502 se suspendieron los recursos por parte del Organismo Financiero para el Proyecto Fortalecimiento del Desarrollo Profesional Docente de Honduras, por lo que no continuó sus actividades ni contó con ejecución física ni financiera para el año 2019, mostrando únicamente un 0.2% de ejecución acumulada del año 2018.

**Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar" (PROMINE KFW Fase II)**

Montos en Lempiras

Proyecto	Convenio	Costo Total Proyecto */	Inicio - FIN	
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar" (PROMINE KFW Fase II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	79,015,679**	2018-2020	
	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado	% Ejec.
II Trimestre 2019	4,268,531	4,268,531	1,165,360	27.3%
Acumulado 2019	4,268,531	4,268,531	1,725,479	40.4%
Acumulado vida del Proyecto */	99,437,200	99,437,200	67,703,596	68.1%

\*/ Presupuesto Aprobado = Costo Inicial del Proyecto

Presupuesto Vigente = Costo Actual del Proyecto

\*\* Únicamente se presenta el Monto aprobado a ejecutar por SEDUC

El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores.

Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

La modalidad de ejecución de proyectos es "Proyectos Ejecutados por la Comunidad" (PEC), que se desarrolla en el marco de la descentralización y bajo una gerencia comunitaria. Para esto, los fondos

Ejecución al II Trimestre 2019; Secretaría de Educación

son transferidos a las municipalidades y de su parte a las comunidades, las cuales son debidamente organizadas, capacitadas y asesoradas, para que realicen las actividades administrativas, organizativas logísticas y técnicas, asumiendo la responsabilidad en la ejecución eficiente y transparente de los recursos financieros. En general la ejecución PEC genera el empoderamiento y apropiamiento de los proyectos y los actores comunitarios y municipales (padres, docentes, autoridades educativas y municipales) que son previamente capacitados para cumplir de forma adecuada su gestión.

Durante el segundo trimestre, el Proyecto PROMINE-SE realizó las siguientes actividades:

- En el maco de actividades del proyecto PROMINE se realizó la Supervisión de Infraestructura y Seguridad Alimentaria.
- Visitas realizadas por los Supervisores Departamentales para evaluación de la situación Actual y la respectiva “pre-Alcances de Proyectos” Priorizados para Fase IV en los departamentos de Copan, Intibucá, Lempira, Choluteca y Ocotepeque.
- Proyectos en Formulación por los supervisores departamentales y la elaboración de Expediente que contiene los planos, presupuestos y especificaciones Técnicas para tres centros educativos en el departamento de Gracias a Dios.
- Adquisición y dotación de equipo informático (Impresoras) a seis Direcciones Municipales de Educación del departamento de Gracias a Dios, que incluyen los seis Municipios del departamento que serán intervenidos por el Programa PROMINE.
- Taller de capacitación sobre Gestión Integral Comunitaria, Conservación y Mantenimiento de los Centros Educativos en el Municipio de Gracias Departamento d Lempira.
- Taller de Capacitación interna para empleados de la Dirección General de Construcciones Escolares en el Marco del Programa PROMINE.
- Adquisición útiles y materiales eléctricos y se realizó instalación de conectividad de internet al equipo del personal técnico del Programa PROMINE.
- Adquisición y dotación de equipo informático de quince (15) computadoras de escritorio para personal del Programa PROMINE, oficina central en Tegucigalpa y para seis Direcciones Municipales del departamento de Gracias a Dios.
- Adquisición y dotación de equipo informático de cuatro (4) computadoras Laptop avanzada para personal que trabaja en el área de diseño de proyectos de infraestructura educativa.
- Proceso de contratación de un especialista para la actualización del sistema contable, con el propósito de brindar información al Organismo donante con informes contables confiales.
- Proceso de contratación de un técnico para la digitalización de información en el sistema contable de toda la vida del Programa (Fase I, II, III y IV).
- Proceso de pago a trece (13) consultores contratados bajo la estructura del Programa PROMINE, quienes realizan actividades de dueños, estudios de pre inversión, presupuestos, seguridad alimentaria, adquisición de bienes y servicios y área administrativa financiera.

Durante el segundo trimestre de 2019, el proyecto PROMINE tuvo una ejecución de 40% referente al presupuesto vigente.

## GESTIÓN DE LA INVERSIÓN

Durante el segundo trimestre se realizaron las siguientes actividades y/o acciones en apoyo a los proyectos de inversión:

- Revisión y actualización de la Proyección Mensual de ejecución para el Año 2019
- Reuniones de seguimiento con la Unidad Ejecutora del Proyecto Joven, BID y OPSP.
- Reunión con equipo del Proyecto Joven para seguimiento y evaluación de la ejecución del proyecto.
- Elaboración del Proyecto de Inversión Pública 2020-2023, donde se sostuvo una reunión con el organismo financiero y la Unidad Ejecutora.

## Conclusiones

- Al II Trimestre la ejecución global de los proyectos ejecutados por la Secretaría de Educación alcanzó un **19%** correspondiente a **L 38,267,936** respecto al presupuesto vigente.
- El Proyecto: **“Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo” Proyecto Joven**”, deberá reprogramar las actividades planificadas que no lograron efectuarse y generaron una baja ejecución para el proyecto. Por lo que este se mantiene como un proyecto en alerta.

## Recomendaciones

- La Unidad Ejecutora del Proyecto Joven, deberá realizar ajustes a las fechas de inicio/fin de las actividades que no se efectuaron durante el primer y segundo trimestre de 2019. Por medio de esto, la unidad contará con un insumo real para poder realizar proyecciones de pago y requerimientos de recursos ante el organismo financiero.
- La Secretaría de Educación deberá tomar acciones de manera más diligente, a fin de ejecutar los proyectos conforme a la programación de los organismos y convenios firmados.
- Se recomienda agregar la programación y ejecución física en SIAFI.

# SECRETARIA DE FINANZAS

Dirección General de Inversión Pública - Subsecretaría de Crédito e Inversión Pública

ANEXO No. 4

## PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJECUCIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE 2019

Cifras en Lempiras

No. Proy.	Gabinete Sectorial / Institución / Proyecto	Convenio	Fecha de Inicio - Fin	Presupuesto Aprobado			Presupuesto Vigente			Ejecutado al II Trimestre-19 (Devengado)				Comprometido (Devengado + Compromiso)			
				Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Dev./ Vig.)	Fondos Nacionales	Fondos Externos	Total	% Ejecución (Comp./ Vig.)
16	Gabinete Social			252,931	274,394,641	274,647,572	252,931	206,394,426	206,647,357	250	38,267,686	38,267,936	19%	250	129,126,808	129,127,058	62%
50	Secretaría de Educación			252,931	274,394,641	274,647,572	252,931	206,394,426	206,647,357	250	38,267,686	38,267,936	19%	250	129,126,808	129,127,058	62%
1	PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II)	SE/FHIS VIII No.2008-66-178	10/07/2012-30/11/2020	252,931	4,015,600	4,268,531	252,931	4,015,600	4,268,531	250	1,725,229	1,725,479	40%	250	1,917,929	1,918,179	45%
2	MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL EMPLEO. PROYECTO JOVEN	BID-4449/BL-HO	03/07/2018-03/10/2023	-	202,378,826	202,378,826	-	202,378,826	202,378,826	-	36,542,458	36,542,458	18%	-	127,208,879	127,208,879	63%
3	FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE HONDURAS	DONACION USAID CARTA EJECUCION 7-10	01/02/2018 31/05/2020	-	68,000,215	68,000,215	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%

Fuente: SIAFI, 30/06/2019
