

Informe General de la Inversión Pública

III Trimestre

Tegucigalpa M.D.C

Honduras C.A.

Octubre, 2019

INVERSIÓN PÚBLICA AL TERCER TRIMESTRE DEL 2019

PRESENTACION

El presente apartado, muestra el análisis del comportamiento de la ejecución física y financiera la de Inversión Pública correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2019. Este documento es elaborado por la Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en el marco de sus competencias como ente técnico coordinador del Programa de Inversión Pública (PIP).

El monto aprobado por el Congreso Nacional del Programa de Inversión Pública (PIP) para el ejercicio fiscal 2019 asciende a **L.12,011,045,094**, en adición se incluye la inversión bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), por un monto de **L.6,509,000,000**, Programa de Infraestructura Vial **L.2,000,000,000**, así como el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza (Vida Mejor) que asciende a **L.4,500,000,000**; totalizando la Inversión Pública por un monto inicial para el año 2019 de **L.25,020,045,094**.

Al Tercer Trimestre la Inversión Pública cuenta con un presupuesto vigente de **L.21,647,210,470**, para la ejecución de 106 proyectos, el presupuesto vigente refleja una disminución de **L3,372,834,622** respecto al presupuesto aprobado. En relación al PIP, muestra un presupuesto vigente que asciende a **L.12,021,310,472**, lo que representa un aumento presupuestal de **L10, 265,378** respecto al aprobado, el cual se debe a incrementos y disminuciones que ha sufrido el programa de inversión pública, dicho incremento no afecta el presupuesto General aprobado por el Congreso Nacional.

Asimismo, muestra una ejecución financiera por la cantidad de **L.11,276,287,708. (52%)** a nivel de devengado, incluye APP, Fondo Social Reducción de la pobreza (vida mejor) y Fondo Vial, a nivel de PIP el porcentaje de ejecución asciende a **44%**.

I. ANALISIS GLOBAL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA AL III TRIMESTRE 2019

1.1 Inversión Pública Global 2019

El presupuesto global de la Inversión Pública al Tercer Trimestre del 2019 registra un vigente de **L. 21,647,210,472** que representa el **3.5% del PIB** proyectado para el 2019, el cual muestra una disminución de **L3,372,834,622** respecto al presupuesto aprobado por el Congreso Nacional.

Referente a los programas y proyectos del PIP aprobado **L12,011,045,094** tiene un aumento presupuestal de **L10,265,378 viéndose** reflejado en fondos nacionales para incorporación de fondos de contraparte para proyectos de inversión ejecutados por el Fondo Hondureño de Inversión Social FHIS, así como fondos nacionales para proyectos ejecutados por la Secretaría de Servicios Públicos INSEP e INVESTH totalizando un monto total de L 310,648,085. Asimismo, se ha disminuido en fondos externos la cantidad de L300, 382,707, de estos L244,507,273.00 corresponden a donaciones externas fuente 22 para incorporación de programas de apoyo presupuestario que no forman parte del PIP. A su

vez, existen L.72,288,262.00 de crédito externo que se encuentran en el presupuesto de la SEFIN, dado que solo se incorporó un monto de L59,830,127 como transferencia para la Alcaldía Municipal del Distrito Central.

Asimismo, se ha incrementado los fondos de donación de la Cuenta del Milenio para INVESTH por la cantidad de L16,412,828.00. Por otra parte, dentro del presupuesto global se observa una disminución por la cantidad de L3,383,100,000 para los Proyectos de Asociaciones Públicas Privadas. Sumando un presupuesto vigente total **L.21,647,210,470**

Cabe mencionar que el aumento de L10,265,378 es producto de los movimientos de incrementos y disminuciones en el programa de inversión pública, sin afectar el monto del presupuesto General de la República aprobado por el Congreso Nacional.

Cuadro N° 1
Inversión Pública: Clasificación Sector Público al 30 de Septiembre de 2019
Cifras en Lempiras


No.	SECTOR PÚBLICO	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Presupuesto (Devengado)	% Ejec./ (Ejecutado/ Vigente)
		Total	Total	Total	
87	Administración Central	11,852,684,862	11,756,963,240	5,306,616,740	45
6	Resto del Sector Público	158,360,232	264,347,232	8,014,986	3
93	Total PIP	12,011,045,094	12,021,310,472	5,314,631,726	44
	Fondo Social Reducción de la Pobreza				
1	(Vida Mejor)	4,500,000,000	4,500,000,000	3,058,200,000	68
11	Proyectos APP's	6,509,000,000	3,125,900,000	2,365,955,982	76
1	Programa Vial	2,000,000,000	2,000,000,000	537,500,000	27
13	Sub-Total	13,009,000,000	9,625,900,000	5,961,655,982	62
106	Total General	25,020,045,094	21,647,210,472	11,276,287,708	52%

PIP: Fuente SIAFI

APP: Dirección de Política Macrofiscal, Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privado (SAPP)

Al término del tercer trimestre, se registra una ejecución financiera de **L11,276,287,708. (52%)**, a nivel de devengado (incluye APP, Fondo Social Reducción de la pobreza (vida mejor) y Fondo Vial, a nivel de **PIP** el porcentaje de ejecución asciende a **44%** para la ejecución de 106 proyectos detallados así: 87 para la Administración Central, 6 para el Resto del Sector Público, 11 de Asociaciones Público Privadas, 1 para el Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida mejor y 1 del Fondo Vial, y el mayor porcentaje se concentra en los proyectos ejecutados por la Administración Central en los Gabinetes: Económico con **(49%)**, Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas, **(45%)**; el Social con **(41%)** y en menor proporción el resto de los Gabinetes.

En el transcurso del tercer trimestre se han incorporado 13 proyectos en el PIP para las instituciones de INSEP diez (10) proyectos con fondos nacionales y en INVESTH tres (3) proyectos de crédito externo.

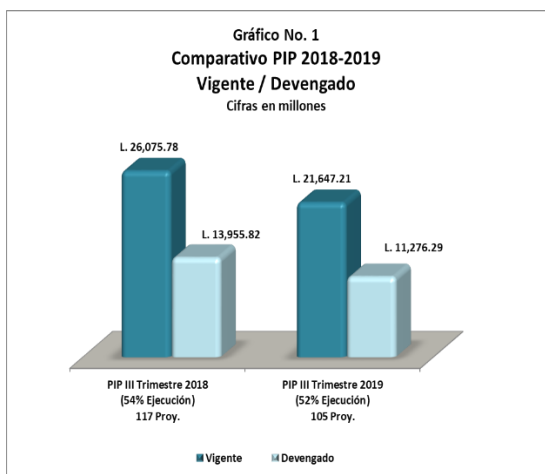

Cabe resaltar que en el PIP se ejecutan programas y proyectos que contribuyen al incremento de los activos no financieros de las entidades que integran el Sector Público y los bienes y servicios de dominio público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o reconstruir la capacidad productiva de bienes y la prestación de servicios nacionales.


El desempeño de la ejecución de la Inversión Pública al tercer trimestre del 2019 a nivel de devengado (52%), (incluye APP Fondo Social para la Reducción de la Pobreza Vida mejor y Fondo Vial; muestra una disminución de 2 puntos porcentuales al compararlo con el año

2018 (54%), la ejecución reportada en el tercer trimestre se encuentra dentro de lo habitual en el Programa de Inversión Pública debido a que los programas y Proyectos dinamizan su ejecución en los dos últimos meses de cada año.

Con el propósito de mantener la estabilidad en el control del gasto y déficit fiscal y en seguimiento al Decreto Ejecutivo No.PCM-036-2019, publicado en la Gaceta en fecha 11 de julio de 2019 la Secretaría de Finanzas ha llevado a cabo la reserva de **US\$119.0 millones (L 2,975.0 millones)** del Programa de Inversión Pública en el tercer trimestre, asimismo se han efectuado traslados de estructuras presupuestarias a fin de compensar espacio presupuestario para la incorporación de los recursos de crédito externo, con esto se pretende lograr que la ejecución del PIP 2019 sea ejecutado conforme a la disponibilidad presupuestaria.

1.2 Programas y Proyectos de Inversión Pública a Nivel de Sector Público 2019

El monto Total de la Inversión Pública a nivel de Vigente asciende a **L.21, 647,210, 472** y se concentra en su mayor parte en los proyectos de las instituciones de la Administración Central, con **99%** específicamente en los proyectos ejecutados por INVESTH, INSEP, ENEE, SAG y SEDIS, proyectos APP, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), Programa Vial y El resto del Sector Público alcanza apenas el **1%** de la Inversión.

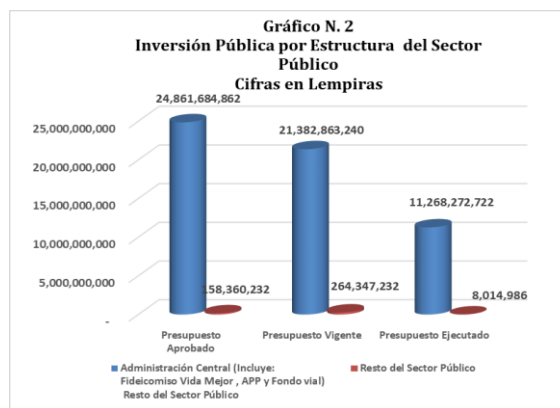

La distribución de la Inversión Pública de acuerdo a la Clasificación del Sector Público se aprecia en el Gráfico No.2. Asimismo, refleja una ejecución de **L.11,276,287,708** representando un **52%** respecto al presupuesto vigente global.


En términos monetarios del Programa de Inversión Pública, se registran mayores niveles de ejecución en INVESTH L2,443,296,893, La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), L 1,095,174,714, La Secretaria de Agricultura y Ganadería SAG

L569,300,411, La Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social L334,624,522, y La Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, L189,505,669 quienes en su conjunto suman L.4,442,396,540; es decir que concentran el **83.6%** del total del presupuesto ejecutado correspondiente al PIP, (L 5,314,631,726); por otra parte, los proyectos APP, el Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor), y el Programa Vial suman L5,961,655,982 representando el **76%**, el **68%** y el **27%** respectivamente, en relación al monto global que conforman la inversión pública (L11,276,287,798.00).

Para el ejercicio fiscal 2019 en las normas de ejecución presupuestarias, se incluyó lineamientos específicos orientados a ordenar y agilizar la ejecución de proyectos, acorde a las restricciones fiscales, así como en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión y la Ley de Responsabilidad Fiscal.


1.3 La Inversión Pública Ejecutada a Nivel de Sector

En cuanto a la ejecución a nivel sectorial, el Sector de Protección Social cuenta con el mayor porcentaje de ejecución **L3,474,680,284, (31%)**; es el que abarca el mayor monto de ejecución presupuestaria; seguido el Sector Carretero por el orden de **L3,383,162,758, (30%)**; de participación en relación al total del presupuesto ejecutado; incluye APP (Construcción del Corredor Logístico; seguido el Sector de Transporte y Obras Publicas L **2,384,938,499, (21%)**; incluye también proyectos APP como ser la Construcción del Aeropuerto Palmerola, Centro Cívico, la Lima, Terminal de Contenedores entre otros, con un monto ejecutado de **L.779,599,317, (25%)**; finalmente el sector Productivo con un **(8%) L 874,449,507**; y en menor proporción el resto de los sectores como ser: Energía y Riego, con un **2%**; respectivamente; y Salud, Educación, Modernización del Estado, Seguridad y Defensa , recursos forestales y Ambiente, con apenas **1%** de ejecución en cada uno de estos sectores. Ver gráfico No.3.

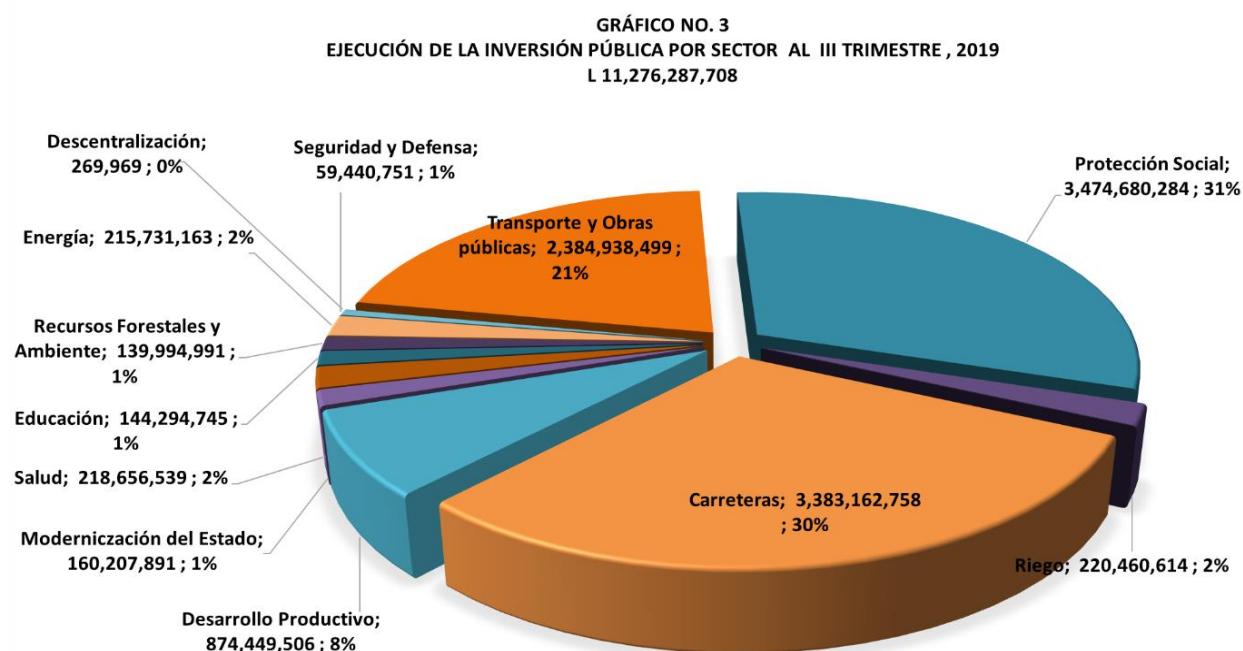

1.4 La Inversión Pública a Nivel de Gabinete Sectorial

En el marco de la reforma a la Ley General de la Administración Pública, Según Decreto Ejecutivo número PCM-009-2018 se conformaron Gabinetes Sectoriales que agrupan las instituciones de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones. En el grafico No.4 se muestra la Inversión Pública distribuida en diferentes Gabinetes, a nivel de presupuesto vigente el Gabinete de Infraestructura, Servicios y Empresas Públicas cuenta con el mayor porcentaje de participación **63%**, el Gabinete Social con el **27%** de participación, seguido el Gabinete Económico con un **7%** y en menor porcentaje el resto de los gabinetes. Ver gráfico No 4.

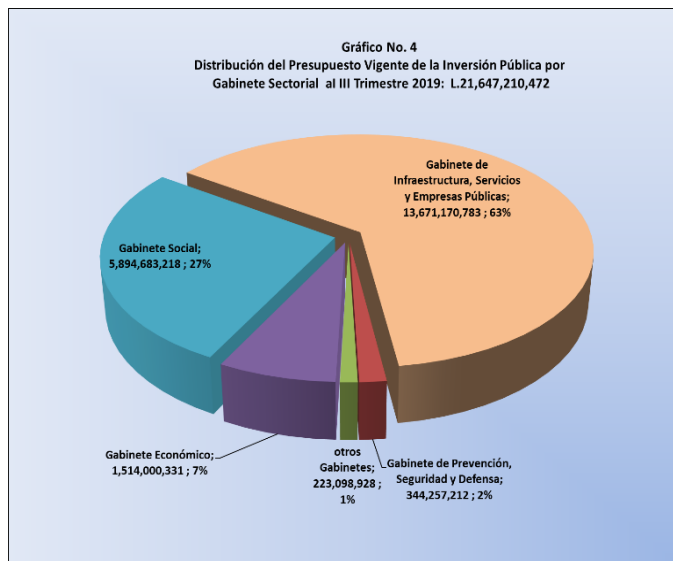

Los avances de la ejecución física respecto al PIP y a Nivel de Gabinete se muestran a continuación.

❖ GABINETE DE INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS

El Gabinete Sectorial Infraestructura Servicios y Empresas Públicas está conformado por 6 Instituciones Públicas y son: Fondo Hondureño de Inversión Social (**FHIS**), Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras(**MCA-INVEST**), Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (**INSEP**), Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (**PRONADERS**), Empresa Nacional de Energía Eléctrica (**ENEE**) y La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (**HONDUTEL**). Al Tercer Trimestre el Gabinete de Infraestructura Servicios y Empresas Públicas cuenta con un presupuesto vigente de **L 8,545,270,783**, su ejecución presupuestaria en este trimestre asciende a **L 3,879,619,182.17 (45%)** según SIAFI.

Al Tercer Trimestre las distintas Instituciones del Sector registraron diferentes avances de ejecución de sus proyectos entre los cuales están:

Proyectos ejecutados por La Cuenta del Desafío del Milenio-Honduras INVESTH:

- **Corredor Pacífico-Programa de Integración Vial Regional (BID_2470/BL-HO-1 y BID_2470BL-HO-2):**

Se avanza en la construcción del tramo 3 Choluteca – Guasaule (41.7 km). El avance físico al 30 de septiembre para cada Lote del tramo 3 es el siguiente: El 31 de julio finalizó el Lote A: Choluteca – Desvío de San Bernardo, el Lote B alcanzó el 95.69%, el cual se tiene previsto finalizar durante el cuarto trimestre 2019.

Durante la implementación del proyecto se identificó la necesidad de reparar un puente y de construir tres puentes que se encontraban en mal estado a lo largo del tramo. Esta situación

provocó la firma en el mes de febrero de la modificación No. 2 a los contratos de obra, ampliando dichos contratos en alcance, monto y tiempo, desfasando la finalización de las obras del lote A para el mes de julio y el lote B para el cuarto trimestre.

Durante el tercer trimestre de 2019, 13 Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) dieron mantenimiento en una longitud de 180 km en los caminos alimentadores del Corredor Pacífico en los departamentos de Valle y Choluteca.

- **Programa de Integración Vial Regional II, (BID-3815/BL-HO):**

El avance físico al 30 de septiembre es el siguiente: Lote A: La Barca – Potrerillos 76.42%, Lote B: Potrerillos – Pimienta 76.04%.

- **Construcción del Corredor Logístico Villa de San Antonio-Goascorán Sección II y III, (BCIE 2116 y BCIE-2205):**

La obra física del tramo El Quebrachal – Goascorán fue finalizada durante el trimestre, misma que consistió en la ampliación de 2 a 4 carriles y pavimentación con carpeta asfáltica de 46.18 Km. Durante los meses de agosto y septiembre el contratista realizó las subsanaciones a las observaciones de la supervisión y de la firma verificadora y el 27 de septiembre la obra fue recepcionada.

- **Construcción, Rehabilitación y Ampliación Carretera CA-5 Sur: Tega - Júcaro Galán, (BCIE-2162):**

Durante el primer semestre se realizaron los pagos finales para las firmas supervisoras de los Tramos “Júcaro Galán-La Venta del Sur” y “La Venta del Sur-Cerro de Hula”; así como el pago final para la firma constructora del Tramo “La Venta del Sur-Cerro de Hula”, correspondiente a la estimación de cierre.

Asimismo, al tercer trimestre se continua con el análisis del DAB (Dispute Adjudication Board) reclamos interpuestos por el contratista del tramo La Esperanza – Camasca, los que se irán resolviendo durante 2019; por lo anterior se incorporaron recursos al presupuesto para hacer frente a las obligaciones de pago que se deriven de las determinaciones del DAB y realizar el cierre financiero de ese tramo.

- **Alianza para el Corredor Seco (Carta de Ejecución No. 7 USAID y TF017904):**

En el tercer trimestre 2019 se realizaron 10,370 eventos de asistencia técnica y capacitación, en las siguientes áreas: producción, manejo de recursos naturales, postcosecha, información de mercados, habilidades de negocio, finanzas/créditos, procesamiento, entre otros. Adicionalmente, se continuó con la ejecución del contrato para Manejo Comunitario de Microcuencas, cuyo objetivo es el manejo y restauración del recurso hídrico en los departamentos de Intibucá, Lempira y La Paz, a través del fortalecimiento de las capacidades locales e inversiones en microcuencas priorizadas

Proyectos ejecutados por Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP):

- **Construcción y pavimentación con concreto hidráulico del tramo carretero valladolid-la virtud-mapulaca con una longitud aproximada de 30 km localizado en el departamento de Lempira, (FN-INSEP-23245):**

El proyecto se encuentra en ejecución con un avance físico del 37%, correspondiente a las actividades de terracería y pavimentación de 9 kilómetros. Actualmente se han incrementado los cortes en roca por lo que se realizará una orden de cambio para realizar los pagos incrementados de dicha actividad sin afectar el costo total del proyecto otorgado en la nota de prioridad.

- **Rehabilitación Vial del Corredor de Occidente: la Entrada - Copán Ruinas - el Florido y la Entrada - Santa Rosa de Copán, (BCIE-2156, BEI-FI No.84859, DCI-ALA/2015/369-566, TA2015034 HN LIF).**

El proyecto se encuentra en ejecución en sus tres lotes Lote No. 1 y No. 2 con un avance físico del 100% Lote No. 3 con un avance físico del 98%. En cuanto el lote 1 y 2 se encuentran realizando las subsanaciones pertinentes realizadas por la empresa supervisora a la empresa constructora de los tramos. El 98 % reflejado del Lote No. 3 es debido a que se han y se están realizando obras adicionales las cuales consisten en construcción de cacetes, mejoramiento de taludes y colocación de barreras. Dichas Obras adicionales estarán contempladas en la última modificación ya ha aprobado por el BCIE.

- **Proyecto "Construcción y Pavimentación Carretera Catacamas-Cuevas de Talgua en el Departamento de Olancho, con una longitud aproximada de 8.93 Kilómetros, (Fondos Nacionales 0000003-13):**

Para el tercer trimestre el proyecto ha alcanzado un avance físico del 67.20% obteniendo la pavimentación de 1.5 km de una totalidad de 2km. Es importante mencionar que la baja ejecución presupuestaria se debe a que la empresa constructora acumula estimaciones para pago por lo que las mismas serán presentadas durante el último trimestre del año 2019.

- **Reconstrucción y Pavimentación Carretera La Libertad - Las Lajas, (Fondos Nacionales 72500):**

El Proyecto fue suspendido en el mes de junio 2019. Lo anterior debido a los largos tiempo para la aprobación por parte de Coordinación General por la modificación al costo del proyecto al 25% misma que será remitida posteriormente al Congreso Nacional para su aprobación.

Es importante mencionar que mientras el proyecto estuvo en ejecución logró un avance físico 20 km pavimentados, la construcción de 2 puentes y la pavimentación 700 mts lineales en el casco urbano obteniendo un porcentaje de avance físico del 99.57%. La obra faltante para finalizar el proyecto es la pavimentación de 5 km de carretera mismos que están contemplados en la última modificación realizada al proyecto.

Proyectos ejecutados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE):

- **Programa de Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional, (BID 3103/BL-HO y GRT/SX-16864-HO):**

Durante el tercer trimestre el proyecto se encuentra en ejecución obteniendo avances en las actividades siguientes: Negociación del Contrato para Consultoría "Estudio de Mecánica de Suelos en sitios donde la ENEE Ampliará Subestaciones Eléctricas, Publicación de la LPN Adquisición de equipo de cómputo para el Centro

Nacional de Despacho (CND) y la UCP- BID-JICA/ENEE y adquisición de computadoras portátiles para la Red de Estaciones de Monitoreo Hidroclimatológicas, Suscripción de Órdenes de Compra para la adquisición de “Mobiliario de oficina para el Centro Nacional de Despacho (CND) y la UCP-BID-JICA/ENEE.

- **Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral - Río Lindo, (BID 3435/BL-HO y JICA HO-P6):**

Para el presente ejercicio fiscal se han definido estrategias para agilizar la ejecución del proyecto, entre ellas: se ha dado seguimiento cercano a la ejecución del contrato de la firma TSK y pruebas de las mejoras a las sub estaciones eléctricas Cañaveral y Río Lindo. Por otra parte, se han tenido acercamientos con la Dirección General de Franquicias Aduaneras para tener claridad en los procesos de exoneraciones para reducir los tiempos de respuestas a las solicitudes. Por otra parte aún está pendiente la definición del proceso de adquisición de equipos de generación para el Complejo Cañaveral – Río Lindo a utilizar.

Proyecto Ejecutado por El Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS):

- **Proyecto De Energía Renovable Para El Desarrollo Rural Sostenible Pro-Energía Rural, (EDCF No. HND-5) Fondos de Korea Eximbank:**

Durante el tercer trimestre se realizó la Supervisión de 1,062 Sistemas Fotovoltaicos, acumulándose a la fecha 9,500 Sistemas Fotovoltaicos supervisados, ejecutándose de acuerdo a su planificación (10,486) en un 91%.

Al 30 de Septiembre 2019 se han instalado un total acumulado desde su inicio (2017, 2018 y 2019) de 21,486 Sistemas Fotovoltaicos sobre los 21,486 planificados, ejecutando el 100% de la meta física total programada del proyecto, (Instalación de 21,036 Sistemas Fotovoltaicos en viviendas, 416 Escuelas y 34 Centros de Salud), distribuidos en los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira, Intibucá, Santa Bárbara y La Paz. Con respecto al componente de las Juntas de Energía se ha logrado ejecutar 580 Juntas de Energía y con respecto a la meta total de 595, (99%).

El Proyecto en la actualidad se encuentra en la etapa de Operación, Mantenimiento y Soporte, la cual comenzó en julio 2019 y finalizará en junio 2020.

En relación a la transferencia entre categorías de inversión, específicamente “Contingencias” el organismo ha manifestado en fecha 2 de septiembre de 2019, que no procedió la validez del aumento de costos por el consultor Dohwa Engineering en el uso de contingencia. Por lo que dicho incremento debe ser absorbido por el consultor.

Proyecto Ejecutado por Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL):

- **El Proyecto Servicios Convergentes de Nueva Generación, (FP-HONDUTEL-22102) Fondos Propios:**

Al tercer trimestre el proyecto no presenta ejecución presupuestaria y cuenta con una baja ejecución acumulada debido a la falta de liquidez que atraviesa la Empresa.

Durante el año 2018 se realizó vía licitación la adquisición de bienes adquiridos para la Instalación de Equipos, soluciones de valor agregado y ampliación de Red IP (Internet Protocol), La Dirección Red IP es un número que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red (elemento de comunicación/conexión de un dispositivo (computadora, tableta, portátil, etc.). Además, continúa en la preparación de documentos y bases legales para el proceso de licitación, para la construcción, iluminación e instalación de rutas de conectividad.

En el tercer trimestre 2019 se sigue dando continuidad al proceso de diseños, presupuestos y definición de alcances para someter a aprobación de los procesos de Junta Directiva.

Proyecto Ejecutado por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS):

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB), (BID 4518/BL-HO):**

Se detallan las principales actividades realizadas durante el tercer trimestre 2019:

Se han diseñado al 100% 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio que incluye: mejora, reparación y/o construcción del sistema de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial y sistema vial para las colonias: Nueva España, Nueva Australia, Nueva Galilea y 25 de Enero.

Se tiene la licencia ambiental para 4 proyectos integrales y la aprobación del SANAA y ENEE del diseño de sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y sistema eléctrico de 4 proyectos integrales de mejoramiento de barrio.

Se ha publicado el documento base de licitación del proyecto: Proyecto de Integración Urbana, incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, agua potable, drenaje pluvial, mejoramiento vial y obras de mitigación de riesgos para 1071 predios en las siguientes colonias: Nueva Australia, Nueva Galilea, Nueva España y 25 de Enero; se espera formalizar el contrato de ejecución de obras para el mes de noviembre de 2019; la supervisión del proyecto ya está adjudicada e inicia la ejecución de su contrato en el mes de octubre de 2019 con la revisión de diseños de obras de infraestructura.

Se ha contratado la ejecución y supervisión de proyecto de 6 obras de equipamiento social Reparación de Cancha Polideportiva, Colonia Nueva Galilea, Construcción de Centro Comunal, Colonia Nueva Galilea, ampliación de Jardín de Niños; Colonia Nueva España, ampliación Escuela David Corea Sánchez, Colonia Australia, construcción Centro Comunal, Colonia Australia, y Construcción Centro Comunal, Colonia 25 de Enero; se espera el inicio de las obras a finales del mes de octubre de 2019.

Se está ejecutando la consultoría para el diseño de 5 proyectos integrales de mejoramiento de barrios: Proyecto de Integración Urbana Incluye: Ampliación, Mejoramiento y/o Construcción de Sistemas de Alcantarillado Sanitario, Agua Potable, Drenaje Pluvial, Red de Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Espacios de Recreación y Obras de Mitigación de Riesgos para 3035 predios, en las siguientes colonias: Montes de los Olivos, Nueva Jerusalén No. 2, Brisas del Mogote, Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble y Altos del Mirador; ya se ha realizado el informe de diagnóstico de barrios y se

están realizando los diseños preliminares de los sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario, drenaje pluvial, pavimentación, alumbrado público y equipamiento social.

Se ha ejecutado el Programa de entrenamiento deportes olímpicos y Valores en las disciplinas de: Taekwondo, Tenis de Mesa, y Levantamiento de pesas, con una participación de 900 niños y jóvenes de las colonias beneficiarias.

Se ha obtenido la asistencia de 1344 personas capacitadas en el programa de valores y emprendimiento en los siguientes temas: Organización Comunitaria, Normas Parlamentarias, Derechos humanos, derechos del niño y adolescencia, Derechos humanos, derechos de la mujer y adulto mayor, Elaboración y envasado de encurtidos.

Elaboración de arroz chino, Elaboración de piñatas, Elaboración de tres leches, Confección de bisutería.

Mujeres de los barrios intervenidos capacitadas en emprendedurismo y empleo: 20 mujeres se capacitan a través del programa Empleando Futuros en las siguientes especialidades: Operario Textil (3), Panadería (4), Auxiliar de Bodega (2), Diseño Gráfico (5), Operario de Restaurante (6).

Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS 522-0501-4):

El propósito de esta actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

Actualmente finalizaron con cierre financiero 9 proyectos, 5 proyectos está por iniciar y 10 proyectos con porcentajes entre 45 % y 98% de ejecución

Programa Infraestructura Rural (BCIE), Agua y Saneamiento, (BCIE-1736):

Actualmente se encuentran en ejecución tres (3) subproyectos de construcción de sistemas de agua potable mediante Microcaptación pluvial y saneamiento, con un avance de (21%) En el sector de Caminos Rurales, se encuentran en ejecución dos (2) subproyectos: rehabilitación del tramo Calle Agua Zarca del municipio de Camasca; así como el tramo Azacualpa - Buena Vista del Municipio de Candelaria.

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/ KFW SE-FHIS FASE III y IV, (2014 67 414 (KFW) / FHIS – SE y SE/FHIS VIII No.2008-66-178):**

A la fecha, se finalizó 4 proyectos con el cual se beneficiaron 1,933 personas (alumnos y personal administrativo) y se generaron 108 empleos, con lo cual se alcanzó ejecutar el 100% con respecto a lo planificado para el tercer trimestre, de acuerdo a la meta física de PROMINE en su Fase III.

Con relación a la Fase IV, actualmente se encuentran 11 centros educativos en ejecución, se espera que se beneficien 1,758 personas (alumnos y personal administrativo) y se espera

generen 294 empleos, se alcanzó a ejecutar el 36% del monto contratado al final del tercer trimestre.

❖ EL GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL:

Este Gabinete Sectorial Social lo conforman 17 instituciones de las cuales seis (6) instituciones: Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Universidad Nacional de Agricultura (UNA) y la Dirección Nacional de Ciudad Mujer, ejecutan 16 programas y proyectos de inversión pública.

El Gabinete tiene un presupuesto vigente asignado de **L1,394,683,218** en el tercer trimestre logró una ejecución de **L570,362,696**. equivalente el **41%** respecto al presupuesto vigente. La Distribución de la Inversión del Gabinete, está concentrada mayormente en la Secretaría de Desarrollo e Inversión Social (SEDIS) con un **49%** seguida de la Secretaría de Salud (**32%**), Secretaría de Educación (**13%**), Universidad Nacional de Agricultura (**3%**), Dirección Nacional de Ciudad Mujer (**1%**) y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (**1%**).

Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Social, están destinadas a inversión en desarrollo humano en las poblaciones más vulnerables, mejoramiento y cobertura de los servicios de salud y la red hospitalaria del País y proyectos de infraestructura (productiva, social, básica), fincas y cultivos; electrificación, (instalación de sistemas solares), extensión de red y rehabilitación de caminos rurales, construcción (sistema de agua potable, conexiones domiciliarias, obras civiles de agua y saneamiento; estudio y diseño para proyectos de alcantarillado; educación y salud.

Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS):

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, la inversión de la institución se concentra en siete (7) proyectos relevantes que apoyan las Traslaciones a las Familias de Extrema pobreza. Entre estos se encuentran.

• Programa de Apoyo a la Red de Protección Social II (BID 3371/BL-HO):

Durante el tercer trimestre en el Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas: no se realizó programación ni ejecución en dicho componente; en el Componente II Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Tercer Ciclo de Educación Básica: con énfasis en zonas rurales focalizadas se continuó fortaleciendo la Unidad de Corresponsabilidad de la Secretaría de Educación a través de la contratación del personal que apoya y garantiza la operatividad técnica del Programa para la corresponsabilidad.

Dentro del Componente V Centros Educativos de Educación Básica con Instalaciones, se continuó con la ejecución de las obras de infraestructura escolar en 19 Centros de Educación Básica (CEB), de los departamentos de Copán (2), La Paz (6), Lempira (3), Ocotepeque (2) y Santa Bárbara (6) distribuidos en siete (7) lotes.

Se efectuó el pago en concepto de anticipo del 20% del valor de los contratos suscritos: a la presentación de la garantía de las Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en: 34

Centros de Educación Básica (CEB) distribuidos en dieciséis (16) lotes de los Departamentos de Intibucá (3), Copán (10), La Paz (5), Lempira (4), Santa Bárbara (9) y Ocotepeque (3), particularmente del Contrato: 411 3371 2019, Contrato: 416 3371 2019, Contrato: 419 3371 2019, Contrato: 420 3371 2019 y Contrato: 421 3371 2019.

Se culminó con la evaluación correspondiente a la LPN-008-SSIS-SE-BID-3371-2018: Obras de Ampliación para el Tercer Ciclo en 24 Centros de Educación Básica (CEB) de los Departamentos de Intibucá (1), Copán (5), La Paz (5), Lempira (6), Santa Bárbara (6) y Ocotepeque (1) distribuidos en doce (12) lotes y se lanzó la expresión de interés de la contratación de la firma supervisora de los 24 CEB.

Asimismo, se realizó el pago No.2 correspondiente al 10% del monto del Contrato de servicios de consultoría: Supervisión de Obras de Infraestructura para el Proyecto Ampliación de Cobertura del Tercer Ciclo en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Ocotepeque y Copán.

Se realizaron visitas de supervisión y verificación de avances de obra del contratista y firma supervisora de los centros educativos correspondiente al lote # 2 ubicados en el Departamento de La Paz e inspección del terreno para las nuevas obras adjudicadas previo a entrega de sitios de los lotes #3, #4 y 5 en los Departamentos de Copán y Ocotepeque, con el fin de mejorar la ampliación de cobertura del tercer ciclo en el occidente del país.

En este período, se hizo la recepción final de nueve (9) Centros de Educación Básica (CEB) en los departamentos de Lempira en los municipios de Gracias (1 CEB), La Campa (1 CEB) y La Unión (1 CEB), en el departamento de Copán en los municipios de San Antonio (1 CEB) y San Nicolás (1 CEB), en el departamento de La Paz en los municipios de Opatoro (1 CEB) y Santa Elena (1 CEB) en el departamento de Ocotepeque en los municipios de San Francisco del Valle (1 CEB) y Sensenti (1 CEB), correspondientes a la LPN-004-SSIS-SE-BID-3371-2019.

- **Financiamiento Adicional para el Proyecto de Protección Social (Bono 10,000), (IDA-5603):**

En abril 2019 fueron finalizados los pagos de los procesos de adquisiciones realizados en el año 2018: (i) adquisición Equipo, mobiliario de Oficina y equipo informático para fortalecimiento de la Operatividad de la SSIS, (ii) equipo de acondicionamiento, acceso, detección de fuego y aislamiento de Data Center, (iii) Licencias informáticas para virtualización de equipos año 2018, para el desarrollo de sistemas, mantenimiento de software, y replicación de bases de datos, firewall entre otros.

Asimismo, se efectuó el pago por los Servicios de Auditoría Externa Financiera y Revisión de Cumplimiento sobre Transferencias Monetarias Condicionadas para el Programa Bono Vida Mejor, correspondiente al año 2018.

En el marco del Desarrollo de la Estrategia de Desarrollo de Protección Social CENISS, se efectuó el pago por las adquisiciones realizadas y bienes recepcionados en 2018: Access Point para red inalámbrica del Centro Nacional de Información del Sector Social (CENISS), adquisición e instalación de servidores, discos, procesadores memorias y accesorios para la ampliación del almacenamiento y capacidades de plataforma de información, adquisición de 30 tabletas (gama alta tipo 1, marca Samsung), en el marco del Fortalecimiento del Registro Único de Participantes (RUP), equipo informático móvil personalizados para levantamiento piloto de la Ficha Socioeconómica única (FSU) en el uso de nuevas tecnologías, renovación de licencias de desarrollo Visual Studio Enterprise with MSDN Licencias Dvexpress para el CENISS, mobiliario de oficina para adecuación de las oficinas (60 sillas semi ejecutivas).

- **Programa de Apoyo al Sistema de Protección Social con Prioridad en Occidente (3723/BL-HO):**

En el tercer trimestre en el Componente I Transferencias Monetarias Condicionadas: se realizó la primera entrega de TMC, a la fecha se cuenta con un dato de entrega 40,655 TMC en los departamentos de: Copán (6,092 hogares), Choluteca (1,910 hogares), El Paraíso (10,615 hogares), Intibucá (9,744 hogares), La Paz (1,796 hogares), Lempira (9,235 hogares), Ocotepeque (749 hogares) y Olancho (514 hogares).

Componente Piloto de Superación de Pobreza: Se continuó con la implementación del Piloto denominado "Emprendiendo una Vida Mejor" (EMVIDA), a través del contrato suscrito entre Fundación Capital y la SSIS, dirigido fundamentalmente aquellos hogares que por la edad de sus hijos(as) saldrán del PBVM.

Se brindó el seguimiento y supervisión a la realización de talleres de manejo de deudas y riesgos en sus visitas a los hogares en el Departamento de El Paraíso.

Se desarrolló el taller y visita a los hogares en la preparación de los perfiles de negocios en el municipio de Marcala, Departamento de La Paz, en el marco de ejecución del Proyecto "Emprendiendo una Vida Mejor" del Programa Bono Vida Mejor.

Se realizó transferencia Fundación Capital, correspondiente al 30% del valor total contrato: 001 FC 3723 2018 por un monto de L3,786,238.80.

Se realizó el complemento para la transferencia a cincuenta (50) hogares participantes del Proyecto Piloto "Programa Emprendiendo una Vida Mejor", de acuerdo a lo establecido en el último párrafo de la Cláusula Primera: Objetivo Contrato de la Adenda No.03 del Contrato de Prestación de Servicios Bancarios Interinstitucional entre la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS/PRAF) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), en el marco del Programa Bono Vida Mejor por un monto de L351,928.00.

Proyecto Ejecutado por Ciudad Mujer:

Centro Ciudad Mujer Kennedy:

El Centro Ciudad Mujer Kennedy se encuentra en operación y funcionando en todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año, se han atendido 151,920 mujeres, de las cuales 38,696 fueron nuevos ingresos (25%) del total y 113,224 (75%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo en 2019 un promedio diario de 278 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 287,652 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 18,278 mujeres de las cuales 2,679 fueron nuevos ingresos (15.0%) del total y 15,599 (85%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 28,420.

Centro Ciudad Mujer Choloma:

Es el segundo Centro Ciudad Mujer en Honduras, se encuentra operando y en funcionamiento todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año, se han atendido 65,023 mujeres, de las cuales 19,594 fueron nuevos ingresos (30%) del total y 45,429 (70%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 163 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 168,928, entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 10,206 mujeres de las cuales 2,110 fueron nuevos ingresos (21%) del total y 8,096 (79%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 26,650.

Centro Ciudad Mujer San Pedro Sula:

Es el tercer Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 26 noviembre del 2018 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 40,713 mujeres, de las cuales 11,894 fueron nuevos ingresos (29%) del total y 28,819 (71%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 227 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 94,568 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 15,069 mujeres de las cuales 3,457 fueron nuevos ingresos (23%) del total y 11,612 (77%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 31,810.

Ciudad Mujer Móvil:

Consiste en extender la capacidad de acción del programa Ciudad Mujer en Honduras mediante la entrega de servicios de calidad en zonas de marginación social y dispersión poblacional y geográfica a la población con nulo o limitado acceso a los servicios esenciales para el empoderamiento de las mujeres.

Entró en operación febrero del 2018, operando con los módulos de SSR, MAPRODEM, MAE-INFOP MEC y MAI. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 8,407 mujeres, de las cuales 7,692 fueron nuevos ingresos (91.5%) del total y 715 (8.5%) visitas subsecuentes en la Móvil, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida y los servicios brindados por los diferentes módulos; los servicios prestados ascendieron a 13,573 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2 o 3 módulos a la vez.

Durante el trimestre se han atendido a 1,532 mujeres de las cuales 1,516 fueron nuevos ingresos (23%) del total y 16 (77%) visitas subsecuentes y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 2,327. Actividades Realizadas:

Se realizó la socialización del programa y desparasitación de los infantes que acompañaban a sus madres en la inauguración del Parque Vida Mejor "Yojoa" #78 ubicado en Santa Cruz de Yojoa.

En las instalaciones del INFOP se realizó una feria de la salud y bienestar, brindando el apoyo y socializando el programa y los centros de Ciudad Mujer de Choloma y San Pedro Sula.

Centro Ciudad Mujer La Ceiba:

Es el cuarto Centro Ciudad Mujer en Honduras, entró en operación 17 julio del 2019 con todos sus módulos. Al 30 de septiembre del presente año se han atendido 10,505 mujeres, de las cuales 7,911 fueron nuevos ingresos (75%) del total y 2,594 (25%) visitas subsecuentes al Centro, reflejando de esa forma su conformidad y satisfacción con la atención recibida en los diferentes módulos, atendiendo un promedio diario de 161 visitas y los servicios brindados por los diferentes módulos ascendieron a 12,438 entendiéndose que cada usuaria puede visitar de 2, 3 o 4 módulos a la vez.

Proyecto Ejecutado por Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM):

- **Construcción del Edificio Multifuncional de Talleres y Laboratorios en el Centro Regional de San Pedro Sula de la UPNFM, (FN 0000057-11 UPNFM):**

La construcción tendrá un edificio de 2 ambientes en el primero de un solo piso se construirá el módulo de talleres para la Carrera de Educación técnica Industrial, contará con obras exteriores, plazas, estacionamientos, áreas de bancas y dispersión de áreas verdes, áreas de juegos de motricidad, el segundo ambiente contará con 3 pisos, en el primer nivel se ubicaran aulas, bodegas, talleres, vestíbulo y áreas para la dirección de servicios estudiantiles, que incluyen: Preclínica, clínicas médicas, odontología, consejería educativa, áreas de espera, y áreas para laboratorios para diferentes especialidades, sala de conferencias y cuarto de servidores.

La Licitación se efectuó de acuerdo a los procedimientos de la LPN establecidos en la Ley de Contratación del Estado y su reglamento. La Dirección General de Inversiones Públicas (DGIP) en seguimiento a este proyecto ha insistido en que la UPNFM debe de acelerar los procesos del inicio de obras y así cumplir con el nuevo cronograma de tiempos. Actualmente la UPNFM al III Trimestre cuenta con un disponible de L11,997,390.0, los cuales están pendientes de ejecutar en este último trimestre 2019.

No hubo ejecución Financiera ni Física en este III Trimestre 2019. El día 13 de Septiembre fue adjudicado este proyecto por el Consejo Superior Universitario, por el momento se encuentra pendiente de firma el Contrato respectivo y la Orden de Inicio con la empresa ganadora DICONSET.

Proyectos Ejecutados por La Secretaría de Educación (SEDUC):

- **Proyecto: “Mejora de la Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el Empleo”, Proyecto Joven, (BID 4449/BL-HO):**

El objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de Educación Básica en los municipios priorizados por el proyecto; a fin de contribuir a la reducción de los factores de riesgo a la migración en adolescentes y la reinserción de los jóvenes emigrantes retornados. Su localización geográfica está en los Departamentos de: Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Santa Bárbara, Cortes y Francisco Morazán.

Durante el tercer trimestre el Proyecto Joven contó con grandes avances principalmente con la implementación de la mesa técnica y la incorporación de un Gestor Técnico del Proyecto (GTP), en la que se trabajó en conjunto con las direcciones de la SEDUC los siguientes documentos:

Términos de Referencia de consultorías varias para el fortalecimiento de la DIGECEBI.

Documentos de Convenio de Cooperación Interinstitucional entre de SEDUC y la UPNFM.

Documentos de Convenio con el Instituto de la Propiedad para la Legalización de Terrenos de Centros Escolares para Infraestructura Educativa.

Priorización de los Centros Escolares para las construcciones de los módulos del tercer ciclo.

Gira de Verificación de datos de CE a intervenir con Infraestructura Educativa.

Se dio inicio al Proyecto Piloto de Matemáticas con la actualización de la Base de Datos de los centros educativos que cumplen los criterios de elegibilidad para ser intervenidos, donde se seleccionaran a cuarenta (40) centros educativos de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Contratación de una asistencia técnica para el diseño y seguimiento de la implementación de proyectos piloto de formación de habilidades para el empleo y emprendimiento (Piloto de Emprendedurismo).

El proyecto presenta dificultad de ejecución por la baja asignación de la Cuota de compromiso que asigna la Tesorería General de la República, lo que conlleva retrasos para realizar las actividades planificadas, sobre todo adquisiciones y contrataciones. A su vez, sigue pendiente por parte de la SAR resolver el tema de la Exoneración de impuestos (bloqueo RTN SEDUC).

- **Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar” (PROMINE KFW Fase II):**

El PROMINE, es el Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar, el cual se enfoca en dotar de una infraestructura educativa adecuada, que permita una educación en condiciones pedagógicas modernas, considerando también el uso de los espacios exteriores, promoviendo una educación por valores.

Además, está la incorporación del rol de las escuelas en la prevención de la violencia y los espacios escolares seguros, con locales adecuados a las diversas condiciones climáticas y culturales de Honduras.

Durante el tercer trimestre, el Proyecto PROMINE-SE realizó las siguientes actividades:

Se efectuaron visitas por parte de los supervisores Departamentales para evaluación de la situación actual mediante la Pre-factibilidad de los Centros Educativos en los departamentos de Lempira, Intibucá y Santa Bárbara (siete centros en total).

Se efectuaron visitas por parte de los supervisores Departamentales para supervisión de los proyectos en ejecución de Fase IV, donde se cuenta con cuatro proyectos en los departamentos de Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara e Intibucá (un centro por departamento).

Al III Trimestre, se cuenta con sesenta y un (61) centros educativos legalizados. Aún están pendientes catorce (14) centros del total que fue priorizado para intervención de PROMINE Fase IV.

Revisión de expedientes y Carpetas de formulación de proyectos PROMINE priorizados en Fase IV, en los municipios de San Pedro de Tutule y La Paz del departamento de La Paz y el Municipio de Lucerna en Ocotepeque.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Salud (SESAL).

- **Programa Apoyo a la Red de Inclusión Social con Prioridad en Occidente, (BID 3723/BL-HO):**

En el Componente de la SESAL, se lograron avances en los siguientes sub componentes:

Sub componente Gestores descentralizados de primer nivel: 68,206 atenciones (atención de embarazadas, seguimiento de púérperas y recién nacido, control de anemia, control de diarrea, PF, y AIN-C a través de gestores descentralizados en el primer nivel). 919 atenciones de partos institucionales en los diferentes hospitales.

Dentro los principales servicios brindados se destacan la atención de mujer en estado de gestación, dotación de métodos de planificación familiar, atención de partos, abastecimiento y entrega de medicamentos, micronutrientes y zinc; así como la contratación de recurso

humano especializado (médicos, enfermeras y odontólogo), también se garantiza la atención 24/7 en el segundo nivel de atención (hospitales).

Las transferencias del período para gestores de primer nivel ascienden a L72,667,616 para el pago de 7 gestores de primer nivel.

Sub Componente Gestores descentralizados de segundo nivel: Dentro de los resultados alcanzados por este subcomponente se pueden mencionar los siguientes:

51,516 atenciones de Consulta Externa, 42,666 atenciones de Emergencia, 2,859 atenciones de Complicaciones Obstétricas, 1,094 atenciones de Complicaciones Neonatales 3,970 atenciones de partos institucionales, 817 atenciones en métodos de planificación familiar, Firma de 4 convenios de gestión para el segundo nivel de atención

Las transferencias del período para gestores de segundo nivel corresponden para tres Hospitales, Hospital Enrique Aguilar Cerrato (FUNDAGES), Hospital Mario Catarino Rivas, y Hospital Leonardo Martínez cuyo monto asciende a L. 16,925,849.

Sub Componente de Fortalecimiento de Hospitales: Comprende la adquisición de equipo médico hospitalario, equipo informático y contratación de asistencias técnicas para el fortalecimiento de hospitales. Al tercer trimestre, se realizó la medición de indicadores en el marco al programa, realizada por Unidad de Gestión Descentralizada (UGD). Igualmente se realizó modificación presupuestaria para incrementar la compra de micronutrientes.

- **Hospital María de Especialidades Pediátricas, (ITALIA-HOS/MARIA):**

El 01 de agosto del año en curso la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo AICS brindó sus observaciones a los contratos de suministros al proceso de Licitación Pública Internacional (LPI) para la adquisición de los lotes 3 y 9.

El 18 de septiembre la AICS brindó la No objeción a los contratos de suministros por lo que se procedió a remitir los mismos a la empresa adjudicada ATHEA S.p.A. para su respectiva firma en Italia igualmente los mismos están en proceso de firma por parte de la Ministra de Salud.

En el presente año no se reporta ejecución financiera; se otorgó una ampliación de plazo al 31 de diciembre 2020.

- **Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca, (EDCF No. HND-4) Fondos de Eximbak Korea:**

En este Proyecto se han realizado reuniones con personal de Salud para conocer la problemática del mismo y encontrándose que no hay acuerdos entre las autoridades de Salud, sobre el alcance del proyecto, por lo tanto a la fecha no se cuenta con los diseños finales para la construcción del Hospital de Choluteca.

Cabe mencionar que se emitió dictamen Técnico de Ampliación de Plazo en cumplimiento al Decreto Legislativo No.162-2018 mediante el cual el Congreso Nacional instruye a la Secretaría de Finanzas a realizar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 26 de enero del 2022.

El Proyecto Construcción y Modernización del Hospital Regional del Sur en Choluteca (EDCF No. HND-4), no presenta ejecución debido a que están realizando estudios y diseños para luego lanzar la Licitación Pública Internacional a finales del mes de octubre del 2019.

Proyecto Ejecutado por la Universidad Nacional de Agricultura (UNA):

- **Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior e Impulso de la Producción Sustentable (UNA/PINPROS)” (BCIE 2069):**

Los principales avances del proyecto a nivel de componentes se describen a continuación:

Construcción de la Primera Etapa del Edificio de Dormitorios para Estudiantes Mujeres H-V1: Se finalizó la Construcción del edificio de vivienda para estudiantes mujeres con la contratación de la empresa Cresco S de R.L. y se entregó la responsabilidad del bien a bienes duraderos de la UNA. En cuanto al equipamiento se contrató a la empresa Cummins S de R.L., la cual tiene pendiente por ejecutar US\$27,292.07 de US\$34,128.57, (20%).

Construcción de la Planta Procesadora de Productos Lácteos:

La planta está construida a un 100%, con garantía de calidad vencida el 02 de agosto de 2019 sin haber presentado ningún problema, construida por la Empresa IDECO.

Los equipos de la planta fueron instalados al 100% por el Consorcio HONDUTEC (hondureña – Nuevos Recursos (Colombia), quedando pendiente hacer las pruebas del equipo y la realización de los servicios conexos.

Se cuenta con la No objeción de la adenda de contrato de ampliación de plazo hasta febrero de 2020 y por monto de US\$57,385.78 para la adquisición de equipos complementarios. Los servicios conexos se realizarán una vez que se entreguen los nuevos equipos, los cuales son necesario para hacer las pruebas y capacitaciones pendientes. Ya se realizó el proceso de comparación de precios para el suministro e instalación del generador eléctrico para la planta de lácteos, se recibieron 3 ofertas, adjudicando el contrato del cual se tiene No objeción, a la fecha está en proceso de firma de contrato por el contratista.

Remodelación de la Planta Procesadora de Productos Cárnicos: El proyecto de la Remodelación de la Planta de Cárnicos se culminó físicamente el 16 de enero de 2017, el cierre de la ejecución financiera se realizó en marzo de 2017.

Se firmó el contrato con las Empresas DISATYR para Equipo por un monto de US\$194,538.7 ejecutado un total de US\$38,630.02, con un avance financiero del 20% y con CUMMINS para proveer Generador Eléctrico, ya se entregó el anticipo del mismo con un plazo de ejecución contractual de 150 días, pero debido a que el trámite de exoneración se venció el 30 de junio de 2019 y a esa fecha no se tenían todos los equipos disponibles, se está a la espera de la renovación de dicho trámite para hacer la recepción total de dichos equipos.

Procesamiento de carnes/Suministro, de instalación de equipo de climatización para planta de cárnicos, la empresa IDECO S.de R.L. firmó el contrato por un monto de US\$116,384.35, ejecutándose US\$79,911.30 (69% en avance financiero y un 90% en avance físico. En lo referente al equipamiento de planta, se firmó el contrato con la Empresa DISATYR para equipo de procesamiento de carnes por un monto de US\$194,538.70, ejecutándose US\$38,630.02 llevando un avance financiero de un 20% y 0% avance físico.

❖ GABINETE ECONÓMICO

Este Gabinete lo conforman veintinueve (29) instituciones:

De las cuales cinco (7) Instituciones están ejecutando proyectos de Inversión Pública: La Secretaría de Agricultura y Ganadería (**SAG**) con 74% de participación, Secretaría de Finanzas (**SEFIN**) 12%, Instituto Nacional de Conservación Forestal (**ICF**) con 8% y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (**STSS**) con 4%, Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (**SENASA**) con un 1%;, y en menor porcentaje el Instituto Hondureño de Ciencia Tecnología e Innovación (**IHCIETI**) y Centro Nacional de Educación para el Trabajo (**CENET**).

Al Tercer Trimestre 2019 el Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico cuenta con un presupuesto Vigente de **L.1,514,000,331** y un presupuesto devengado que asciende a **L. 735,318,716 (49%)**. Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico, están enfocados en la ejecución de Planes de Negocios, implementación de Sistemas de Riego, Modernización y Conservación Forestal y Medio Ambiente y Mejoras en zonas turísticas y culturales. Al tercer trimestre las distintas Instituciones del Sector, registran los siguientes avances físicos:

Proyecto Ejecutado por Instituto Nacional de Conservación Forestal (ICF):

- **El Proyecto Adaptación Al Cambio Climático en el Sector Forestal (CLIFOR), (DCI-AL-4/2012/023-5 I0) KFW/UE:**

Dentro de las actividades principales realizadas durante el tercer trimestre de 2019 se encuentran las siguientes:

Elaboración y presentación del documento que contiene un análisis cualitativo de diferentes temas que fueron abordados a través de acciones y procesos implementados durante los seis (6) años de intervención del programa CLIFOR, tales como:

Manejo forestal comunitario, Adaptación al cambio climático, Investigación aplicada y participativa, Participación de las mujeres en la forestería comunitaria, Beneficios obtenidos con la asistencia técnica del personal del proyecto y la sostenibilidad de las acciones.

Desarrollo de investigación aplicada-participativa y síntesis para tomadores de decisiones de la Región Forestal de La Mosquitia y El Paraíso en temática relacionada a las cadenas de valor en Forestería Comunitaria, Desarrollo de talleres como parte de las actividades de seguimiento a la implementación de Planes de Acción de las comunidades de Pransa, Suhi, Mabita y Rus Rus, en la Región Forestal de La Mosquitia.

El proyecto se encuentra en etapa de cierre, por lo que debe tomar las acciones necesarias en el último trimestre para la regularización de los fondos ejecutados en el presente año, de acuerdo a lo establecido en las Disposiciones Generales del Presupuesto Vigentes, referente a los proyectos que se encuentran en dicha etapa.

La asignación de cuota de compromiso por parte de la TGR es insuficiente para realizar las actividades planificadas, sobre todo adquisiciones y contrataciones.

Proyectos Ejecutados por Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG):

- **El Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR), (BCIE-2101):**

Comprende la construcción de cinco grandes sistemas de riego en los Departamentos de Yoro y Comayagua, lo que convierte al Proyecto en suma prioridad del Gobierno, ya se firmaron tres contratos de diseño y construcción de las obras a realizarse en las zonas de influencia del Proyecto.

Mostrando ejecución únicamente en: 95 km de Líneas de tubería Instaladas (conducción, distribución y terciarias), El subproyecto de Riego Sulaco: reporta un avance de 75 %, en la represa Maralito, 67% en Siguapa y 72% en Tascalapa, 21.8 Kms en avance: Línea de Conducción es de 0.705 Km, línea de Distribución 1.7 Km y línea terciaria de 19.4 Km.

- **Programa de Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR), (FIDA 816-HN):**

El Programa EMPRENDESUR, tiene su fecha de cierre en diciembre de 2019, por lo que el año 2019 tiene el gran reto de ejecutar sus recursos en base a lo programado, año clave lo que implica ejecutar los recursos eficaz y eficientemente.

Entre las actividades físicas ejecutadas del Proyecto tenemos:

Caminos rurales terciarios rehabilitados 41 km, Implementación del Plan de Asistencia Técnica. Incorporación de hectáreas agrícolas al riego 100 hectáreas, Estudio de Evaluación de Impacto elaborado del proyecto EmprendeSur, Informe de implementación de la Estrategia de Salida del proyecto.

- **Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego del Valle de Jamastran Fase 1, IN-(DL98134500295569L) Fondos de Exim Bank India:**

Se realizó visita e inspección al noveno Batallón de Infantería con el objeto de determinar la viabilidad de establecer el almacén de materiales en su predio, lo cual tuvo un resultado favorable, se solicitó al ministro de SEDENA su autorización y apoyo para este fin, posteriormente se realizó inspección en conjunto con el 1er Batallón de Ingenieros para determinar un presupuesto para acondicionamiento del plantel.

Pendiente el Pago de US\$3.6 Millones para embarque de materiales y equipo de riego.

Obtención de Licencia Ambiental Operativa, a través de la contratación de un Profesional en Servicios Ambientales (PSA).

Acondicionamiento del plantel en el 9no. Batallón de Infantería, compra y condicionamiento del reservorio para irrigación superficial, tramitación de dispensa definitiva para maquinaria y repuestos a importar.

La Empresa Apolo presentó enmienda al contrato comercial, la cual incluye cambios en el monto, diseño y plazos de ejecución, el monto inicial del contrato era de US\$.22.5 millones y se incrementó a US\$26.5 millones, que es el monto total del Convenio firmado con el Exim Bank India. Según argumenta la Empresa Apollo este incremento se debe a cambios de diseño, costos y plazos de ejecución.

- **Proyecto de Transformación en Regadío en la Ribera del Aguán, ING-BANK-(CREDITO-S/N) Fondos de Holanda:**

El proyecto consiste en dotar de equipo de riego a 311 productores del Municipio de Olanchito, Yoro; con este proyecto se incorporarán 3110 hectáreas bajo riego.

La ejecución financiera asciende L.200,528,985.57 representativos del 97% del presupuesto vigente.

- **Proyecto de Competitividad y Desarrollo Sostenible del Corredor Fronterizo Sur Occidental “PROLENCA”, (FIDA-I-899-HN, FIDA-II-200000125200 y GEF-FSS-05-HN):**

Comprende la formulación e inversión de planes de negocios y planes de desarrollo organizacional en los Departamentos del occidente y norte del país en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés.

Actualmente las inversiones ya están ejecutándose en el occidente del país, en los rubros de café, cacao, granos básicos (Departamentos de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara).

Entre las actividades físicas presentadas por la Unidad Ejecutora se resaltan:

Componente 1. Desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones rurales

Formalización y legalización de 30 organizaciones beneficiarias, proceso que se inició en el 2018, Formulación de 10 Planes de Negocios y 80 Planes de Desarrollo Productivo (Consultoría iniciada en el 2018, se pagará el 50% en el 2019), Formulación de 30 Planes de Negocio y 70 Planes de Desarrollo Productivo,

Componente 2. Desarrollo productivo y de negocios: asistencia técnica a las 90 organizaciones, Liquidación del primer desembolso y solicitud de segundos desembolsos.

Durante este periodo se han estado fortaleciendo las Organizaciones Beneficiarias en procedimientos de compras, procesos de liquidación del primer desembolso, en la actualidad hay 59 OB que están implementando los planes de inversión, al mes de septiembre se han ejecutado L.25,471,748.08 de fondos FIDA y de fondos GEF se han ejecutado L 5, 296,843.78

Componente 3. Infraestructura Rural: Se realizaron 28.7 km para completar el tramo de 33.30 km, Mecanización, Conformación tipo II: Alcantarillas (Drenaje) Balastado y Conformación Actividades ejecutada al 100%

Construcción Sistema de Riego El Carrizal, La Cañada y La Puerta, Municipio de Belén, Departamento de Lempira. Con la implementación de los planes de inversión se han generado 1,090 fuentes de empleo.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Finanzas (SEFIN):

- **Manejo Sostenible De Bosques, (BID3878/BL-HO):**

Se detallan las principales actividades acumuladas al tercer trimestre según Componentes:

Componente 1. Restauración de bosques afectados por la plaga del gorgojo

Se ha finalizado la socialización del proyecto a nivel de corporación municipal en 34 municipios, y se ha socializado a la fecha 20 a nivel municipal y 31 a nivel comunitario.

Se han identificado 42,852.31 hectáreas que cumplen con los criterios de elegibilidad del proyecto para realizar actividades de restauración, que significa el 101.3% del total del área programada a identificar. Se ha elaborado 18 planes de restauración, que representan 21,965.29 hectáreas, de los cuales se han aprobado 14 planes de restauración equivalentes a 14,884.68 hectáreas. En proceso de elaboración 4 planes de restauración que representan 1,460.16 hectáreas. Suscritos 13 convenios para la implementación del mismo número de planes de restauración, que representan 14,128.90 hectáreas.

En procesos de revisión y validación los Términos de Referencia para el Diseño e Implementación de la Estrategia de Comunicaciones, Visibilidad y Sensibilización del Proyecto. Desarrollada la versión Beta del Sistema de Monitoreo del Proyecto.

Se ha iniciado el proceso de adquisición (licitación pública internacional) del equipo de protección, seguridad y prevención de incendios, materiales e insumos para la producción de plantas para las organizaciones.

Componente 2. Fortalecimiento del sistema de sanidad forestal y mejora de la resiliencia de los bosques al Cambio Climático, En ejecución (etapa final) el Diplomado en Salud y Sanidad Forestal impartido por UNACIFOR para 50 técnicos del sector.

Componente 3. Mejora del acceso a financiamiento climático para promover el MFS

Se continúa con el fortalecimiento de la Oficina Presidencial de Cambio Climático Clima Plus a través de la contratación de las 2 asesorías técnicas en planificación y alianzas estratégicas. Se ha recibido la no objeción del banco el financiamiento del Certificado de Fundamentos de Cambio Climático para 25 funcionarios públicos y se iniciará en el mes de octubre 2019. Se ha elaborado el diseño del mecanismo financiero y operativo para acceder a financiamiento climático y el diseño de la Unidad de Gestión Económica y Financiera de Cambio Climático (UGE FCC) en la Secretaría de Finanzas.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS)

- **Fortalecimiento Institucional de Empleo Decente y Oportunidades de Empleo para Jóvenes en Honduras EUROLABOR, (DCI-ALA/2014/026-851) Fondos de la Unión Europea:**

Al tercer trimestre se continuó con el desarrollo de investigaciones sobre políticas, estrategias, programas y actores públicos y privados involucrados en la promoción del empleo decente. Se finalizó la aprobación del Marco de Acción Conjunta (MAC) por los sectores que conforman el Consejo Económico (CES). Asistencia Técnica para la creación y desarrollo de agendas de trabajo/Mesa Sectorial para la promoción del Trabajo Decente (MSD) dentro del CES. Capacitación con la OIT, para los sectores del CES, en diseño y ejecución políticas de empleo, protección social, migraciones laborales y trabajo decente, creación de un plan de monitoreo y evaluación de la implementación del MAC. Su avance Físico Acumulado al III Trimestre es: 55%.

Componente N.2: se finalizaron 4 estudios prospectivos en sectores productivos priorizados. Su avance Físico Acumulado al III Trimestre es: 47%.

Componente N.3: Instaladas 15 Mesas Territoriales de Empleo (MTE), 7 planes de Promoción de Empleo e Ingresos actualizados, en funcionamiento 8 nuevas oficinas del SENAHE, en Copán, Lempira, Intibucá, Islas de la Bahía, Olancho (2), Valle y Cortés asistencia técnica y acompañamiento a 200 MIPYMES en cadenas de valor priorizadas. Su avance Físico Acumulado al III Trimestre es: 42%.

❖ **GABINETE DE PREVENCIÓN, SEGURIDAD Y DEFENSA:**

Para el presente año, el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa cuenta con un Presupuesto vigente para el Programa de Inversión Pública (PIP) por la cantidad de **L. 344,257,212** para la ejecución de dos proyectos, los cuales uno (1) es ejecutado por la Secretaría de Seguridad y uno (1) por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) representando un 20% de ejecución (L. 68,050,176.59) para el tercer trimestre de 2019. Las principales metas ejecutadas al III trimestre, 2019 son:

Proyecto Ejecutado por Comisión Permanente de Contingencias (COPECO):

- **Proyecto Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) (IDA 5190-HN):**

El avance físico obtenido al tercer trimestre del 2019, se vio mejorado en relación al Trimestre anterior. El proyecto avanzó en las actividades prioritarias y con mayor impacto en los indicadores de resultados:

Construcción de 6 medidas estructurales (Obras) y su respectiva supervisión en los municipios de: i). San Pedro Sula, Cortés (2), ii) Tela, Atlántida, iii) Pimienta, Cortés iv) San Francisco de Yojoa, Cortés y v) Quimistan, Santa Bárbara. Los proyectos de ejecución de obras se encuentra adjudicados por un monto de L.37.2 millones, de los cuales están entre un 25% y 40% de ejecución física.

Diseño de 5 medidas estructurales en los municipios de: i) Puerto Cortés, Cortés, ii) Choloma, Cortés, iii) San Antonio de Cortés, Cortés, iv) Santa Rita, Yoro, v) El Negrito, Yoro. Con un monto base aproximado de L.2.5 millones, y cuya ejecución física está en un 50%.

Fortalecimiento institucional a través del diseño y construcción de parque solar de COPECO Central. Con un monto base de L.100 mil y cuya ejecución física está al 90%, este diseño será la base de la construcción del parque solar valorado en L.5.4 millones.

Fortalecimiento institucional del diseño y construcción del edificio de CENAOS-COPECO. Con un monto base de L.1.2 millones y su avance físico es 75%.

Fortalecimiento institucional compra de equipo y repuestos de CENAOS-COPECO. El proceso se encuentra adjudicado y está en espera de recepción de los bienes. Con un monto base de L.12.25 millones.

El proyecto realizó la socialización del levantamiento de necesidades en fortalecimiento institucional y se firmaron actas de necesidades, se adjudicó mediante una Licitación Pública Nacional por un monto de L.6.12 millones, y en el mes de noviembre los bienes serán entregados y pagados.

Proyecto Ejecutado por Secretaría de Seguridad (SEDS):

- **Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios, crédito BID 4518/BL-HO:**

Entre los avances del Componente Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios, destaca:

Negociación de Contrato del Proceso de Contratación de Firma Diseño de ANAPO para la Construcción de 2 Unidades Metropolitanas Policiales SPS y Municipal en Copán Ruinas. Contrato firmado para la Adquisición de cuatro (4) Vehículos Institucionales y un (1) Microbús, entrega 18 octubre. Elaboración de Informe de Evaluación para la adquisición de Unidades Móviles equipadas para el desarrollo de actividades comunitarias y vehículos SEDS. Periodo de presentación de ofertas del 10 de octubre al 10 de noviembre para el proceso de Remodelación y Acondicionamiento del Área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela y Oficinas de la Unidad de Modernización de la PNH.

Contrato firmado para la Adquisición de Equipo Informático para el área de recepción de denuncias, Modulo VIF en la UMEP No. 2, Belén, Comayagüela, entregas última semana mes de octubre. Contrato firmado para la Adquisición de Equipo Informático para la UTECI, entrega última semana mes de octubre.

En cuanto al Componente Efectividad policial los principales avances son: En proceso de elaboración el Rediseño Curricular de 4 cursos de ascensos para la escala de oficiales de Policías y Diseño Curricular de 5 cursos para ascensos para la escala básica. Contrato firmado para la Adquisición de Tablets para cadetes ANAPO, entrega última semana mes de octubre. Contrato firmado para la Adquisición de Equipo informático Unidad de Tutoría y Mentoría, entrega última semana mes de octubre.

Contrato Firmado para la adquisición de Test psicométricos para aspirantes a ingresar a la Policía Nacional, entrega el 25 de octubre. Contrato firmado para la Adquisición de Equipo Informático DIPOL, entrega última semana mes de octubre. Diseño de Obras de la Academia Nacional de Policía (ANAPO), contrato en ejecución. Entrega de tercer producto última semana de octubre. Notificación de adjudicación del proceso de Suministro y Colocación de Generador Eléctrico para la ANAPO. Lista corta conformada para el proceso de contratación de Firma para la supervisión de obras de la ANAPO. Notificación de Adjudicación para adquisición de Insumos para casos de homicidios y Equipo complementario para Laboratorio Criminalística

1.4 Financiamiento de la Inversión

El 49.4% del Gran Total es financiado por fuentes nacionales (incluye Vida Mejor, APP's y Programa de Infraestructura Vial), el 50.6% por fondos externos; de estos el 89.2% es financiado por crédito externo (fuente 21) y el 10,8% por donaciones (fuente 22 y 28). Principalmente con recursos provenientes del BID, BCIE, BM, Unión Europea y OFID. Ver cuadro No.2

Cuadro N° 2
Programa de Inversión Pública: Clasificación Fuente de Financiamiento al 30 de septiembre de 2019
Cifras en Lempiras

Fuente de financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado Aprobado	%Ejec./ (Ejecutado/ Vigente)
Fondos Nacionales	761,744,370	1,072,392,455	350,795,393	33
11 - Tesoro Nacional	635,005,194	945,653,279	348,456,359	37
12 - Recursos Propios	126,739,176	126,739,176	2,339,034	2
Fondos Externos	11,249,300,724	10,948,918,017	4,963,836,334	45
21 - Crédito Externo	9,829,788,795	9,757,500,533	4,352,122,151	45
22 - Donaciones Externas	1,385,973,094	1,141,465,821	576,634,833	51
28 - Cuenta del Milenio	33,538,835	49,951,663	35,079,349	70
Total general	12,011,045,094	12,021,310,472	5,314,631,726	44
Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor)	4,500,000,000	4,500,000,000	3,058,200,000	68
Proyectos APP	6,509,000,000	3,125,900,000	2,365,955,982	76
Programa Vial	2,000,000,000	2,000,000,000	537,500,000	27
Sub-Total	13,009,000,000	9,625,900,000	5,961,655,982	62
Gran Total	25,020,045,094	21,647,210,472	11,276,287,708	52

PIP: Fuente SIAFI

APP's: Dirección de Política Macrofiscal, Dirección de Contingencias Fiscales, Superintendencia de Alianza Público Privado (SAPP)

Las instituciones que concentran el mayor porcentaje de recursos, destaca la INVESTH, INSEP, ENEE, SAG, SEDIS orientado a la construcción de carreteras, proyectos de energía, construcción de sistemas de riego, planes de negocio, Fondo Social Reducción de la Pobreza (Vida Mejor, Microempresas Eco fogones, techos, pisos saludables, CONVIVIENDA, Microempresas Huertos familiares). En seguimiento a las Disposiciones Generales de Presupuesto Año 2019, en su Artículo 25, que literalmente expresa que; "Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 36 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de agilizar la incorporación de los recursos externos provenientes de donaciones o préstamos previamente aprobados por el Poder Legislativo, el Formulario (FMP-05) denominado "Documento de Modificación Presupuestaria" generado por el SIAFI, hará las veces de una Resolución Interna y se adicionarán en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente Ejercicio Fiscal, siempre que se cuente con la contraparte nacional, cuando corresponda.

En el caso de los recursos de financiamiento externo, que requieran incorporación presupuestaria deberán contar previamente con el Dictamen Favorable de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, SEFIN."

1.5 Factores que han incidido en la Ejecución de la Inversión Pública, para el tercer trimestre del año 2019

Durante la ejecución de programas y proyectos, se presenta una serie de obstáculos que limitan la normal ejecución de los mismos, en términos físicos y financieros, sin cumplir el objetivo esperado, y por ende la ausencia de impacto en la población meta. Entre los problemas relevantes sobresalen:

Área	Problemas	Acciones
Técnica	La inadecuada planificación por parte de las unidades ejecutoras ocasiona reprogramación de metas, lo que implica solicitar al Organismo Financiador su No Objeción (en caso de los préstamos), ocasionando retrasos en la ejecución.	Brindar por parte de la DGIP, asistencia técnica a las instituciones gubernamentales en la identificación, formulación y evaluación de proyectos.
	Debilidad en el ciclo de pre inversión, lo que se traduce en la modificación o reformulación de los proyectos, incrementando el costo de los mismos, teniendo que ser cubiertos por el Gobierno.	Se debe dar mayor importancia a la elaboración de los diseños y estudios de proyectos, pasando por todos los niveles de pre inversión: idea, perfil, pre factibilidad y factibilidad; y de acuerdo a la Guía metodológica de Formulación de proyectos de Inversión de la DGIP.
Administrativa-Financiera	Falta de asignación de Cuotas por parte de la Tesorería General de la República	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.
	Desfase de la ejecución, considerando la tardía presentación de estimaciones de avance por parte de los proveedores.	Identificar mecanismos de control para establecer tiempos de entrega en los informes de estimaciones, tratando de programar los pagos de acuerdo al tiempo que corresponde.
	El proceso de cumplimiento de condiciones previas para que declaren vigente el préstamo los organismos financiadores y el cumplimiento de condiciones previas al Segundo desembolso, es lento.	La Unidad Ejecutora responsable y la SEFIN, deben dar un seguimiento puntual para mejorar dichos procesos.
	Falta de un mecanismo para acelerar las exoneraciones de impuestos que están sujetos los proyectos de inversión	Implementar acciones con la Dirección General de Franquicias Aduaneras, para mejorar la atención a las gestiones de proyectos y otorgar una respuesta oportuna a las unidades ejecutoras.
	Personal de apoyo insuficiente en relación a la carga de trabajo en las UAP, que limita la agilidad en la firma de contratos, así como la ejecución de los proyectos.	Identificar un mecanismo de respuesta oportuna y eficaz a las solicitudes por parte de las unidades ejecutoras a fin de agilizar los procesos en las mismas.
	Falta de asignación de fondos de contraparte para convenios de crédito entre el Gobierno de Honduras y Organismos Financiadores.	Las instituciones deberán programar los recursos de contraparte para hacer frente a dicho compromiso, evitando la reorientación de los mismos.
Legal	Retrasos en la formalización de contratos de construcción y supervisión, derivados del pago de derecho de vía y paso de servidumbre en el caso de líneas de transmisión.	Establecer e implementar una adecuada estrategia legal de negociación para liberar el derecho de vía de los tramos en construcción. Aplicación de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos.
